



E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 891.180.026-5

ESTADO: Registrado

CUENTA X PAGAR Nro. 62485

Fecha Doc Pagos: 24 de diciembre de 2025

Nro. Factura/Cta. Cobro: CVS19

Fecha Doc Invent:

A: CONSORCIO SAN VICENTE

Nit/CC 901785549

DIRECCION: CR 4 2 85 ZONA INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

TELEFONO: 60887168 CIUDAD: NEIVA
26

DETALLE:

FACTURA CSV 19, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL No. 15 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0790 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR CAUSACION 2,332,916,930.00

- VALOR RETEFUENTE 66,654,769.00
- OTRAS RETENCIONES 216,628,001.00
- VALOR RETEIVA 0.00
- VALOR RETEICA 23,329,169.00

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
319 EDIFICACIONES	16150101		EDIFICACIONES	Debito	\$ 3,332,738,472.00
302 ANTICIPO ADQUISICION DE SERVICIOS	19060402		ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	Credito	\$ 999,821,542.00
914 CONTRIBUCIONES	24402301		CONTRIBUCION 5% LEY 1106 DE 2006	Credito	\$ 166,636,924.00
909 RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 66,654,769.00
911 RETEICA POR SERVICIOS	24362702		RETEICA POR COMPRA DE SERVICIOS	Credito	\$ 23,329,169.00
128 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24402403		TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Credito	\$ 49,991,077.00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24010105 \$ 2,026,304,991.00

SÓN: DOS MIL VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. <u>214805525</u>	Fecha <u>30 DIC 2025</u>
Firma del Responsable <u>[Firma]</u>		Banco <u>Regalias</u>	
Firma Pagador <u>[Firma]</u>		Firma Pagador <u>[Firma]</u>	
CONTABILIDAD		CONTROL ADMINISTRATIVO	
Firma contador (a) <u>[Firma]</u>		Subdirector administrativo <u>[Firma]</u>	
ORDENADOR DEL GASTO			
Gerente <u>[Firma]</u>			

RECIBI CONFORME

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhijimenec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-410003
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-3:03 p. m.

JUAN DE JESUS JIMENEZ CORDOBA
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

RELACION DE PAGOS

Tipo Doc. Identidad:		NIT	Número Doc. Identidad:	901785549	Tercero:	
Tipo:		CONTRATO	Número:	090 DE 2024	Fecha:	2024-01-04
Objeto:		OBJETO				
Unidad / Sub-Unidad:		CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA				
		03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL				
		Número de Compromiso:				
		225				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO			DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE S	VALOR NETO	CTACHED UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2025-03-27	525	1.934.505.99	8.00	525		19372972 5	2025-04-04	1.934.505.99	254.249.360.00	1.680.256.63 8.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-06-05	1125	989.672.081	0.00	925		19708762 5	2025-06-11	989.672.081	0.00	989.672.081 0.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-07-25	1625	1.831.026.39	1.00	1225		20020972 5	2025-08-06	1.831.026.39	240.649.183.00	1.590.377.20 6.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-08-01	2125	1.394.909.42	7.00	1325		2025002 5	2025-08-11	1.394.909.42	183.330.883.00	1.211.578.47 4.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-08-14	2625	1.831.521.37	8.00	1625		20270242 5	2025-08-21	1.831.521.37	240.714.238.00	1.590.807.13 9.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-08-05	3225	1.467.420.86	8.00	2225		2060472 5	2025-09-23	1.467.420.86	192.661.029.00	1.274.759.83 8.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-10-07	3325	1.435.745.16	6.00	2325		20753372 5	2025-10-10	1.435.745.16	188.697.936.00	1.247.047.23 6.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-10-21	3725	1.248.384.79	5.00	2625		21022512 5	2025-10-26	1.248.384.79	164.073.431.00	1.084.311.36 4.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-12-20	4325	1.374.216.89	2.00	3125		21411142 5	2025-12-24	1.374.216.89	180.611.363.00	1.193.605.52 9.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		
2025-12-26	4725	2.332.916.93	0.00	3425		21480562 5	2025-12-30	2.332.916.93	306.611.939.00	2.026.304.99 1.00	267877108	BANCO DE OCCIDENTE			01-130100-DT		

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

MHjijmenec
03-410003

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	214805525	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad /Subunidad ejecutora:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL				
Estado:	Bajo Procesamiento			Nro Obligación:	3425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2.332.916.930.00			Valor Deducciones:	306 611 939.00	Valor Neto:	2.026.304.991,00	Saldo x Pagar:	2.332.916.930.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS									
Números				No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00: Reintegrado Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00: Reintegrado Neto Moneda:				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901785549	Razón Social:	CONSORCIO SAN VICENTE				Medio de Pago:		Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	267877108	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
TESORERIA									
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:			Tipo:		Fecha:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
			VALOR			VALOR REINTEGRADO			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO			FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL			100RG-1901-0300-2022-00006-0007	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA					
			Nación	RG41000	CSF	2.332.916.930.00	0,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
		TERCERO	TARIFA	VALOR						
2-01-04-01-14	REFERENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	2.000 %	66.654.769,00	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	800103913	5.000 %	166.636.924,00	DEPARTAMENTO DEL HUILA					
2-01-05-01-36-03-08	RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	891180022	0.700 %	23.329.169,00	MUNICIPIO DE GARZON					
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800103913	1.500 %	49.981.077,00	DEPARTAMENTO DEL HUILA					
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
03-410003 - ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-26	2.332.916.930,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Unidad ó Subunidad: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Ejecutorio Solicitante: 03-410003
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-4:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	4725	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	225	Nro. Cdp:	225	Tasa de Cambio:	0.00
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total:	2.332.916.930,00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Valor Antes del Iva:	2.332.916.930,00	Valor Iva:	0.00						
Identificacion:	901785549	Razon Social:	CONSORCIO SAN VICENTE						
TERCERO									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.: Factura CSV19 ACTA PARCIAL 15 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 090 DE 2024. VALOR TOTAL FACTURA \$3.332.738.472 PESOS MCTE. SE AMORTIZA 30% ANTICIPO POR \$999.821.542 PESOS MCTE GIRADO CON RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHamidiaz
Unidad ó Subunidad: 03-410003
Ejecutora Solicitante: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	3425	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	2.332.916.930,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	2.332.916.930,00	Saldo x Ordenar:	2.332.916.930,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	306.611.939,00	Valor Neto:		2.026.304.991,00		Nro. Compromiso:	225	Nro. Ctip:	225		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	78		
TERCERO											
Identificación:	901785549	Razon Social:	CONSORCIO SAN VICENTE	Medio de Pago:							
CUENTA BANCARIA											
Número:	287877108	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:		CAJA MENOR					
Número:	4725	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificación:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	Tipo:		Fecha:								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	60RG-1901-0300-2022-00006-0007 CONSTRUCCION DE LA NUEVA E S E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA	Nación	RG41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-12-26	2.332.916.930,00	0,00	2.332.916.930,00	2.332.916.930,00		
Total:						2.332.916.930,00	0,00	2.332.916.930,00	2.332.916.930,00		

Objeto:

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-28	Generada	2.332.916.930,00



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MIMILIAZ MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Unidad ó Subunidad 03-410003 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
Ejecutora Solicitante VICENTE DE PAUL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26 4:40 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETENIENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197286	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	3.332.738.472,00	2,000 %	66.654.769,00	66.654.769,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.332.738.472,00	5,000 %	166.636.924,00	166.636.924,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.332.738.472,00	1,500 %	49.991.077,00	49.991.077,00
2-01-05-01-98-03-08 RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORIA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	NIT 891180022	MUNICIPIO DE GARZON	3.332.738.472,00	0,700 %	23.329.169,00	23.329.169,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



RESOLUCIÓN No. 0790 DE 2025
(22 de diciembre de 2025)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL No. 15 DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL DE GARZÓN Y CONSORCIO SAN VICENTE"**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, mediante el Decreto 086 de 2024, con acta de posesión No. 050 del 27 de marzo del 2024 y en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, y constitucionales legales, estatutarias y administrativas, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 13° de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.
2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rigen en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. Que mediante la Resolución 1440 de 2024, el Ministerio de Salud estableció nuevos lineamientos para actualizar y fortalecer los mecanismos de contratación dentro de las Empresas Sociales del Estado. Esta resolución tiene como objetivo mejorar los procesos de contratación en aspectos como la sostenibilidad financiera, el uso eficiente de los recursos públicos y el control riguroso de la ejecución contractual.
4. Que el artículo 4° del Acuerdo No. 016 de 2024 – Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.
5. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No. 003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la "Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente

Vigilado Supersalud



de Paúl del Municipio de Garzón- Huila", por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE Iva Incluido (\$86.899.134.742)**, y con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo al avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.
7. Que adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el parágrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).
8. Que el parágrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.
9. El Consorcio San Vicente, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.
10. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 2 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$208.905.712,60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto



a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$146.233.999). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.

11. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 3 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$719.606.482,40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$503.721.537,40) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de Noviembre de 2024.
12. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 6 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 003 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$882.800.683,70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$617.960.479) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0971 del 05 de Diciembre de 2024.
13. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 5 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 004 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$390.626.458,30), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$273.438.521), Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0995 del 17 de Diciembre de 2024.
14. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 7 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 005 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$137.838.998,70), correspondiente a un pago



parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$96.487.299,00). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 1014 del 26 de diciembre de 2024.

15. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 8 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 006 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$2.763.579.997,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.934.505.998,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0150 del 21 de marzo de 2025.
16. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 9 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 007 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$1.413.817.258,10) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS (\$989.672.080,00) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0290 del 16 de mayo de 2025.
17. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 10 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 008 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$2.615.751.986,90) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.831.026.391) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0416 del 11 de julio de 2025.
18. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 11 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 009 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS



MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.992.727.752,60) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$1.394.909.427) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0428 del 21 de julio de 2025.

19. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 12 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 010 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2.616.459.111,50) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.831.521.378) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0485 del 05 de agosto de 2025.

20. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 13 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 011 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.096.315.525,20) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.467.420.868) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0545 del 28 de agosto de 2025.

21. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 15 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 012 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (\$2.051.064.523) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$1.435.745.166) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0600 del 24 de septiembre de 2025.

22. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura N° CSV 17 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 013 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN



VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.783.406.850) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.248.384.795) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0650 del 10 de octubre de 2025.

23. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con NIT 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 18 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 014 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte. (\$1.963.166.988) M/CTE., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/cte. (\$1.374.216.892) M/CTE. Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0726 del 19 de noviembre de 2025.
24. Que el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión EL VERGEL INGENIERIA S.A.S y la supervisora, suscribieron el **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 015** en noviembre del 2025, la cual comprende el período del 01 al 31 de octubre de 2025, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.
25. Que el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. **CSV 19** de fecha 10 de diciembre de 2025, facturó por concepto del contrato de obra pública No. 090 del 2024, la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.332.738.472,00).
26. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 015** de octubre del 2025, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/cte (\$3.332.738.472,00) M/CTE., de los cuales se descontara el 30% para amortización del anticipo de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, para un neto de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/cte (\$2.332.916.930).**
27. Que en mérito de lo expuesto,



RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a favor del **CONSORCIO SAN VICENTE** con NIT 901.785.549-8, la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$2.332.916.930)**. En calidad de pago parcial No. 15 del contrato de obra pública No. 090 de 2024, menos amortización de anticipo y retenciones de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Pagador de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, a través del medio o herramienta de pago dispuesto por el SGR, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del CONSORCIO SAN VICENTE NIT 901.785.549-8.

Dada en Garzón, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

22/12/2025
Revisó texto legal: LFCM-ABOGADO S.A.S.
Asesoría Jurídica Externa



CONSORCIO SAN VICENTE
NIT 901.785.549-8
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA
PALERMO
Tel: (608) 716826
Neiva - Colombia
consorciosanvicente2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CSV 19

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA		
NIT	891.180.026-5	Teléfono	(608) 8332441
Dirección	Calle 7 14-69	Ciudad	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 09:15
Expedición	10/12/2025, 09:54
Vencimiento	10/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE	1.00	2,563,644,978.46

about:blank

1/2

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres mil trescientos treinta y dos millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 3,332,738,472.00

Total Bruto	2,563,644,978.46
Administración 22.00%	564,001,895.26
Imprevistos 3.00%	76,909,349.36
Utilidad 5.00%	128,182,248.92
Total a Pagar	3,332,738,472.00

Observaciones:
CORTE PARCIAL DE OBRA No 15 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA"
AMORTIZACION ANTICIPO 30% : \$ 1,000,188,767

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización Electrónica 18764070846973 aprobado en 20240517 prefijo CSV desde el número 1 al 589 Vigencia: 24 meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: dd726a3c72d70b62e1c12b3585c99243beff7199114b38afbf620dd5a21ab63623b0456454cac92a321365b97a4a031

about:blank

2/2

Garzón, 23 diciembre del 2025

Señores

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON, HUILA

ASUNTO: Nota aclaratoria del valor de la amortización del anticipo en factura CSV 19.


Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos de su valiosa colaboración con el fin se tenga en cuenta lo siguiente:

La factura N° CSV 19, correspondiente al acta N°15 del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL" en observaciones cuenta con un error en el valor descrito de la amortización, siendo el correcto **\$999.821.542** (novecientos noventa y nueve millones ochocientos veintiún mil quinientos cuarenta y dos pesos).

Muchas gracias por su atención, quedamos atentos a sus comentarios

Atentamente,



INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA
Contador Público
TP 211838-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCION GENERAL			
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u>X</u> No.: <u>15</u>		
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	090 AÑO: 2024
CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN		
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SAN VICENTE	
	NIT O CC:	901.785.549-8	
	DIRECCIÓN:	CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 VIA PALERMO	TEL. 8716826
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA	
	REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA	
	CC:	7.711.612 de Neiva-Huila	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR No 224 RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE		
CUENTA BANCARIA	Nº: 267877108 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Banco: BANCO DE OCCIDENTE		
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$ 86.899.134.742		
	Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.		
VALOR ADICIONAL	Nº2	N.A.	
VALOR TOTAL	OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte. (\$ 86.899.134.742)		
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.	
PLAZO TOTAL:	TREINTA (30) MESES		
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE TERMINACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026		



FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	DICIEMBRE DE 2025	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO SAN VICENTE
	NOMBRE	ARGELIO CERQUERA ARAUJO
	EN CALIDAD DE	R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
	NOMBRE:	MARIA ISABEL MEDINA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2. ANEXO FINANCIERO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Numero de contrato	090 de 2024
Contratista	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit contratista	901785549-8
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 090 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA Y EL CONSORCIO SAN VICENTE
Fecha de suscripción del contrato	ENERO 4 DE 2024
Plazo de ejecución del contrato	30 meses
Fecha de inicio del contrato	MARZO 20 DE 2024
Valor del contrato	\$ 86,899,134,742.00
Interventor	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 86,899,134,742
Valor pagado en calidad de anticipo	\$ 26,069,740,422
Valor pagado o causado a la fecha Acta #1	\$ 208,905,712
Valor pagado o causado a la fecha Acta #2	\$ 719,606,764
Valor pagado o causado a la fecha Acta #3	\$ 882,800,683
Valor pagado o causado a la fecha Acta #4	\$ 390,626,459
Valor pagado o causado a la fecha Acta #5	\$ 137,838,998
Valor pagado o causado a la fecha Acta #6	\$ 2.763,579,997
Valor pagado o causado a la fecha Acta #7	\$ 1.413,817,258
Valor pagado o causado a la fecha Acta #8	\$ 2.615,751,987
Valor pagado o causado a la fecha Acta #9	\$ 1.992,727,752
Valor pagado o causado a la fecha Acta #10	\$ 2.616,459,112



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Valor pagado o causado a la fecha Acta #11	\$	2.096.315.525
Valor pagado o causado a la fecha Acta #12	\$	2.051.064.523
Valor pagado o causado a la fecha Acta #13	\$	1.783.406.850
Valor pagado o causado a la fecha Acta #14	\$	1.963.166.988
Valor acta periodo certificado Acta #15	\$	3.332.738.472
Amortización del anticipo	\$	999.821.542
Valor final acta periodo certificado	\$	2.332.916.930
Retención de garantía 10%	\$	333.273.847
Valor Neto a pagar	\$	1.999.643.083
Saldo por ejecutar del contrato	\$	43.351.229.363

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO SAN VICENTE contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, para constancia adjunto al presente documento se entregan certificados de cumplimiento de aportes.

PLANILLA No 9494565196 APORTES EN LINEA – CONSORCIO SAN VICENTE			
Total, Planilla mes octubre 2025	Salud	12,5%	\$ 8.469.700
	Pensión	16 %	\$ 34.275.200
	ARL	6.96%	\$ 14.500.800
Total \$ 65.644.200	CCF		\$ 8.398.500

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago: **Acta Parcial No. 15** por un valor de **TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.332.738.472)**, sin amortizar anticipo; el valor a amortizar del anticipo son **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$999.821.542)**; Una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar son **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.332.916.930)**.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 15.

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
R.L CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA


ANGULO CERQUEZA ARAUJO
R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

MARIA ISABEL MEDINA OSORIO
SUPERVISORA

JOAN ERNESTO PALACIOS YUNDA
R.L EL VERGEL INGENIERIA S.A.S
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

**CUMPLIDO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE**

El suscrito Ing. Argelio Cerquera Araujo identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara/Huila, en calidad de representante legal del Consorcio **INTERCONSTRUCTORES**, identificado con Nit 901.785.559-1, en desarrollo del contrato de interventoría 091 de 2024, cuyo objeto es: *"Realizar interventoría integral, técnica, administrativa, financiera y ambiental, al contrato de obra que tiene por objeto "construcción de la nueva e.s.e. hospital departamental san vicente de paul del municipio de Garzón- Huila", se permite CERTIFICAR, que:*

El contratista **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, quien ejecuta el contrato de obra 090 de 2024, cuyo objeto es: "Construcción de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul - HDSVP de Garzón/Huila", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes de parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual **AUTORIZA** el pago de las cantidades de obra y valores ejecutados en el corte de obra **No.15**, de octubre 2025; por un valor de **TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.332.738.472)**; los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Tipo	Valor
Anticipo de Obra	Obra Civil	\$ 26.069.740.423
Acta de Obra N.15	Obra Civil	\$ 3.332.738.472
Amortizacion Anticipo	Obra Civil	\$ 999.821.542
Amortizacion Acumulada	Obra Civil	\$ 7.490.642.124
Total Acta de corte N.15		\$ 2.332.916.930

Por lo anterior la Interventoria **AUTORIZA**:

1. Amortizar del **Acta de Corte N.15**, la cual se aprueba por un valor de **TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.332.738.472)**, el valor equivalente al **30%** de la misma, el cual corresponde a **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$999.821.542)**
2. Se autoriza de acuerdo con lo anterior, pago al contratista, por el valor del **Acta de Corte N.15**, correspondiente al mes de octubre de 2025, menos el valor de


CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES



la amortización, de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.332.916.930).**

3. Así mismo, se certifica que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el Corte de obra No.15, fueron medidos y verificados en su totalidad por interventoría
4. En el mismo sentido se avala que el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas descritas en la minuta del contrato 090 de 2024.

La presente certificación se expide en el Municipio de Garzón /Huila, a los tres (3) días, del mes de diciembre de 2025.


ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA

1

[illegible]

**INFORME DE GESTION**

CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA"**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 20****CONTRATO N°090 DE 2024****OCTUBRE 2025****CONTRATISTA
CONSORCIO SAN VICENTE****GARZÓN HUILA**

**INFORME DE GESTION**


CONTRATO 090 DEL 2024

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE

AÑO: 2025

VERSION 001

**REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS****“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA”****CONTROL DE REVISIÓN**

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISÓ	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
01	81	Octubre	Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo		Informe de gestión octubre de 2025

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

TABLA DE CONTENIDO

COMPONENTE TECNICO	3
1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	3
1.2 INFORMACION FINANCIERA.....	4
1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO.....	4
1.2.2 INFORME FACTURACIÓN.....	4
1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	4
1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B	5
1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A.....	6
1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO	17
1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES	17
1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	18
1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B.....	19
1.4.4 EXTERIORES.....	20
1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.....	22
1.4.6 EQUIPOS.....	22
1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS.....	24
1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA.....	26
1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO	26
1.5.2 BITACORA DE OBRA	27
1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA	27
1.6 GESTION ADMINISTRATIVA.....	28

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.6.1	CORRESPONDENCIA	28
1.6.2	REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO.....	28
1.6.3	POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO	29
1.6.4	EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO.....	30
2	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32
2.1	MARCO NORMATIVO.....	32
2.2	BASE DE DATOS SST PERSONAL.....	33
2.2.1	PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE	34
2.2.2	PERSONAL CASETÓN	36
2.2.3	PERSONAL HIDROSANITARIAS.....	37
2.2.4	PERSONAL ELÉCTRICO	37
2.2.5	PERSONAL TOPOGRAFÍA.....	37
2.2.6	PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.....	37
2.2.7	PERSONAL MAMPOSTERÍA #2.....	38
2.3	SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL.....	38
2.4	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	39
2.5	COMITÉ\$ DE APOYO AL SG-SST	41
2.6	RECOMENDACIONES DE SALUD	41
2.7	INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES.....	41
2.8	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.....	42
2.9	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN.....	42
2.10	INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS	42
2.11	AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	43
2.12	GESTIÓN EN EMERGENCIAS	43

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.13	INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO	43
2.14	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO	44
2.15	PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO	44
2.16	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	44
2.17	INFORME PROVEEDORES	45
2.18	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.....	45
2.19	ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	45
2.20	AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA.....	45
2.21	ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL.....	45
2.21.1	IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR	45
2.21.2	ACOMPañAMIENTO A VISITANTES.....	46
2.22	ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES.....	46
2.23	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO	47
3	GESTIÓN AMBIENTAL.....	48
3.1	ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS	48
3.1.1	MARCO NORMATIVO	48
3.2	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.....	54
3.2.1	INFORME AMBIENTAL	54
3.2.2	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL.....	54
3.2.3	PERMISOS AMBIENTALES	54
3.2.4	OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO.....	55
3.3	SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES.....	55
3.4	MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS.....	55
3.4.1	PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS	55

3.4.2	ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN	57
3.4.3	MEZCLA DE CONCRETO	58
3.5	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	58
3.5.1	TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	58
3.6	ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION	60
3.7	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES	61
3.7.1	RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN	61
3.7.2	ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	62
3.7.3	DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	62
3.8	MANEJO DE RCD	62
3.8.1	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	62
3.8.2	CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL	62
3.8.3	REPORTE MENSUAL DE RCD	62
3.8.4	CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN	63
3.8.5	REUTILIZACIÓN DE RCD	63
3.8.6	TRANSPORTE	64
3.9	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	64
3.9.1	CLASIFICACIÓN Y ACOPIO	64
3.9.2	DISPOSICIÓN FINAL	64
3.10	MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS	65
3.10.1	CERRAMIENTO DE OBRA	65
3.10.2	CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD	65
3.10.3	HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES	65
3.10.4	CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES	66

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.10.5	VÍAS DE ACCESO.....	66
3.10.6	VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	66
3.11	MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	67
3.11.1	SUMIDEROS	67
3.11.2	MANTENIMIENTOS SUMIDEROS	67
3.11.3	AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	67
3.11.4	SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA	68
3.11.5	ACÓPIOS DE MATERIALES	68
3.11.6	CUERPOS DE AGUA	68
3.11.7	CONTROL DE VECTORES	68
3.12	MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.....	68
3.12.1	INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA.....	68
3.13	CAPACITACIONES AMBIENTALES	69
3.14	ORDEN Y ASEO	69
3.14.1	JORNADAS DE ASEO	69
3.14.2	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA.....	70
3.15	RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.....	70
3.15.1	VISITAS Y REQUERIMIENTOS	70
3.15.2	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES	70
3.16	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.....	70

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto	2
Ilustración 2. Excavaciones para implantación tanque RCI	5

Ilustración 3. Solado para implantación tanque RCI.....	6
Ilustración 4. Mampostería para subestación eléctrica.....	6
Ilustración 5. Armado de mampostería.....	8
Ilustración 6. Elementos de confinamiento.....	8
Ilustración 7. Zimbra forme y liberación para armado de mampostería.....	9
Ilustración 8. Armado de mampostería fachada.....	9
Ilustración 9. Pañetes.....	9
Ilustración 10. Instalación ductería para apantallamiento.....	10
Ilustración 11. Instalación de ductería EMT en muros.....	10
Ilustración 12. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 2.....	11
Ilustración 13. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 3.....	12
Ilustración 14. Conexión a red principal de alcantarillado municipal.....	12
Ilustración 15. Armado aceros columnas y muro cortina.....	13
Ilustración 16. Armado de aceros.....	13
Ilustración 17. Armado de aceros.....	14
Ilustración 18. Vaciado de concreto en placa.....	14
Ilustración 19. Concreto escaleras.....	14
Ilustración 20 Casetón.....	15
Ilustración 21. Columnas.....	15
Ilustración 22. Placas.....	15
Ilustración 23. Foto general.....	16
Ilustración 24. Puntos de control asentamientos.....	17
Ilustración 25. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B.....	20
Ilustración 26. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7°.....	21
Ilustración 27. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso.....	22
Ilustración 28. Bomba estacionaria.....	23
Ilustración 29 sistema de encofrado STEM.....	23
Ilustración 30. Grúa auto desplegable.....	24
Ilustración 31. Brazo distribuidor de concreto.....	24
Ilustración 32. Publicaciones ambientales.....	69

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN”. cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 31 de octubre del 2025**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I11, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Ilustración 33. Orden y aseo	70
------------------------------------	----

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato	3
Tabla 2 Resumen de actas	4
Tabla 3. Comités de Obra mensuales.	29
Tabla 4. Mesas técnicas de octubre.	29
Tabla 5. Pólizas	29
Tabla 6. Equipos y herramientas.....	30
Tabla 7. Personal que laboro durante el periodo.....	30
Tabla 8. Marco normativo SST.....	32
Tabla 9. Personal CSV.....	34
Tabla 10. Personal Icoconstruccion	36
Tabla 11. Personal Hidrosanitario	37
Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño.....	37
Tabla 13. Personal Topografía.....	37
Tabla 14. Tabla Personal Mampostería #1.....	37
Tabla 15. Tabla Personal Mampostería #2.....	38
Tabla 16. Cumplimiento EMO ingresos	39
Tabla 17. Capacitaciones y charlas.....	39
Tabla 18 Cumplimiento charlas y capacitaciones.....	40
Tabla 19. Inducciones	41
Tabla 20. Cumplimiento EPI.....	42
Tabla 21. Cumplimiento kit señalización SST	42
Tabla 22. Relación agua potable.....	43
Tabla 23. Cumplimiento Kit de emergencias	43
Tabla 24. Personal con incapacidad por AT.....	44
Tabla 25. Marco legal gestión ambiental.....	48
Tabla 26. Relación de materiales e insumos.....	55
Tabla 27. Relación de materiales pétreos	55

Anexo 21. Informe Acciones del periodo	44
Anexo 22. Informe de contratista	45
Anexo 23. Solicitud cierres temporales PMT	45
Anexo 24. Acta Apertura Buzón PQRS	46
Anexo 25. Registro fotográfico SST	47
Anexo 26. Control de material	57
Anexo 27. Inspección acopio y consumo combustible.....	61
Anexo 28. Control de material RCD	63
Anexo 29. Certificado de disposición y actas entrega material	65
Anexo 30. Control aseo de baños	67
Anexo 31. Control de plagas y roedores	68
Anexo 32. Registro de charlas	69
Anexo 33. Inspección de orden y aseo	70
Anexo 34. Registro fotográfico Ambiental	70

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNUICIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.

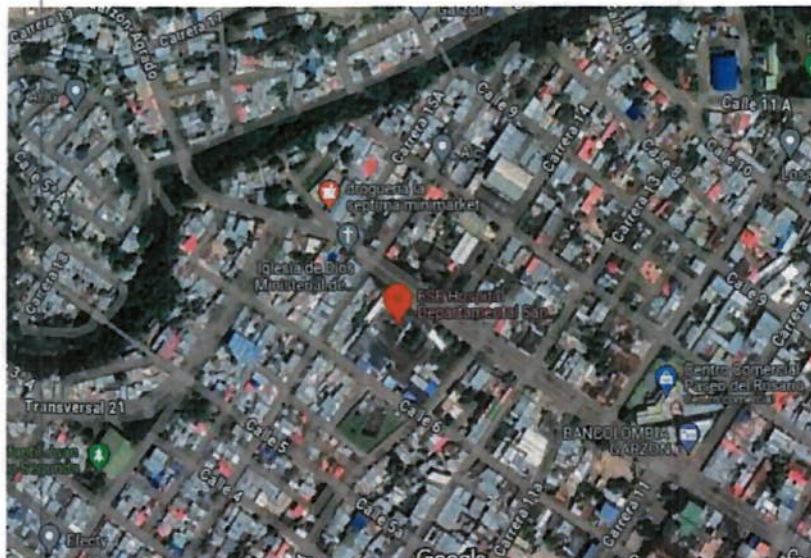


Ilustración 1. Ubicación del proyecto

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

COMPONENTE TECNICO

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información general del contrato

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	\$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

1.2 INFORMACION FINANCIERA

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, en el presente periodo ninguno de estos se llevó a cabo a través de la Fiducia.

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado **catorce (14)** actas de corte de obra, verificadas por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas.

Tabla 2 Resumen de actas

# ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	NETO A GIRAR
ACTA #1	\$ 208.905.712.00	\$ 62.671.713.60	\$ 146.233.998.40
ACTA #2	\$ 719.606.482.00	\$ 215.881.944.60	\$ 503.724.537.40
ACTA #3	\$ 882.800.683.00	\$ 264.840.204.90	\$ 617.960.478.10
ACTA #4	\$ 390.626.459.00	\$ 117.187.937.70	\$ 273.438.521.30
ACTA #5	\$ 137.838.998.00	\$ 41.351.699.40	\$ 96.487.298.60
ACTA #6	\$ 2.763.579.997.00	\$ 829.073.999.10	\$ 1.934.505.997.90
ACTA #7	\$ 1.413.817.258.00	\$ 424.145.177.40	\$ 989.672.080.60
ACTA #8	\$ 2.615.751.987.00	\$ 784.725.596.10	\$ 1.831.026.390.90
ACTA #9	\$ 1.992.727.752.00	\$ 597.818.325.60	\$ 1.394.909.426.40
ACTA #10	\$ 2.616.459.112.00	\$ 784.937.733.60	\$ 1.831.521.378.40
ACTA #11	\$ 2.096.315.525.00	\$ 628.894.657.50	\$ 1.467.420.867.50
ACTA #12	\$ 2.051.064.523.00	\$ 615.319.356.90	\$ 1.435.745.166.10
ACTA #13	\$ 1.783.406.850.00	\$ 535.022.055.00	\$ 1.248.384.795.00
ACTA #14	\$ 1.963.166.860.00	\$ 588.950.058.00	\$ 1.374.216.802.00

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina "3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas,

validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B

En este frente de obra se llevaron a cabo actividades enfocadas en la conformación de la placa de contrapiso del Edificio 02, designado como la subestación eléctrica.

Se realizaron trabajos de mampostería perimetral en área de edificio destinado para la subestación eléctrica, de igual forma se realizó la demolición de la estructura existente de tanque elevados en el área destinada para la nueva PTAR, excavaciones para implantación de tanque de almacenamiento de la red contra incendios.



Ilustración 2. Excavaciones para implantación tanque RCI



	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Ilustración 3. Solado para implantación tanque RCI



Ilustración 4. Mampostería para subestación eléctrica

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

Se desarrollaron actividades de elementos estructurales a nivel de piso 1 a piso 7 específicamente en columnas, muros pantalla, placas de entrepiso y escaleras dando cumplimiento al cronograma de obra establecido de igual forma dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto

- **Armado de acero:** Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales
 - **Columnas y pantallas:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales, elementos de piso 7 a piso 8 en ejes 2-9 entre B-F.
 - **Placa de entre piso:** Se realizo el respectivo montaje y armado de acero de refuerzo para vigas principales, riostras y torta superior para placa de entre piso nivel 7 ejes B-F entre 2-9, y se da inicio al armado de formaleta y amarre de acero para placa nivel 8
 - **Escaleras en concreto:** se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de las escaleras de piso 5 a piso 6 en los ejes 9 C-D, escaleras de piso 4 a piso 5 en los ejes 6 entre D-E.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

➤ **Vaciado de concreto:**

- Se realizó vaciado de concreto en columnas y pantallas elementos de piso 6 a piso 7 en ejes 2-3 entre B-F y de piso 7 a piso 8 en ejes 2-9 entre B-F.
- Vaciado de concreto para vigas principales, riostras y torta superior para placa de entre piso nivel 7 ejes B-F entre 2-9.
- Concreto para escaleras de piso 5 a piso 6 en los ejes 9 entre C-D y de piso 4 a piso 5 en los ejes 6 entre D-E.

➤ **Mampostería:**

Durante el mes de octubre se dio continuidad a las actividades de mampostería y se da inicio a pañetes en el área de sótano. En los espacios correspondientes a morgue clínica, radiología y ultrasonido, se ejecutó el cierre de elementos de confinamiento hasta una altura de 4,20 m. De igual manera, en estas mismas áreas se desarrolló el armado de mampostería en los muros perimetrales.

Adicionalmente, se adelantó el armado de los elementos de confinamiento en dichos muros perimetrales hasta la viga superior.

Se da continuidad a los ambientes destinados a baños, depósitos y estar médico, entre otros, se continuó con la ejecución de las actividades de armado de mampostería y conformación de elementos de confinamiento, garantizando la secuencia constructiva establecida para esta etapa del proyecto.

En el piso 1 se dio continuidad a las actividades de mampostería de fachada y, de manera paralela, a la mampostería interior, logrando completar en el periodo la ejecución total de la mampostería del nivel hasta la altura de viga de confinamiento. la mampostería se ha trabajado a una altura de 3,00 m, incluyendo la conformación de sus elementos de confinamiento y se continua con en armado y fundida de elementos de confinamiento para dar paso a la mampostería y cierre de espacios.

En el piso 2, durante el periodo se ejecutaron las actividades de Zimbra, forme y liberación para el posterior armado de mampostería en las áreas húmedas (baños, trabajo sucio, trabajo limpio, entre otras), las cuales se desarrollan en mampostería de arcilla, conforme a las modificaciones aprobadas respecto a las referencias constructivas según su uso y servicio. De manera simultánea, a medida que avanza la mampostería, se ejecuta el armado y fundida de los elementos de confinamiento, garantizando la correcta integración estructural.

En los pisos 3 y 4, se inicia la mampostería de fachada y zonas húmedas, y el armado de acero para los elementos de confinamiento.



Ilustración 5. Armado de mampostería



Ilustración 6. Elementos de confinamiento



Ilustración 7. Zimbra forme y liberación para armado de mampostería



Ilustración 8. Armado de mampostería fachada



Ilustración 9. Pañetes

➤ **Redes y especialidades eléctricas.**

El personal eléctrico continuó con el tendido de tubería EMT. Esta labor se realizó específicamente para el sistema de detección de incendios con actividades de instalación de tubería EMT de ¾" piso 3, instalación de tubería EMT de ¾" para alimentación de interruptores, tomas en área de sótano sistema de detección de incendio y demás especialidades, conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

De igual forma instalación de tubería PVC de 1" para apantallamiento en piso 6, línea de tubería que se ha instalado desde el sótano hasta los pisos superiores, a fin de establecer el anillo perimetral del sistema de puesta a tierra del proyecto para el edificio asistencial.

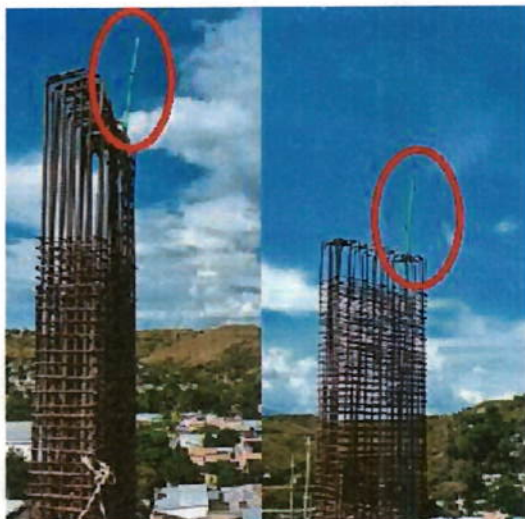


Ilustración 10. Instalación ductería para apantallamiento



Ilustración 11. Instalación de ductería EMT en muros

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

➤ **Redes y especialidades hidrosanitaria**

El personal hidrosanitario, culminó la instalación de tubería de ventilación en área de sótano, con la instalación de esta red se dio por terminado la instalación de ventilación en sótano y piso 1.

En el área del piso 2 se continuó con la instalación de la red para patógenas y sanitarias.

En el área de piso 3 se dio inicio a la instalación de redes sanitarias para el piso en referencia.

En el área de piso 4 se dio inicio con actividades de replanteo, localización y perforación con saca núcleos para los diferentes diámetros (2",3",4") e instalación de tubería sanitaria y no doméstica en este piso.

Se realizó instalación de tapas de pruebas y puntos en áreas de piso 1, 2, 3 en los diámetros (2", 3",4") a fin de realizar pruebas de estanqueidad para las diferentes redes.

En la zona externa se realizó la conexión de la red de 8" a pozo de conexión principal del alcantarillado municipal sobre la calle 7, según lo indicado en los planos de diseño.



Ilustración 12. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 2.

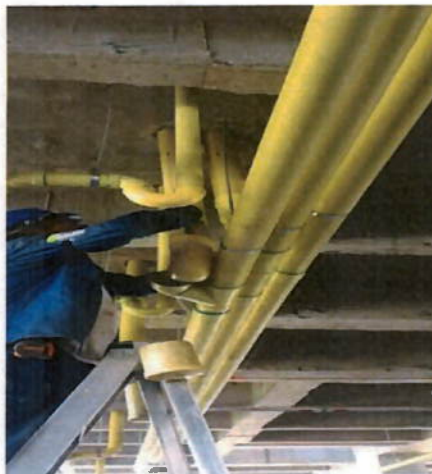


Ilustración 13. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 3.



Ilustración 14. Conexión a red principal de alcantarillado municipal.

➤ Estructura

Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.



Ilustración 15. Armado aceros columnas y muro cortina.



Ilustración 16. Armado de aceros



Ilustración 17. Armado de aceros



Ilustración 18. Vaciado de concreto en placa



Ilustración 19. Concreto escaleras.



Ilustración 20 Casetón.



Ilustración 21. Columnas



Ilustración 22. Placas



Ilustración 23. Foto general

CONTROL TOPOGRAFICO

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.

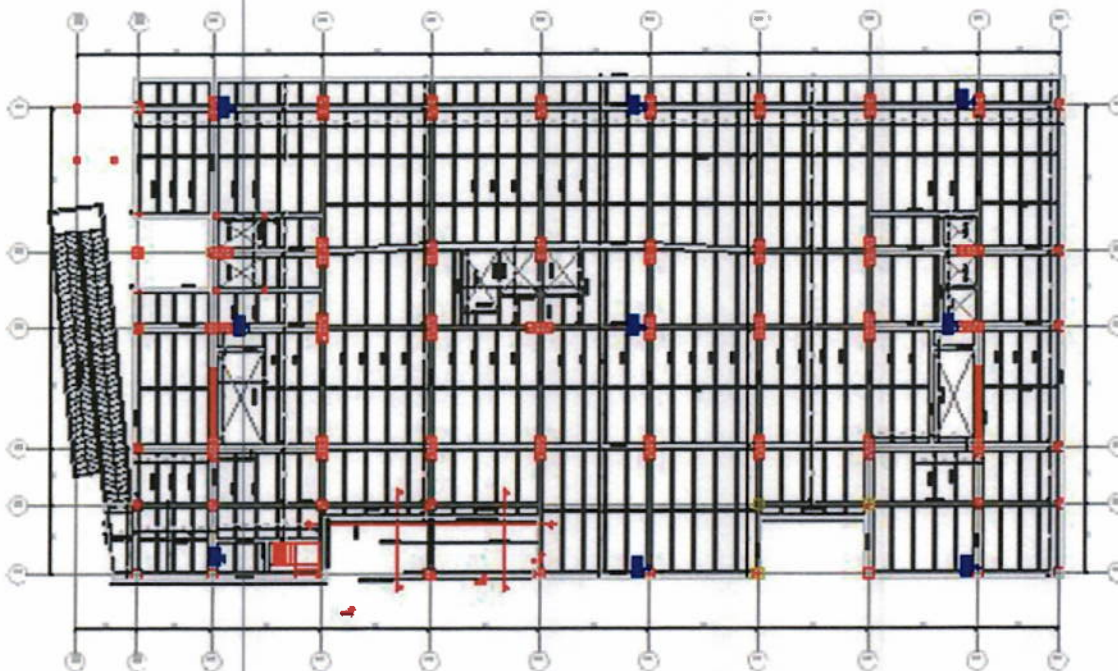


Ilustración 24. Puntos de control asentamientos

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos para el edificio asistencial como para el edificio lote B.

Anexo 1. Informe control asentamientos

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

Durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversas situaciones que requieren atención específica por parte del constructor, la interventoría y la supervisión. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados hasta el momento, organizados por especialidad, así como aquellos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación por los responsables correspondientes.

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES

- Se continúa a la espera de la respuesta por parte del Consorcio San Vicente en relación con el suministro de la información oficial requerida para las diferentes especialidades. Esta información incluye planimetría, detalles y cortes de fachada, así como los cruces de vía para las redes en los edificios 1, 2 y 3 del Lote B.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

- A la fecha el Consorcio San Vicente continua a la espera en que se realice un pronunciamiento por parte de la entidad contratante y la interventoría referente al sistema de gases medicinales. Lo anterior considerando que por parte del Consorcio San Vicente se han venido realizando solicitudes de aclaraciones en cuanto al alcance y criterios a tener en cuenta en el desarrollo del sistema de gases, toda vez que la planimetría entregada, presupuesto y las especificaciones técnicas para esta especialidad del proyecto presentan inconsistencias en cuanto al presupuesto asignado. Esta situación ha sido comunicada formalmente y presentada en comités de obra, solicitando revisión por parte del ente interventor, así como aclaraciones sobre las especificaciones técnicas de los equipos a instalar.
- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E. María Auxiliadora, verificando los diseños del proyecto.
- Se presentaron a interventoría análisis de precios unitarios para las especialidades y sistemas eléctricos, lo anterior sustentado en la planimetría entregada por la interventoría en lo referente a estas especialidades apoyados en los ajustes realizados por el consultor externo para esta especialidad en la actualización de RETIE y RETILAP.
- Se presentaron a la interventoría análisis de precios unitarios para los sistemas hidrosanitarios y sistema de red contra incendios, lo anterior como resultado de las mesas de trabajo realizadas conjuntamente, en las cuales se evidenció la necesidad de incluir actividades no contempladas en el alcance presupuestal, las cuales son necesarias para el desarrollo de estas especialidades.

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación se mantiene la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Verificar las jornadas extra-tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (placas de entepiso, columnas-pantallas y escaleras).

Buscar la estrategia para culminar la placa de cubierta del edificio asistencial, garantizando los progresos requeridos en la programación.

En relación con el avance de obra, se reitera la solicitud hecha a la interventoría de contar con la revisión, validación, y aprobación de observaciones para actividades relacionadas con el avance estructural de las Edificaciones Pendientes para el Lote B que involucran adicionalmente la consolidación del Balance de obra para la Etapa 1 del proyecto, bajo las siguientes consideraciones que se detallan como sigue:

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B

- Petar y central de gases medicinales

A partir del planteamiento de ubicación de los equipos para PETAR nueva y existente, CENTRAL DE GASES MEDICINALES, TANQUE RCI, entregada por la Consultoría del proyecto Sergio Arquitectura SAS a través de la Supervisión e Interventoría, para lo cual y teniendo en cuenta la reubicación y separación de la cimentación y estructura para la edificación N°3, se solicitó a interventoría el apoyo para agilizar con quien corresponda los ajuste o nuevos diseños estructurales para la Petar y Central de Gases Medicinales, esto fundamentados en que los diseños originales unen por medio de zapatas y columnas las dos estructuras. (ver Ilustración N°1 Planta de Cimentación)

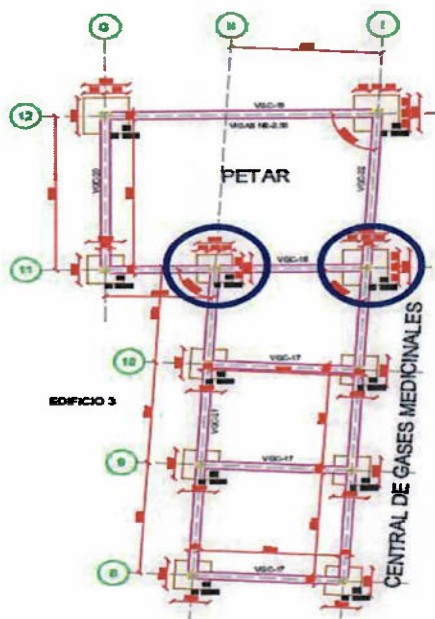


Ilustración 25. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B

1.4.4 EXTERIORES

- Rampa acceso peatonal costado norte

Para el acceso peatonal del costado norte sobre la calle 7 y en relación con los cambios de nivel, se identifica e interpreta en planos de Planta arquitectónica de piso 1° una rampa peatonal de acceso hacia la plazoleta central del proyecto, información y planimetría que no se encuentra resuelta en el proyecto estructural tanto en planos estructurales, detalles y memorias de cálculo, entre otros, situación que no permite claridad tanto para su ejecución como para su cuantificación, por lo cual y de la manera más cordial, les solicitamos sean ubicados y remitidos al Consorcio San Vicente lo antes posible esta documentación.



Ilustración 26. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7°

- Muros Contención Plazoleta Central

En la plazoleta exterior que según planos arquitectónicos, específicamente en la Planta de Piso 1°, se identifica unos esquemas que representan según nuestra interpretación desde el punto de vista arquitectónico, unos muros que contendrán el terreno en los diferentes cambios de nivel que se muestran esquemáticamente en los planos de las secciones transversales o cortes arquitectónicos, sin embargo esto no es suficiente información puesto que no se cuenta, ni se ha ubicado dentro de los archivos entregados al inicio del proyecto, los correspondientes detalles, plantas, despieces, especificaciones y memorias en el proyecto estructural y al igual que el punto anterior, les solicitamos de la manera más cordial sea ubicada y remitidos toda esta información al Consorcio San Vicente lo antes posible, con el fin de lograr desde el área técnica la revisión, planeación y cuantificación de todas las actividades dentro del proceso constructivo.

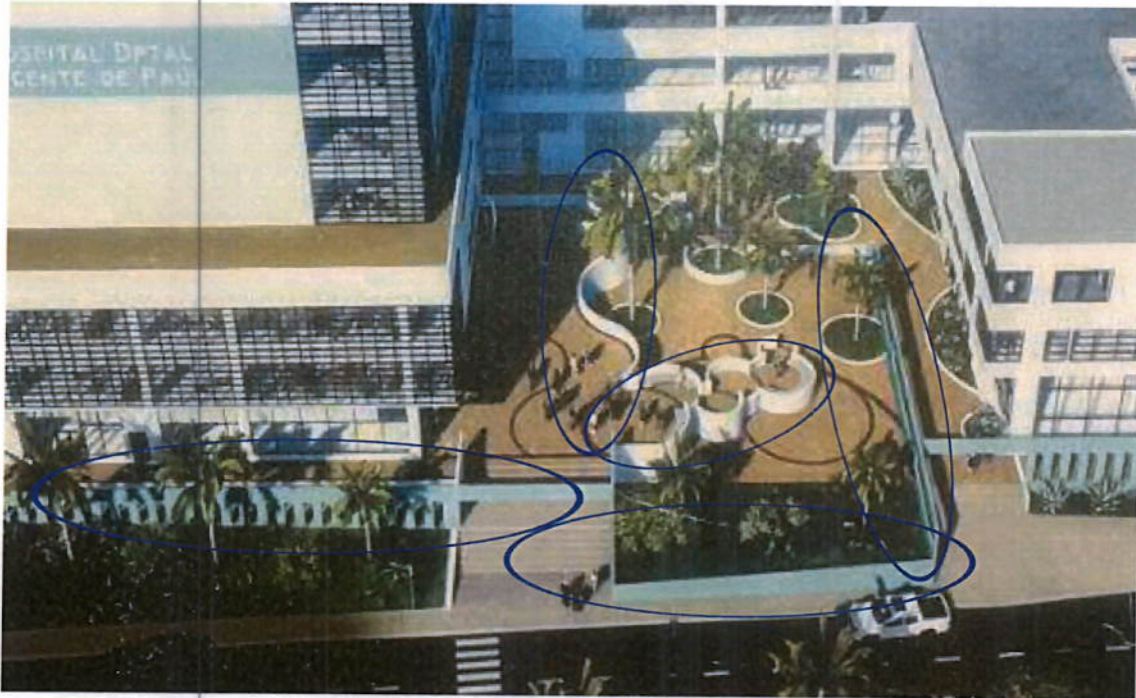


Ilustración 27. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso

1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.

Según balance, diseño y programación presentada por el consorcio San Vicente y conciliada junto con la interventoría y la Supervisión de la ESE, se desarrollan los siguientes procesos:

- Para garantizar los tiempos establecidos en la programación continuamos con la propuesta ya presentada en los informes anteriores; se incrementa la jornada laboral en dos horas extras de lunes a viernes y el sábado una jornada de 6:00 am a 2 pm, por último, un domingo intermedio se trabajará de 6:00 am a 2:00 pm.

1.4.6 EQUIPOS.

El consorcio san Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto de marca Putzmeister de gran capacidad de bombeo, adicional se cuenta

con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entrepiso del sistema STEM llegando a 1.800 m². Se adquiere una grúa auto desplegable MIDI 16/20 y un brazo para colocación de concreto, este complementa la bomba de concreto su nombre Placing boom BHD 18R3.



Ilustración 28. Bomba estacionaria

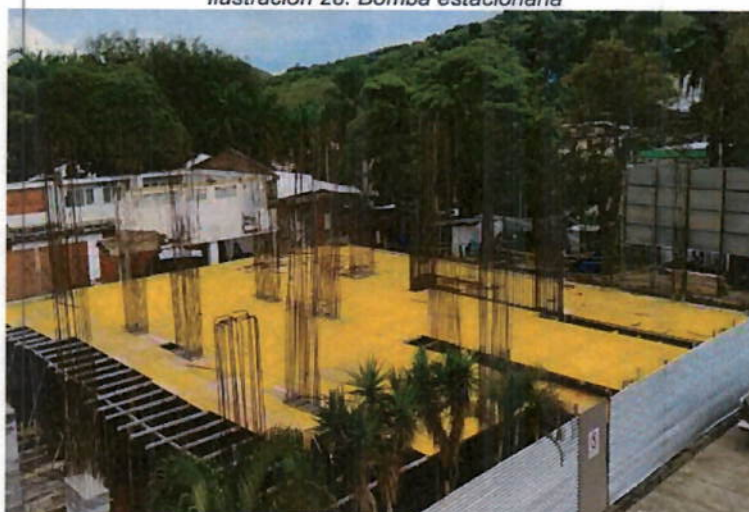


Ilustración 29 sistema de encofrado STEM



Ilustración 30. Grúa auto desplegable

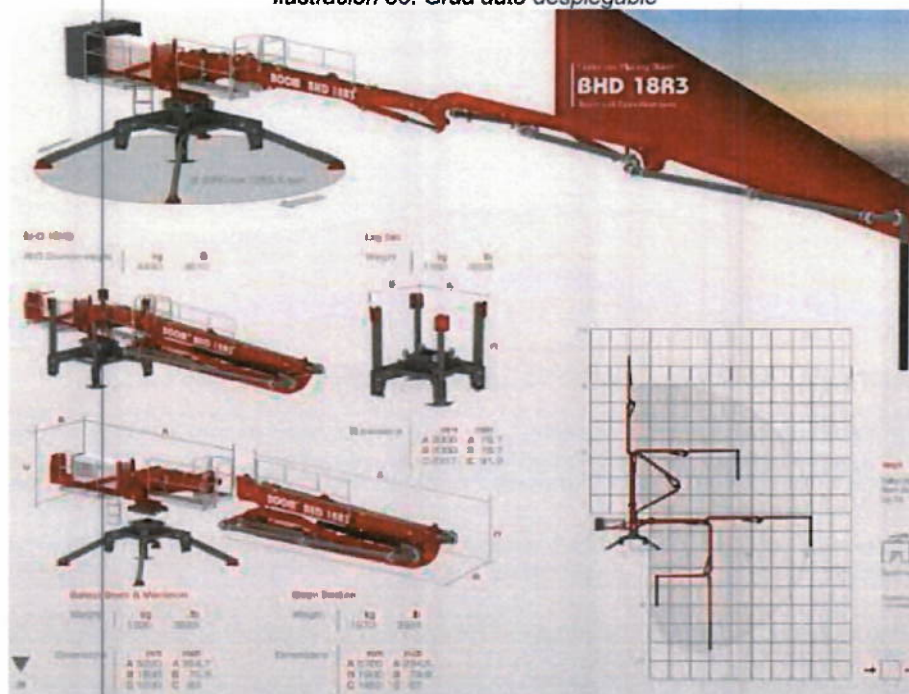


Ilustración 31. Brazo distribuidor de concreto

1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS

Durante el presente periodo se identificaron inconsistencias en las alturas de los antepechos correspondientes a la ventanería instalada en la fachada en mampostería de

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

concreto, las cuales no concuerdan con los parámetros establecidos en la normativa vigente según el uso funcional de cada espacio. Esta situación se evidencia en diferentes áreas, entre ellas la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde la ventanería proyectada presenta un antepecho con altura de 70 cm, lo que imposibilita la correcta instalación de las redes hospitalarias. En consecuencia, se procedió a realizar la modificación de dichos elementos, garantizando el cumplimiento normativo y las condiciones técnicas requeridas.

No obstante, la variación de las dimensiones de los vanos ha generado una afectación en el proceso de medición y cobro de las ventanas, dado que en el presupuesto contractual estas se encuentran registradas por unidad específica (referencia y dimensión determinada) y no por área en metros cuadrados (m²). Por tal motivo, será necesario efectuar los ajustes correspondientes en la estructura presupuestal para reflejar correctamente los cambios ejecutados y permitir la facturación conforme a las condiciones reales de obra.

Adicionalmente, se identificaron inconsistencias entre las especificaciones técnicas y los detalles de diseño de la fachada flotante y otras referencias de ventanería, observándose que algunos detalles constructivos se encuentran incompletos, especialmente en los empates entre la mampostería y la ventanería flotante, donde no se cuenta con la información suficiente para su correcta ejecución.

Así mismo, se evidenció que los accesos a las habitaciones de los pisos 4°, 5°, 6° y 7° no cumplen con los anchos mínimos requeridos para el ingreso de camillas y equipos hospitalarios. Ante esta situación, el Consorcio remitió un comunicado formal a la Interventoría exponiendo la problemática. De manera informal, la Interventoría manifestó la posibilidad de eliminar los nichos de los clósets con el fin de ampliar el paso y garantizar la funcionalidad requerida. No obstante, se encuentra pendiente el pronunciamiento formal por parte de la Interventoría para proceder con las decisiones técnicas y presupuestales correspondientes dentro del balance del proyecto. Así mismo, se encuentra pendiente la recepción de las modificaciones de diseño correspondientes a los baños previamente relacionados en el informe anterior. Dichos espacios no han podido ser ejecutados debido a las restricciones técnicas presentadas para la instalación de las redes hidrosanitarias las cuales requieren ajustes en la distribución interna. En

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

tanto se reciben los planos actualizados, las actividades constructivas asociadas a estos baños permanecen suspendidas.

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.

Anexo 2. Reporte de ensayos

Para los insumos con certificados de conformidad como los aceros son suministrados por el fabricante con cada pedido entregado a obra.

Anexo 3. Certificados de calidad

Mampostería: En el presente periodo se tomaron muestras de grouting mezclado en obra, para la construcción de elementos no estructurales, Se tomaron a la fecha las siguientes muestras:

- M-10. Viguetas y Columnetas H 2,2m sótano muros 70, 72, 79, 110 y 115 - el 04 de octubre del 2025.
- M-11. Viguetas y Columnetas H 3,7m sótano muros 202, 204, 209, 117, 118, 119, 120 Y 121 - el 06 de octubre del 2025.
- M-12. Columnetas H 1,5m piso 3 ejes 2-3; E-F - el 06 de octubre del 2025.
- M-13. Viguetas y columnetas H 1,5m piso 3 ejes 7-6; B-D – el 07 de octubre de 2025.
- M-14. Viguetas H 2,2m sótano muros 194, 195, 152, 149, 147, 145 y 122 – el 09 de octubre de 2025
- M-15. Viguetas H-2,9m piso 1 muro 67 – el 10 de octubre de 2025.

698	M-10	VIGUETAS Y	04-10-2025	14	18-10-2025	6.02	11.72	20.45	11.236	2.85	115.00	6.20	916	64.18	30.52	90	3,000.00	3
698	M-10	COLUINETAS H.2.3M	04-10-2025	14	18-10-2025	6.02	11.74	20.45	11.564	2.99	107.18	5.81	946	59.23	28.21	90	3,000.00	3
698	M-10	SOTANO MUROS	04-10-2025	28	01-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
698	M-10	70.72.79.110 Y 115	04-10-2025	28	01-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
699	M-11	VIGUETA Y	06-10-2025	14	20-10-2025	5.98	11.88	20.00	11.973	2.18	236.00	13.13	1,913	133.83	63.77	90	3,000.00	6
699	M-11	COLUINETAS H.	06-10-2025	14	20-10-2025	5.98	11.84	20.00	11.955	2.19	226.00	12.45	1,814	126.00	60.47	90	3,000.00	6
699	M-11	3.70M SOTANO	06-10-2025	28	03-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
699	M-11	MUROS 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000																
700	M-12	COLUINETAS	06-10-2025	14	20-10-2025	5.94	12.60	27.71	12.833	2.31	581.00	32.39	4,718	330.24	157.38	90	3,000.00	5
700	M-12	H.15M PISO 3 ERES	06-10-2025	14	20-10-2025	5.94	11.96	27.71	12.052	2.32	541.30	30.14	4,391	307.36	146.36	90	3,000.00	5
700	M-12	3-3-5-#	06-10-2025	28	03-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
700	M-12		06-10-2025	28	03-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
701	M-13	VIGUETAS Y	07-10-2025	14	21-10-2025	5.94	12.80	27.71	13.113	2.39	594.00	34.42	4,989	346.96	161.96	90	3,000.00	6
701	M-13	COLUINETAS	07-10-2025	14	21-10-2025	5.94	12.80	27.71	13.113	2.39	594.00	34.42	4,989	346.96	161.96	90	3,000.00	6
701	M-13	H.15M PISO 3 ERES	07-10-2025	28	04-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
701	M-13	7-6-9-D	07-10-2025	28	04-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
702	M-14	VIGUETAS H.2.3M	09-10-2025	14	23-10-2025	6.02	12.00	20.45	12.516	2.33	338.10	18.34	2,671	186.90	88.04	90	3,000.00	6
702	M-14	SOTANO MUROS	09-10-2025	14	23-10-2025	5.94	12.04	27.71	12.533	2.29	372.00	20.76	3,024	211.68	100.80	90	3,000.00	3
702	M-14	194, 195, 192, 149,	09-10-2025	28	06-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
702	M-14	147, 145 Y122	09-10-2025	28	06-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
703	M-15	VIGUETAS H.2.8M	10-10-2025	14	24-10-2025	5.98	11.96	20.00	11.479	2.31	224.50	11.79	1,717	120.35	57.54	90	3,000.00	3
703	M-15	PISO 1 MURO 07	10-10-2025	14	24-10-2025	5.94	12.60	27.71	12.564	2.30	199.00	11.11	1,629	113.34	53.97	90	3,000.00	6
703	M-15		10-10-2025	28	07-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	
703	M-15		10-10-2025	28	07-11-2025	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100	3,000.00	

RESISTENCIA % ESPERADA (3 DÍAS 40% - 7 DÍAS 70% - 14 DÍAS 90% - 28 DÍAS 100%) SEGÚN NORMA TÉCNICA 500/630-22 (NVIAS-22 / NTC 3211)
LAS MUESTRAS DE CONCRETOS DE NOMENCLATURA PERTENECEN AL CÓDIGO INTERNO DEL LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
OBSERVACIONES SE TIENE EN CUENTA PARA DETERMINAR EL TIPO DE FALLA, EL NUMERAL 7.6 DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 673 EN LA FIGURA 2. ESQUEMA DE LOS MODELOS DE FRACTURAS TÍPICOS
MUESTRAS TOMADAS EN SITIO Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE DEL SERVICIO

Anexo 4. Reporte de ensayos

De acuerdo con el informe de ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto mezclado en obra se observan que la mayoría de las muestras tienen un buen desempeño temprano, se evidencia que las muestras tienen tendencia de ganancia progresiva, lo que confirma que el concreto tiene la capacidad de cumplir y superar las exigencias normativas de resistencia.

1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionada con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

Anexo 5. Bitácora de obra

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Este documento o programación fue ajustado este año y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo el implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

Anexo 6. Programación de obra

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría interconstructoresconsorcio@gmail.com, así mismo se confirma que el correo para la recepción de comunicados por parte del Consorcio San Vicente es consorciosanvicente2024@gmail.com, que corresponde al correo oficial implementado por el Consorcio San Vicente.

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

De acuerdo con los requerimientos contractuales y lo indicado por la Interventoría, en el periodo se llevan a cabo las diferentes reuniones de comité técnico de obra, que les precede al correspondiente recorrido de obra, las cuales, de acuerdo con lo establecido desde el inicio de obra, se convocó por la Interventoría del contrato, una reunión semanal de comité de obra, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con especialistas para tratar temas puntuales o específicos.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Tabla 3. Comités de Obra mensuales.

No. ACTA	FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS COMITÉ
#66	02/10/2025	➤ Supervisión HSVDP ➤ Interventoría Consorcio Interconstructores ➤ Consorcio San Vicente	➤ Radicación del concepto del especialista estructural CSV con respecto a propuesta de ajuste de especificación de mampostería. ➤ Entrega por parte del CSV de la subsanación de las observaciones de Acta Parcial No. 13, realizadas por la interventoría. ➤ Radicación de solicitud de ajuste de la licencia por parte del HSVDP, ante la Secretaría de Planeación Municipal.
#67	09/10/2025	➤ Supervisión HSVDP ➤ Interventoría Consorcio Interconstructores ➤ Consorcio San Vicente	➤ Radicación del concepto del especialista estructural sobre la mampostería. ➤ Radicación del informe mensual No. 19 y Gestión de facturación. ➤ Radicación de las Memorias de Cantidades del Balance de Mayores y Menores. ➤ Visita a la Secretaría de Planeación Municipal.
#68	23/10/2025	➤ Supervisión HSVDP ➤ Interventoría Consorcio Interconstructores ➤ Consorcio San Vicente	➤ Radicación del concepto de especialista (Mampostería). ➤ Compromiso sobre la radicación del informe mensual No. 19 ➤ Compromiso sobre la radicación de Memorias de Cantidades. ➤ Compromiso sobre visita y ajuste de licencia de construcción.

Anexo 7. Actas de comité de obra

Tabla 4. Mesas técnicas de octubre.

No. ACTA	FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS COMITÉ
EH21	02/10/2025	➤ Asesor Hospitalario Interventoría. ➤ Asesora entidad E.S.E HSVDP	➤ Se requiere una Bomba de Vacío VMS de mayor capacidad a la diseñada y contratada. ➤ El Sistema de Aire Medicinal SAM que se requiere es de menor capacidad a la diseñada y contratada.

Anexo 8. Actas de mesas técnicas.

1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 5. Pólizas

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

POLIZAS / COBERTURAS	No POLIZA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	AB001298	19/03/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB001301	19/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		19/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES		19/09/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA		19/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		19/09/2031

Anexo 9. Pólizas de garantía

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO

Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

Tabla 6. Equipos y herramientas

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	UND	CANTIDAD
VOLQUETA SENCILLA	UND	1
BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO	UND	1
TORRE GRUA	UND	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	2
RETROCARGADOR JCB	UND	1
APISONADOR TIPO CANGURO	UND	1
VIBRADOR PARA CONCRETO	UND	6
SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA	UND	6
ROTOMARTILLOS	UND	3
AMOLADORAS ANGULARES	UND	5
SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)	UND	1
COMPRESOR NEUMATICO	UND	0
EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)	M2	1800
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS)	SEC	36
MOTOBOMBA 2"	UND	1
MOTOBOMBA 4"	UND	1
BOMBA EYECTORA 2"	UND	2
ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)	UND	1
BRAZO HIDRULICO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO	UND	1

Tabla 7. Personal que laboro durante el periodo

PERSONAL / CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	3
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1
RESIDENTE DE ACTAS	1
PROFESIONAL SST	2
INSPECTOR DE OBRA	1
TECNICO SST	2
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	1
MAESTRO DE OBRA (EJERO)	1
OFICIALES	41
AYUDANTES	35
PLOMEROS	9
ELECTRICOS	4
MAMPOSTEROS	21
OPERADORES MAQUINARIA	2
CONDUCTORES VOLQUETAS	1

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 8. Marco normativo SST

Ley 9/79:	Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
Decreto Ley 1295/94:	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 1616/13:	Ley de salud mental.
Decreto Ley 1562/15:	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto 1072/15:	Decreto único reglamentario del sector trabajo.
Resolución 2400/79:	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013/86:	Comité paritario de salud ocupacional.
Resolución 2346 de 2007:	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.
Resolución 2646 de 2008	Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial
Resolución 1918 de 2009	Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Resolución 652/12:	Comité de convivencia laboral.
Resolución 0312/19:	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores
Resolución 0491 de 2020	Trabajo en espacios confinados
Resolución 4272 de 2021	Trabajo en alturas
Resolución 773 de 2021	Sistema Globalmente Armonizado
Resolución 2764 de 2022	Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo.

Anexo 10. Cumplimiento Requisitos Legales

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 30 de octubre del 2025.

- ✓ En el presente periodo se presentaron 14 ingresos de CONSORCIO SAN VICENTE

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

- ✓ 3 ingresos de hidráulicos
- ✓ 11 ingresos de mamposteros DS Losada
- ✓ 2 ingresos de ventanas y cristales SAS
- ✓ 1 ingreso de YM seguridad, control y diseño

2.2.1 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 9. Personal CSV

NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHON JAIRO CABRERA ARDILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	19/07/2024	
ELADIO CERQUERA DURAN	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHONATANT MEDINA POLO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO MURCIA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	23/10/2024	
CHRISTIAN CAMILO CORONADO CRISTANCHO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDWIN LEONARDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
EDWIN ALEXANDER DEVIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO SANCHEZ VERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
GERMAIN INOJOSA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
JULIO CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIDIER CAMPOS ARDILA	OFICIAL HERRERO	7/01/2025	
NIDA LUCERO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DEIBI ALEJANDRO PASCUAS BERMEO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDILBER SALGADO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/01/2025	
JUAN CARLOS PENNA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
GIAN FRANCO FERRO TRIANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
HECTOR VARGAS MONROY	OFICIAL HERRERO	20/01/2025	

NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIAN ANDRES SALGADO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
LUIS ERNESTO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
AILER VIUCHE CORDOBA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
JULIO CESAR AYALA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	ARMADOR	03/02/2025	
FRANCISCO PRADA RAMOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	03/02/2025	
DIEGO ARMANDO SIERRA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
MAURICIO MANRIQUE MEDINA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/02/2025	
MEDARDO ANDRES SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/02/2025	
DAIMER ALEXIS MUÑOZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
JHANER MURCIA GALINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
LUIS PARMENIDES HURTADO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
WILLIAM ALEXANDER GUERRERO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JOINER STIVEN GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
LUIS FERNANDO PARRA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JORGE MARIO GOMEZ	OFICIAL HERRERO	12/03/2025	
ADOLFO NAGLES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
CARLOS ANDRES MENDOZA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
BRAYAN RIVERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	14/03/2025	24/10/2025
EDWIN LEANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
JACKSON BORJA MOSQUERA	OFICIAL HERRERO	20/03/2025	
NILSON BAÑOS SURMAY	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	
YEISON ANTONIO NARVAEZ	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	
ALBERTO MAHECHA BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ALEJANDRO ELIZALDE URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
JEFFERSON ALBERTO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	06/10/2025
LEONARDO SAENZ PIMENTEL	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ARGEMIRO RAYO URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	22/04/2025	
DESIDERIO LOAIZA	OFICIAL HERRERO	22/04/2025	
JOSE ALBEIRO CORDOBA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
JESUS ANDRES OSSO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	25/04/2025	
RAFAEL MARTINEZ ZAMBRANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
CARLOS MARIO DE AVILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
YONATAN VILLANUEVA VERJAN	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	06/05/2025	14/10/2025
HELMER ARLEY PASTRANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/05/2025	
JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JULIO CESAR JARA CARDOZO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	21/10/2025

DANIEL ALEXANDER TRIANA YANDE	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	06/10/2025
JAIME GONZALEZ TRUJILLO	OPERADOR	12/06/2025	
MEDARDO VALENZUELA PERDOMO	APAREJADOR	07/07/2025	
ELVER ADOLFO BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	16/07/2025	
EDWIN DAYAN BENAVIDEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	17/07/2025	
PETER IVINSON LEMUS ORTIZ	HERRERO	5/08/2025	
JAIME CHAVARRO RAMOS	OFICIAL DE OBRA	5/08/2025	
WILMER EDUARDO TIBADUIZA CALDERON	AYUDANTE	20/08/2025	29/10/2025
DIEGO ALEJANDRO PEDROZA PERDOMO	OFICIAL	20/08/2025	
RONALD NARVAEZ MARTINEZ	HERRERO	20/08/2025	
CHRISTIAN DAVID NAVAS ROJAS	AYUDANTE	25/08/2025	
ANDERSON URRIAGO SERRATE	AYUDANTE	25/08/2025	
JESUS ANDRES OSORIO	OFICIAL	18/09/2025	
WILLIAM ESNEIDER TRUJILLO	AYUDANTE	18/09/2025	
WILSON MIGUEL PARRA	AYUDANTE	18/09/2025	
YEIFFER ALEJANDRO CUELLAR	AYUDANTE	18/09/2025	24/10/2025
YEPPERSON LOPEZ GOMEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RAFAEL DIONISIO FERNANDEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RODOLFO CERQUERA OSORIO	AYUDANTE	1/10/2025	
FLORENTINO NAGLES VARGAS	OFICIAL	1/10/2025	
ALFREDO NAGLES VARGAS	OFICIAL	1/10/2025	
MIGUEL ARTURO RIOS MONJE	OFICIAL	1/10/2025	
MARLON FELIPE OLAYA PIAMBA	OFICIAL	1/10/2025	
JUAN DAVID RIVAS PIÑACUE	AYUDANTE	1/10/2025	
WILINTON MUÑOZ RUIZ	AYUDANTE	1/10/2025	
CARLOS ANDRES CABRERA	AYUDANTE	1/10/2025	
JOSE ILIER ORDOÑEZ GAITAN	AYUDANTE	15/10/2025	
CRISTIAN CAMILO MAYA CORTES	AYUDANTE	24/10/2025	
EDUARD IGNACIO TRUJILLO	AYUDANTE	24/10/2025	

2.2.2 PERSONAL CASETÓN

Tabla 10. Personal Icoconstruccion

NOMBRE	CARGO
ERNESLEY LIZCANO	OFICIAL
DIEGO ANDRES MORALES	AUXILIAR
CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ	AUXILIAR
CARLOS ALFONSO TRUJILLO	AYUDANTE

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.2.3 PERSONAL HIDROSANITARIAS

Tabla 11. Personal Hidrosanitario

NOMBRE	CARGO
ALEJANDRA PIZO RIVERA	PROFESIONAL SST
CARLOS EDUARDO BELTRAN	OFICIAL PLOMERIA
JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO	AYUDANTE DE PLOMERIA
LUIS NIGRINIS MATTA	OFICIAL PLOMERIA
RODOLFO JAVIER LEIVA	SUPERVISOR DE OBRA
JUAN DIEGO SANCHEZ PERDOMO	AYUDANTE PLOMERIA
MIGUEL ANTONIO ESPITIA	OFICIAL PLOMERIA
PABLO CESAR PALENCIA	OFICIAL PLOMERIA
JOSE LUIS CUBILLOS	AYUDANTE PLOMERIA
JULIAN ANDRES HERNANDEZ	AYUDANTE PLOMERIA
ANDER SMITH ALVARADO	AYUDANTE PLOMERIA

2.2.4 PERSONAL ELÉCTRICO

Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño

NOMBRE	CARGO
OMAR JAVIER RODRIGUEZ	OFICIAL ELECTRICO
NELSON ROJAS GARZON	AUXILIAR ELECTRICO
FREDY FIERRO MEDINA	AUXILIAR ELECTRICO
OMAR ALEJANDRO SILVA	AUXILIAR ELECTRICO

2.2.5 PERSONAL TOPOGRAFÍA

Tabla 13. Personal Topografia

NOMBRE	CARGO
SEGUNDO ANDRADE ANDRADE	TOPOGRAFO

2.2.6 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.

Tabla 14. Tabla Personal Mampostería #1

NOMBRE	CARGO
EDWARD ARMANDO TORRES	SST
FRANCISCO GUTIERREZ MAYORGA	ENCARGADO
JUAN SEBASTIAN RUIZ	OFICIAL
YEISSON FERNANDO ROVIRA	OFICIAL
VICTOR DAMIR MORENO	OFICIAL
JAIR SANTANILLA BARRERA	AYUDANTE
LUIS FELIPE CONTRERAS	OFICIAL

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

ELMER ANGULO	OFICIAL
BRAYAN ESNEIDER NAVARRETE	AYUDANTE

2.2.7 PERSONAL MAMPOSTERÍA #2

Tabla 15. Tabla Personal Mampostería #2

NOMBRE	CARGO
MIKELIZ JEANNETTE LARRADA	PROFESIONAL SST
LUIS ANTONIO PINZON	INGENIERO
JOSE YONATHAN NARVAEZ	CORTADOR
CARLOS NARVAEZ RODRIGUEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
ARMANDO ELIZALDE	OFICIAL PLUMERO
GIOVANNY DEVIA MUÑOZ	OFICIAL DE MAMPOSTERIA
JOHAN SEBASTIAN FRAGUA	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
JACI ALEJANDRO LOPEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
ROBINSON GONZALEZ ASPRILLA	OFICIAL MAMPOSTERO
LUIS ENEL VALENCIA	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
JUAN CARLOS MONSALVE MARTINEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
JUAN CARLOS LIZARAZO	OFICIAL MAMPOSTERO
CARLOS JULIO PIÑACUE	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
FREDIDEL BERMEO CORDOBA	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
MANUEL GERARDO RIVERA	OFICIAL MAMPOSTERO

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Preparación y atención emergencia- Simulacro Nacional 2025	10-10-2025	62	15 minutos
Funciones principales de la ARL	11-10-2025	55	10 minutos
Cuidado de mano, sus manos las mejores aliadas.	14-10-2025	73	10 minutos
Preparación Simulacro – alarma sonora	15-10-2025	66	10 minutos
Preparación Simulacro campaña: “Prepárate tú reacción salva vidas”	17-10-2025	69	20 minutos
Resistencia muscular “la calistenia”	18-10-2025	48	10 minutos
No exceso de confianza y seguridad en el vaciado	20-10-2025	62	10 minutos
Concentración en la tarea, evitar accidentes	21-10-2025	60	10 minutos
Rutas de evacuación de emergencia y recomendaciones para evacuación	22-10-2025	58	15 minutos
Capacitación – Socialización Procedimiento compactador de rodillo y riesgos	22-10-2025	1	20 minutos
Actos y condiciones inseguras	23-10-2025	66	15 minutos
Controles de riegos en alturas y riesgo eléctrico	24-10-2025	2	20 minutos
Socialización actividad de bienestar (31-10-2025)	24-10-2025	76	5 minutos
Diligenciamiento de formato para equipos TA	25-10-2025	59	10 minutos
Uso obligatorio de EPCC – calistenia	25-10-2025	57	10 minutos
Socialización advertencias o llamados de atención SST	27-10-2025	81	15 minutos
Capacitación – Alimentación saludable	29-10-2025	65	30 minutos
Exceso de confianza entre compañeros, límites y respeto	30-10-2025	50	10 minutos
Bienestar a colaboradores- Dia de Halloween	31-10-2025	69	1 hora + 30 minutos

Tabla 18 Cumplimiento charlas y capacitaciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD
Indicador de Calificación	(No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%
	(21/21) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron veintiséis (26) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual el día 24/10/2025.

También se presenta informe trimestral del Comité de convivencia laboral.

Anexo 14. Comités de apoyo

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

Anexo 15. Recomendaciones médicas


2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

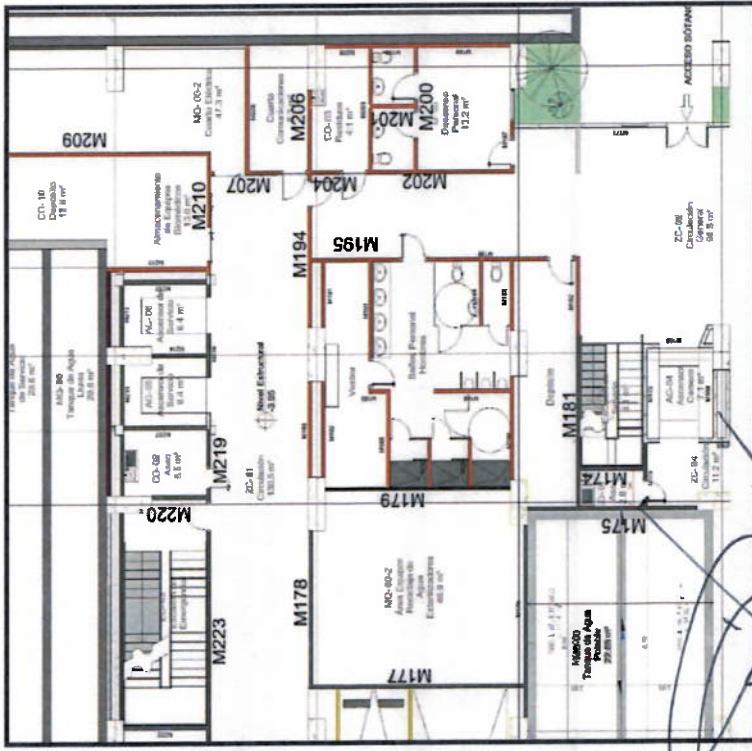
El proceso de inducción y reinducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. Ver Registro fotográfico

Anexo 16. Inducción y reinducción

Tabla 19. Inducciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDUCCION AL TRABAJADOR
Indicador de Calificación	(No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%
	(37/37) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se realizaron treinta y uno (31) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente.

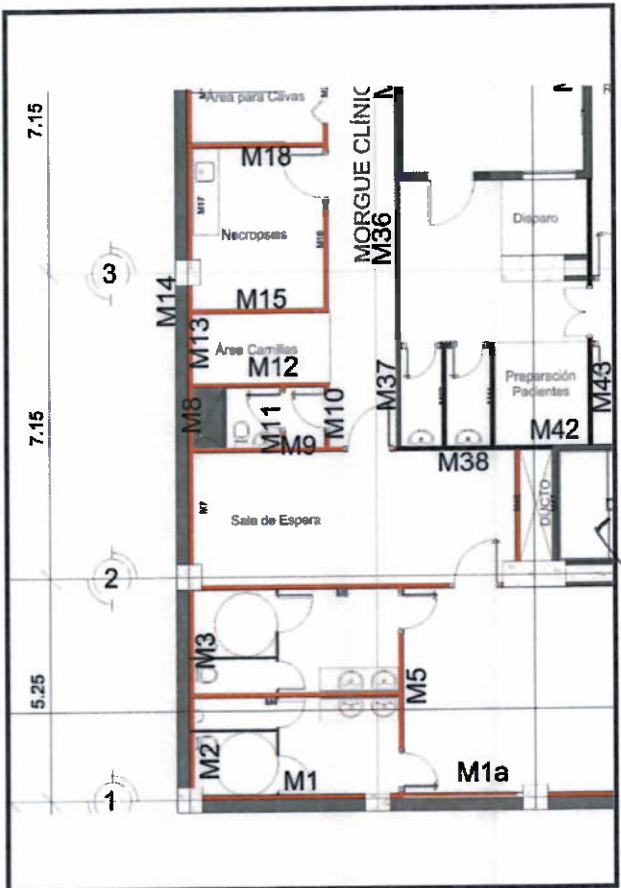
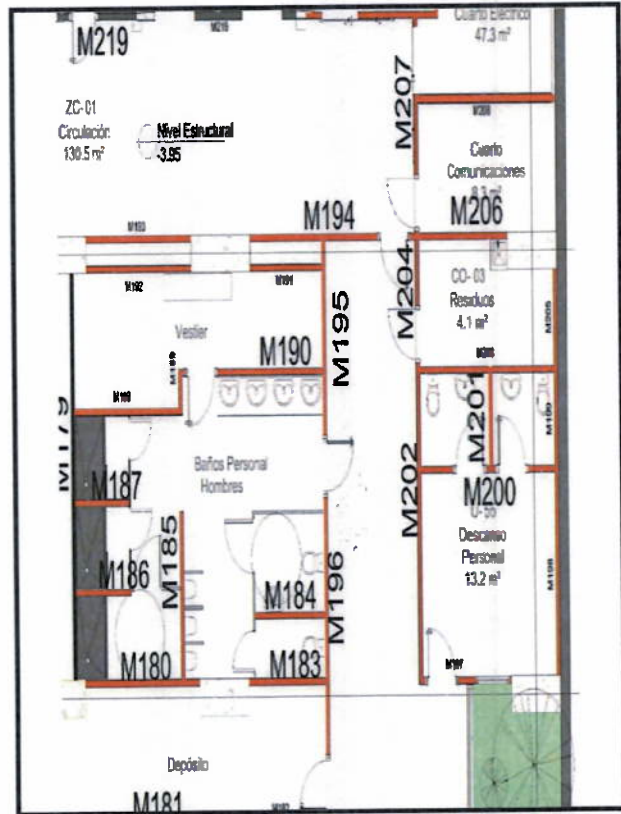
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 2023					
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:		15	FECHA:		OCTUBRE 2025
INTERVENTORIA:											
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:		ML			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
											
SOTANO											
(e) LOCALIZACION			(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL			
M77, M80,M104,M126,M125,M124	viga cierre		14,50				1,00	14,50			
M105	viga cierre			3,06			1,00	3,06			
M108	viga cierre			1,46			1,00	1,46			
M109	viga cierre			4,42			1,00	4,42			
M110	viga intermedia			3,38			1,00	3,38			
M111	viga cierre			3,38			1,00	3,38			
M116	viga cierre			4,56			1,00	4,56			
M114	viga cierre			4,46			1,00	4,46			
M115	viga intermedia			3,09			1,00	3,09			
M117	viga intermedia			3,24			1,00	3,24			
M121	viga cierre			3,24			1,00	3,24			
M120	viga intermedia			1,43			1,00	1,43			
M122	viga cierre			1,43			1,00	1,43			
M144	viga intermedia			1,74			1,00	1,74			
M123	viga cierre			1,74			1,00	1,74			
M58	viga intermedia			1,25			1,00	1,25			
M65	viga cierre			1,25			1,00	1,25			
M60,M62,M64	viga intermedia			3,10			1,00	3,10			
M61	viga cierre			3,10			1,00	3,10			
M127,M129,M131,M141	viga intermedia			2,29			1,00	2,29			
	viga cierre			3,64			1,00	3,64			
	viga intermedia			1,85			1,00	1,85			
	viga cierre			2,65			1,00	2,65			
	viga intermedia			8,20			1,00	8,20			
	viga cierre			1,57			1,00	1,57			
	viga intermedia			8,22			1,00	8,22			
SUB TOTAL VIENEN PASAN							92,25				
							92,14				
							184,39				
Elaboró: 											
Revisó: 											
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozajó											


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha:					
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15		FECHA:		OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:		7.8.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi		(c) UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PLANIMETRIA SOTANO											
											
Elaboro:						Revisó:					
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios						RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jay Lozano					

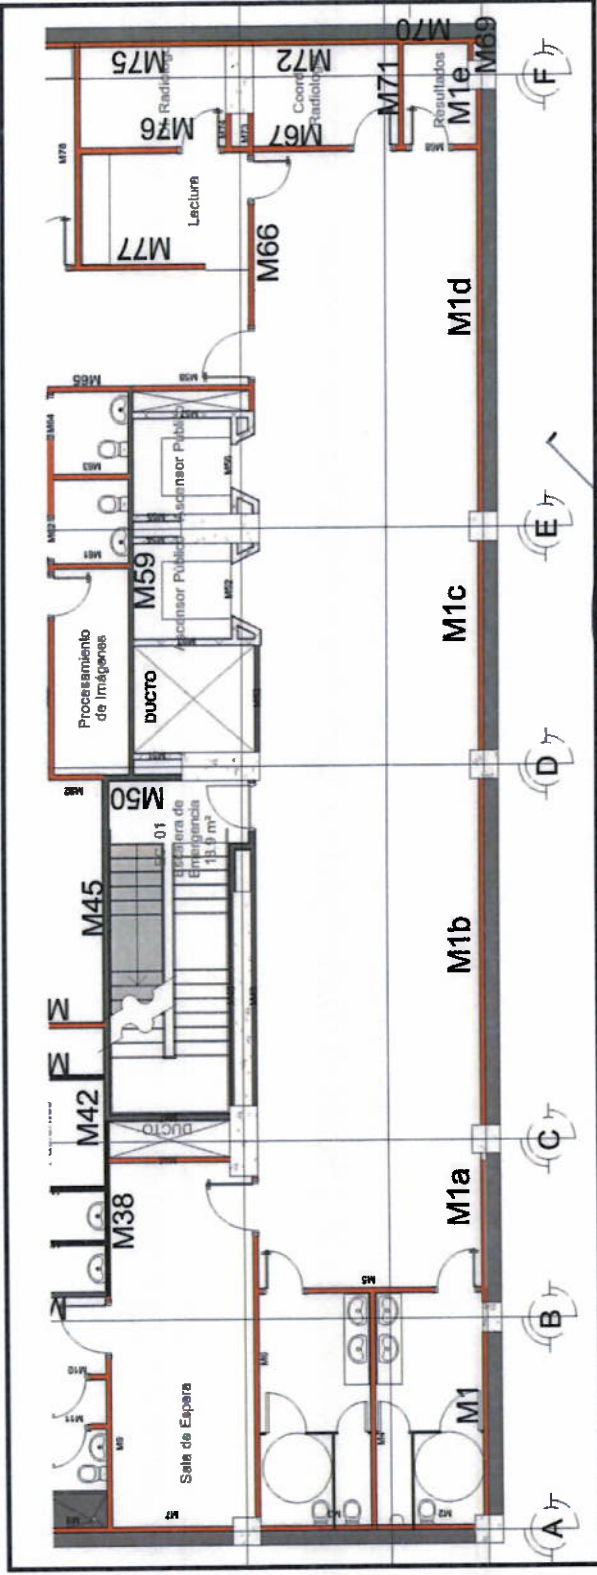

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:				CORTE N°: 15		FECHA:		OCTUBRE 2025	
(a) ITEM N°: 7.8.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi		(c) UND: ML			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
(e) LOCALIZACION		(f) Ancho		(g) Longitud (Kg/ml)		(i) MEDIDA PARCIAL HR		(j) N° DE ELEMENTOS	
				SOTANO					
M196		viga cierre		5,17				1,00	
M184		viga intermedia		2,08				1,00	
M183		viga cierre		2,08				1,00	
M183		viga cierre		2,30				1,00	
M190		viga cierre		3,23				1,00	
M185		viga cierre		2,71				1,00	
M180		viga cierre		3,47				1,00	
M186		viga intermedia		1,66				1,00	
M187		viga intermedia		1,66				1,00	
M3		viga intermedia		2,42				1,00	
M2		viga cierre		2,20				1,00	
M5		viga cierre		2,20				1,00	
M9		viga cierre		4,89				1,00	
M10		viga cierre		1,41				1,00	
M11		viga cierre		1,41				1,00	
M8		viga intermedia		1,42				1,00	
M12		viga cierre		1,42				1,00	
M15		viga cierre		3,15				1,00	
M13		viga intermedia		3,15				1,00	
M14		viga cierre		1,81				1,00	
M18		viga intermedia		1,81				1,00	
		viga intermedia		0,57				1,00	
		viga cierre		0,57				1,00	
		viga cierre		3,14				1,00	
		SUB TOTAL		VIENEN				63,28	
		PASAN						265,08	
								328,36	
Elaboró:									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios		Revisó:							
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano							

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código PA-FO-30 Versión N°. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023		
	CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
PLANIMETRIA SOTANO

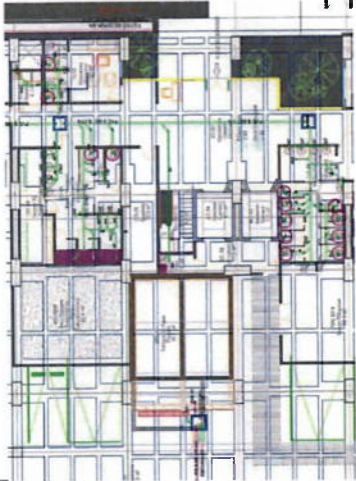
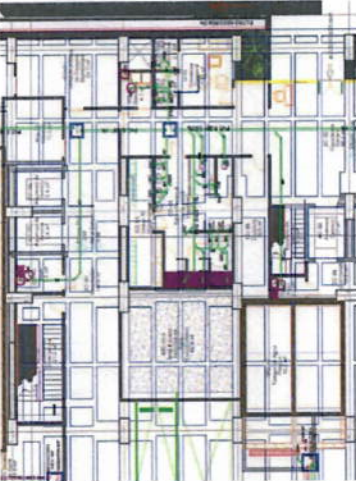
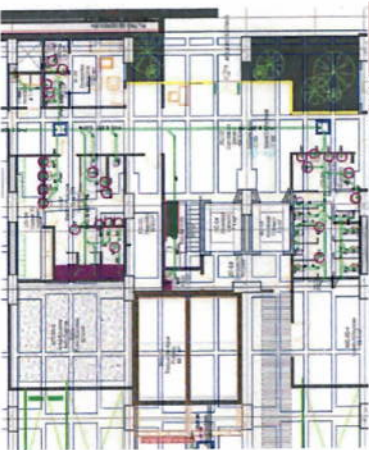



Elaboró:	
RESIDENTE DE OBRA	
Arq Francisco Barrios	
Revisó:	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Arq Jair Lozano	

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			CORTE N°:		15	FECHA:	OCTUBRE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
INTERVENTORIA:											
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi					(c) UND:	ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
PLANIMETRIA SOTANO											
											
Elaboró: 											
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios											
Revisó: 											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano											

[illegible]


[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
		Codigo: PA-PO-30				Página 1 de 1					
		Version No. 00				5					
		Fecha:				4					
						2023					
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATISTA:		FECHA:		OCTUBRE 2025			
INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		15					
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		Tapones de prueba Ø4" - Ø3" y Ø2"		UND:		UND:			
26.12.5											
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
EJE 5-8 ; A-F 4° SÓTANO 			EJE 6-9 ; A-F 3° SÓTANO 			EJE 5-8 ; A-F 2° SÓTANO 					
Elaboró:  RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios			Revisó:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano								

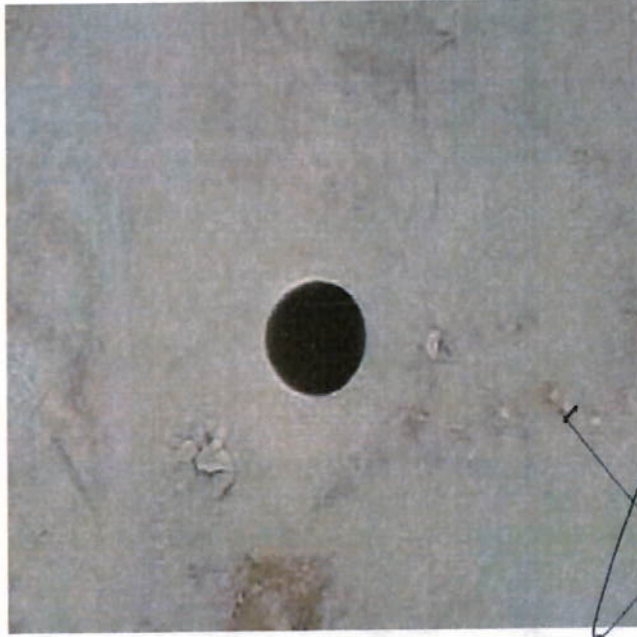
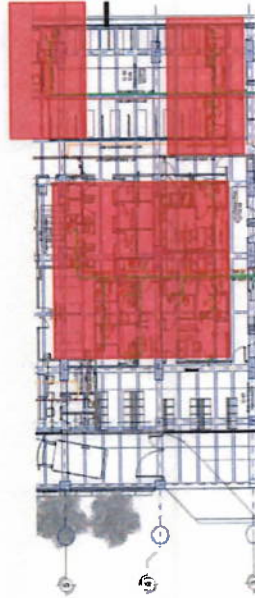
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Codigo: PA-FO-38 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
INTERVENTORIA						
ITEM N°:	26.12.7	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa Ø4" con maquina sacanudos			UND:

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

EJE 1-3 ; A-F 4° PLACA PRIMER PISO



EJE 3-5 ; A-F 4° PLACA PRIMER PISO



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barrios

Realizó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

[illegible]

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

Anexo 17. Entrega de dotación y EPI

Tabla 20. Cumplimiento EPI

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de Calificación	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
	(77/77) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS
Indicador de Calificación	(No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100%
	(65/65) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%.

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. Ver Registro fotográfico

Tabla 21. Cumplimiento kit señalización SST

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT SEÑALIZACIÓN SST
Indicador de Calificación	(No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%
	(20/20) *100%= 100%
Análisis	Durante este periodo se realizó la instalación de veinte (20) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo.

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones a los equipos, máquinas, herramientas, equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

Anexo 18. Inspecciones

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
 Consorcio San Vicente cuenta con servicios sanitarios para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales

Tabla 22. Relación agua potable

PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Del 25 de septiembre al 02 de octubre	Botellón 20 L	30
03 octubre al 10 de octubre	Botellón 20 L	27
11 octubre al 20 octubre	Botellón 20 L	27
21 de octubre al 31 de octubre	Botellón 20 L	30

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS
 CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el anexo 15. Inspecciones. También como gestión para la preparación y atención de emergencias se participó del simulacro nacional llevado a cabo el 22 de octubre, las actividades de planeación y ejecución para lo cual se elaboró el informe y se adjunta la evidencia fotográfica. **Ver Registro fotográfico.**

Tabla 23. Cumplimiento Kit de emergencias

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS
Indicador de Calificación	(No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100% (5/5) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se cuenta con cinco (5) kit de emergencias uno (1) en campamento y cuatro (4) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto.

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO
 Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

En el periodo se presentaron tres (3) accidentes de trabajo no graves ni mortal, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

Tabla 24. Personal con incapacidad por AT

INCAPACIDADES POR ATEL			
Número AT Periodo	3	Total días de incapacidad por AT	7
Nombres y Apellidos del trabajador	Cargo	Días de incapacidad del periodo	
Jonier Stiven Gutiérrez	Ayudante	4	
Edwin Dayan Benavides	Ayudante	0	
Fredy Andrés Cerquera	Oficial	3	

Anexo 19. Indicadores y reporte de accidentes

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan el Registro de permisos y Análisis de trabajo seguro.

Anexo 20. Permisos de trabajo y ATS

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría.

2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

El CONSORCIO SAN VICENTE realiza la detección, documentación, verificación de plan y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de asegurar la eficacia del sistema de gestión SST y prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como para optimizar continuamente las condiciones de trabajo

Anexo 21. Informe Acciones del periodo

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.17 INFORME PROVEEDORES

Para el presente periodo el proveedor de mampostería presenta informes de las actividades ejecutadas, que incluye capacitación y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo, entre de elementos de protección personal y dotación.

Anexo 22. Informe de contratista

2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo se llevaron a cabo actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el tema Estilos de vida saludable: Hábitos Alimenticios.

2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

En desarrollo de las actividades del PMT en el proceso constructivo en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. Ver Registro fotográfico

2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

Anexo 23. Solicitud cierres temporales PMT

2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:

2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 012 del 31/10/2025

Anexo 24. Acta Apertura Buzón PQRS

2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. Ver registro fotográfico

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:

- Diligenciamiento de registro de visitantes
- Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.
- Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores, como es la celebración de Halloween, donde se realizó un concurso al mejor casco disfrazado con materiales reciclables y se premiaron los 3 mejores cascos. De igual manera, como se realiza mes a mes, la celebración de los cumpleaños del mes. **Ver Registro fotográfico.**

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Anexo 25. Registro fotográfico SST

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN".

3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 25. Marco legal gestión ambiental

NORMAS GENERALES	Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.
	Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales.
	Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.
	Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.

		Constitución política del 1991: • Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. • Art 58: "La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica". • Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables." • Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano". • Art 80: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución." • Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. • Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc. • Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.
NORMAS REGLAMENTARIAS		Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo, Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos. Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto

AIRE		Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
		Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
		Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
		Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
		Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
		Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.
SUELO		Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.
		Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
AGUA		Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.
		Ley 99 de 1993. Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.
		Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.
		Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
		Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.

RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.

Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos

Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.

Resolución 472 del 2017: Donde se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que deroga expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.

FAUNA	Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.
	Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.
	Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre
	Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
FLORA	Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
	Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana
	Certificado de Incentivo Forestal – CIF: Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.
PAISAJE	Decreto 1715 de 1978: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS	Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.
	Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.
	Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
	Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
	Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.
	Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.
	Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos

ORDENAMIENTO TERRITORIAL		Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Ley 1152 de 2007. Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas. Decreto 879 de 1998. Artículo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial
RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES		Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial. Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas. Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas. Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84. Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres. Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo
ARQUEOLOGIA		Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

	investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico
	Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial.
	Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.

3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2025, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

Se continúa realizando seguimiento a las fichas ambientales establecidas en el PMA garantizando su cumplimiento. Los indicadores se presentan de manera semestral.

3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

Para el presente periodo se utilizaron materiales pétreos para las diferentes actividades constructivas.

3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

Tabla 26. Relación de materiales e insumos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
Maderas Ordoñez	Tabla burra 25x3x3	190 unds
EDS Gasoil	ACPM	520 galones
EDS Cootransgar LTDA	Gasolina	

Tabla 27. Relación de materiales pétreos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
DF Construcciones y servicios SAS	Arena	56 m3
DF Construcciones y servicios SAS	Arenilla	14 m3
DF Construcciones y servicios SAS	Sub base	196 m3

Tabla 28. Relación Ingreso de concreto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE CONDUCTOR	VOLQUETA PLACAS	M3
2/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	KZV-893	4,25
7/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
7/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
7/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7

7/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	5,25
14/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-710	3,25
15/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	4,75
20/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-713	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
20/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-710	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
20/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-713	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
20/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
21/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-713	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
21/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-713	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	CESAR PARRA	ZKG-152	7

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

21/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
21/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	W0W-039	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	ULDARICO GARCIA	SYK-839	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JHON MONTOYA	SRD-710	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIZ	SRD-713	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	WILLIAN TRUJILLO	VKK-758	7
21/10/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-893	6
21/10/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	W0W-039	5
24/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	8
24/10/2025	CONVENCIONAL	ROMULO PERDOMO	GQZ-819	7
24/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	7
24/10/2025	CONVENCIONAL	ROMULO PERDOMO	GQZ-819	7
24/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	5,25
26/10/2025	CONVENCIONAL	MIGUEL SANCHEZ	GQZ-709	7
26/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	7
26/10/2025	CONVENCIONAL	ROMULO PERDOMO	GQZ-819	7
26/10/2025	CONVENCIONAL	MIGUEL SANCHEZ	GQZ-709	7
27/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	4,25
28/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	8
28/10/2025	CONVENCIONAL	ROMULO PERDOMO	GQZ-819	7,5
28/10/2025	CONVENCIONAL	MIGUEL SANCHEZ	GQZ-709	7
28/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	6,25
30/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	8
30/10/2025	CONVENCIONAL	MIGUEL SANCHEZ	GQZ-709	8
30/10/2025	CONVENCIONAL	ALEXANDER MAJE	THS-616	6,5
TOTAL				435.25 m3

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.

Anexo 26. Control de material

3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo. En el presente periodo se realiza fundida de estructura con concreto premezclado.

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.

Tabla 29. Sustancias químicas usadas

SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS	
CEMENTO	Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

	ACPM	Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación.
	GASOLINA	El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía. Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor.
	PEGANTE PVC	Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías. Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.
	DESMOLDANTE PARA FORMALETA	Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico. Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.
	EPOTOC 1	Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.
	TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE	Es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.
	DURAL 452 GEL	Adhesivo epóxico de dos componentes, 100% sólido, de alto módulo, diseñado para aplicaciones de unión estructural que requieren un material que no se descuelgue o deslice.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Ha sido específicamente diseñado para proveer una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base. Es apropiado para resistir cargas medianas y altas, tanto estáticas, como de viento o sísmicas en tensión y cortante en aplicaciones estructurales y no estructurales.
LIMPIADOR PVC	Producto químico diseñado para limpiar y preparar superficies de cloruro de polivinilo (PVC) antes de aplicar adhesivos o selladores.
ESMALTE AMARILLO	Es un tipo de pintura que se utiliza para dar un acabado brillante y protector a diversas superficies.
CURASEAL ANTISOL	Solución coloidal, disponible en rojo, blanco o transparente, que se utiliza para el curado, sellado y endurecimiento de concreto y mortero
ENDURECEDOR PARA PISOS	Formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas.
MORTERO ACRILICO	Material transpirable y de alta resistencia compuesto de resinas acrílicas y pigmentos.
ET-3G	Se utiliza para anclar varillas roscadas y barras de refuerzo en concreto y mampostería, siendo ideal para aplicaciones generales, incluso en condiciones secas o húmedas y en concreto agrietado o no agrietado.

3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continúa el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.

Anexo 27. Inspección acopio y consumo combustible

3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo al código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

3.8 MANEJO DE RCD

3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

En el presente periodo se dispuso 124 m³ de RCD. Residuos que fueron depositados y dispuestos en el sitio definido por la empresa y mencionado en el anterior ítem.

Estas disposiciones fueron realizadas por Consorcio San Vicente y el proveedor de volquetas DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 901359095-1.

Cabe resaltar que la salida de volquetas en obra siempre es carpada con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

En este periodo se realizó disposición final de RCD lo cual se generaron reportes mensuales de sobrantes, dichos residuos fueron dispuestos en el sitio establecido y autorizado.

Tabla 30. Retiro RCD

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

FECHA	SALIDA DE MATERIAL	PLACA VOLQUETA	M3	VIAJES	TOTAL, M3
6/10/2025	ESCOMBRO	SWK - 353	7	1	7
9/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
9/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
11/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
17/10/2025	ESCOMBRO	VAD-766	7	1	7
18/10/2025	ESCOMBRO	OWH-742	7	1	7
23/10/2025	ESCOMBRO	OWH-742	7	1	7
25/10/2025	ESCOMBRO	OXB - 074	7	1	7
27/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
28/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
29/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
30/10/2025	ESCOMBRO	ABL - 519	7	1	7
30/10/2025	ESCOMBRO	WHA-003	8	5	40

En la siguiente tabla, se relaciona de manera trimestral el reporte de disposición final de RCD generados en el 2025.

Tabla 31. Reporte RCD

PERIODO	SALIDA DE MATERIAL	TOTAL, M3
Ene - mar	Escombros y excavación	1252
Abr - Jun	Escombros	7
Jul - Sep	Escombros	426

3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombros, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.

3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizo ningún material en obra ya que todo los RCD generados en obra fueron dispuestos en sitio.

Anexo 28. Control de material RCD

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.8.6 TRANSPORTE

Durante este periodo se realizó cargue y/o transporte de RCD, dichos sobrantes fueron transportados por las siguientes volquetas.

Tabla 32. Vehículos retiro RCD

PLACA	M3
ABL-519	49
OWH-742	14
OXB-074	7
WHA-003	40
VAD-766	7
SWK-353	7

3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se programa nuevamente su retiro y disposición final.

3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL

En el periodo anterior, se realizó la primera entrega de residuos industriales a la empresa Serviambiental S.A E.S.P. quien ofrece sistemas de tratamiento (incineración) y disposición final de toda clase de residuos. Los residuos dispuestos en septiembre fueron los siguientes:

- Elementos de protección individual usados y dañados.
- PVC
- Bolsas de cemento
- Aceite hidráulico

El mes pasado, no contábamos con el certificado de disposición, por lo tanto, se adjunta en el presente informe.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

En el presente periodo, los restos de madera, cartón y plástico generados y acopiados en obra fueron donados a personas, quienes manifestaron su interés en reutilizarlo, quedando constancia de dicha entrega.

Resaltar que, en este mes de octubre, Consorcio San Vicente realiza la celebración de Halloween, donde premia a los tres mejores cascos disfrazados con material reciclable, donde se promovía a los colaboradores a reciclar y reutilizar materiales como cartón, tapas de gaseosa, bolsas de comida, icopor, entre otros materiales que se generan día a día en obra. Siendo los premios, tres anchetas de diferentes tamaños, realizadas por dos colaboradores de la empresa, reutilizando madera que ya no era útil para actividades técnicas de obra. **Ver registro fotográfico.**

Anexo 29. Certificado de disposición y actas entrega material

3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES

Durante el presente periodo, se realizaron las labores de humectación de superficies mediante riego controlado, aplicadas principalmente en actividades como el barrido de placas, con el fin de minimizar la emisión de polvo y mantener las condiciones adecuadas de limpieza. Estas acciones se ejecutan bajo criterios de uso eficiente del recurso hídrico,

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

evitando el desperdicio de agua y en coherencia con las campañas internas de ahorro y consumo responsable.

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de corte de ladrillo bajo condiciones controladas, aplicando humectación previa del material con el propósito de minimizar la generación y dispersión de material particulado. Asimismo, se adecuó un área específica para el corte, cubierta con poli sombra, que actúa como barrera física para evitar la propagación de polvo hacia otras zonas de trabajo. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la prevención de impactos al entorno y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

3.10.5 VÍAS DE ACCESO

En este periodo, las vías de acceso a la obra Hospital Departamental San Vicente de Paúl se mantienen en óptimas condiciones, libres de acumulación o dispersión de material particulado. Al finalizar cada jornada o actividad que implique movimiento de materiales o tránsito de vehículos, se realizan barridos y limpieza preventiva en las vías de acceso, con el fin de remover el material particulado o residuos sueltos generados durante las labores. Estas acciones contribuyen al control ambiental del área de influencia, asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra una volqueta para la salida de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así autorizar su ingreso.

Tabla 33. Volquetas entrada y movimiento de material

PLACA	LINEA	MODELO
ABL-519	KODIAK-157	2006
SWK-353	KODIAK 7500	2007
XMC-971	KODIAK-157	2009
WHA-003	SIN LINEA	1946

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

OXB-074	BRIGADIER-151	1984
---------	---------------	------

Tabla 34. Relación maquinaria en obra

CLASE	LINEA	MODELO
BOMBA ESTACIONARIA	PUTZMEISTER	BSA 1004
TORRE GRUA MOVIL	-	ACRS13-L
PLANTA ELECTRICA	-	P-100
TORRE GRUA	-	CM4810

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de estos.

3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

Tabla 35 Relación consumo de agua

Factura No.	Código interno	Consumo m3
3503142	00185097	36

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.

Anexo 30. Control aseo de baños

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

En el presente periodo se implementaron acciones de control para prevenir la dispersión de material particulado y el derrame de residuos en las vías de acceso. Cuando se requiere, a las volquetas se les realiza el lavado de llantas mediante riego controlado, evitando el arrastre de material hacia el exterior de la obra. Asimismo, el lavado de los mixers se efectúa en un área acondicionada con dique de contención, lo que permite retener los residuos sólidos y evitar vertimientos directos sobre el suelo. Los residuos generados durante estas actividades son recolectados y trasladados a las áreas de acopio temporal, donde se almacenan de manera segura para su posterior disposición final.

3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

3.11.6 CUERPOS DE AGUA

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.7 CONTROL DE VECTORES

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

Anexo 31. Control de plagas y roedores

3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 32. Publicaciones ambientales

3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de julio, se llevó a cabo la siguientes charlas y capacitaciones:

Tabla 36. Relación de temas ambientales

No.	Tema	Fecha	Duración
1	Material particulado - plástico e icopor	01/10/2025	10 min
2	Hábitos en el trabajo - orden y aseo	03/10/2025	15 min
3	Clasificación de residuos - uso adecuado puntos ecológicos	16/10/2025	10 min
4	Cuidado de los cuerpos de agua - protección de sumideros	24/10/2025	20 min
5	La costumbre de hacer aseo no nos cuesta	28/10/2025	10 min
6	Las 3 R - reducir, reutilizar, reciclar	30/10/2025	35 min

Anexo 32. Registro de charlas

3.14 ORDEN Y ASEO

3.14.1 JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.

	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001



Ilustración 33. Orden y aseo

Anexo 33. Inspección de orden y aseo

3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados, contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS

Durante el presente periodo no se recibió visita de ningún ente o autoridad ambiental.

3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de octubre, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

Anexo 34. Registro fotográfico Ambiental

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	151612638	1982680900	04/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901785549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **179.33.177.104**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 8,334,740.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 8,334,740.00	COP\$ 8,334,740.00

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO DE
OCCIDENTE

Nro. Transacción

151612638

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1982680900

04/12/2025

Número de Identificación

901785549

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

HUILA

Dirección de Domicilio

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Localización

Nacional

Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

Regional

Huila

Número Licencia de Obra

0

Nombre Obra

HTAL DTAL SAN VICENTE HUILA

Fecha Terminación Obra

19/10/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

3333895889.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO SAN VICENTE

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

NEIVA (HUILA)

Ciudad de Domicilio

neiva

Teléfono de Contacto

+57,317 0884254

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-041-000000

Número Contrato de Obra

090 de 2024

Fecha Inicio Obra

20/03/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra

GARZON

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

3333895889.00

Número de Trabajadores en el Periodo

10

Aporte FIC

8334740.00

Valor del Pago

8334740.00



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

1.La sociedad SEINGECOL SAS. de conformidad con la ley 21 de 1982 y en concordancia con la ley 789 de 2002, cancelo oportunamente los aportes parafiscales septiembre (Pensión) y octubre (Salud), de los empleados vinculados a esta sociedad mediante contrato laboral correspondiente al nueve por ciento (9%), distribuidos en cuatro por ciento (4%) para caja de Compensación Familiar, tres por ciento (3%) para el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y dos por ciento (2%) para el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

2.La sociedad SEINGECOL SAS., de conformidad con la ley 100 de 1993 y el decreto 3033 de 2013, cancela oportunamente los aportes por sistema General de Seguridad Social Integral a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), elegidas por los empleados, cada una con los porcentajes establecidos en la ley para el cumplimiento de las obligaciones patronales.

El presente certificado se expide en Neiva a solicitud del interesado, con destino al INTERESADO a los (03) días del mes de diciembre del año 2025, en conformidad con los soportes y los documentos Contables que están a disposición.

HERNANDO QUINTERO MORA

TP-96943-T

Revisor Fiscal

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el tres (03) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,



LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T
C.C. 52.158.483 de Bogotá

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con Nit **830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el tres (03) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,



INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA

Contador

Tarjeta Profesional No. TP 211838-T

C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES

Yo, **ZAIDA ALJURE NARANJO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.572.975 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUSAR S.A.** identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Dada en Bogotá, a los 03 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Zaida Aljure Naranjo
C. C. No. 51.572.975 de Bogotá
Representante Legal
Construsar S.A.

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 0000141043337614

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4 9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO SAN VICENTE

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO

42. Correo electrónico

consorciosanvicente2024@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono

6 0 8 8 7 1 6 8 2 6

45. Teléfono 2

3 1 7 0 8 8 4 2 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 3 1 2 1 5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 1 4 1 6 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso; Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 2 de 4 Hoja 2 141043337614	
				(415)7707212489984(8020) 0000141043337614	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 8 5 5		6. DV 4 9 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	
14. Buzón electrónico 1 3					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 3, 1 2, 1 5					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro 2 0 2 3, 1 2, 1 5					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento 4 1					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Composición del Capital					
82. Nacional 1 0 0 %					
83. Nacional público 0 . 0 %					
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero 0 %					
86. Extranjero público 0 . 0 %					
87. Extranjero privado 0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4

9

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8 2 0 2 3 1 2 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3 7 7 1 1 6 1 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POLO	POLANIA	WILLIAM	ALEXANDER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL	1 9 2 0 2 3 1 2 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan	1 3 7 9 9 0 5 7 1 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	FAJARDO	TELMO	ALEXANDER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043337614



(415)7707212489984(8020) 0000141043337614

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 5 5

6. DV

4 9 8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 0 3 7 3 2 2	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3, 1 2, 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 2 0 0 2 9 8 5	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONSTRUSAR SA				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3, 1 2, 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 0 7 2 6 6 7	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA				
120. Valor capital del socio 289,663,782,473	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3, 1 2, 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	8363083	serviciocliente@construsar.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menores de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOR
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	92057377	1
					TOTAL A PAGAR
					\$1.012.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS005	Sanitas EPS	800251440-3	288.800	0	No. Autorización	Valor	0	1.700	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								270.800	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
								Total a Pagar	No. Afiliados
								270.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-7	Seguros Bolívar S.A.	800002203-2	407.900				407.800	10	3.000	470.800		4.670	470.900	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF22	Colsubsidio	860007335-1	268.900	10	1.700	270.600	1		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	10	0	0	0
0	10	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud		1	268.900	270.800
Pensión		0	0	0
Riesgos Laborales		1	467.900	470.900
CCF		1	268.900	270.600
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		3	1.005.700	1.012.100

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$1,012,100	

DETALLE POR COTIZANTE																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Aptitudes y Nombres	Credencial	Indicador	Excedente	Contribución	Indicador	TRE	TME	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	
1	CC	51772975	ALJURE NARANJO ZADIA GARCINE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

מלכות

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

303E 144 / 47 09.30 AM

Total	Afiliados(106)
-------	-----------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT 901785549	8	CONSORCIO SAN VICENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
---------------	---	-----------------------	-----------------------------

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

2025-10	2025-11	1917695266	9494565196	E	2025/11/13
---------	---------	------------	------------	---	------------

RESUMEN DE PAGO

TOTAL

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl				vip
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	\$6,457,329	4%	\$258,300	
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		\$6,457,329	16%	\$1,033,200
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		\$6,457,329		\$32,300
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		\$6,457,329		\$32,300
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		\$0	0%	\$0
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		\$0	0%	\$0
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-10	30																		\$6,457,329	6.96%	\$449,500
9494509723	1911547156	E	2025-11-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-10	30																		\$6,457,329	4%	\$258,300
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-10	30																		\$6,457,329	4%	\$258,300
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-09	30																		\$6,457,329	16%	\$1,033,200
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		\$6,457,329		\$32,300
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		\$6,457,329		\$32,300
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		\$0	0%	\$0
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		\$0	0%	\$0
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		\$6,457,329	6.96%	\$449,500
9492838673	1821312769	E	2025-10-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		\$6,457,329	4%	\$258,300

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 08:57.

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCIALES Y SALUD			
CC	79140334	FABIO HERNAN LOPEZ MARTINEZ	KM15 AUTONORTE CONDORCONGRAND	8018713275	fatopez@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOPÓ	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPL-ADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2025-10	2025-10	1	28/11/2025	99811567	\$197.600				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santitas EPS	80025140-8	187.600	0	0	0	17	2.100	189.800
									0
									1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Fsp - Solidaridad	Aporte Fsp - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fsp	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011183-6	7.900				7.900	17	100	79	8.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCIALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	17	0	0	0
0	17	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IFR y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	187.500	188.600	
Pensión	0	0	0	
Riesgos Laborales	1	7.900	8.000	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	2	195.400	197.600	

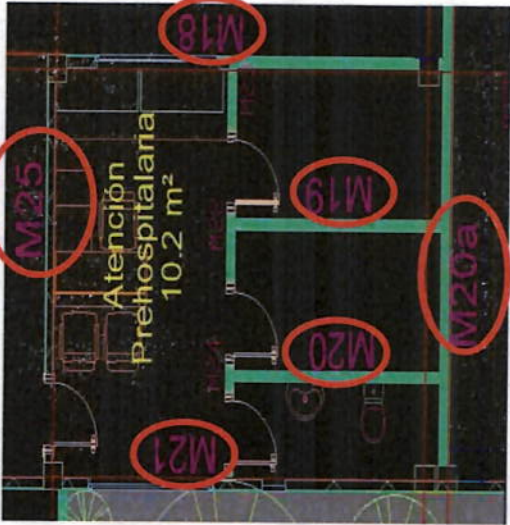
TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC		7814034	FABIO HERNAN LOPEZ MARTINEZ		KM15 AUTONORTE CONDOR COGNORAND	6018713275	fatolopez@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA		1 - Independiente				CUNDINAMARCA	SOPÓ



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓNES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	1	20/11/2025	90811587	\$197.500

...LE POR COTIZANTE


[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES		ACTUALES		ACTA DE MAYORES Y MENORES M01		ACUMULADO PARCIA		PRESENTE PERIODO CORTE # 15		ACUMULADO TOTAL	
			CANT.	VR. UNIT*	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
5.4	FAJONE													
5.5	Muro, placa para lona Concreto 4000 PSI	M2	2710.00	\$ 2,226,713.00	\$ 6,034,782	219.00	\$ 2,226,713.00	\$ 487,639.750	91.00	\$ 202,333,326.00		\$ 19,100	202,333,326.00	43.33%
5.6	REJES DE ACERVO													
5.7	Muro, placa para lona Concreto 4000 PSI	M2	37.00	\$ 2,102,315.00	\$ 78,185.655	14.51	\$ 2,102,315.00	\$ 31,810.411	14.51	\$ 31,810,202.00		\$ 14,511	31,810,202.00	90.59%
5.8	PLACA DE CONCRETO													
5.9	PLACA DE CONCRETO													
6.1	PLACA DE CONCRETO													
6.2	PLACA DE CONCRETO													
6.3	PLACA DE CONCRETO													
6.4	PLACA DE CONCRETO													
6.5	PLACA DE CONCRETO													
6.6	PLACA DE CONCRETO													
6.7	PLACA DE CONCRETO													
6.8	PLACA DE CONCRETO													
6.9	PLACA DE CONCRETO													
7.1	MAQUINARIA INTERIOR													
7.2	Muro en bloque de arida N° 4 Isople Graft 4mm, perforacion, anclaje y adhesion epoxico	M2	583.00	\$ 44,328.00	\$ 25,842.060	583.00	\$ 44,328.00	\$ 25,842.060	583.00	\$ 25,842,060.00		\$ 583.00	25,842,060.00	100.00%
7.3	Muro en bloque de arida N° 4 Isople Graft 4mm, perforacion, anclaje y adhesion epoxico	M2	10.00	\$ 25,842.00	\$ 258,420.00	10.00	\$ 25,842.00	\$ 258,420.00	10.00	\$ 258,420.00		\$ 10.00	258,420.00	60.53%
7.4	Muro en bloque de concreto gris 10x10x20 cm	M2	3,450.00	\$ 13,530.00	\$ 46,672.500	2,420.00	\$ 13,530.00	\$ 32,752.200	327.50	\$ 4,517,534.00		\$ 4,517.50	4,517,534.00	58.31%
7.5	Muro en bloque de concreto gris 10x10x20 cm	M2	308.00	\$ 11,717.00	\$ 3,607.840	308.00	\$ 11,717.00	\$ 3,607.840	308.00	\$ 3,607,840.00		\$ 308.00	3,607,840.00	1.00%
7.6	ENTRERES													
7.7	Dintel concreto 3000 x 15 cm x 15 cm	M2	31.00	\$ 12,800.00	\$ 396,800.00	31.00	\$ 12,800.00	\$ 396,800.00	31.00	\$ 396,800.00		\$ 31.00	396,800.00	27.30%
7.8	ENTRERES													
7.9	ENTRERES													
8.1	ENTRERES													
8.2	ENTRERES													
8.3	ENTRERES													
8.4	ENTRERES													
8.5	ENTRERES													
8.6	ENTRERES													
8.7	ENTRERES													
8.8	ENTRERES													
8.9	ENTRERES													
9.1	ENTRERES													
9.2	ENTRERES													
9.3	ENTRERES													
9.4	ENTRERES													
9.5	ENTRERES													
9.6	ENTRERES													
9.7	ENTRERES													
9.8	ENTRERES													
9.9	ENTRERES													
10.1	ENTRERES													
10.2	ENTRERES													
10.3	ENTRERES													
10.4	ENTRERES													
10.5	ENTRERES													
10.6	ENTRERES													
10.7	ENTRERES													
10.8	ENTRERES													
10.9	ENTRERES													
11.1	ENTRERES													
11.2	ENTRERES													
11.3	ENTRERES													
11.4	ENTRERES													
11.5	ENTRERES													
11.6	ENTRERES													
11.7	ENTRERES													
11.8	ENTRERES													
11.9	ENTRERES													
12.1	ENTRERES													
12.2	ENTRERES													
12.3	ENTRERES													
12.4	ENTRERES													
12.5	ENTRERES													
12.6	ENTRERES													
12.7	ENTRERES													
12.8	ENTRERES													
12.9	ENTRERES													
13.1	ENTRERES													
13.2	ENTRERES													
13.3	ENTRERES													
13.4	ENTRERES													
13.5	ENTRERES													
13.6	ENTRERES													
13.7	ENTRERES													
13.8	ENTRERES													
13.9	ENTRERES													
14.1	ENTRERES													
14.2	ENTRERES													
14.3	ENTRERES													
14.4	ENTRERES													
14.5	ENTRERES													
14.6	ENTRERES													
14.7	ENTRERES													
14.8	ENTRERES													
14.9	ENTRERES													
15.1	ENTRERES													
15.2	ENTRERES													
15.3	ENTRERES													
15.4	ENTRERES													
15.5	ENTRERES													
15.6	ENTRERES													
15.7	ENTRERES													
15.8	ENTRERES													
15.9	ENTRERES													
16.1	ENTRERES													
16.2	ENTRERES													
16.3	ENTRERES													
16.4	ENTRERES													
16.5	ENTRERES													
16.6	ENTRERES													
16.7	ENTRERES													
16.8	ENTRERES													
16.9	ENTRERES													
17.1	ENTRERES													
17.2	ENTRERES													
17.3	ENTRERES													
17.4	ENTRERES													
17.5	ENTRERES													
17.6	ENTRERES													
17.7	ENTRERES													
17.8	ENTRERES													
17.9	ENTRERES													
18.1	ENTRERES													
18.2	ENTRERES													
18.3	ENTRERES													
18.4	ENTRERES													
18.5	ENTRERES													
18.6	ENTRERES													
18.7	ENTRERES													
18.8	ENTRERES													
18.9	ENTRERES													
19.1	ENTRERES													
19.2	ENTRERES													
19.3	ENTRERES													
19.4	ENTRERES													
19.5	ENTRERES													
19.6	ENTRERES													
19.7	ENTRERES													
19.8	ENTRERES													
19.9	ENTRERES													
20.1	ENTRERES													
20.2	ENTRERES													
20.3	ENTRERES													
20.4	ENTRERES													
20.5	ENTRERES													
20.6	ENTRERES													
20.7	ENTRERES													
20.8	ENTRERES													
20.9	ENTRERES													
21.1	ENTRERES													
21.2	ENTRERES													
21.3	ENTRERES													
21.4	ENTRERES													
21.5	ENTRERES													
21.6	ENTRERES													

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	1.6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°: 15		FECHA:	OCTUBRE 2025			
Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm			(c) UND:			M2			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
BLOQUE B - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA									
									
LOTE B - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA									
(e) LOCALIZACION	(f) Ancho	(g) Longitud	DESCUENTO vano		(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL		
M25	4.21	2.93	2.14		10.20	1.00	10.20		
M21	5.62	2.93	2.85		13.61	1.00	13.61		
M20	3.11	3.24			10.08	1.00	10.08		
M19	3.11	3.24			10.08	1.00	10.08		
M18	5.60	2.93	2.70		13.71	1.00	13.71		
M20a	4.38	2.93			12.83	1.00	12.83		
LOTE B - SUBESTACION ELECTRICA									
M29	0.61	2.93			1.79	1.00	1.79		
M30	3.66	2.93			10.72	1.00	10.72		
M34	5.70	2.93			16.70	1.00	16.70		
M36	1.27	2.93			3.72	1.00	3.72		
M35	0.60	2.93			1.76	1.00	1.76		
M33	5.38	2.93			15.76	1.00	15.76		
M32	4.88	2.93			14.30	1.00	14.30		
M31	2.10	2.93			6.45	1.00	6.45		
M26	6.60	3.24	0.31		21.08	1.00	21.08		
M27	7.50	2.90			21.75	1.00	21.75		
	7.13	2.90			20.68	1.00	20.68		
TOTAL PG						204.91			
Elaboró:									
Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	1.6.1.1	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm			CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025
(c) UND: M2									
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
SUBESTACIÓN ELECTRICA									
									
Elaboró: 									
Revisó: 									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano									

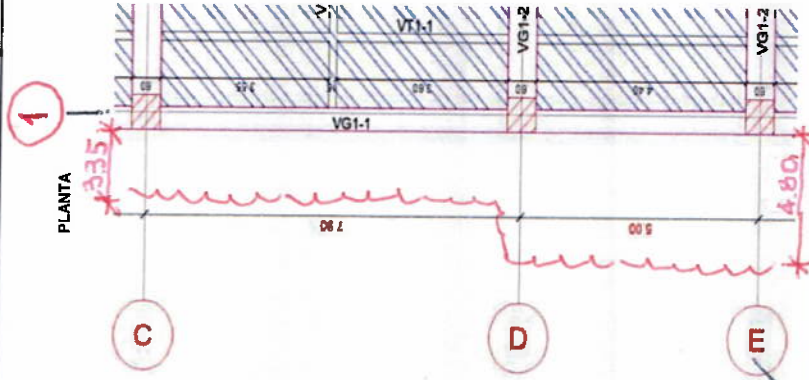
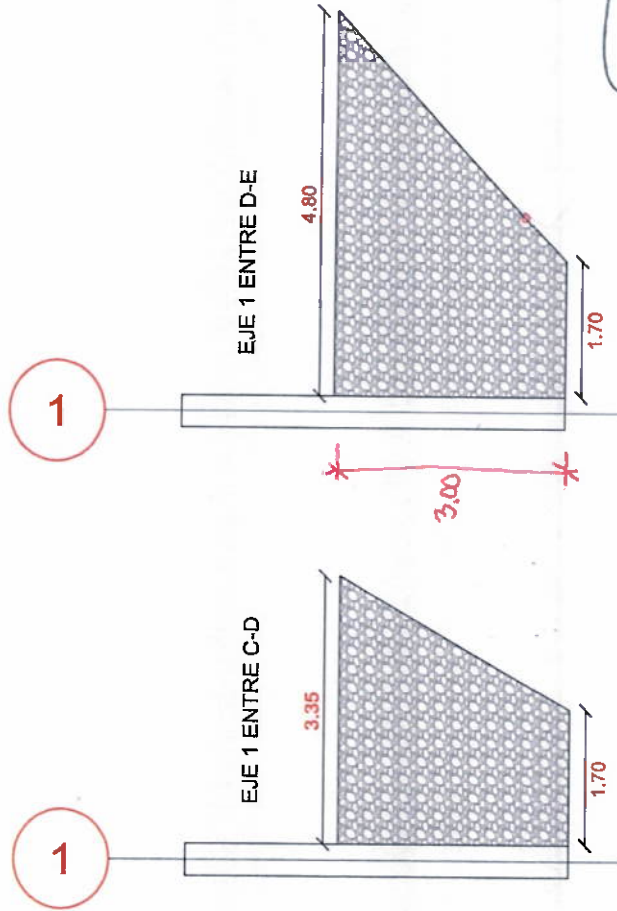
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	1.6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM			CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
			Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm				(c) UND:	M2	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOTE B - ATENCION PREHOSPITALARIA									
									
Elaboró:				Revisó					
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios						RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano			

 SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
INTERVENTORIA:					
(a) ITEM N°:	1.6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolele 19x12x39 cm		
		CORTE N°:	15	FECHA : OCTUBRE 2025	
		(c) UNID:	M2		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA SUBESTACION ELECTRICA					
					
Elaboró: 					
Revisó: 					
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					

 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 15/10/2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	4.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Sub-base granular h=25 cm
CORTE N°:		15	FECHA:
			OCTUBRE 2025
(c) UND:			M3

MEMORIA GRAFICA

CORTES



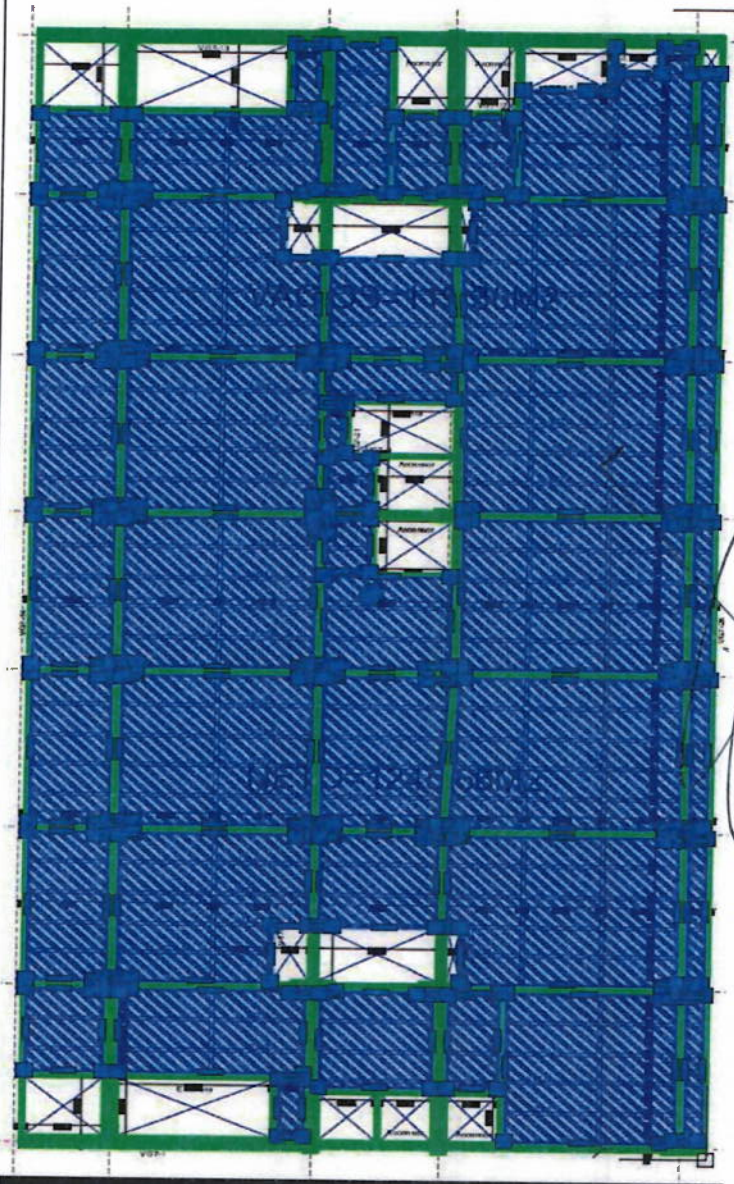
Elaboró:

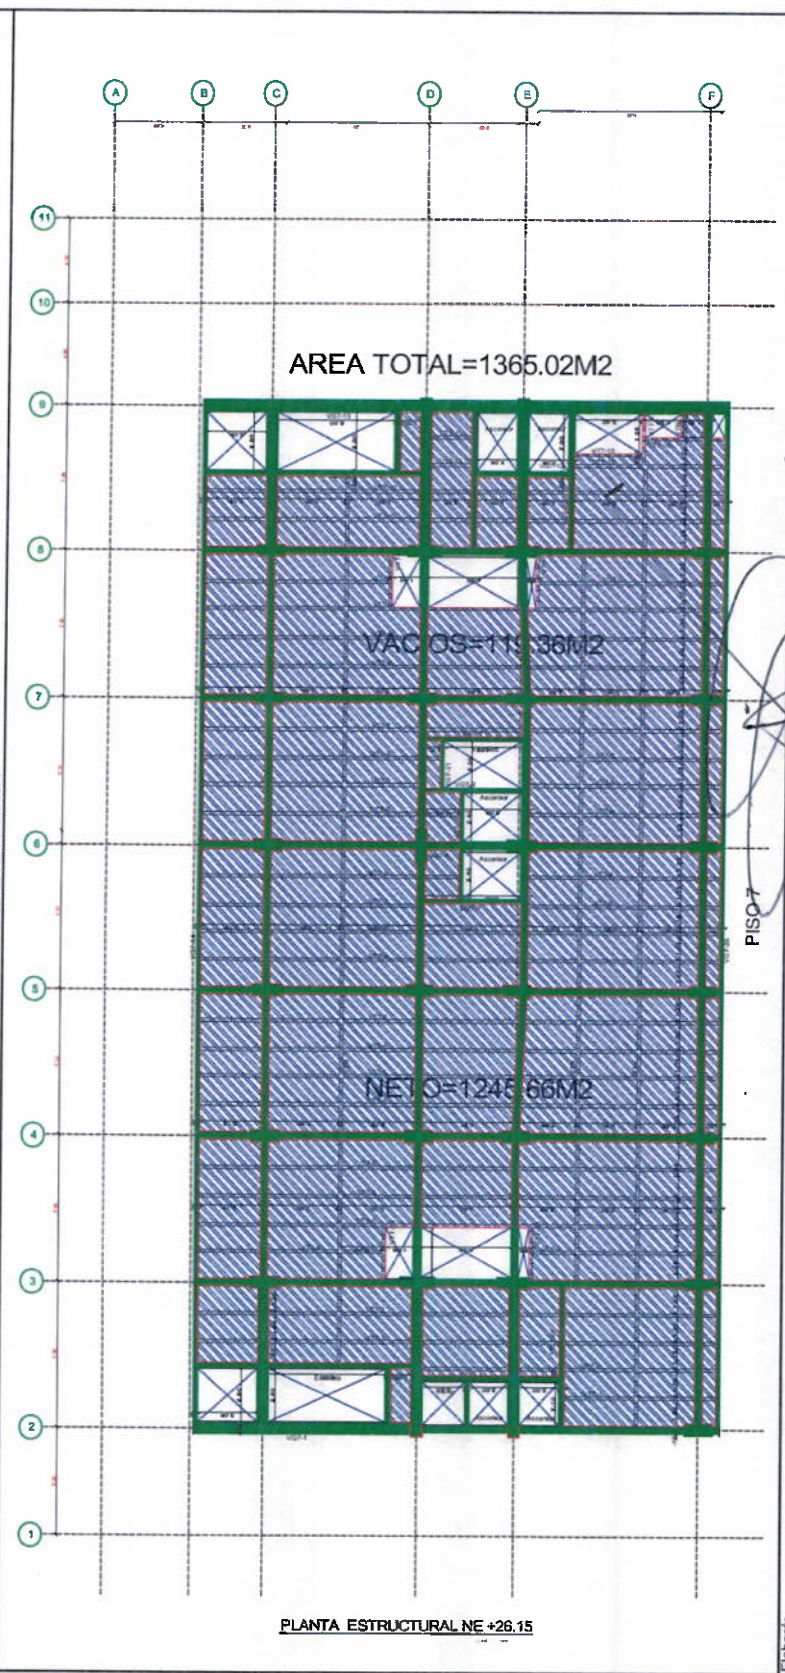
Revisó:

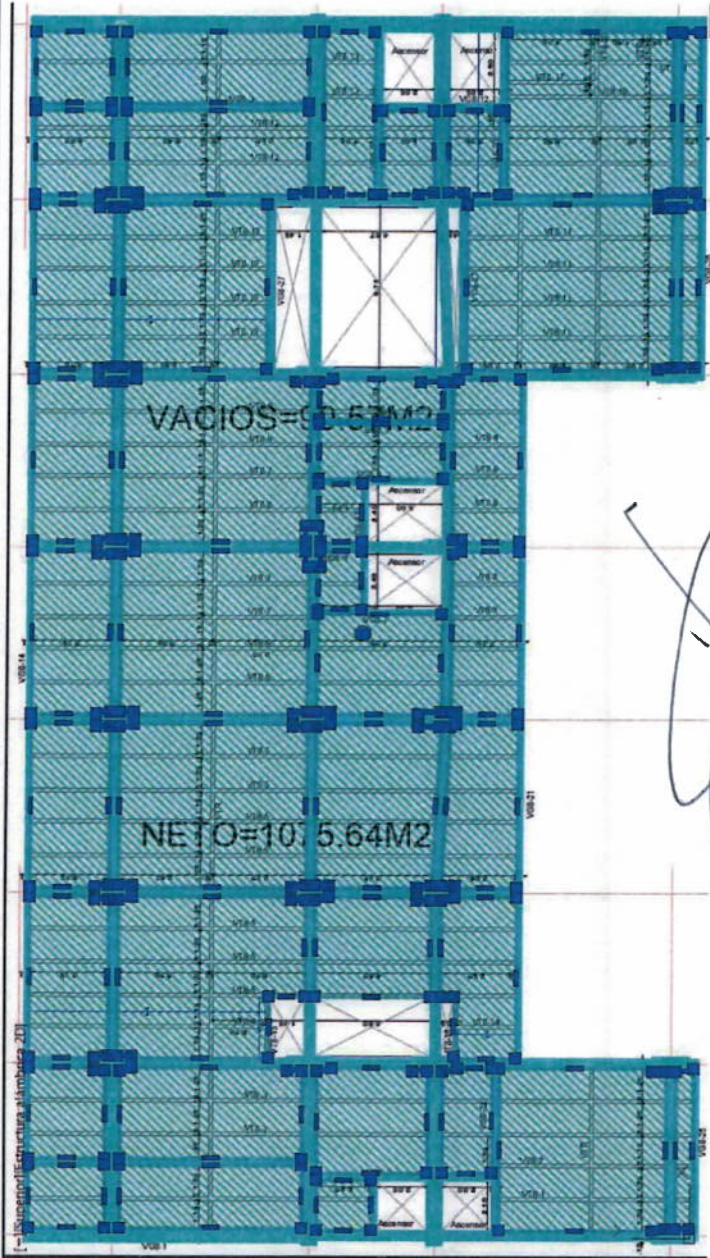
RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

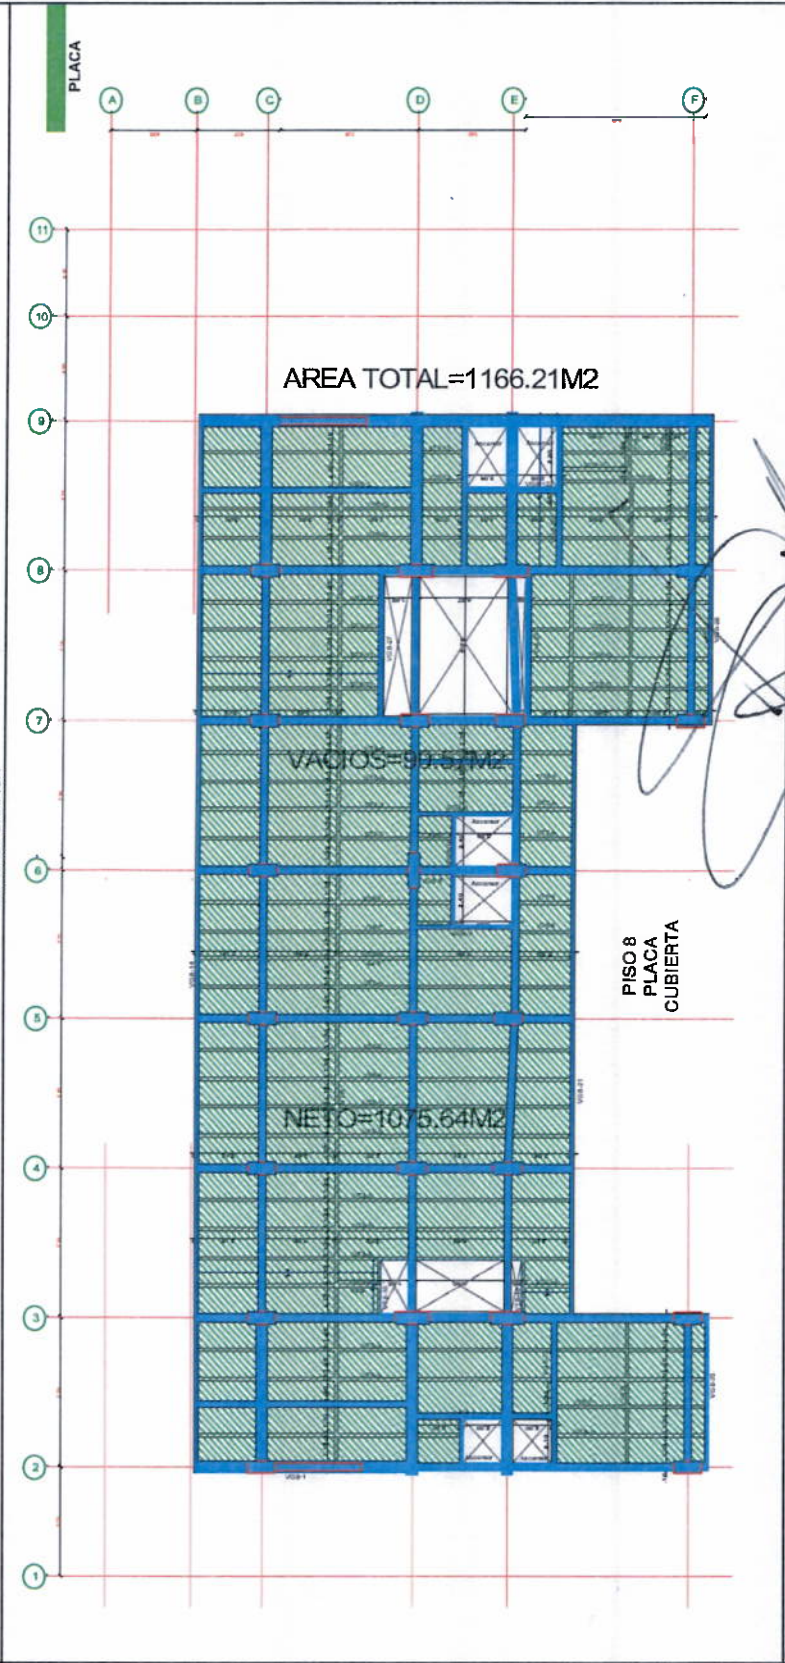
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

[illegible]

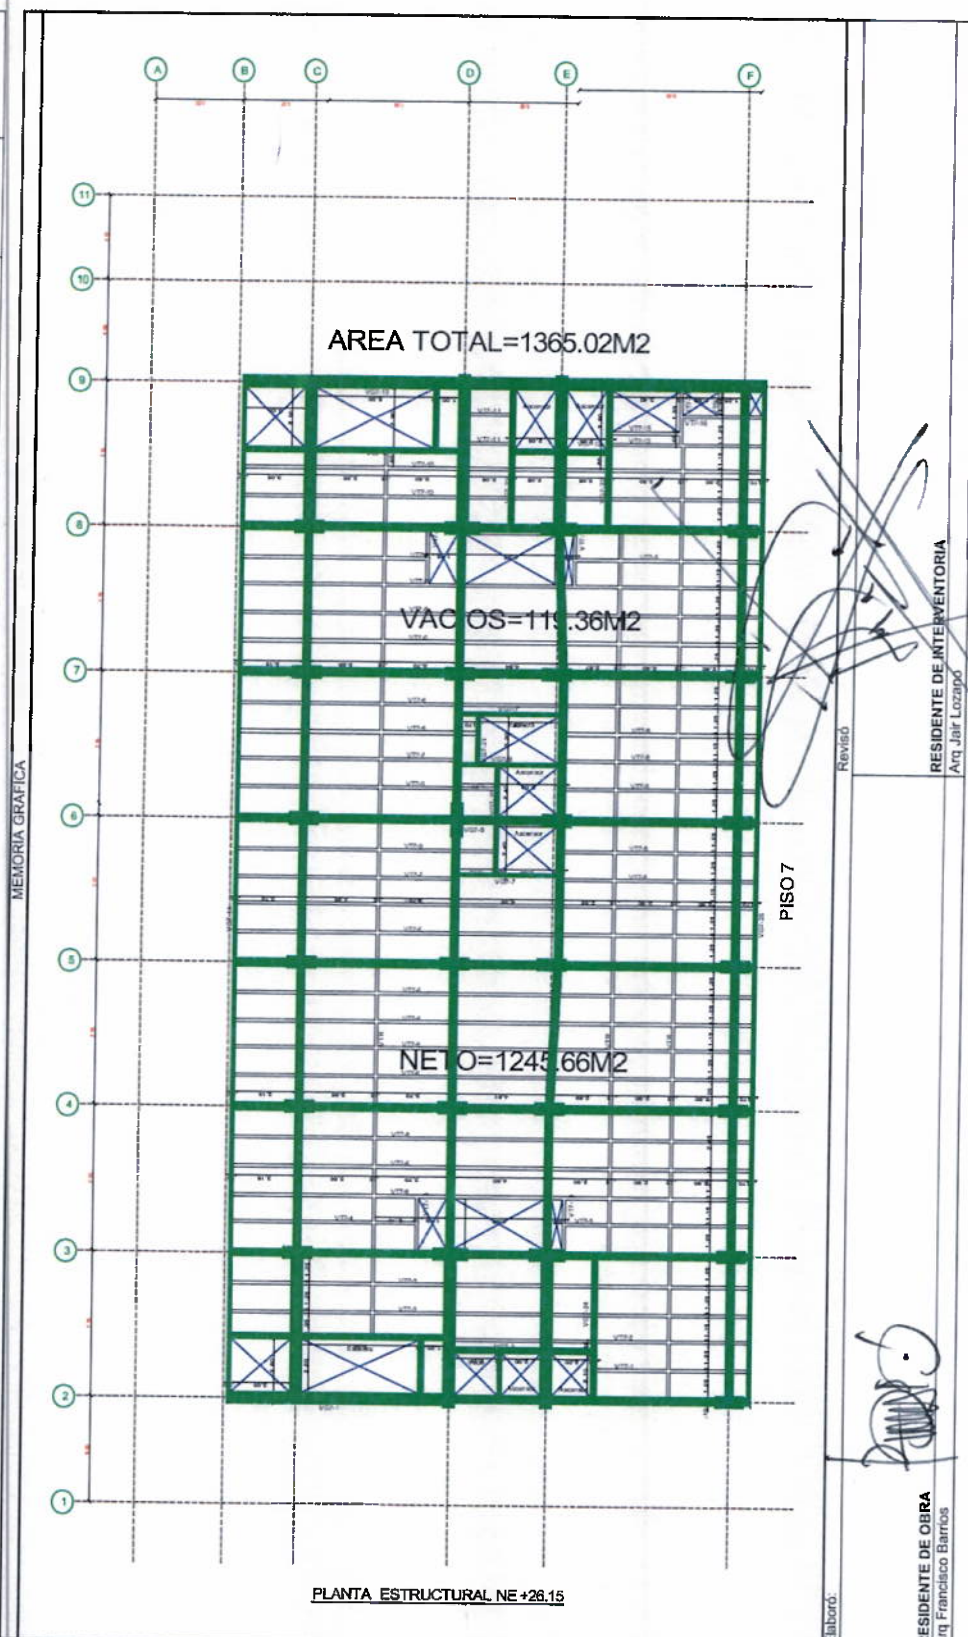
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		2023	
CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE	
CONTRATISTA:		INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
(a) ITEM N°:		8.1.1		(b) DESCRIPCION ITEM			
				Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI		M2	
				MEMORIA GRAFICA		(c) UND:	
							
							
				RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios			
							
				RESIDENTE DE OBRA Arq Jairo Lozano			

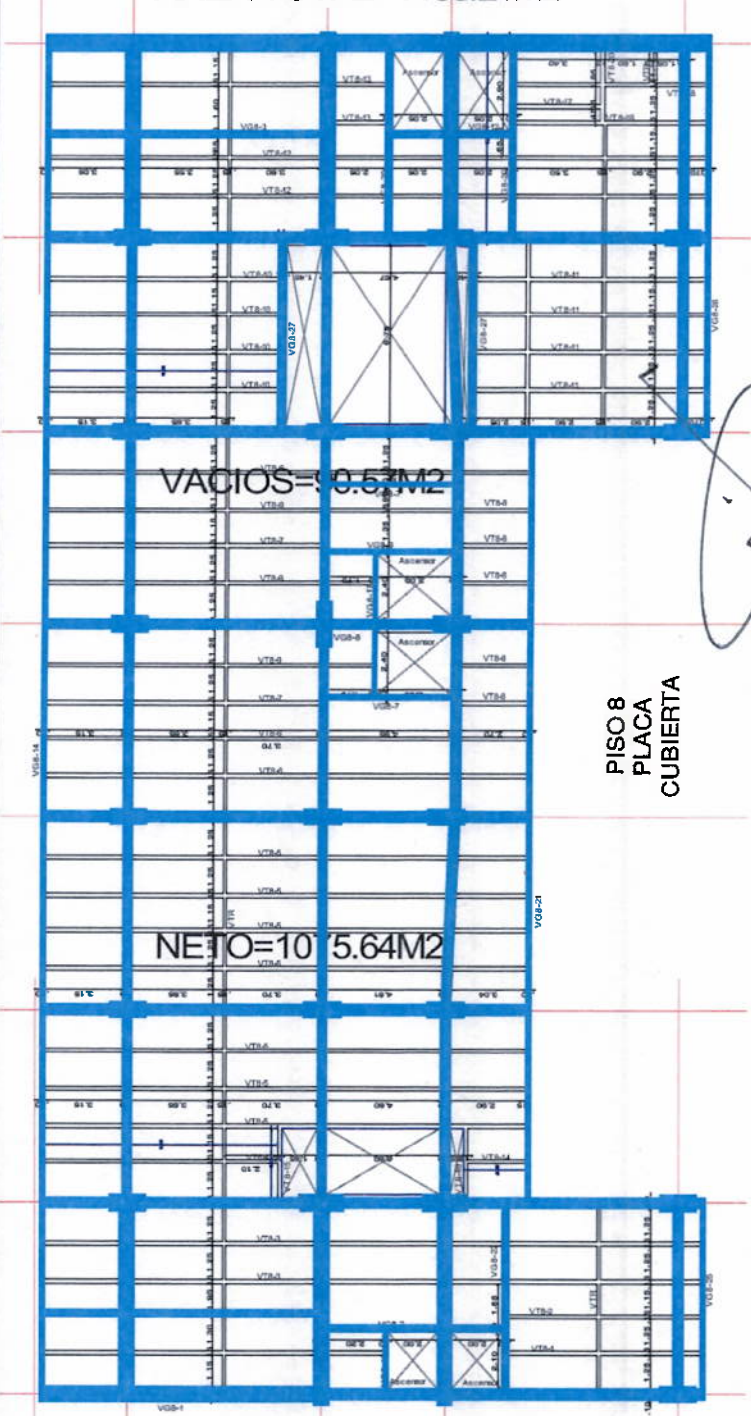
 SAN VICENTE GOBIERNO MUNICIPAL		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 4/2023				
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE									
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:	6.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:				15	FECHA:	OCTUBRE 2025	
		Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI							(c) UND:	M2
MEMORIA GRAFICA										
 AREA TOTAL=1365.02M2 VACIOS=115.36M2 NETO=1245.66M2 PISO 7 Elaboró:  RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios Revisó:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano										
PLANTA ESTRUCTURAL NE +26.15										

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		Página 1 de 1			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		FECHA :		2023	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		15		OCTUBRE 2025		5	
(a) ITEM N°:		(b) DESCRIPCION ITEM		Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI		(c) UND:		M2	
6.1.1									
MEMORIA GRAFICA									
PROPIEDADES Sombreado Patrón Predefinido Nombre de patrón ANSI31 Angulo 0 Escala 2.0000 Origen X 0.0000 Origen Y 0.0000 Intervalo 2.0000 Grosor de plumilla ISO 2.00 mm Doble No Asociativo No Estilo de detección d... Exterior Color de fondo Ninguno Geometría Elevación 0.0000 Área 864.0615 Área acumulada 864.0615 									
Elaboró:									
									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios									
Revisó:									
									
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA Arq Jair Rodino									

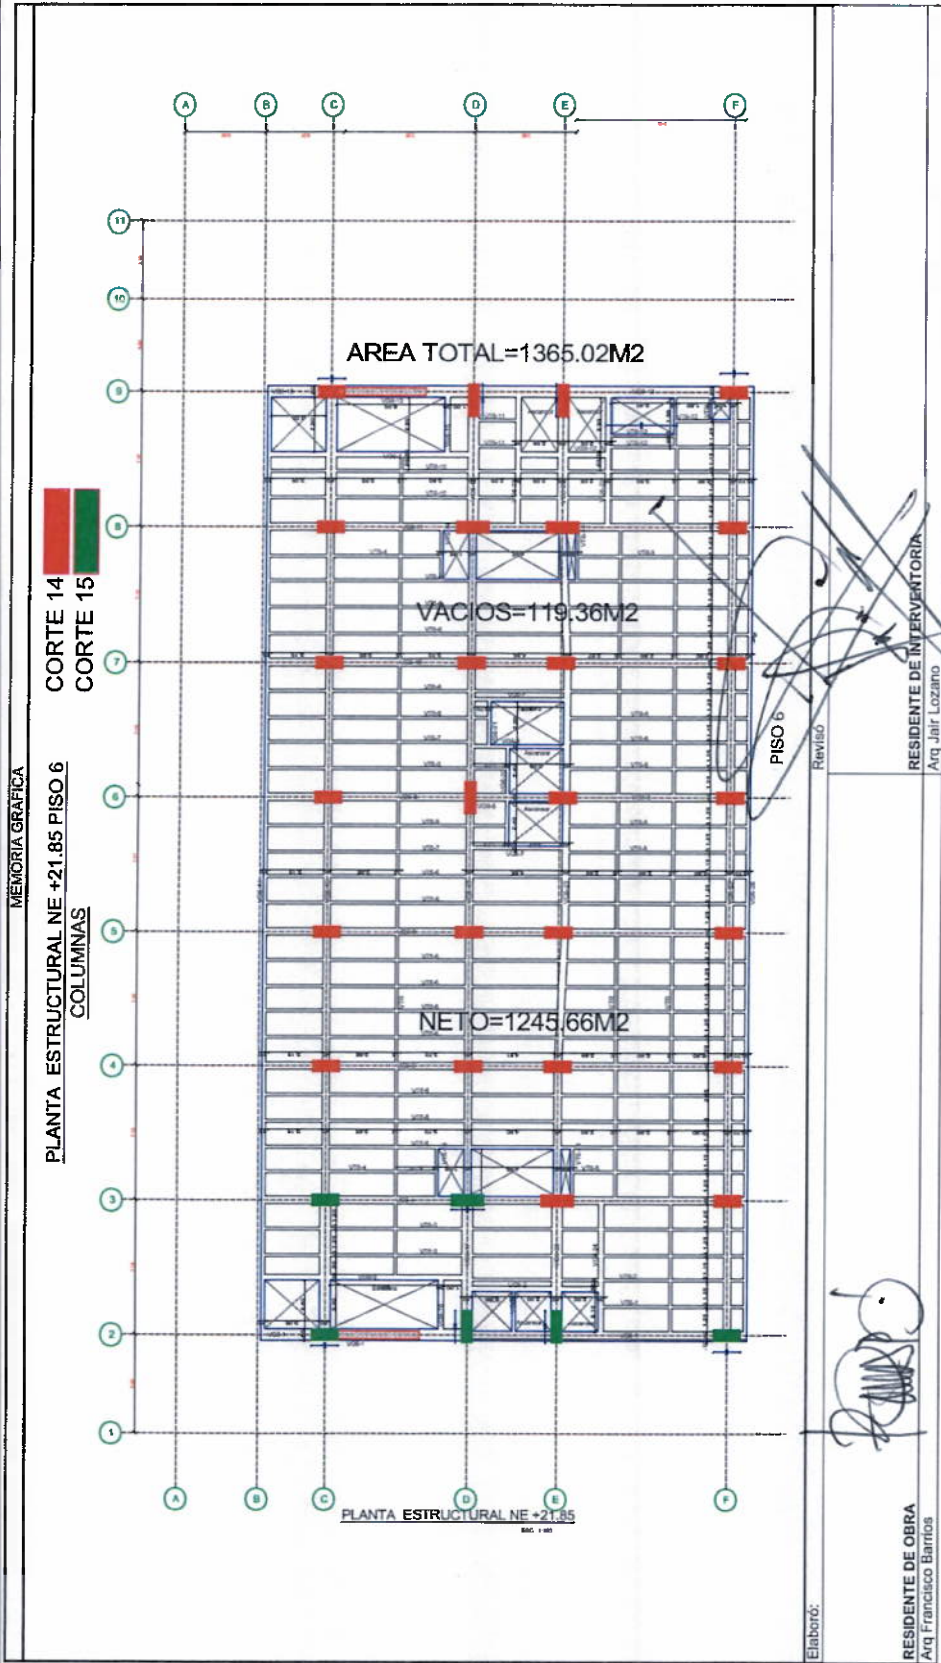
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 1 de 1 4 2023		
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°: 15		
INTERVENTORIA:						FECHA: OCTUBRE 2025		
(a) ITEM N°:	8.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI			(c) UND:	M2	
MEMORIA GRAFICA								
								
Elaboró: 								
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios								
Revisó: 								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano								


 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 de 2023	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	6.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI
		CORTE N°:	15
		FECHA:	OCTUBRE 2025
		(c) UND:	M3

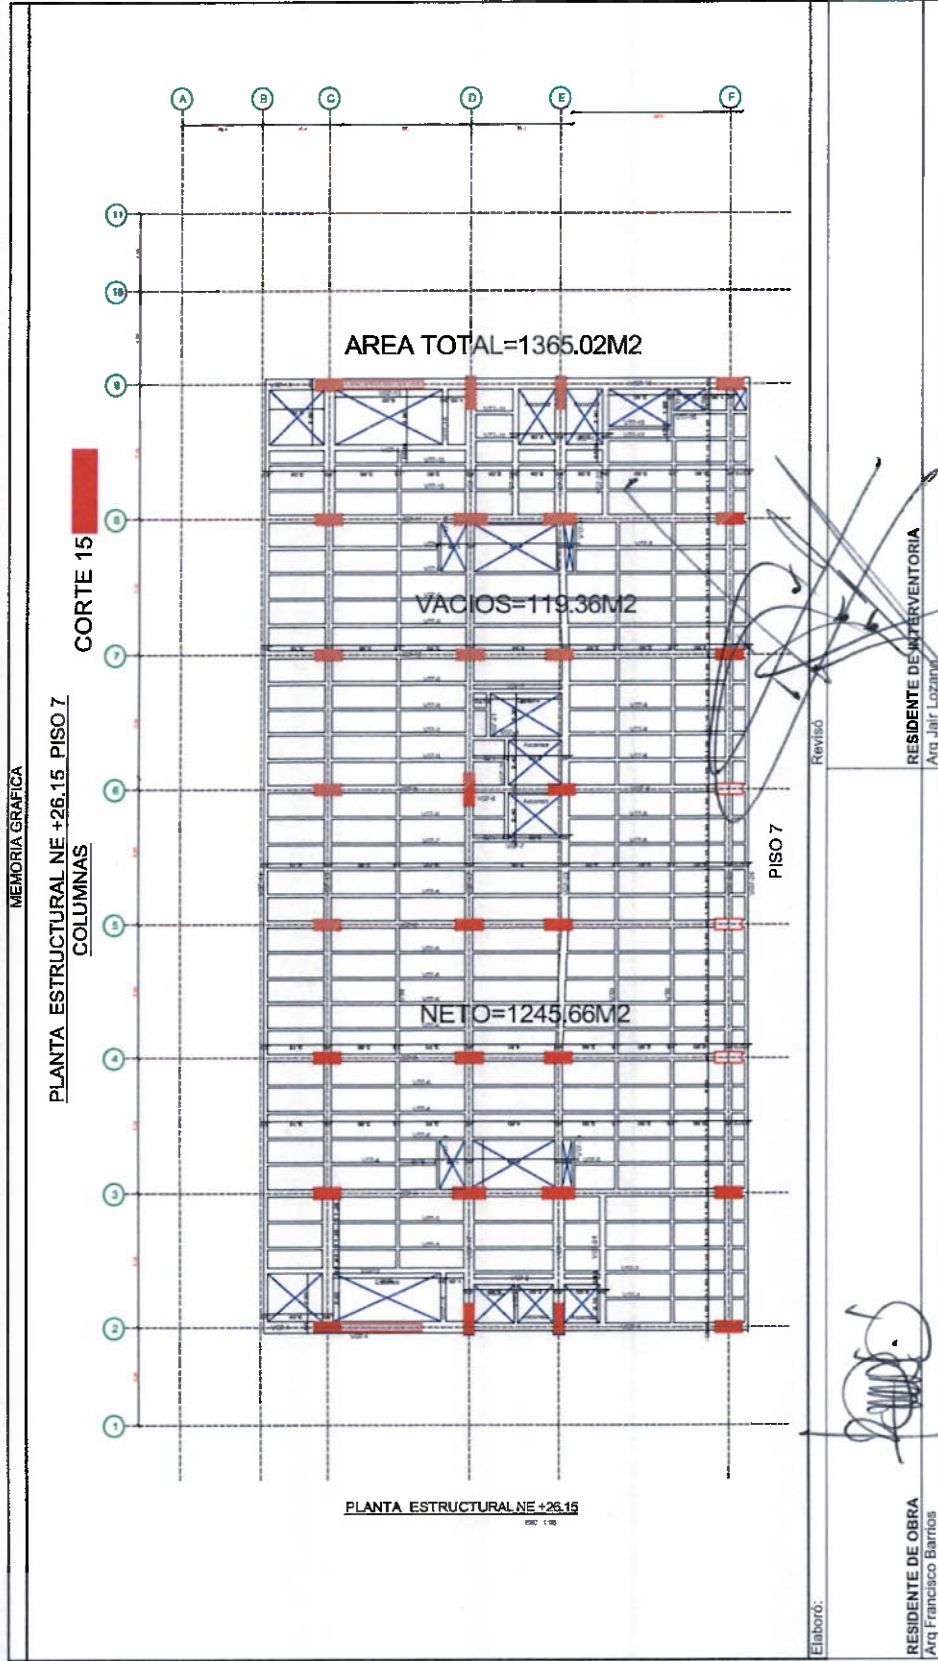


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30			
San Vicente				Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha		2023	
CONTRATO N°:		OBJETO:		CORTE N°:		FECHA:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		15		OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:		(b) DESCRIPCION ITEM		Vigas aéreas en concreto Concreto 4000 PSI		(c) UND:	
6.2.1						M3	
MEMORIA GRAFICA							
							
Elaboró:							
							
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros							
Revisó:							
							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano							

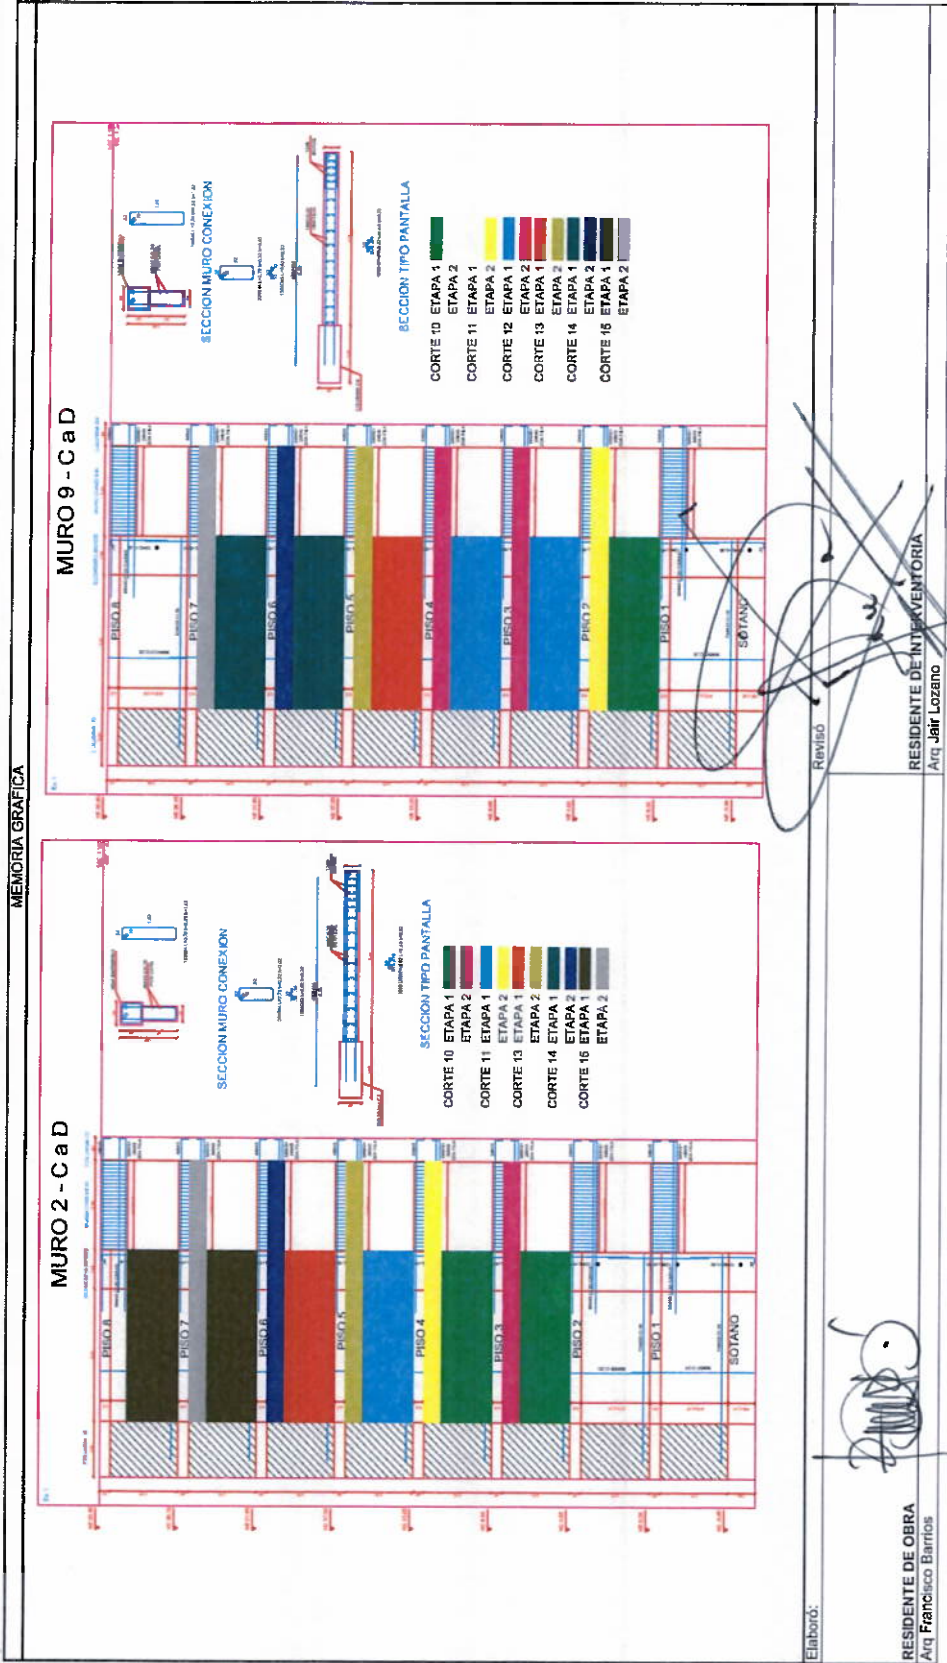
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 1 de 1 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	6.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	15	FECHA :
			OCTUBRE 2025		
			Columnas en concreto Concreto 4000 PSI		
			(c) UND:	M3	



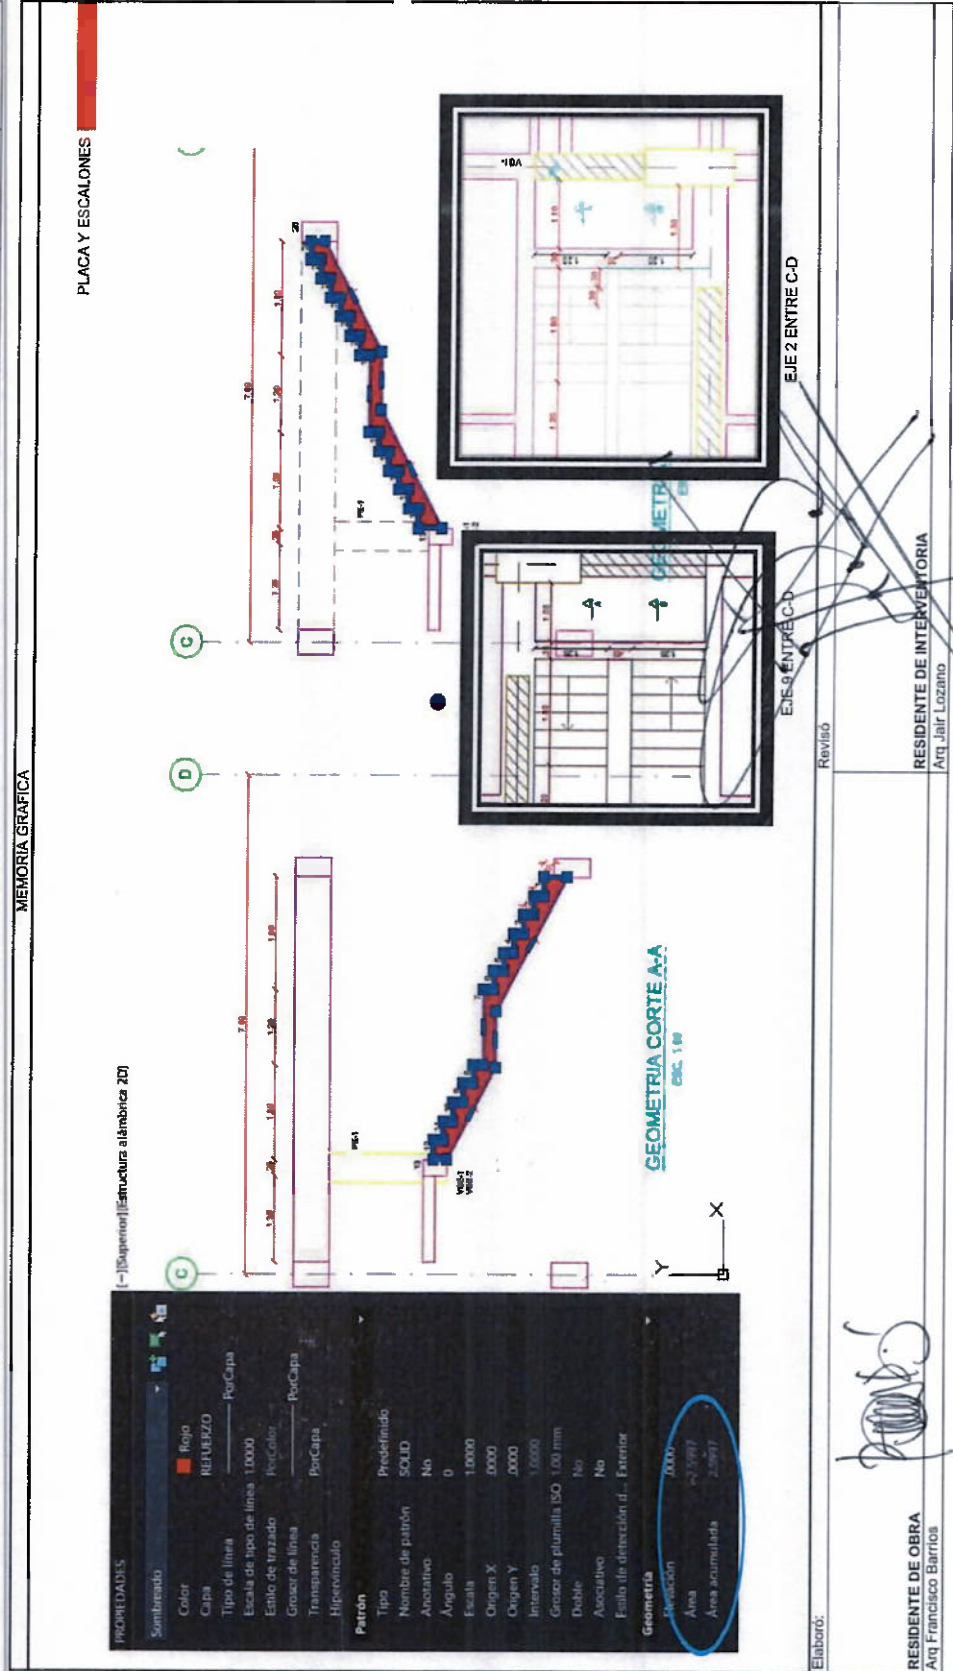
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PAFO-30			
CONTRATO N°:		OBJETO:		Versión No. 00		Página 1 de 1	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		Fecha:		2023	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		CORTE N°: 15	
(a) ITEM N°:		6.3.1		(b) DESCRIPCION ITEM		Columnas en concreto Concreto 4000 PSI	
						FECHA : OCTUBRE 2025	
						(c) UND: M3	



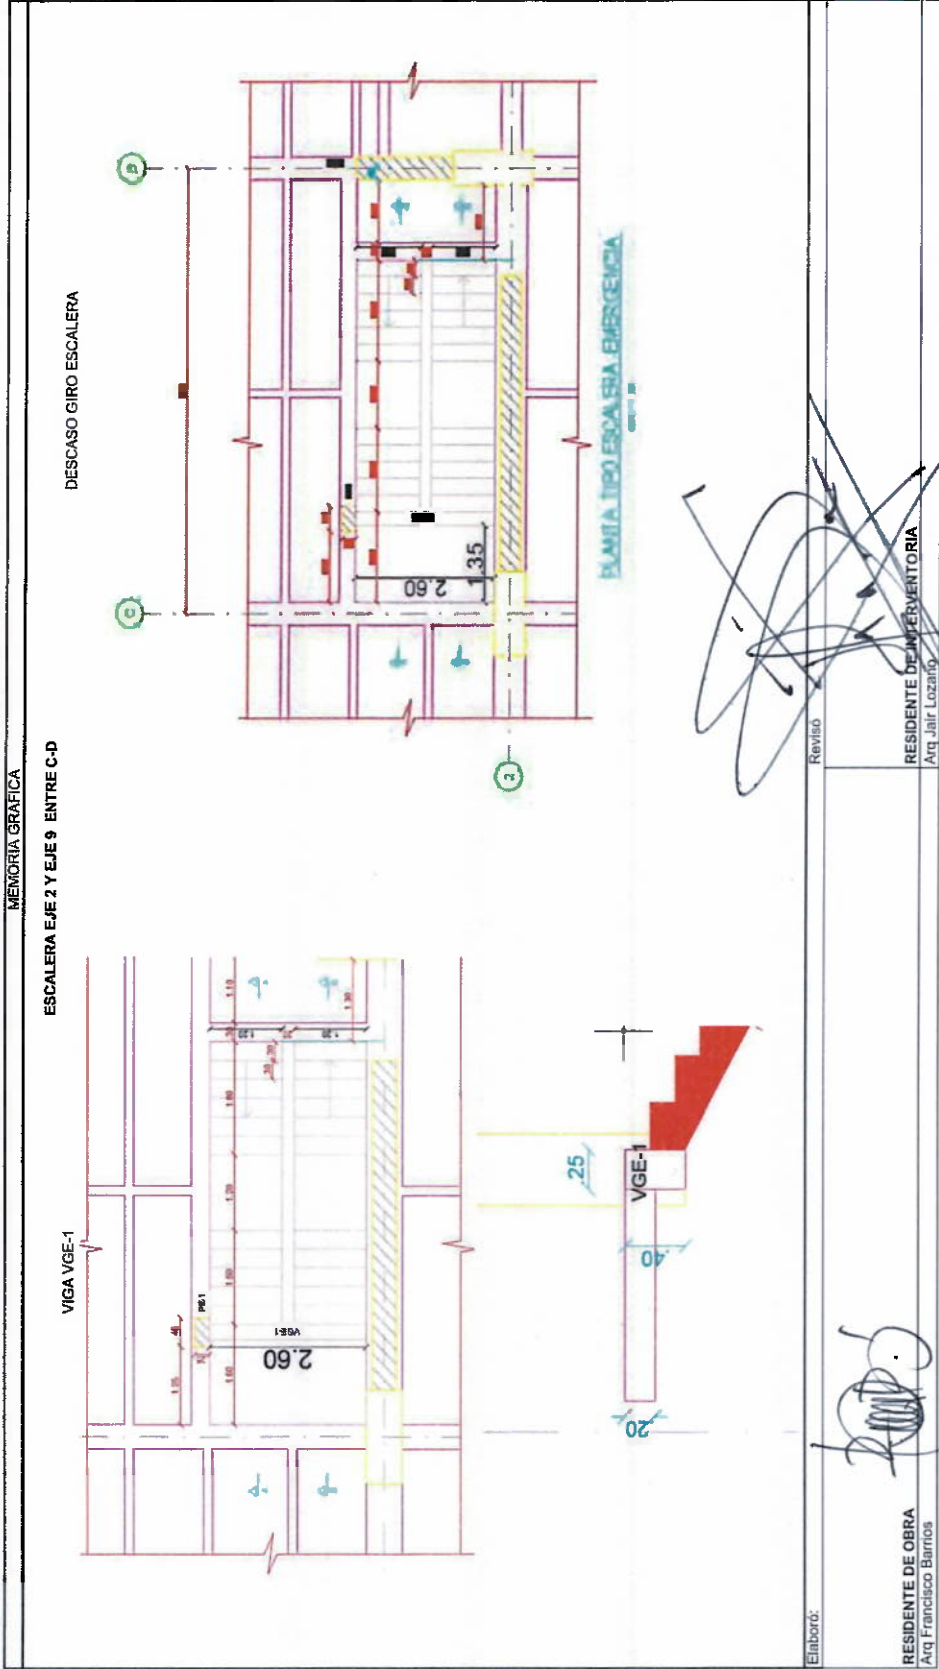
CONTRATO N°: 000 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30			
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				Versión No. 00		Página 1 de 1	
(a) ITEM N°: 6.3.2		(b) DESCRIPCION ITEM:		CONORTE N°: 15		FECHA: 5		2023	
		Muros cortina Concreto 4000 PSI		CORTE N°: 15		FECHA: 5		2023	
				(c) UND: M3					



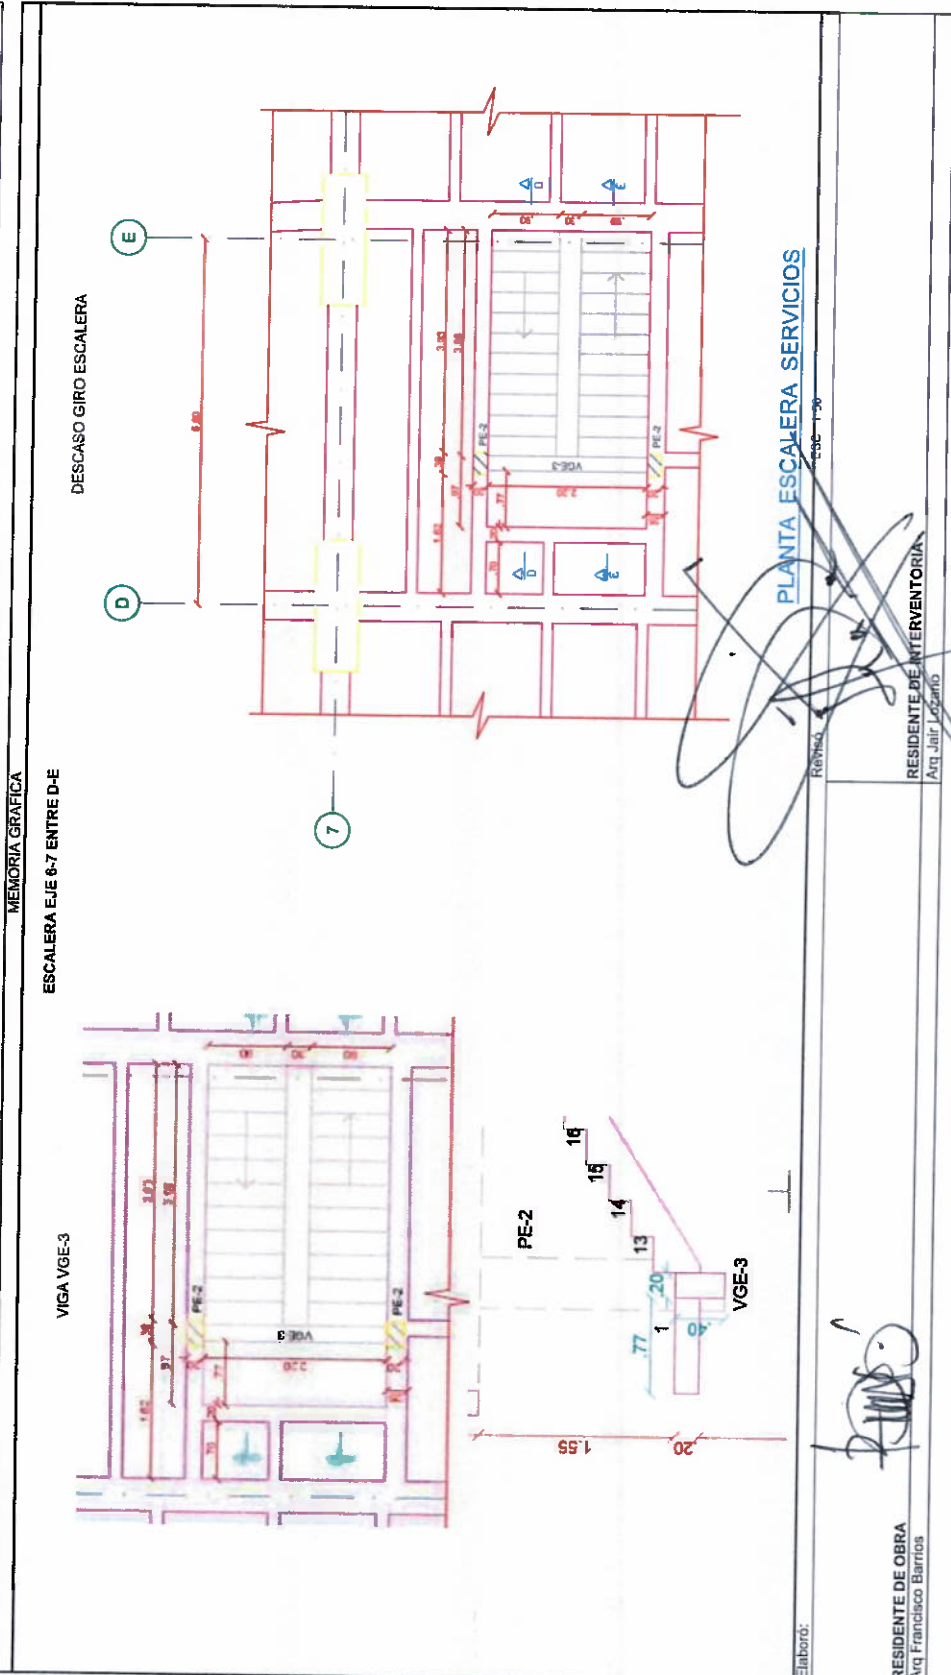
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30	
Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha:		2023	
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 15	
FECHA: OCTUBRE 2025		(c) UND: M3	
(a) ITEM N°: 6.4.1		(b) DESCRIPCION ITEM: Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI	



		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha:				Página 1 de 1 4 5 2023					
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:		15		FECHA :		OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:		6.4.1		(b) DESCRIPCION ITEM		Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI		(c) UND:		M3					



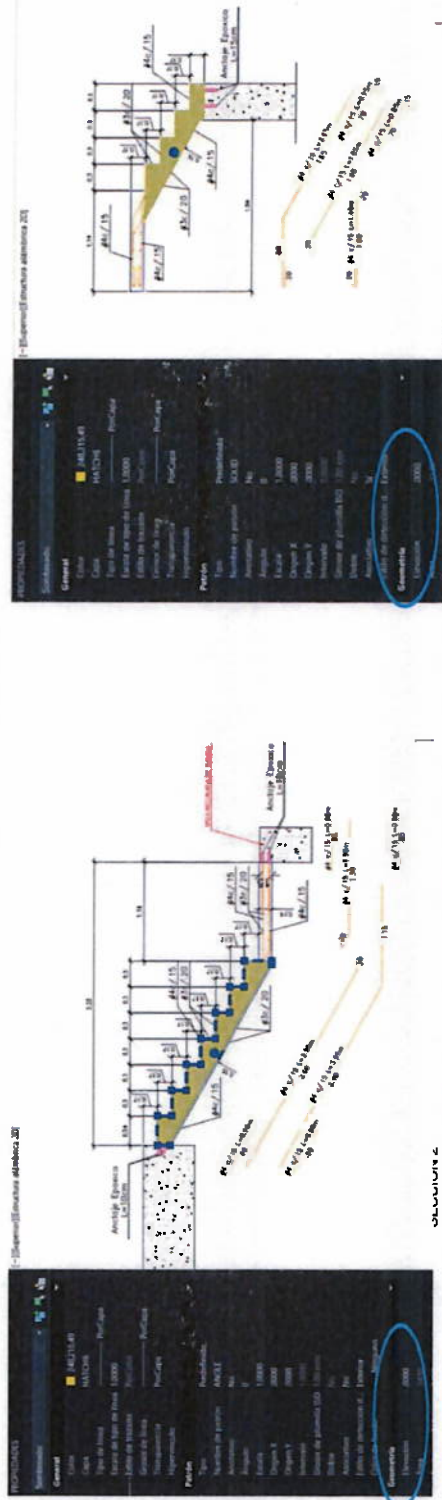
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM			
		Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI		CORTE N°:	15
				FECHA:	OCTUBRE 2025
				(c) UND:	M3



 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI
		CORTE N°:	15
		FECHA :	OCTUBRE 2025
		(c) UND:	M3

MEMORIA GRAFICA

ESCALERA EJE 8-9 ENTRE A-B



PLANTA ANCHO ESCALON 1.40 M


SECCION 1

Elaboró:



RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

Revisó:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lopez

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023		
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°: 7.1.3		(b) DESCRIPCION ITEM		CORTE N°: 15	FECHA :	OCTUBRE 2025		
		Muro en bloque de concreto gris tolele 19x12x39 cm		(c) UND:		M2		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
								
(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL HR		(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
		LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel				
SOTANO - Imagenologia								
M103	2,06	3,70	2,88	4,75	1,00	4,75		
M81	2,12	3,70	0,55	7,30	1,00	7,30		
M100	2,74	4,20	3,08	8,43	1,00	8,43		
M97	3,65	4,20	0,18	15,15	1,00	15,15		
M132	3,81	4,20	0,16	15,85	1,00	15,85		
M133	3,47	3,70	2,80	10,04	1,00	10,04		
M135	3,31	4,20	0,16	13,75	1,00	13,75		
M162	8,20	4,20	0,60	33,84	1,00	33,84		
M83	2,03	4,20	2,85	5,68	1,00	5,68		
M84	2,08	4,20	2,35	6,39	1,00	6,39		
M85	4,12	4,20	2,93	14,38	1,00	14,38		
M34	7,19	4,20	3,16	27,04	1,00	27,04		
M45	6,44	3,70		23,83	1,00	23,83		
M50	1,60	3,70		5,92	1,00	5,92		
M59	2,72	3,70		10,06	1,00	10,06		
M42	2,23	3,70		8,25	1,00	8,25		
M38	2,23	3,70		8,25	1,00	8,25		
					218,88			
Elaboró:				Revisó				
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano						

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PAFO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
INTERVENTORIA:							
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:				
		Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm	M2				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
		(e) LOCALIZACION					
		DIMENSIONES					
		LARGO	ALTO	Descuento vigeetas placa - vanos puerta dintel	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO - Imagenologia					
M37	2,30	4,20	0,08	9,58	1,00	9,58	
M43	2,40	4,20	0,08	10,00	1,00	10,00	
M44	2,40	4,20	0,08	10,00	1,00	10,00	
M26	3,07	4,20	2,50	10,39	1,00	10,39	
M28	1,59	1,90	0,08	2,94	1,00	2,94	
M30	4,22	4,20	3,26	14,47	1,00	14,47	
M160	4,04	4,20	0,08	16,89	1,00	16,89	
M163	8,04	4,20	6,19	27,58	1,00	27,58	
M178	4,29	3,70	5,13	10,75	1,00	10,75	
M177	7,73	4,20	0,29	32,18	1,00	32,18	
M220	1,88	3,70		6,96	1,00	6,96	
M223-M219	14,17	4,20	18,70	40,81	1,00	40,81	
M224	4,30	3,70		15,91	1,00	15,91	
	2,90	3,70		10,73	1,00	10,73	
		SOTANO E-02					
M175	5,98	3,70		22,13	1,00	22,13	
M181	6,16	3,70	0,75	22,05	1,00	22,05	
M174	2,28	3,70		8,44	1,00	8,44	
		SUB TOTAL		271,80		271,80	
		VIENEN		218,88		218,88	
		PASAN		490,68		490,68	
Elaboró: 							
RESIDENTE DE OBRA Arqu Francisco Barros							
Revisó: 							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arqu Jair Lozano							

 SAN VICENTE CORFOMENTO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1		2023		
		Fecha:		5		4		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025		
Muro en bloque de concreto grs toleta 19x12x39 cm					(c) UND:	M2		

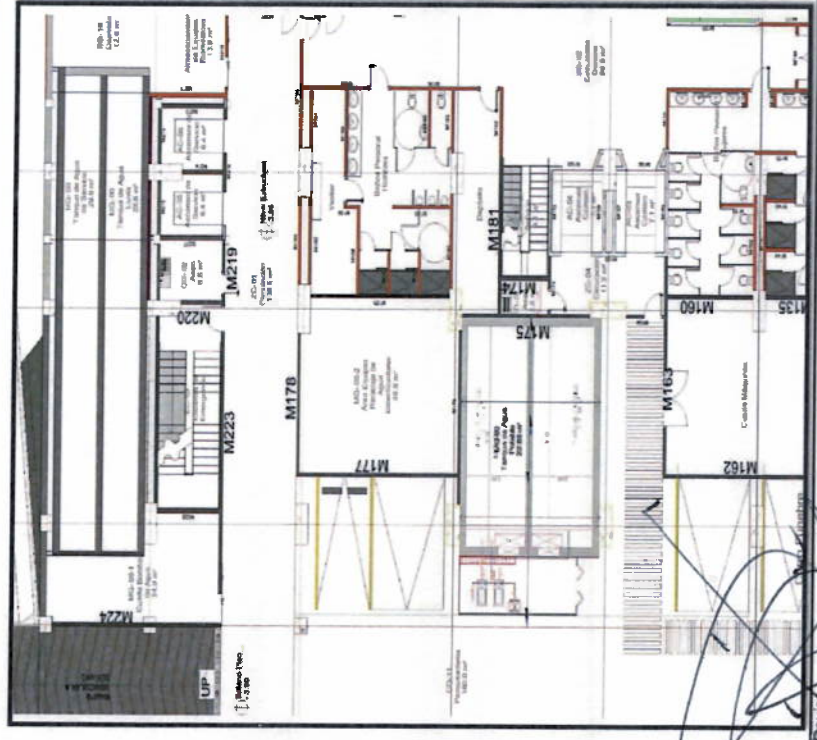
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO




Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios



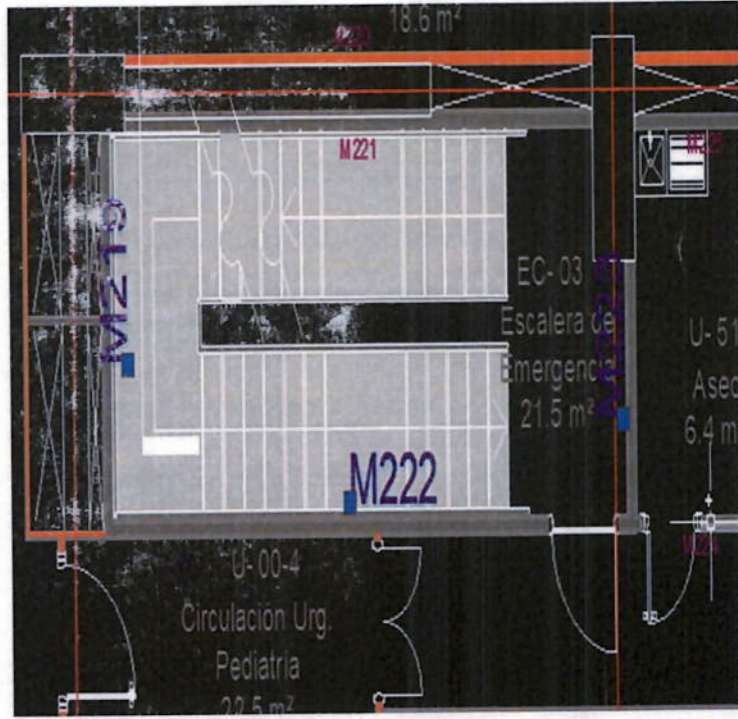
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm						
(c) UND:			M2						
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
 			(e) LOCALIZACION				DIMENSIONES		
			LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel		(f) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			SOTANO - AREA EQUIPOS RECICLAJE						
			M179	6,53	4,20	0,32	27,11	1,00	27,11
			SOTANO - MORGUE						
			M29	3,45	4,20	1,01	13,48	1,00	13,48
			M88	1,68	4,20	0,10	6,96	1,00	6,96
			SUB-TOTAL				47,54		
			VIENEN				490,68		
			PASAN				538,22		
Elaboró: 									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros									
Rensó 									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

 SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-PO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	OBJETO:	090 DE 2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	15
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	FECHA:
(a) ITEM N°:	7.1.3	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm	OCTUBRE 2025
(c) UND:	M2		

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/10/2023	
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris telete 19x12x39 cm			M2
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						

PISO 1



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

[illegible]

 SANVICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-PO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:		5	4
				2023	

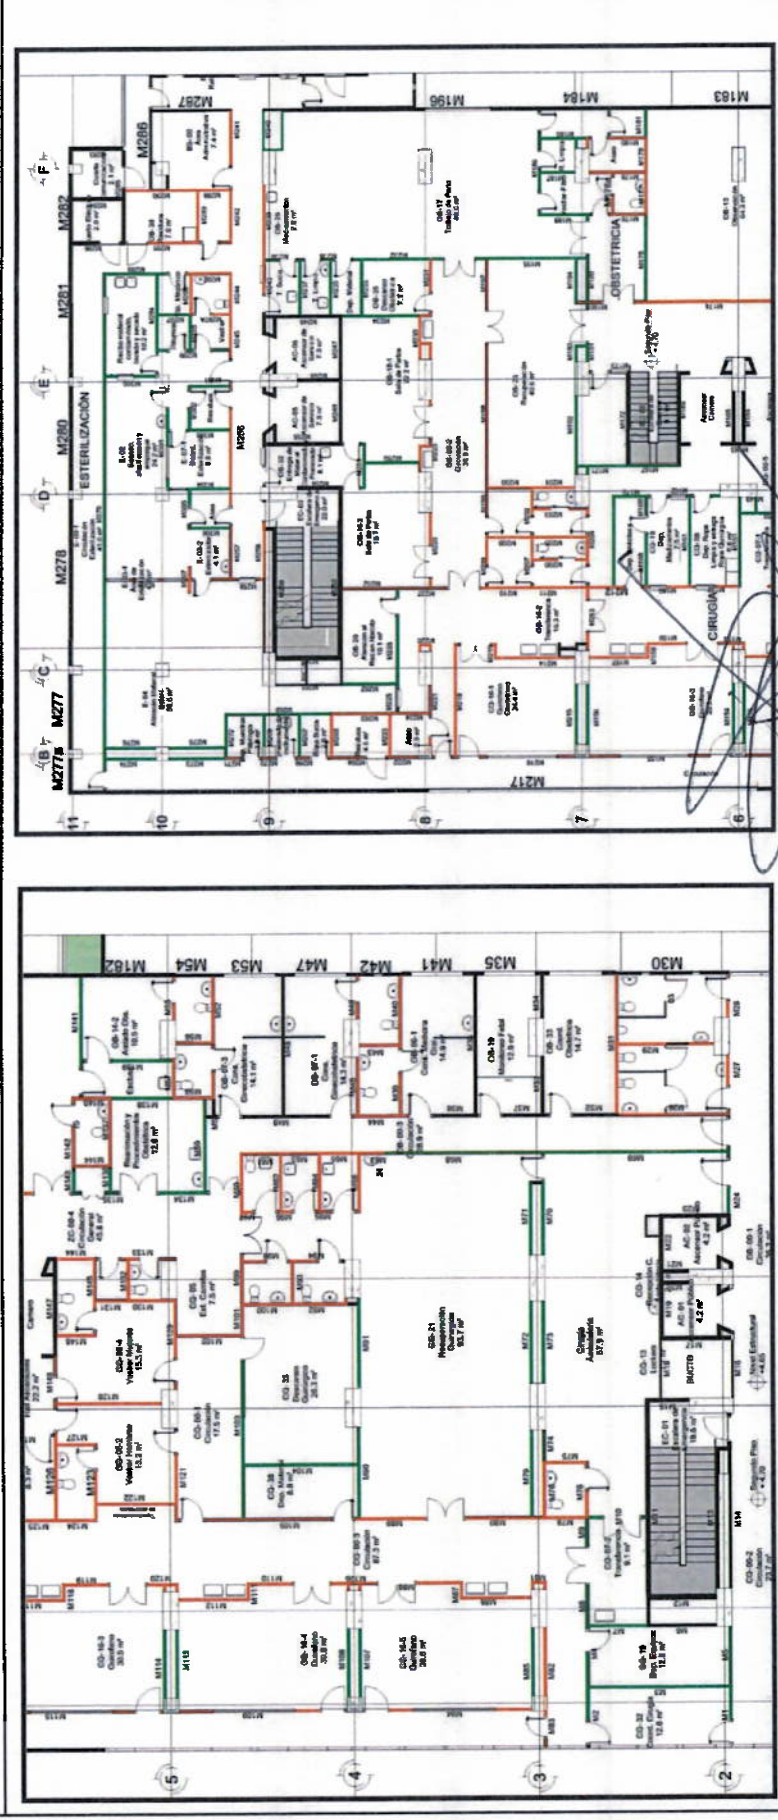
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
(a) ITEM N°:	7.1.3		(b) DESCRIPCION ITEM		Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm			(c) UND:	M2

[illegible]

Elaboró:	1032,30
 RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros	Revisó RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Lozano

 SAN VICENTE CONSTRUCCIONES		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 2023			 SAN VICENTE CONSTRUCCIONES	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm					(c) UND:	M2		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

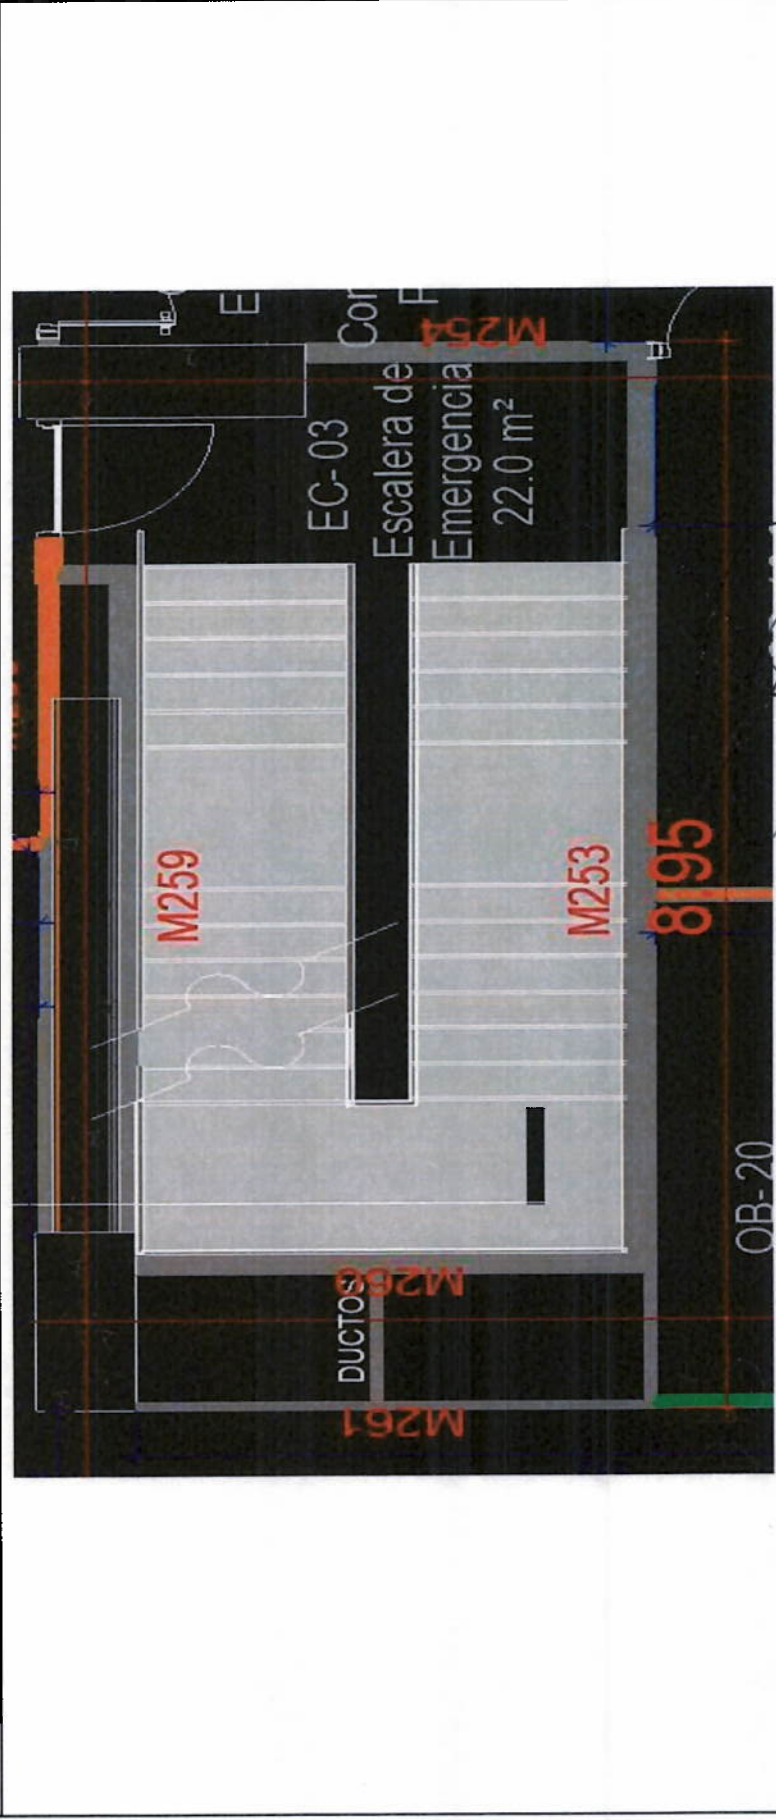



Elaboró:	 RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros
Revisó:	 RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30						
					Versión No. 00						
					Página 1 de 1						
								Fecha: 5 4 2023			

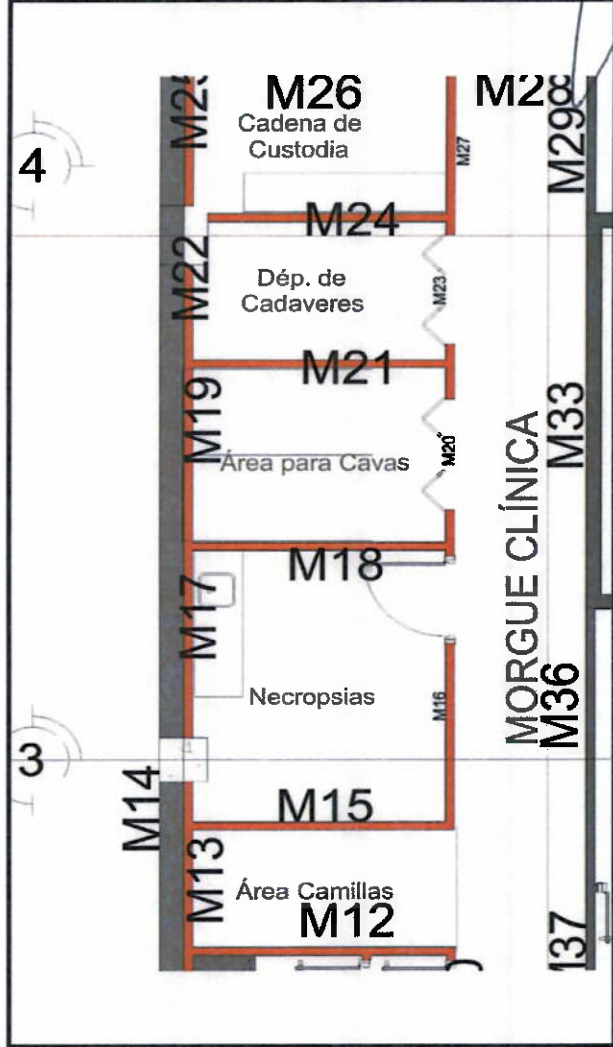
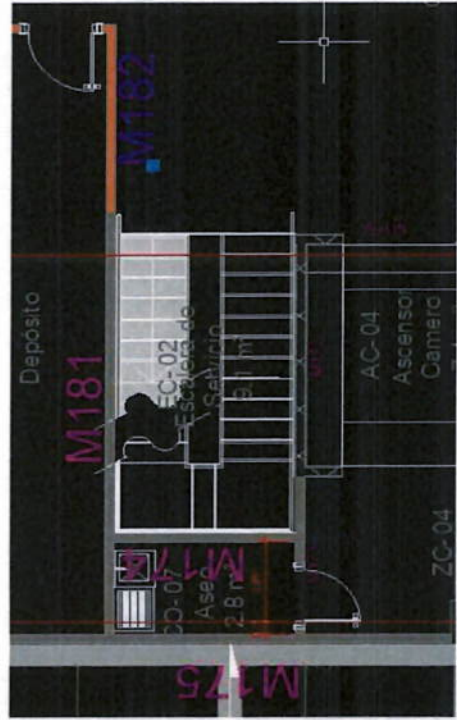
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm		
		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
		(c) UND:	M2		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:		Revisó:	
RESIDENTE DE OBRA	Arq Francisco Barrios	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arq Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
INTERVENTORIA:									
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 									
(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
			(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)				
SOTANO - MORGUE, IMAGENOLOGIA									
M1	viga intermedia	3,88					1,00	3,88	
	viga cierre	3,88					1,00	3,88	
M1a	viga intermedia	2,81					1,00	2,81	
	viga cierre	2,81					1,00	2,81	
M1b	viga intermedia	7,31					1,00	7,31	
	viga cierre	7,31					1,00	7,31	
M1c	viga intermedia	4,40					1,00	4,40	
	viga cierre	4,40					1,00	4,40	
M1d	viga intermedia	7,54					1,00	7,54	
	viga cierre	7,54					1,00	7,54	
M1e	viga intermedia	1,18					1,00	1,18	
	viga cierre	1,18					1,00	1,18	
M70	viga intermedia	1,59					1,00	1,59	
	viga cierre	1,59					1,00	1,59	
M71	viga cierre	2,05					1,00	2,05	
M72	viga intermedia	3,18					1,00	3,18	
	viga cierre	3,18					1,00	3,18	
M67	viga cierre	3,15					1,00	3,15	
M75	viga intermedia	3,23					1,00	3,23	
	viga cierre	3,23					1,00	3,23	
M76	viga cierre	3,80					1,00	3,80	
M77	viga cierre	2,67					1,00	2,67	
M66	viga cierre	3,63					1,00	3,63	
M79	viga intermedia	3,30					1,00	3,30	
	viga cierre	3,30					1,00	3,30	
								92,14	
Elaboró: 									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios									
Revisó: 									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025			
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga Intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
PLANIMETRIA SOTANO									
 									
Elaboró:									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios									
Revisó:									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano									



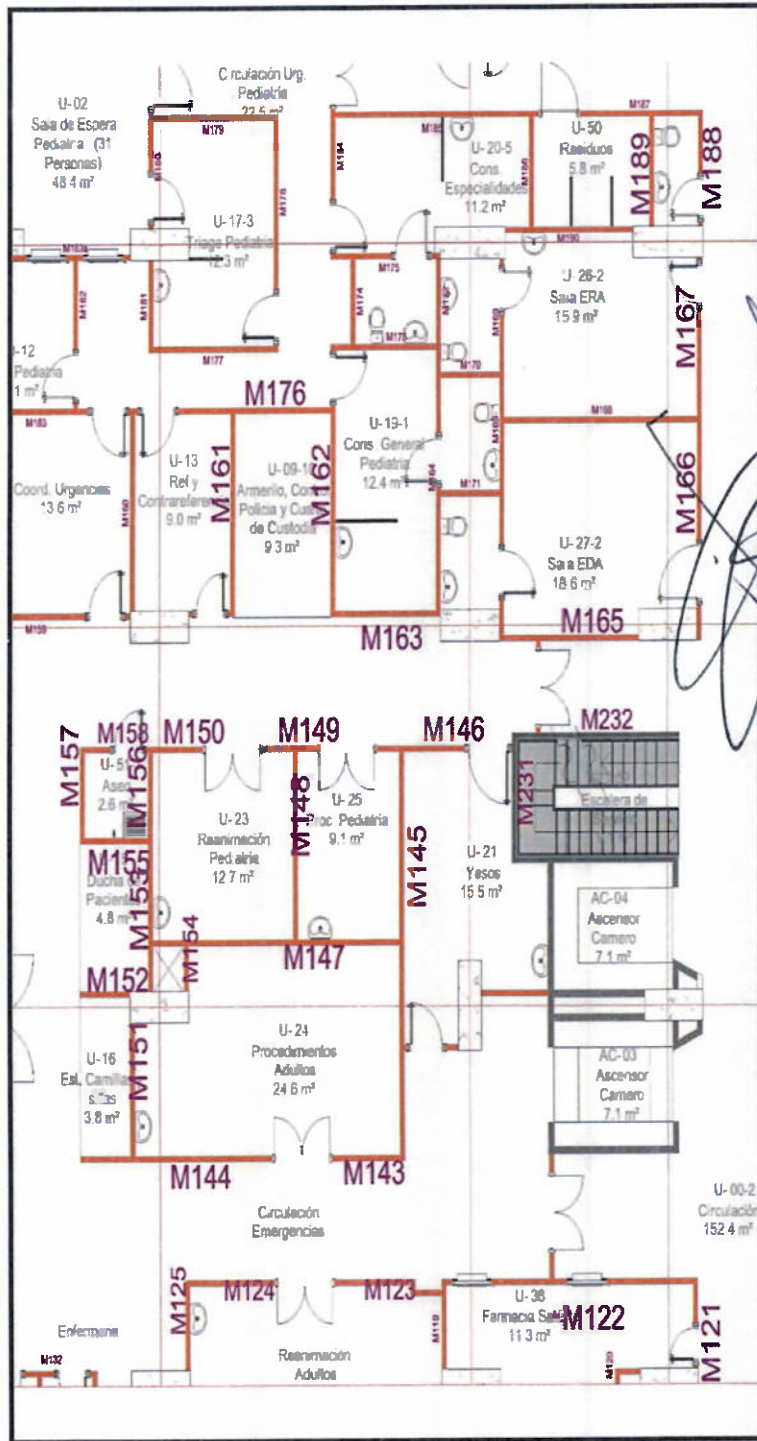
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga Intermedia 15x15 cm 3000 psi			
						(c) UND:
						ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
PLANIMETRIA PISO 1

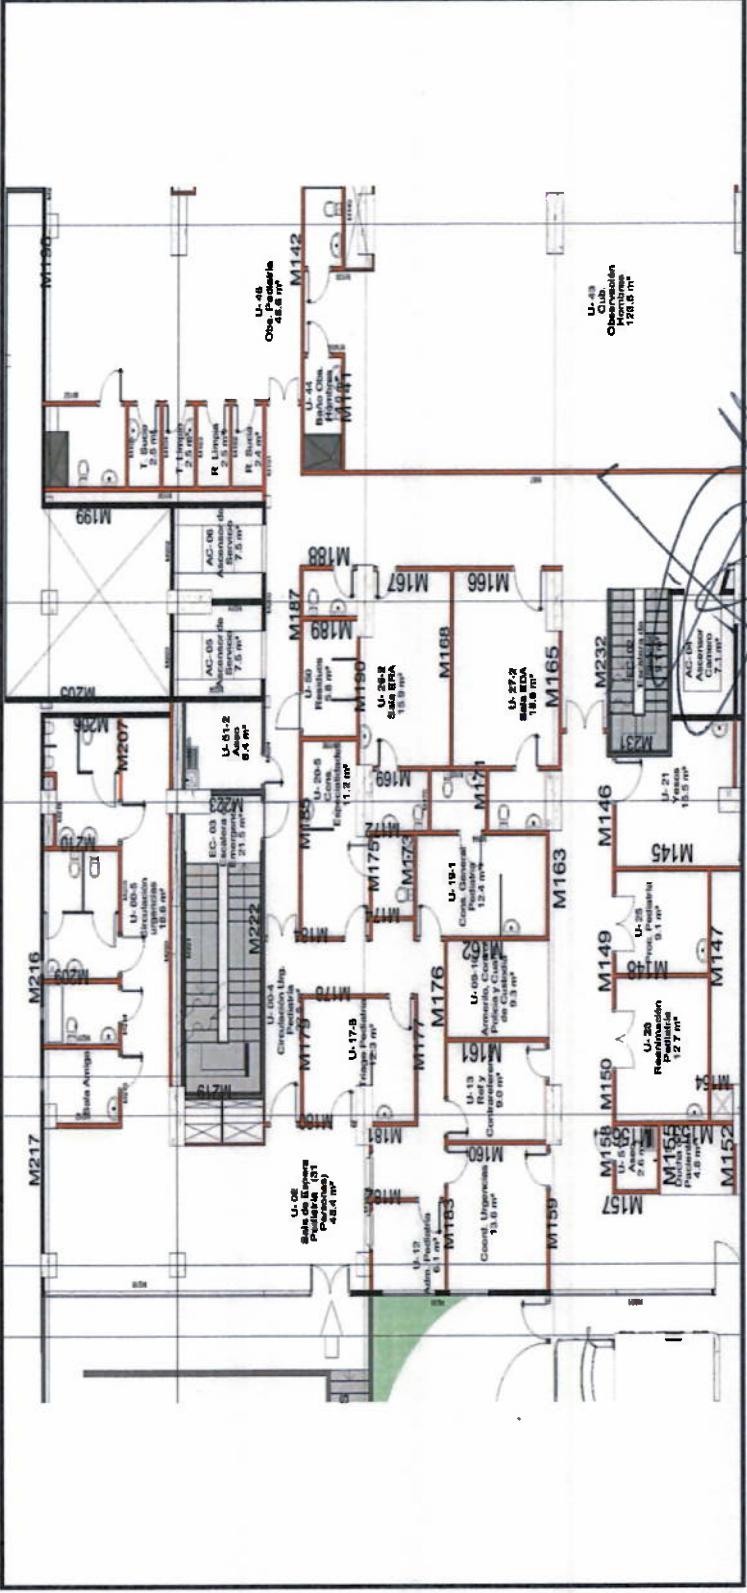



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg dair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 pel							(c) UND:	ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
											
(e) LOCALIZACION											
(f) Ancho			(g) Longitud			(h) MEDIDA PARCIAL HR			(j) N° DE ELEMENTOS		
PISO 1											
M187	viga intermedia	3,05							1,00		3,05
M185	viga intermedia	5,13							1,00		5,13
M184	viga intermedia	1,44							1,00		1,44
M178	viga intermedia	2,91							1,00		2,91
M179	viga intermedia	3,13							1,00		3,13
M180	viga intermedia	0,98							1,00		0,98
M190	viga intermedia	3,19							1,00		3,19
M168	viga intermedia	4,14							1,00		4,14
M169	viga intermedia	4,40							1,00		4,40
M171	viga intermedia	1,50							1,00		1,50
M170	viga intermedia	1,50							0,00		0,00
M172	viga intermedia	3,33							0,00		0,00
M173	viga intermedia	1,50							0,00		0,00
M174	viga intermedia	1,60							0,00		0,00
M175	viga intermedia	1,60							0,00		0,00
M177	viga intermedia	3,37							1,00		3,37
M181	viga intermedia	1,61							1,00		1,61
M160	viga intermedia	3,75							1,00		3,75
M159	viga intermedia	2,52							1,00		2,52
M183	viga intermedia	2,40							1,00		2,40
M182	viga intermedia	1,63							1,00		1,63
M206	viga intermedia	4,90							0,00		0,00
M207	viga intermedia	1,96							0,00		0,00
M210	viga intermedia	2,87							0,00		0,00
M209	viga intermedia	2,87							0,00		0,00
SUB-TOTAL										VIENEN	40,75
PASAN										REVISAR	423,31
											464,06
Elaboró:											
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jar Lozano											

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30			
				Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha:		2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
(a) ITEM N°:		7.8.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi	
				CORTE N°:		15	
				FECHA :		OCTUBRE 2025	
				(c) UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
PLANIMETRIA PISO 1							
							
Elaboró:							
							
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios							
Revisó:							
							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano							

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		15	FECHA :
						OCTUBRE 2025
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia -15x15 cm. 3000 psf			
					(c) UND:	ML

[illegible]

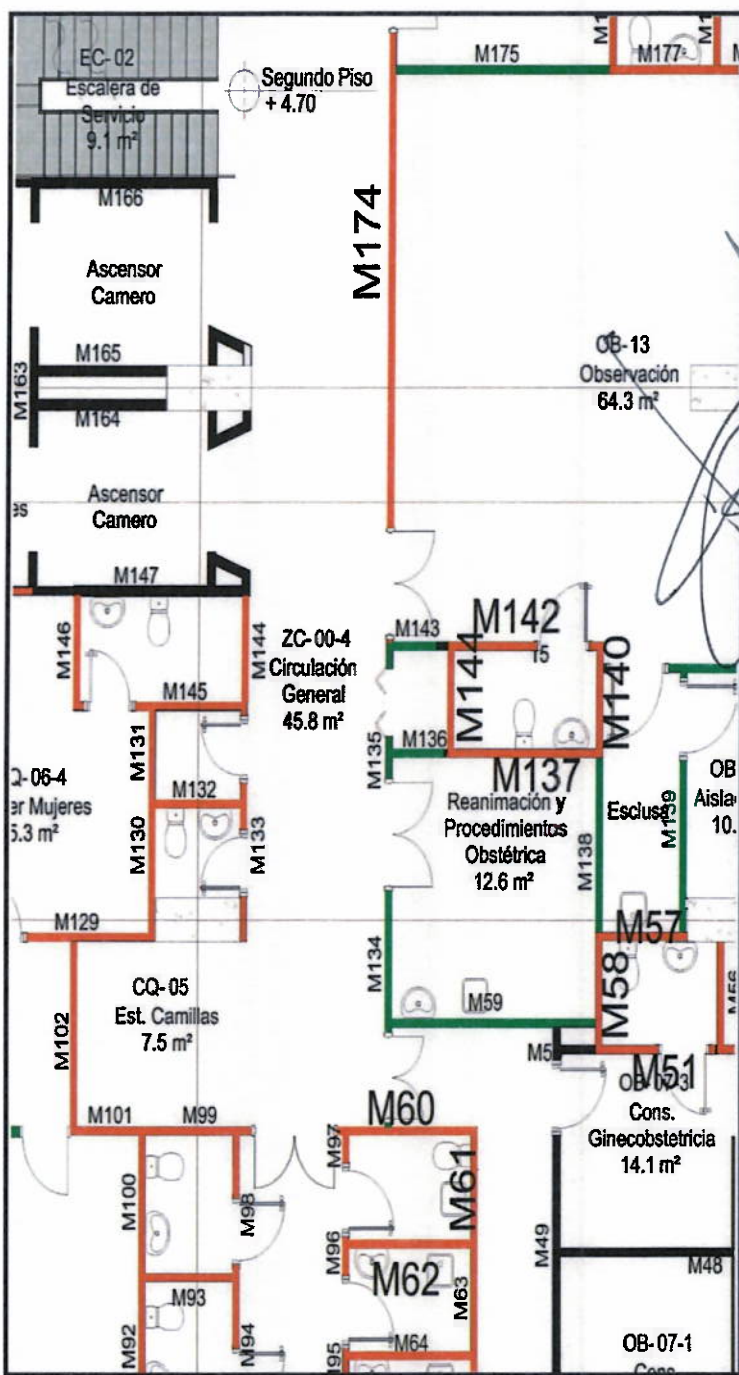
Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

Arg Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jaif Lozano

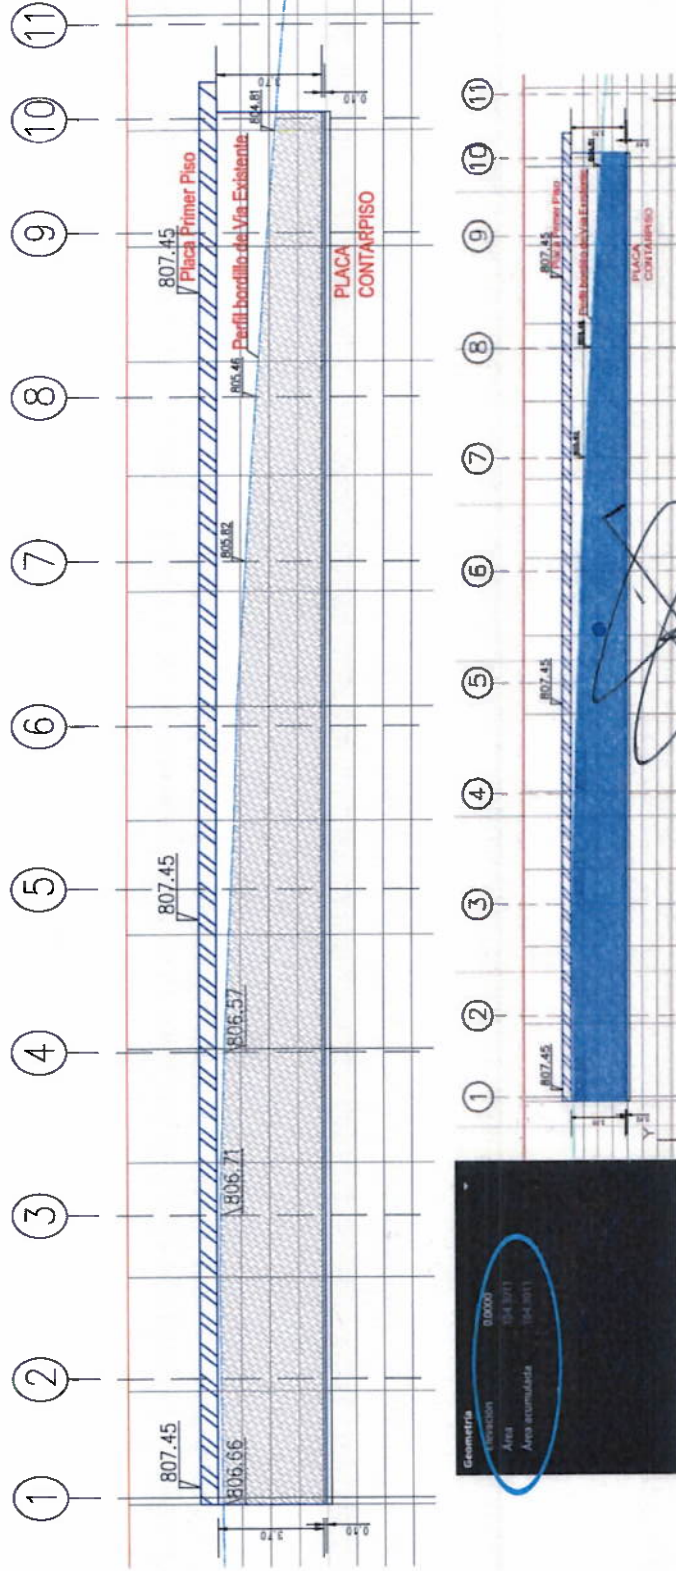
 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PAFO-30 Versión No. 00 Fecha:		5	4	2023	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi						
(c) UND:	MIL								
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	PISO 2 								
OCTUBRE 2025		CORTE N°: 15		FECHA:		15			

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFO-30 Versión No. 00 Fecha:		Página 1 de 1 4 2023		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	FECHA:	OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	12.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Impermeabilización muros, placa lanque, Xypex o similar concentrado						(c) UND:	M2


MEMORIA GRAFICA

PERFIL LONGITUDINAL EJE A



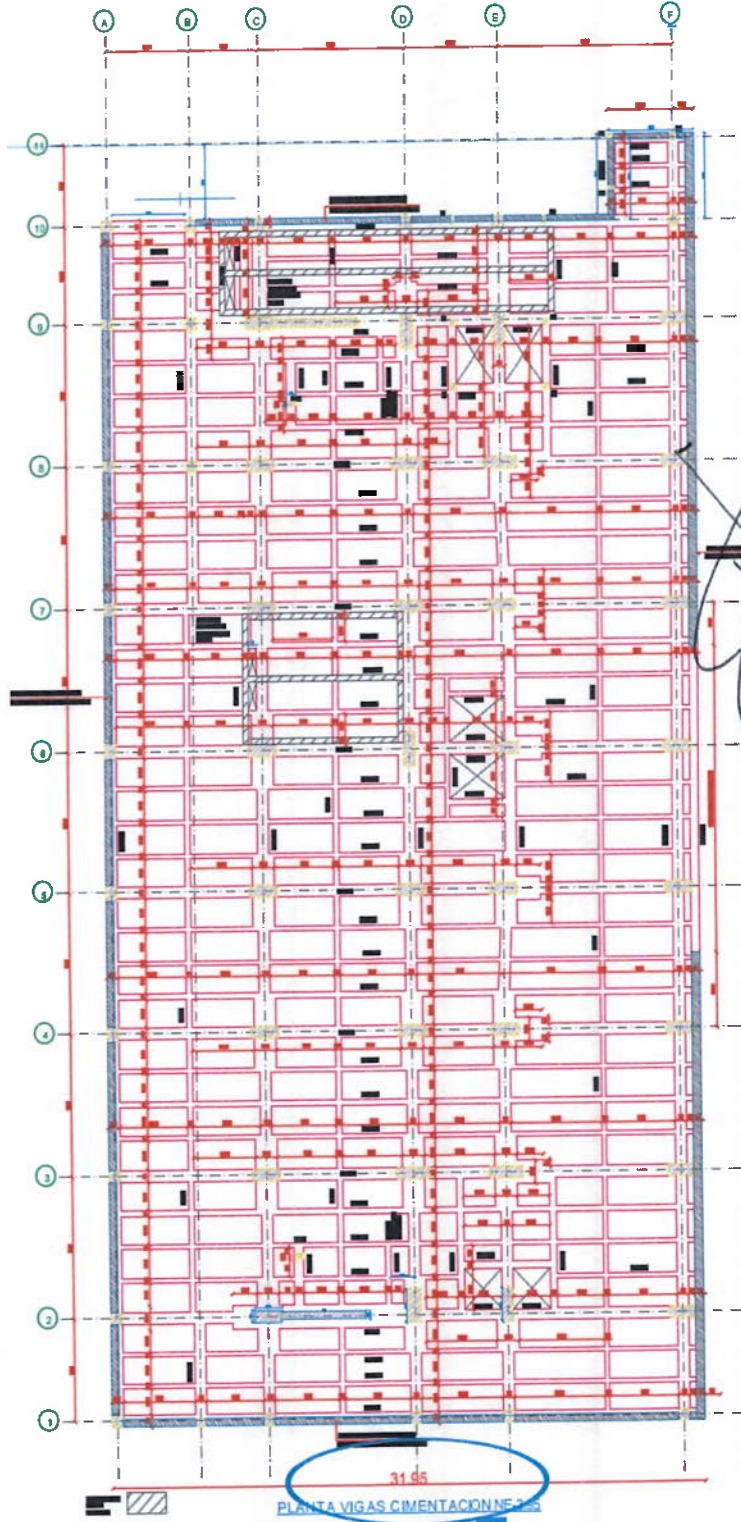
Elaboró:


 RESIDENTE DE OBRA
 Arq. Francisco Barrios


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 Arq. Jayr Gaitán

 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38		Página 1 de 1		2023	
		Versión No. 00		5		4	
		Fecha					
CONTRATO N°: 080 DE 2024		OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		FECHA: 15		OCTUBRE 2025	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°: 12.3.1		(b) DESCRIPCION ITEM		(c) UND: M2			
		Impermeabilización muros, placa tanque, Xypex o similar concentrado					

MEMORIA GRAFICA




Elaboró:




RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

Revisó:



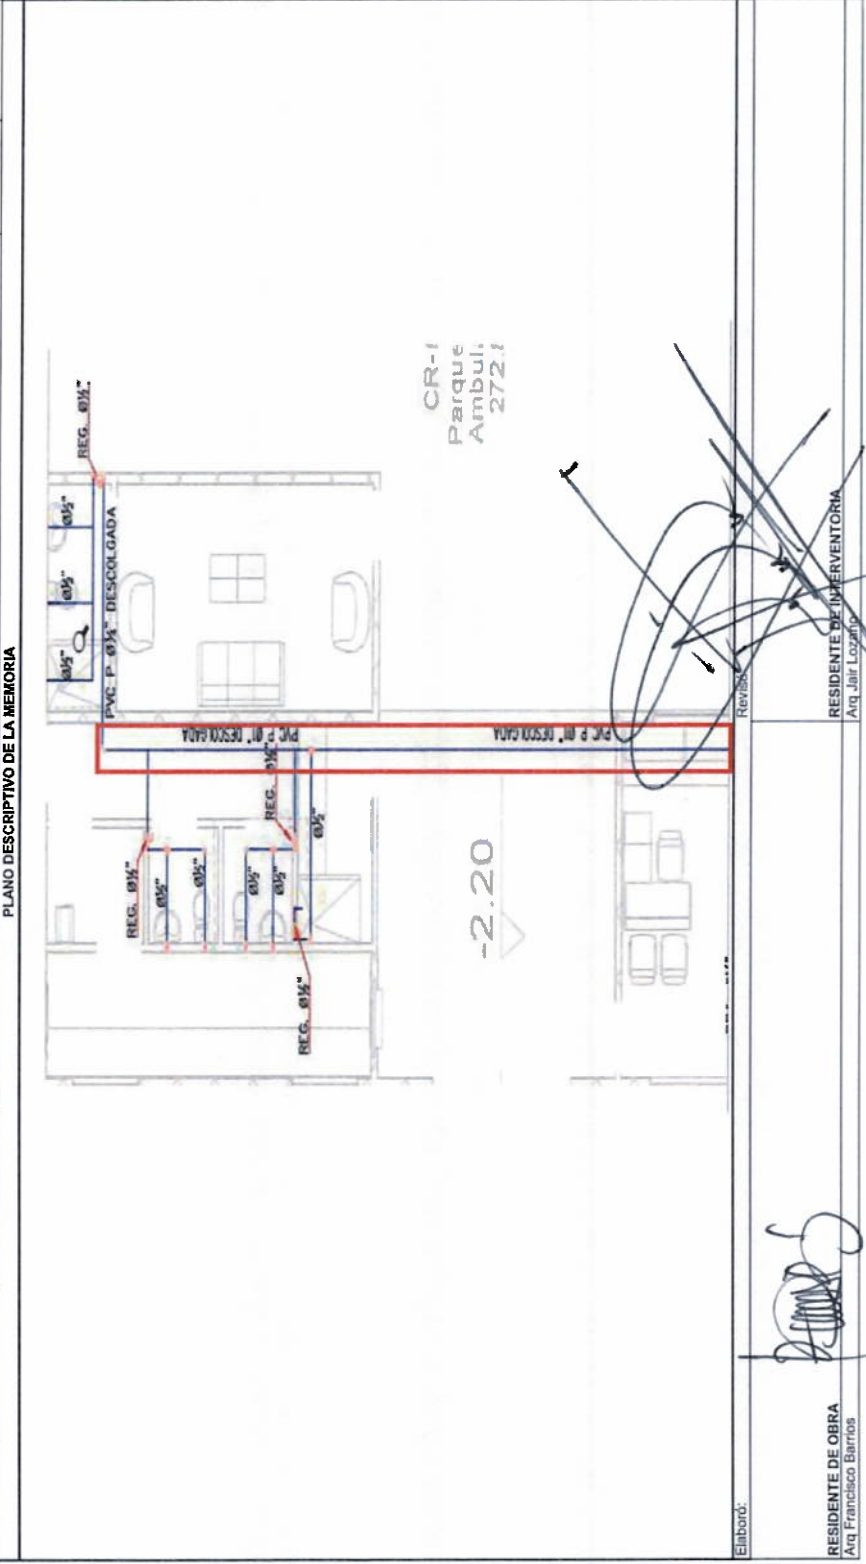
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

 SAN VICENTE COMUNIDAD		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 PA-FO-38	
				Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha:		5 4 2023	
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		CORTE N°:		FECHA:	
26.0.2.1		Tubería PVC presión Ø1 1/4"		15		OCTUBRE 2025	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UND:		ML	
							
							
Elaboró: 							
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios							
Revisó: 							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Lozano							

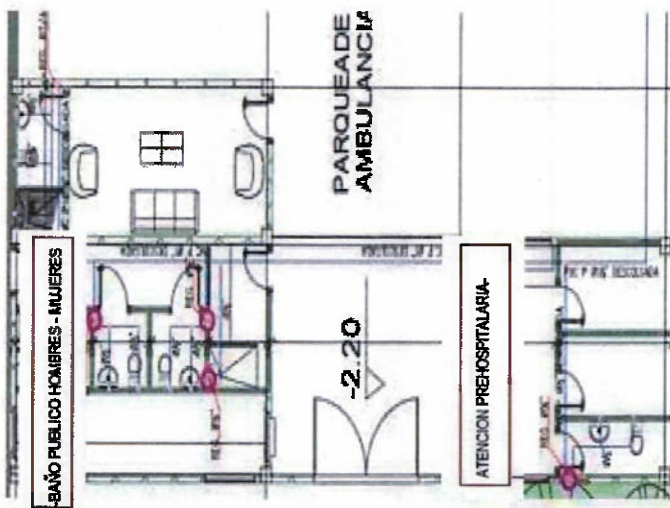
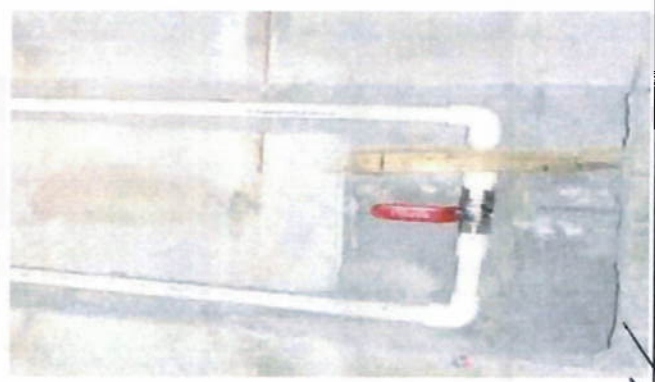
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						Código: PA-FO-30			
						Versión No. 00			
						Página 1 de 1			
						Fecha: 5 / 4 / 2023			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE						
CONTRATISTA INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.0.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC presión Ø1"						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACIÓN BANOS EDIFICIO B						
			DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL - (m³)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
			Ancho	Longitud (Kg/ml)					
						TOTAL PAG			
Elaboró:			 RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios						
			 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Arq. Jairo Lozano						

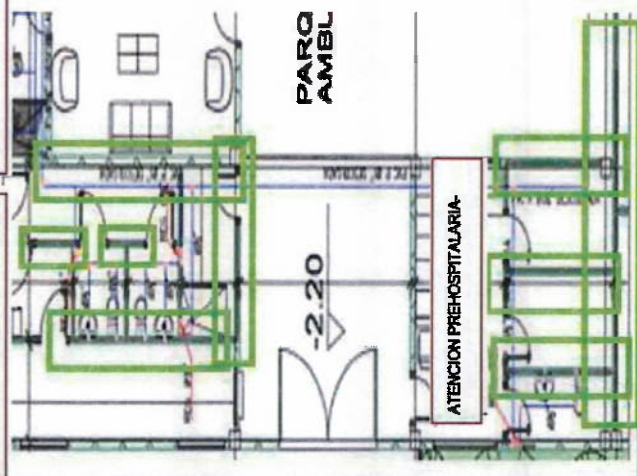
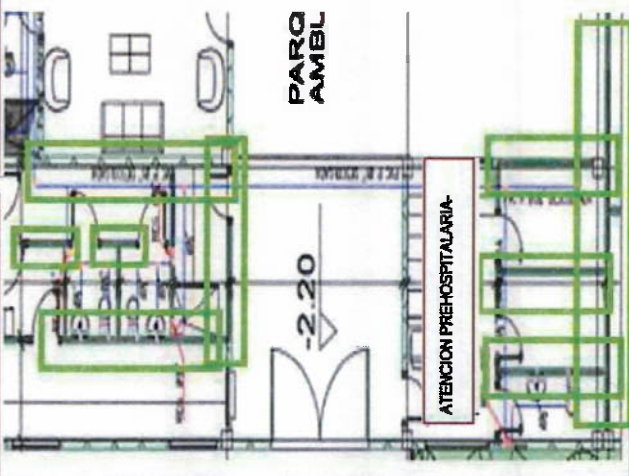
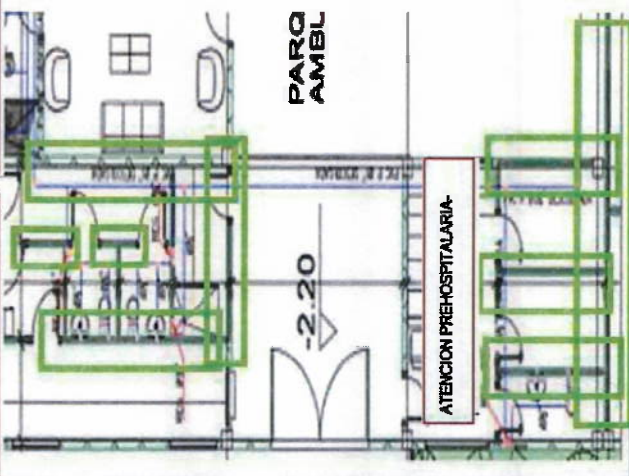
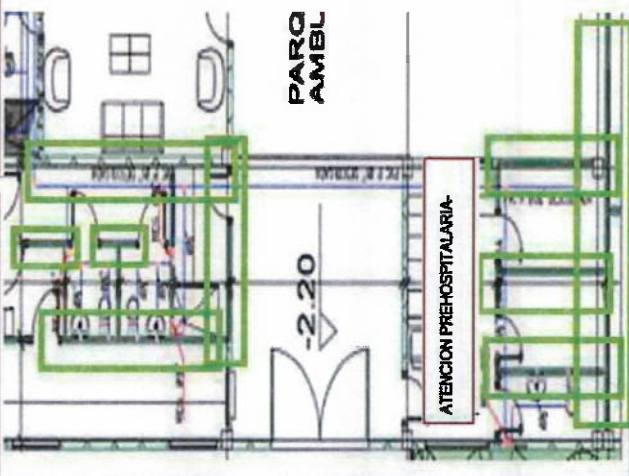
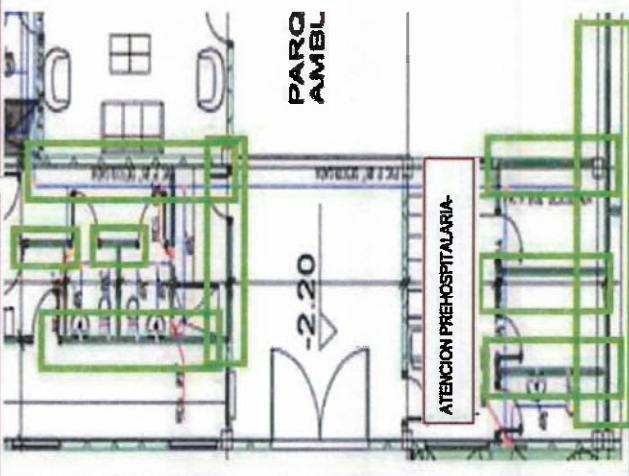
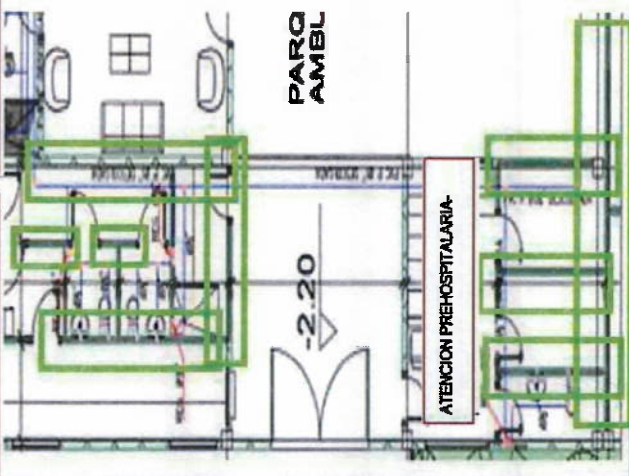
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30					
						Versión No. 00			Página 1 de 1		
						Fecha:			2023		

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
ITEM N°:	26.0.2.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC Presión Ø3/4"			UND:	ML

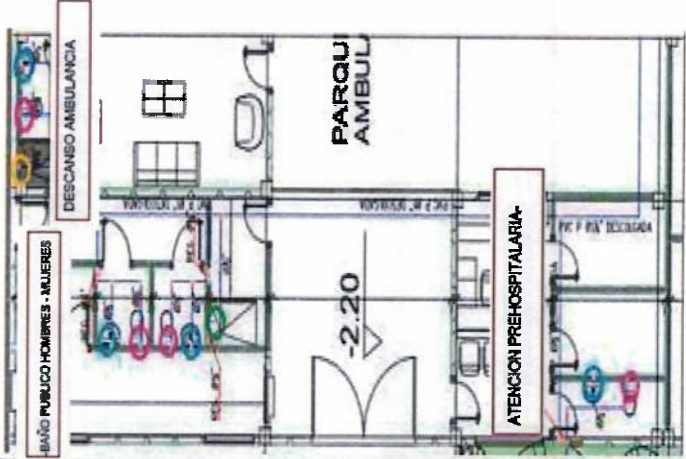
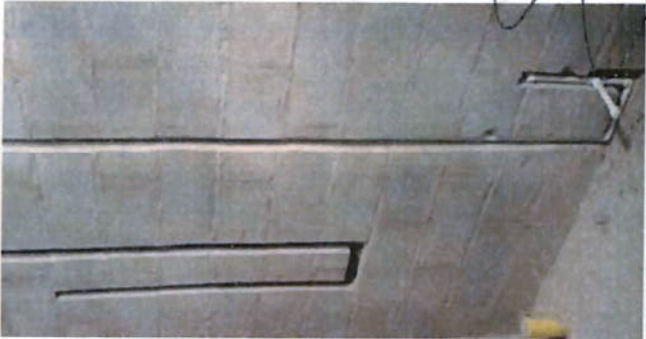


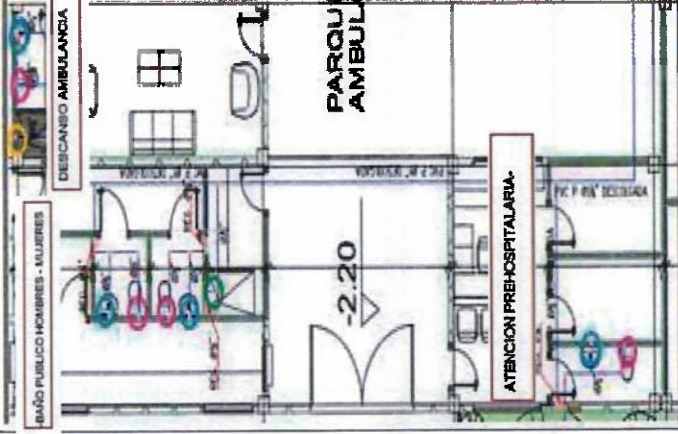
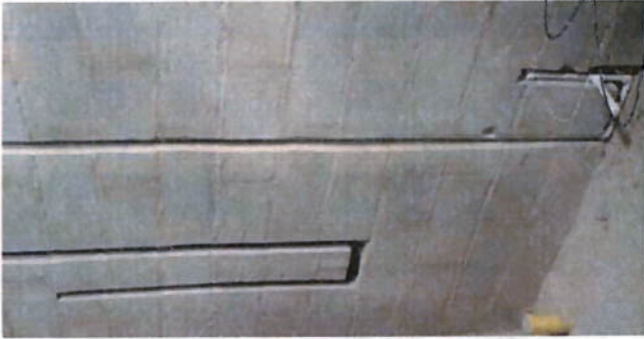
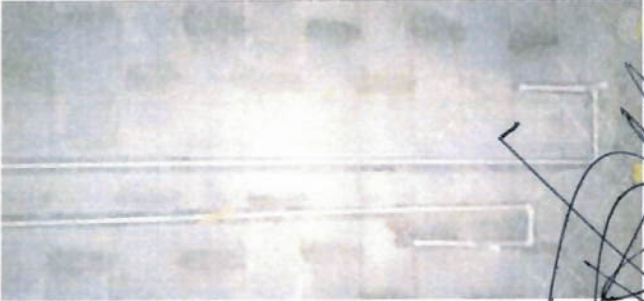

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE		Código: PA-PO-30		Versión No: 00		Página 1 de 1	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		Fecha:		5		4	
ITEM N°:		26.0.2.5		DESCRIPCION ITEM		FECHA:		15		OCTUBRE 2025	
				Registro bola Ø1/2"		UND:		UND:		UND	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
											
BAÑO PUBLICO HOMBRES - MUJERES			ATENCION PREHOSPITALARIA			BAÑO PUBLICO HOMBRES - MUJERES					
Elaboró:											
											
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios											
Revisó:											
											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Bozano											


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUKLA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	FECHA :	OCTUBRE 2025
INTERVENTORIA									
ITEM N°:	28.0.2.8	DESCRIPCION ITEM	Regatas con pulidora (no incluye resinas)					UND:	ML
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
		DESCANSO AMBULANCIA		DESCANSO AMBULANCIA		ATENCION PREHOSPITALARIA-		BAÑO PUBLICO HOMBRRES - MUJERES	
									
Elaboró:									
									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios									
Resaltó:									
									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Zoung									

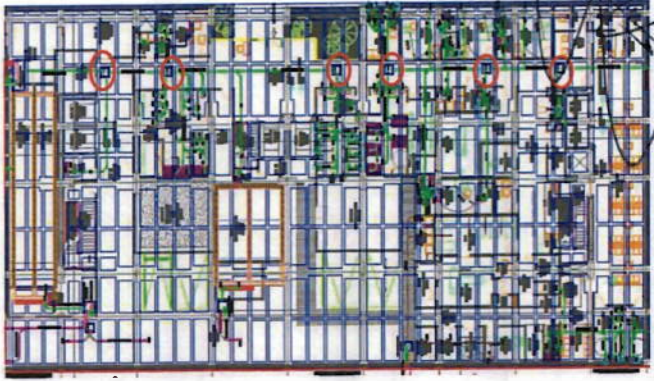
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HULLA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025		
ITEM N°:	20.0.2.12	DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø3/4"			UND:	UND	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
DESCANSO AMBULANCIA DESCANSO AMBULANCIA								
Revisor:								
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Mar Lorelino								

 CONVENIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 Código: PAFO-36 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	26.9.3.1	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	15	
		Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"	FECHA:	OCTUBRE 2025	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
					
Elaboró:		Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano			

 SAN VICENTE CONTRATO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-CD-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE					CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025		
INTERVENIENTOS:			Regatas con pulidora (no incluye resanes)			UND:	UND	
ITEM N°:	26.0.3.2	DESCRIPCION ITEM	PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
   								
 RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jhory Lezama								

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		Fecha: 5 / 4 / 2023	
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA:	
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		UND:	
26.0.3.3		Cámara de alre en PVC P Ø12" (Niple y Téo en A.G.)		OCTUBRE 2025	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA LOCALIZACION SANITARIOS EDIFICIO B POCETA DE ASEO EDIFICIO B LAVAMANOS EDIFICIO B DUCHA EDIFICIO B DIMENSIONES Ancho Longitud (Kg/ml) MEDIDA PARCIAL					

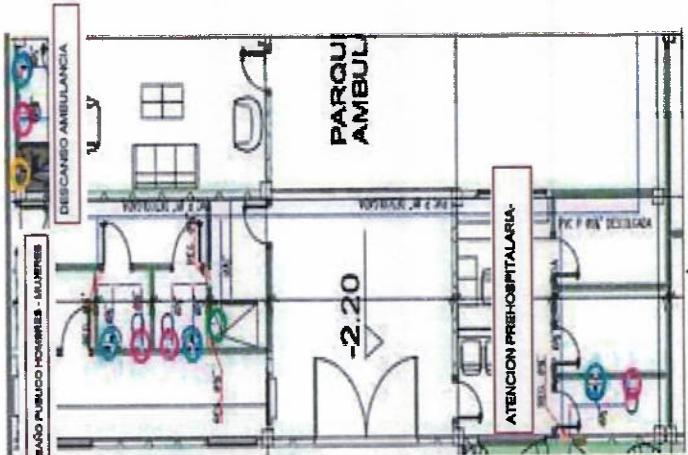
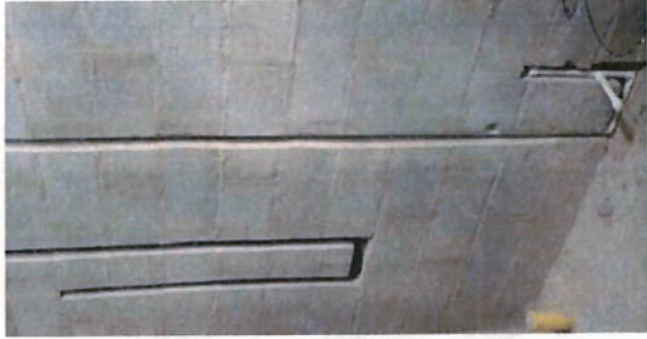
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
					Código: PA-FO-38			
					Versión No. 00			
					Fecha: 5 4 2023			
					Página 1 de 1			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
INTERVENTORIA:								
ITEM N°:	26.17.8	DESCRIPCION ITEM			Abrazadera peraltrespeco Ø4"			
					UND:	UND		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
								
Elaboró:						Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios								
						RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano		

		Código: PA-FO-30		Página 1 de 1		2023	
Versión No. 00		Fecha:		5		4	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26-18.6	DESCRIPCION ITEM	Excavación para cajas				
UND:		M3					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
CAJAS EJE 1-10; A - G 							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					

 SAN VICENTE Municipio	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
	Código: PA-FO-30					
	Versión No. 00					
Página 1 de 1		5		4		2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.0.3.3	DESCRIPCION ITEM	Cámara de aire en PVC P Ø1/2" (Niple y Tee en A.G.)			UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

			
BAÑO PÚBLICO HOMBRERES - MUJERES	DESCANSO AMBULANCIA	ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA	DESCANSO AMBULANCIA

Elaboró:

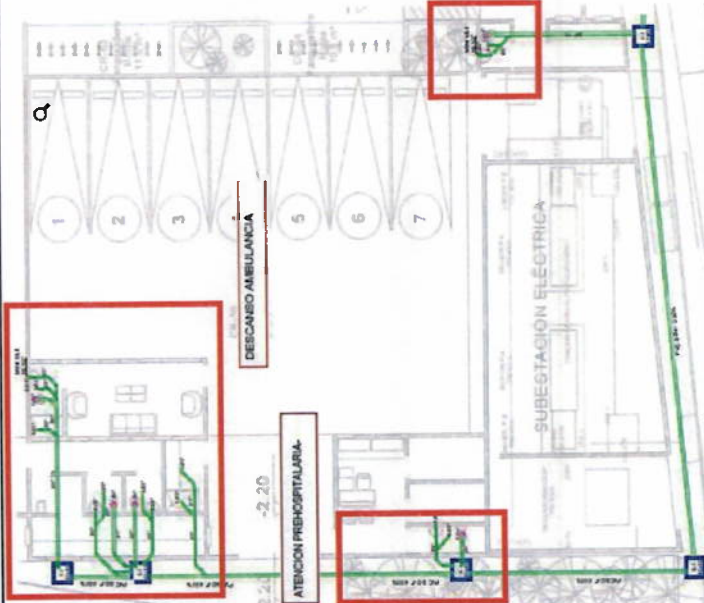



RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barrios

Elaboró:



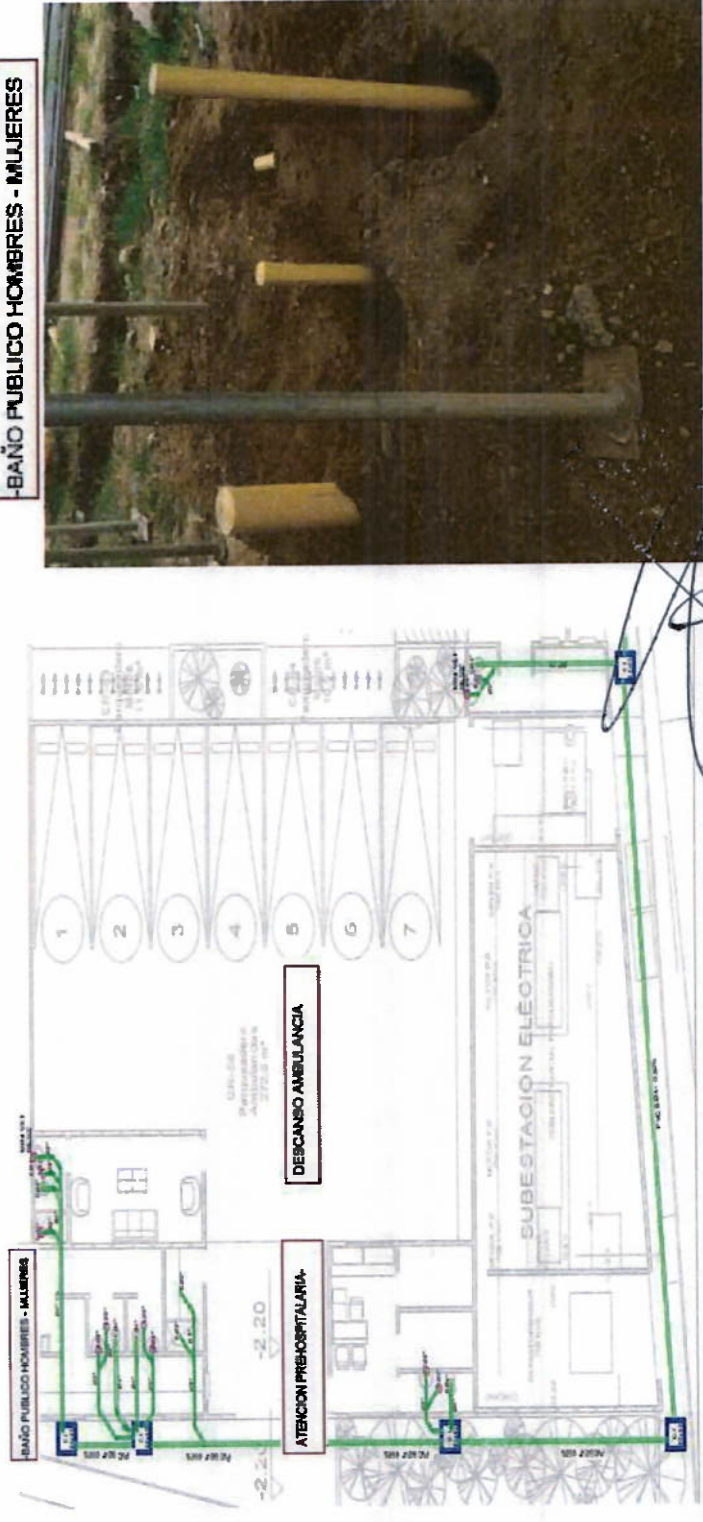
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38		Página 1 de 1		2023	
Versión No. 00		Fecha:		5		4			
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		CORTE N°:		15	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		FECHA :		OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:		DESCRIPCION ITEM		26.0.4.1		Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"		UND:	
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		26.0.4.1		Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"		UND:	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:					Revisó:				
									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrero					RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano				

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30			
						Versión No. 00			
						Página 1 de 1			
					Fecha:		5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.0.4.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-D 102"				
			CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
						UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

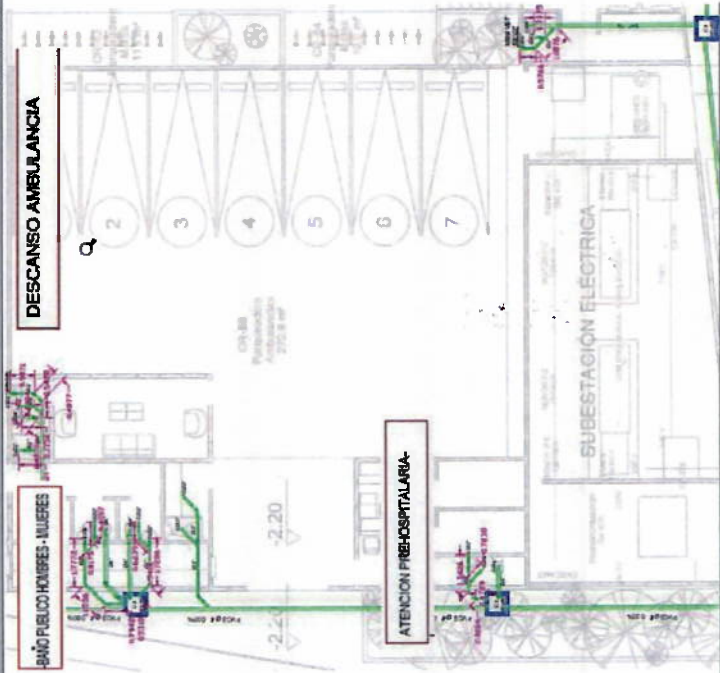


Elaboró:		Revisó:	
RESIDENTE DE OBRA	Arq. Francisco Barrios	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arq. Jair Lozano

[illegible]

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-39 Versión No. 00 Página 1 de 1	
	Fecha: 5		4		2023	
SAN VICENTE CONTRATISTA						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.0.5.3	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
			Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:
						ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



ATENCIÓN PREHOSPITALARIA-BAÑOPÚBLICOS HOMBRE- MUJERES-BAÑO DESCANSO AMBULANCIA



Elaboró:

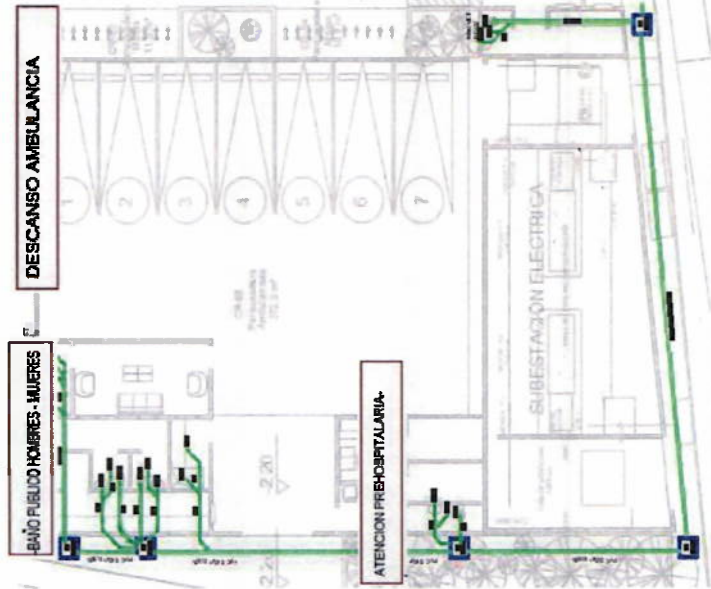
RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barros

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jairo Cárdeno

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30	
	Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha:		5	4	2023
CONTRATO N°:		080 DE 2024		
OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE		
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
INTERVENTORIA:		CORTE N°: 15		
FECHA:		OCTUBRE 2023		
ITEM N°:		26.0.5.4		
DESCRIPCION ITEM		Excavación		
UND:		ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



ATENCION PREHOSPITALARIA-BAÑOPUBLICOS HOMBRE- MUJERES-BAÑO DESCANSO AMBULANCIA

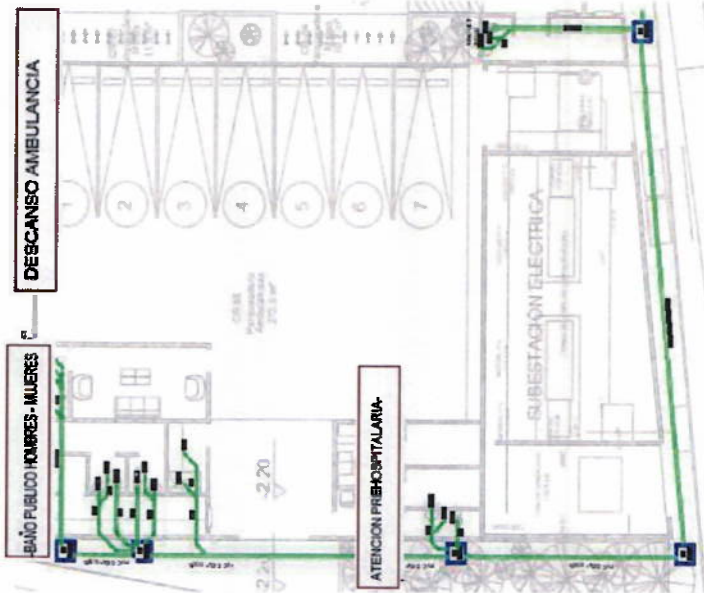


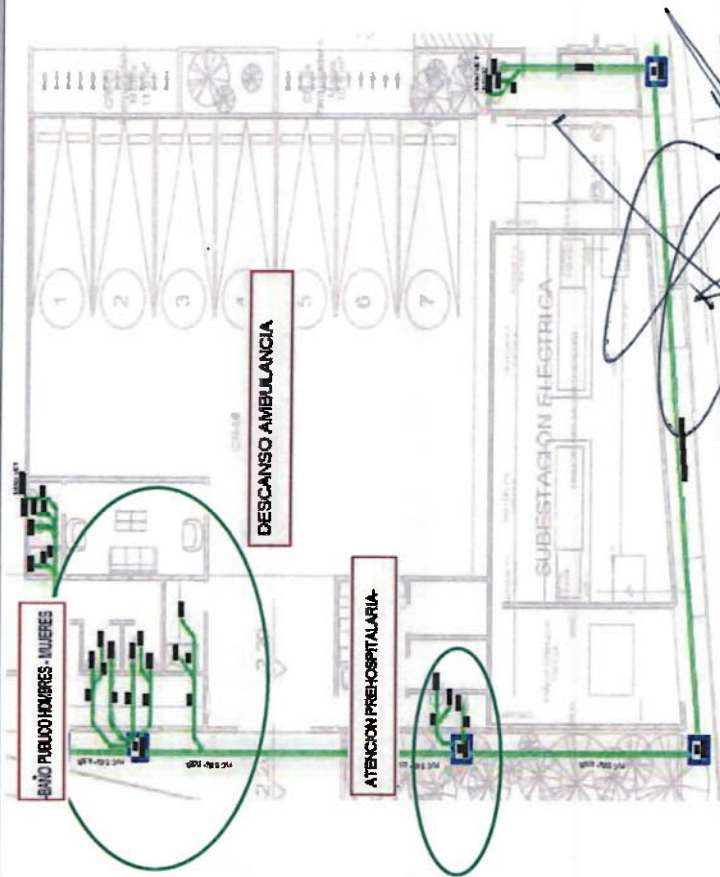
Elaboró:

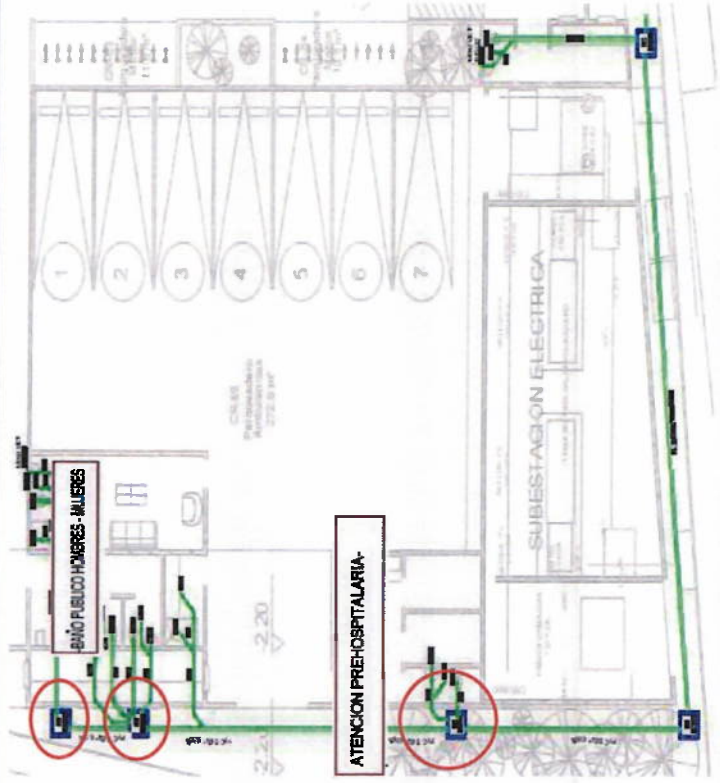
Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barros

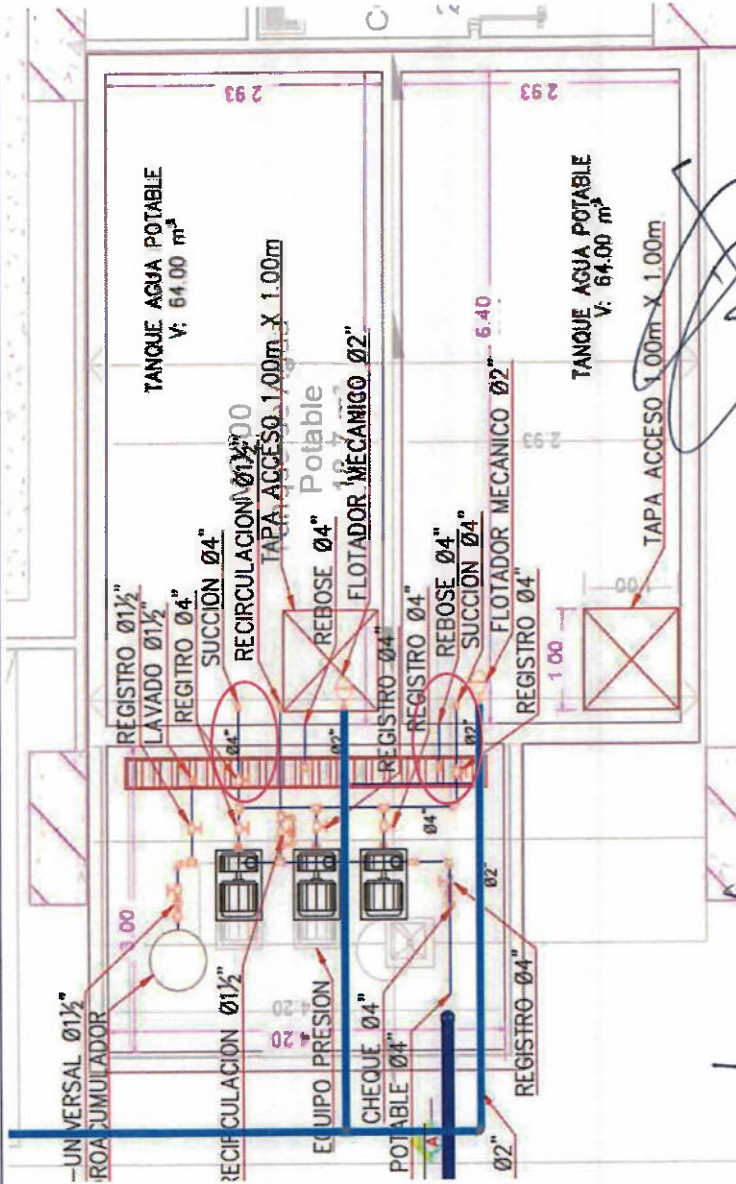
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lopez

E.E.E. SAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		
						Fecha: 5	4	2023
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTER-CONSTRUCTORES						
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		CORTE N°:	FECHA:	OCTUBRE 2023		
28.0.5.6		Cama arena base soporte tubaría		15				
						UND:	ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
DESCANSO AMBULANCIA  ATENCION PREHOSPITALARIA-BAÑO PUBLICOS HOMBRE- MUJERES-BAÑO DESCANSO AMBULACIA 								
Elaboró:								
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros								
Revisó:								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano								

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
ITEM N°:	26.0.5.9	DESCRIPCION ITEM	Prueba de flujo					UNID:	UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 									
Elaboró: 									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrón									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		Código: PA-FO-30			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		Versión No. 00			
INTERVENTORIA:						Página 1 de 1			
ITEM N°:		26.0.6.2	DESCRIPCION ITEM	Excavación para cajas		Fecha: 5 4 2023			
				CORTE N°:	15	FECHA :		OCTUBRE 2025	
						UND:		M3	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 									
Elaboró:									
Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano						

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-39 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA							
ITEM N°:	26.3.18	DESCRIPCION ITEM	Niple Pasamuros Acero Inox. Ø4"			UND:	
UND							
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:		Revisó					
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano					

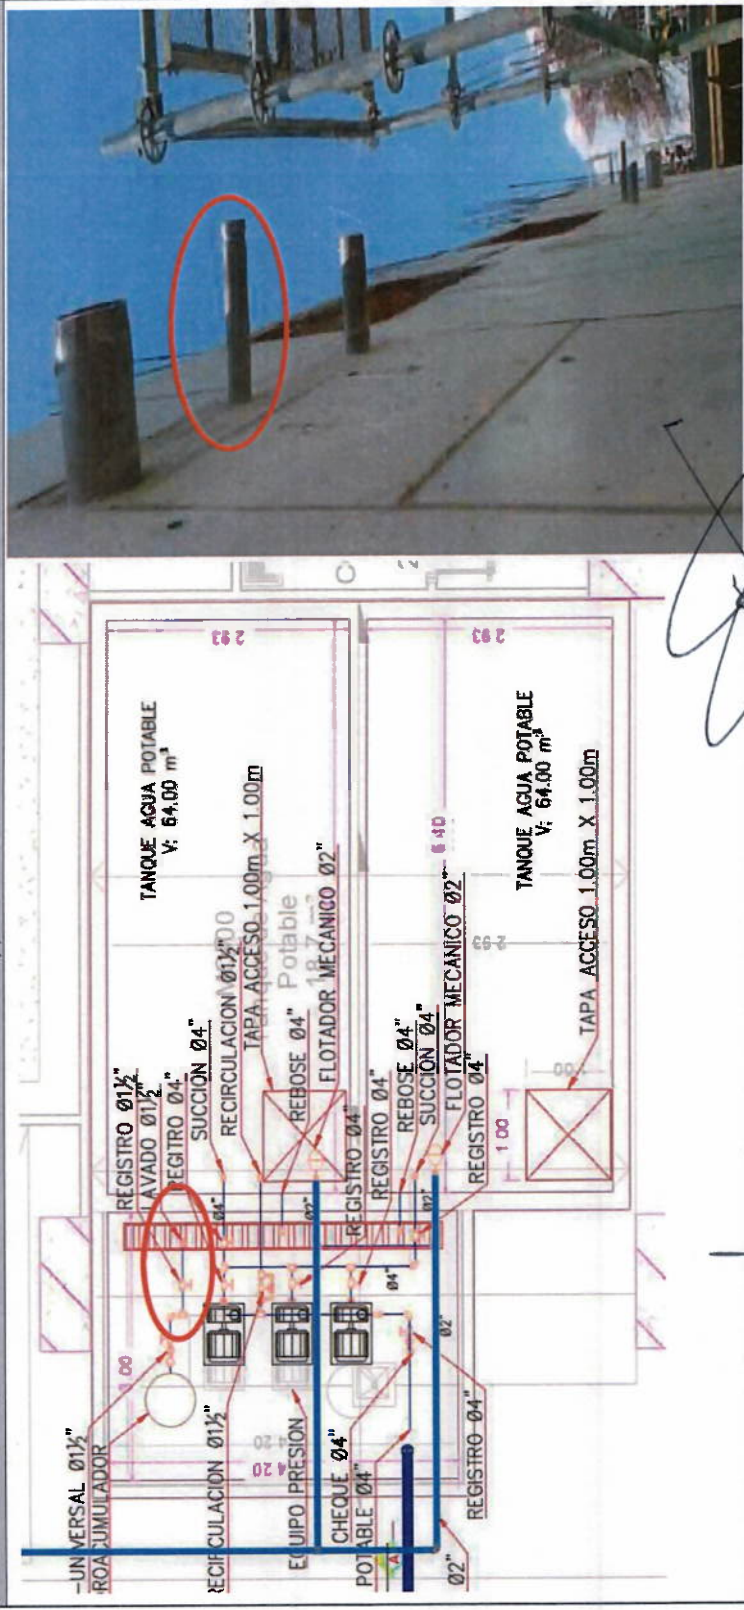
[illegible]

RESIDENTE DE OBRA
Arg Francisco Barrios

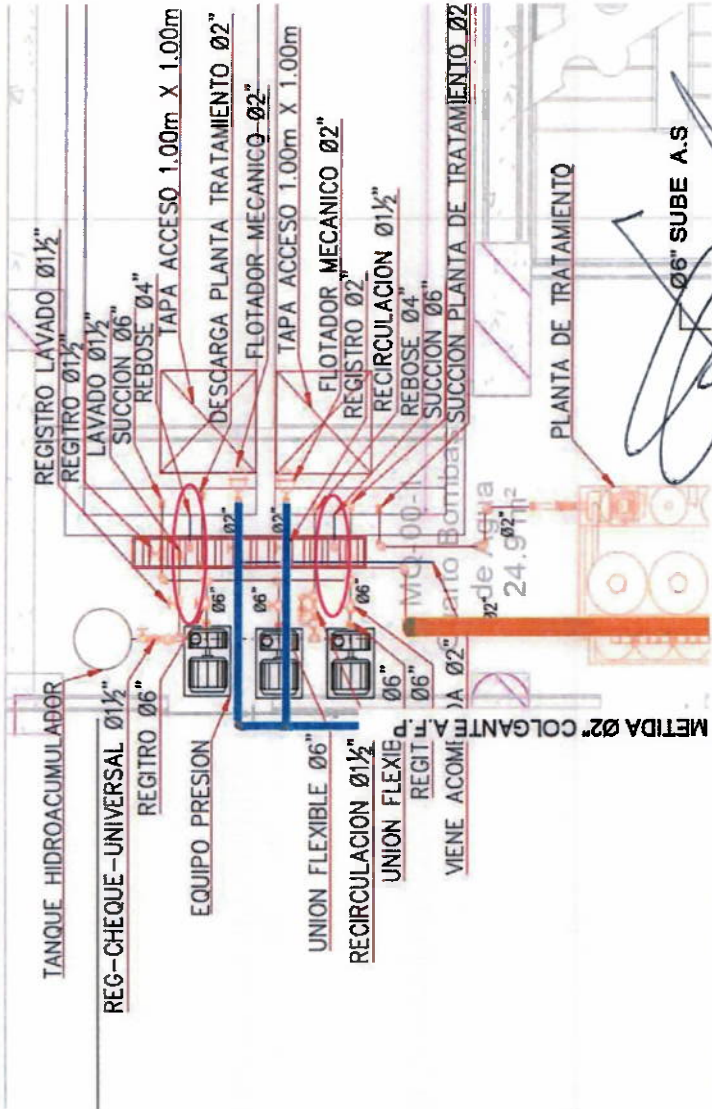

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

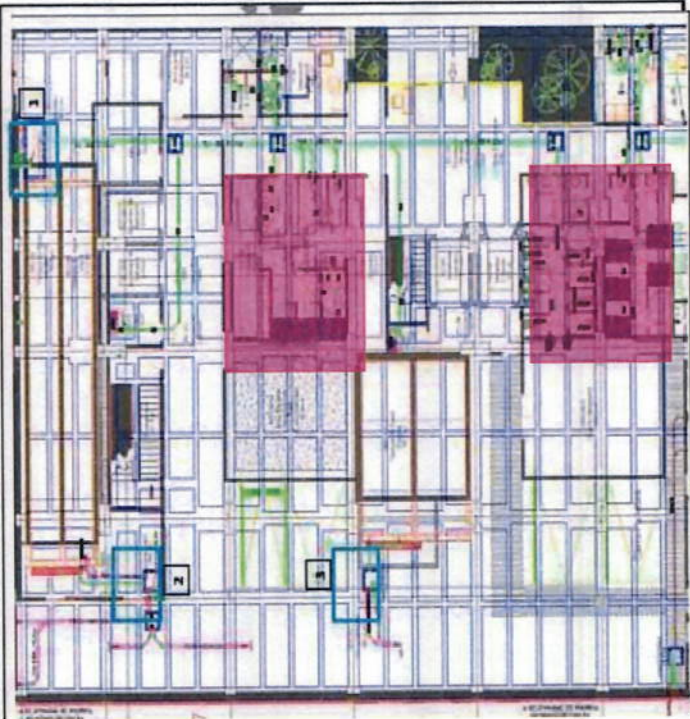
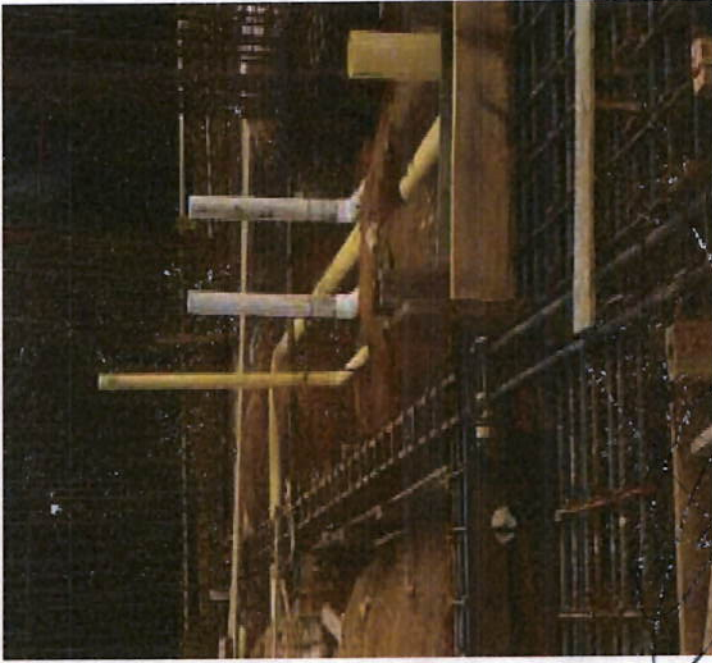
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-39			
CONTRATO N°:		OBJETO:		Versión No. 00		Página 1 de 1	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		Fecha:		2023	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		5		4	
ITEM N°:		26.3.19		DESCRIPCION ITEM		Niple Pasamuros Acero Inox. Ø1 1/2"	
				CORTE N°:		15	
				FECHA:		OCTUBRE 2025	
				UND:		UND	



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

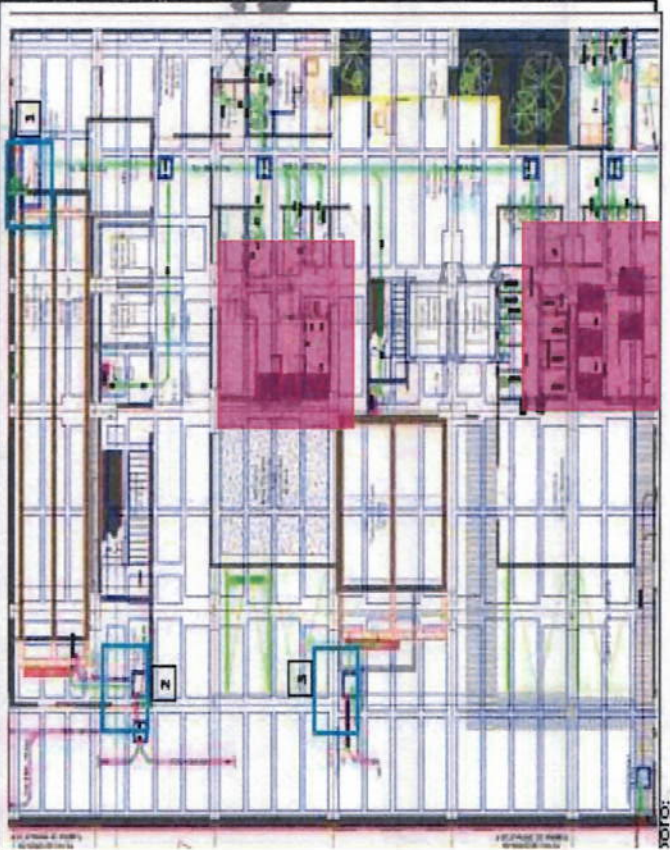



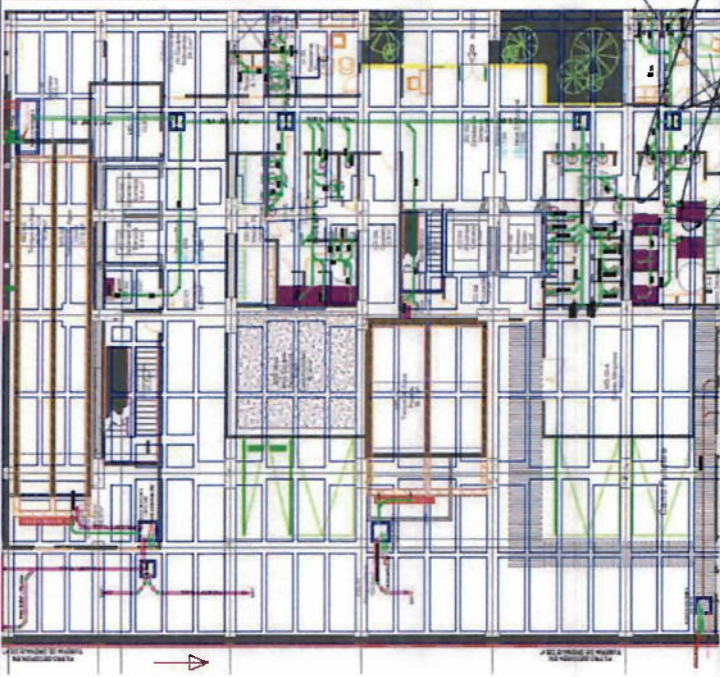
Elaboró:	Revisó:
	
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios	RESIDENTE DE INTERVENCIÓN Arq Jair Lozano

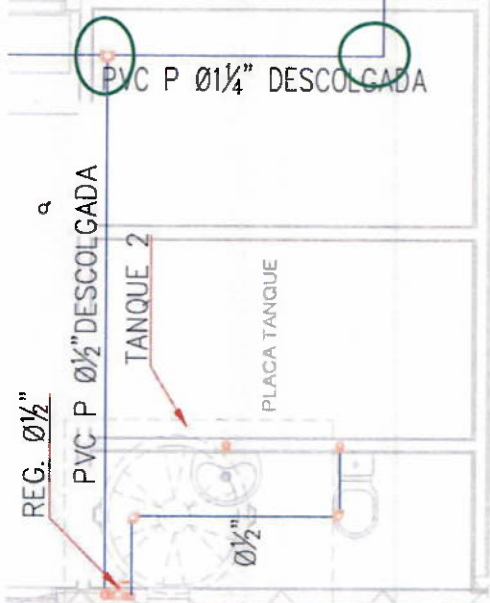

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO N°:		OBJETO:		Código: PA-FO-30		Página 1 de 1	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		Versión No. 00		Página 1 de 1	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Fecha:		2023	
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		CORTE N°:		OCTUBRE 2025	
26.4.18		Niple Pasamuros Acero Inox. Ø6"		15		FECHA :	
				UND:		UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró: 							
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros							
Revisó: 							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano							

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		Fecha: 5 4 2023							
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15		FECHA:		OCTUBRE 2025	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
INTERVENTORIA:													
ITEM N°:		26.5.2		DESCRIPCION ITEM		Tubería PVC presión 80"				UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA													
													
Elaboró:				Reseño									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

 SAN VICENTE CONSTRUCTORA	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 de 4 2023 						
	CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
ITEM N°:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2"		UND:	ML					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
					LOCALIZACION	Ancho	Longitud	Profundidad	MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					POZOS EYECTORES 4 EJE 4x10; A-G		2,00			4,00	8,00
					TOTAL PAG				8,00		
Elaboró:					Revisó						
 RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios					 RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano						

		Código: PA-FO-00		Versión No. 00		Página 1 de 1		Fecha: 5 4 2023	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE			
CONTRATISTA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
INTERVENTORIA:				CORTE N°:		15		FECHA:	
ITEM N°:		26.6.4		DESCRIPCION ITEM		Tubería PVC presión 02"		OCTUBRE 2025	
								UND:	
								ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:					Revisó:				
									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros					RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano				

		Código: PA-PO-30		Página 1 de 1		2023	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Versión No. 00		Fecha:		5 4	
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA :		OCTUBRE 2025	
ITEM N°:		26.6.11		DESCRIPCION ITEM		Accesorios presión Ø3"	
				UND:		UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA  Elaboró: Revisó:							
RESIDENTE DE OBRA		Arq Francisco Barros		RESIDENTE DE INTERVENCIÓN		Arq Jair Lozano	

 E.E. SAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Codigo: PAFO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1			
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA: 15		OCTUBRE 2025	
ITEM N°: 26.6.15		DESCRIPCION ITEM		ACCESORIOS PRESTION Ø1 1/4"		UND:		UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
BAÑO EN ATENCION HOSPITALARIA  									
Elaboro:  RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barros									
Reviso:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano									


[illegible]

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023				

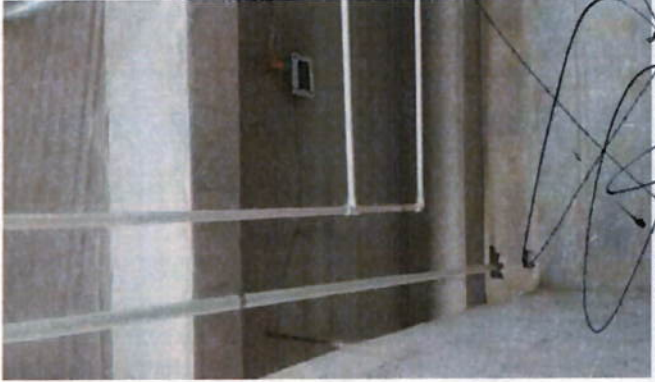
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
ITEM N°:	26.6.17	DESCRIPCION ITEM:	CORTE N°:		15	FECHA :	OCTUBRE 2025	UND:	UND
Accesorios prestom-Ø3/4"									

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

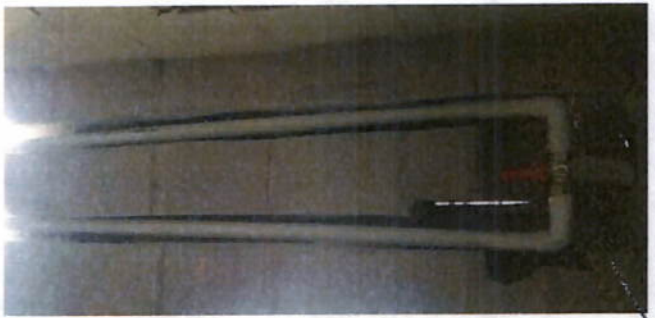
DESCANSO AMBULANCIA



DESCANSO AMBULANCIA



DESCANSO AMBULANCIA




Elaboró:



RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barros

Revisó:

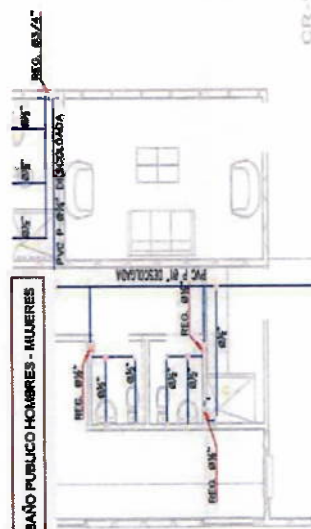


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

 E.E. SAN VICENTE Escuela Especial	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30 Versión: No. 00 Fecha:	Página 1 de 1 4 5 2023
	CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.6.18	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presión Ø1/2"			CORTE N°:	15
						FECHA:	OCTUBRE 2025
						UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


BAÑO PUBLICO HOMBRERES - MUJERES



DESCANSO AMBULANCIA



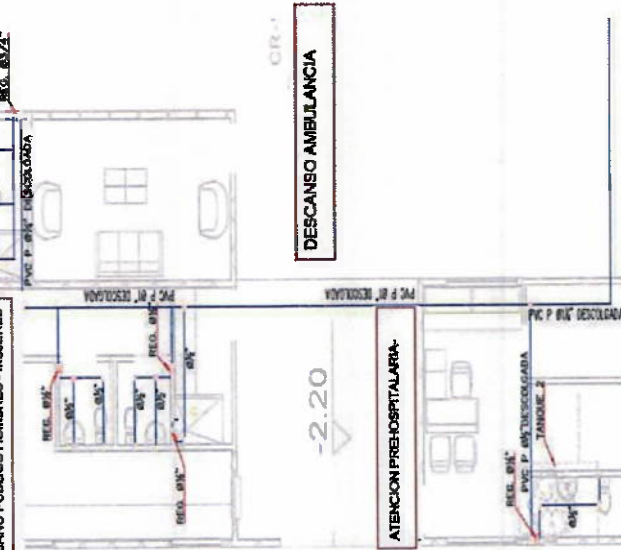
BAÑO PUBLICO HOMBRERES - MUJERES



DESCANSO AMBULANCIA




ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA




ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA



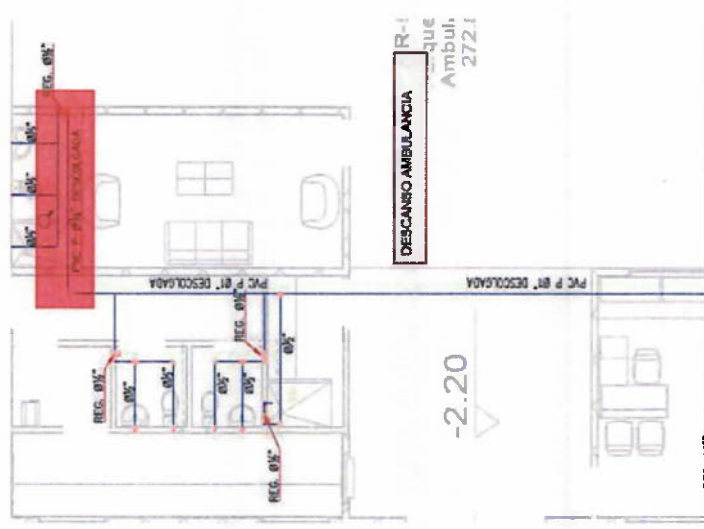

Elaboró: 

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

Revisó: 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lopez

[illegible]

		Código: PA-FO-30		Versión No. 00		Página 1 de 1		Fecha: 5 4 2023	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - NUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	
INTERVENTORIA:						FECHA:		OCTUBRE 2023	
ITEM N°:		26.6.3.4		DESCRIPCION ITEM		Abrazadera peraltapaclo 03/4"		UND: UND.	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
 									
Elaboró:									
									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros									
Revisó:									
									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano									

[illegible]

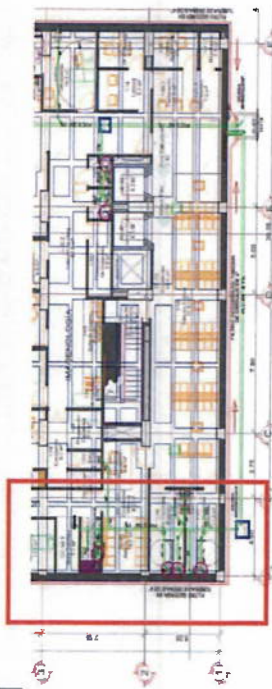
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1			
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				2023	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
CORTE N°:		15	FECHA :	OCTUBRE 2025					
ITEM N°:		26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S 64"				UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

EJE 3-5 : A-F SÓTANO



EJE 1-3 : A-F SÓTANO



EJE 1-3 : A-F SÓTANO



EJE 3-5 : A-F SÓTANO

Elaboró:

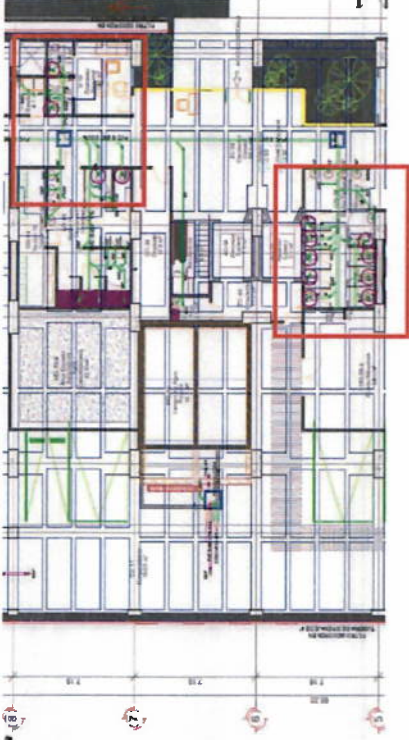



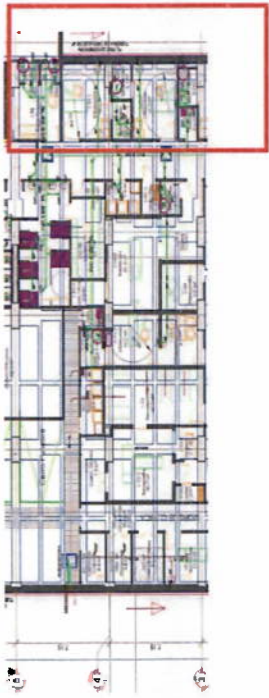

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrón

Revisó:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jairo Lozano

			
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Página 1 de 1	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	15
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA:	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-6 Ø4"
UND: UND: UND:			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			
EJE 5-8 : A-F SÓTANO  EJE 5-8 : A-F SÓTANO   Elaboró: RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios  Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Loraño			

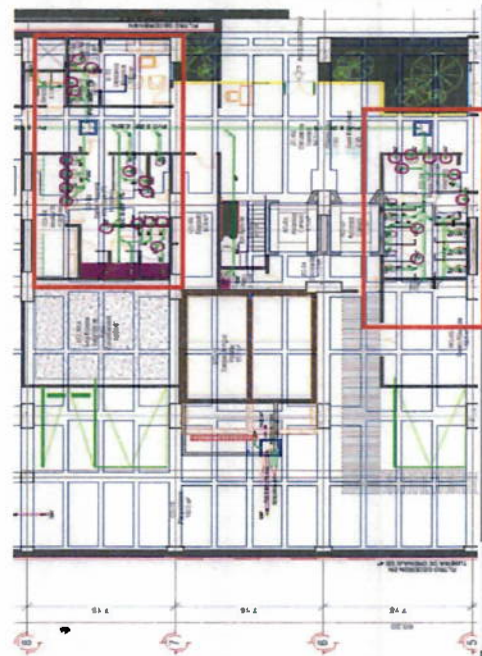
		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
		Código: PA-FO-30				Página 1 de 1	
		Versión No. 00				Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:		INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE	
ITEM N°:		26-12.2		DESCRIPCION ITEM		Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"	
				CORTE N°:		15	
				FECHA :		OCTUBRE 2025	
				UND:		UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
 EJE 3-5 ; A-F SÓTANO  EJE 1-3 ; A-F SÓTANO  EJE 1-3 ; A-F SÓTANO  EJE 3-5 ; A-F SÓTANO							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA		Arq. Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Arq. Jair Lozano	

 SAN VICENTE CONSULTING S.A.S.		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 Código: PA-FQ-30			
						Versión No. 00			
						Fecha:			
						Página 1 de 1			
						4			
						2023			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26-12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:
						UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

EJE 5-8 : A-F SÓTANO



EJE 5-8 : A-F SÓTANO

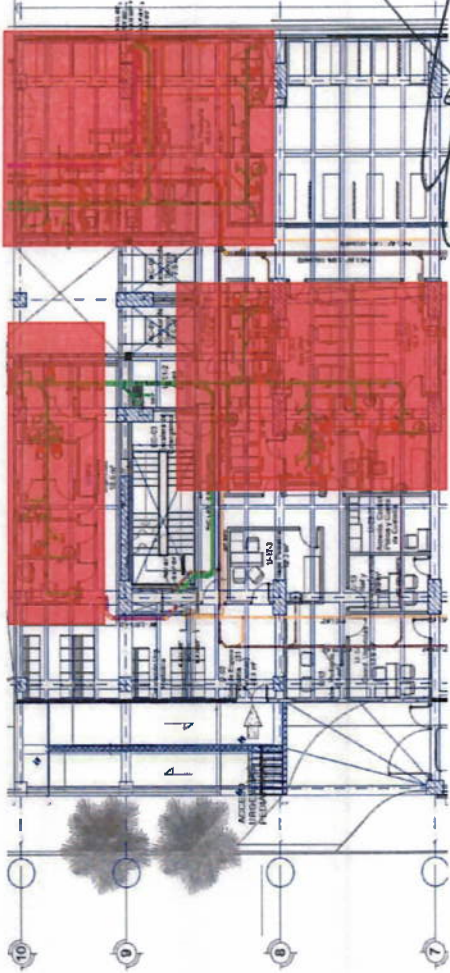


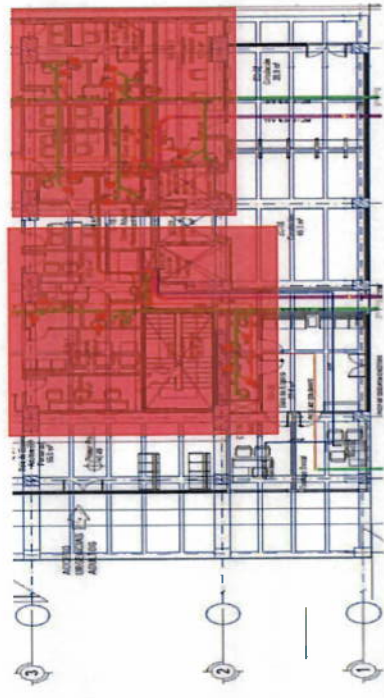
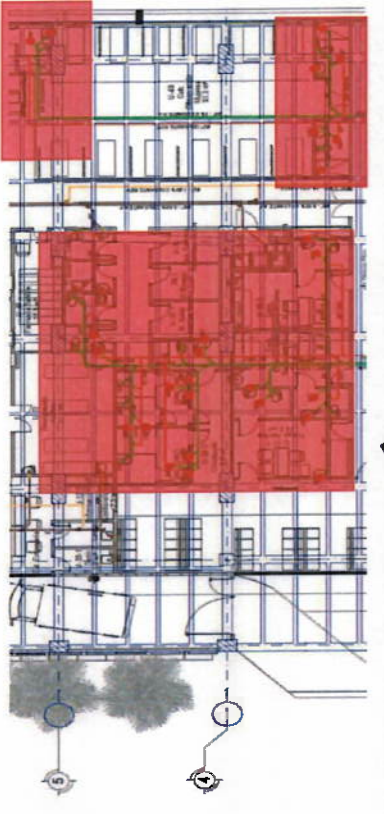
Elaboró:

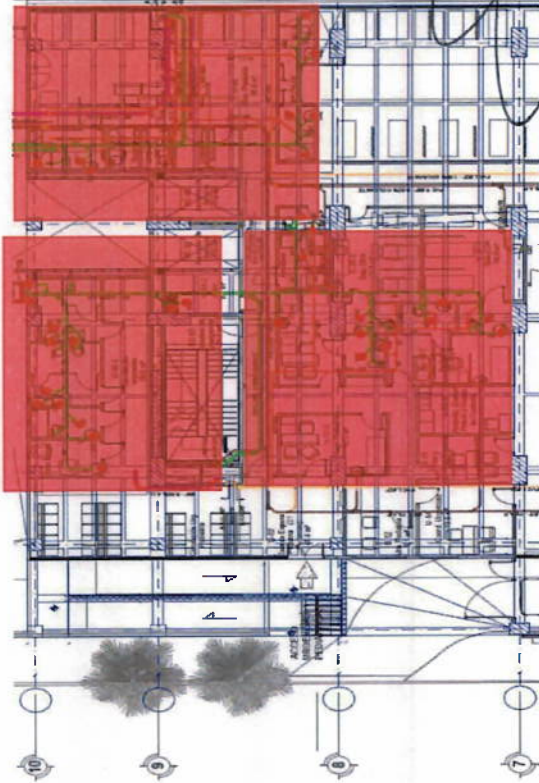

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

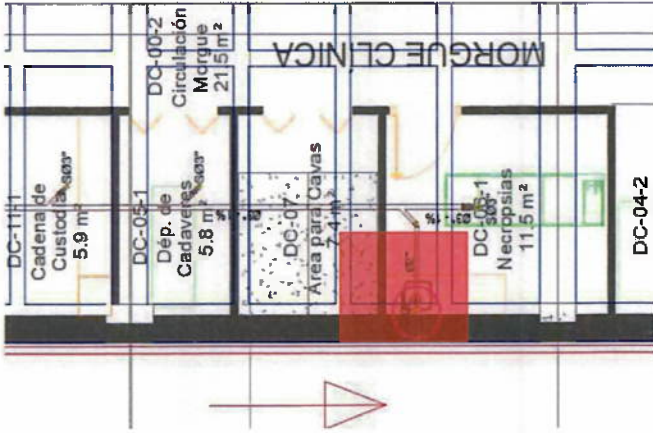

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		Página 1 de 1	
ITEM N°:		26.12.7	DESCRIPCION ITEM		Pasos por placa 64" con maquina sacanudos		CORTE N°:	15	FECHA :
								OCTUBRE 2025	UND:
								UND:	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
EJE 7-10 ; A-F 4° PLACA PRIMER PISO  									
Elaboró:					Revisó:				
									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios					RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano				

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-PC-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.12.9	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa Ø12" con máquina sacanudosos					UND:	UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
EJE 1-3 ; A-F 2° PLACA PRIMER PISO  EJE 3-5 ; A-F 2° PLACA PRIMER PISO 									
Elaboró: 									
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios									
Revisó: 									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano									

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-PO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa Ø2" con máquina sacanúcleos			UND:	UND		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
EJE 7-10 : A-F 2° PLACA PRIMER PISO  									
Elaboró:					 RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios				
					 RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Cardozo				

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025			
ITEM N°:	2613.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
 EJE 3-4 : A-B SOTANO 											
Elaboró:											
											
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios											
Revisó:											
											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lucio											



CONTRATO N°:	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE				FECHA :	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°:	15
INTERVENIORIA:							OCTUBRE 2025
ITEM N°:	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa 23" con maquina sacanuclos					
26.13.5		UND: UND					

[illegible]

Elaborate:

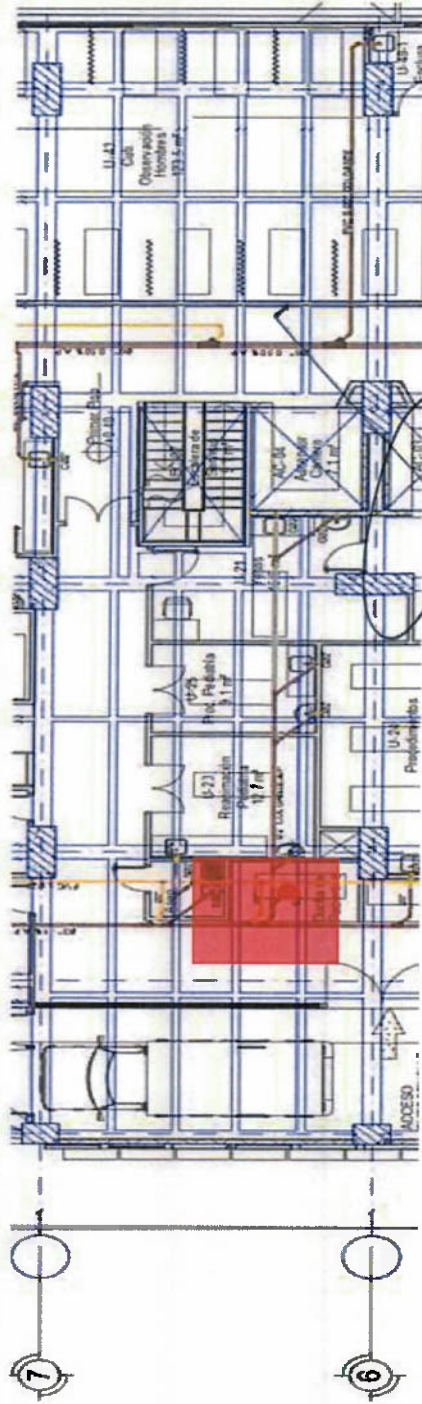
RESIDENTE DE OBRA
Arg. Francisco Barrón

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-PO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		Fecha: 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
INTERVENTORIA:	CORTE N°: 15 FECHA : OCTUBRE 2025				
ITEM N°:	26.13.5	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa Ø3" con maquina sacanucleos		
		UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

EJE 6-7 : A-F 3" PLACA PRIMER PISO



Elaboró:



RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barrios

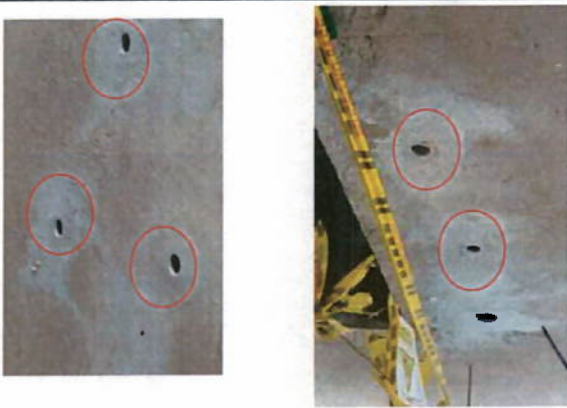
Revisó:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023	
	CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:							
ITEM N°:	26.13.6	DESCRIPCION ITEM	Pasos por placa 02" con máquina sacanucleos				
		UND:	UND				

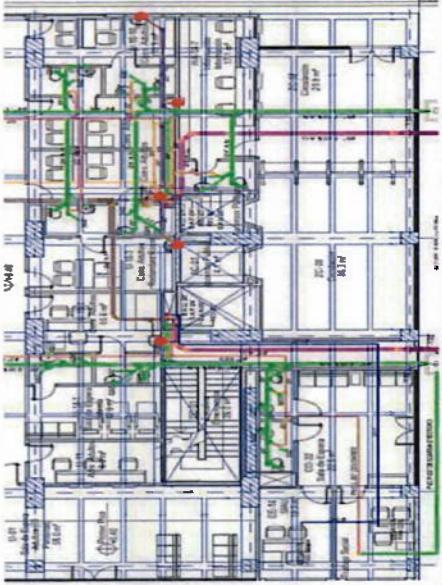
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



EJE 3-5 ; A-F 2" PLACA PRIMER PISO



EJE 1-3 ; A-F 2" PLACA PRIMER PISO

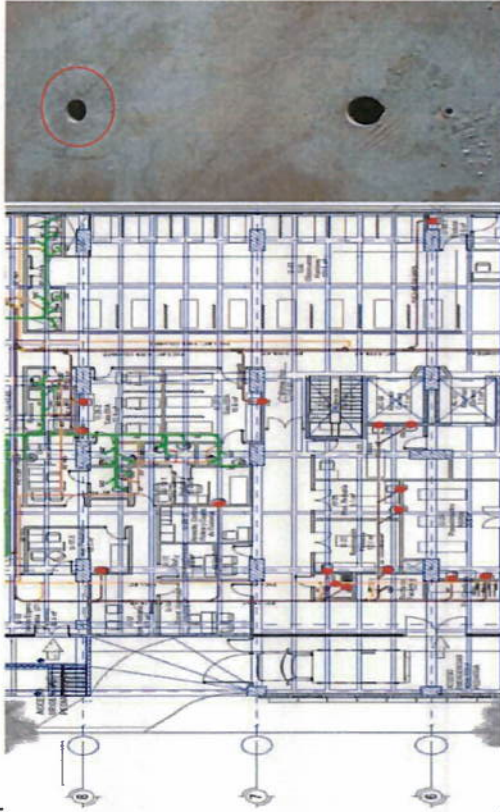


Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrera	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

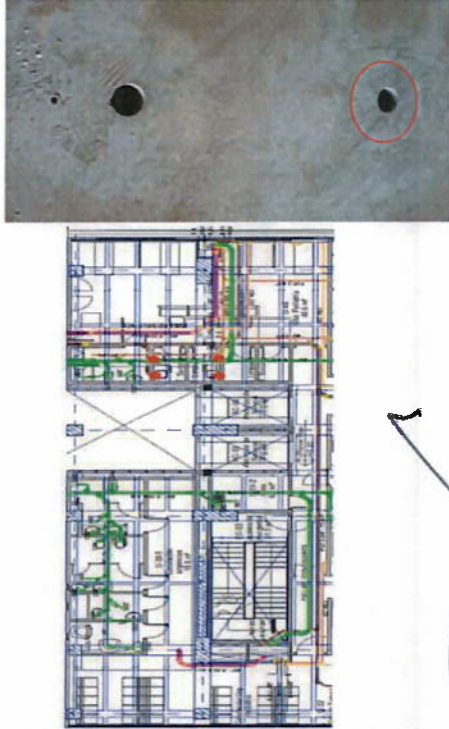
	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-PO-30			
					Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha:		2023		
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATISTA:		FECHA :		
090 DE 2024		CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		OCTUBRE 2025		
INTERVENTORIA:		DESCRIPCION ITEM		CORTE N°:		15		
ITEM N°:		26.13.6		Pasos por placa 02" con maquina sacanucleos		UND:		
						UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

EJE 5-8 : A-F 2" PLACA PRIMER PISO



EJE 8-10 : A-F 2" PLACA PRIMER PISO

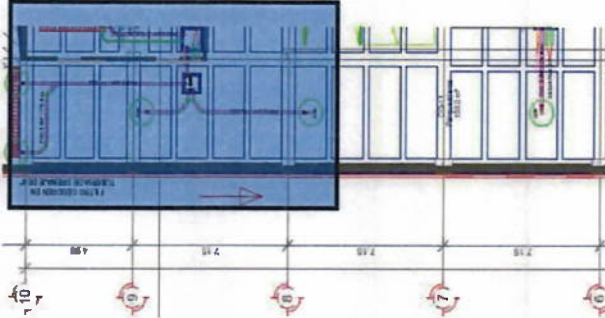



Elaboró:


RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

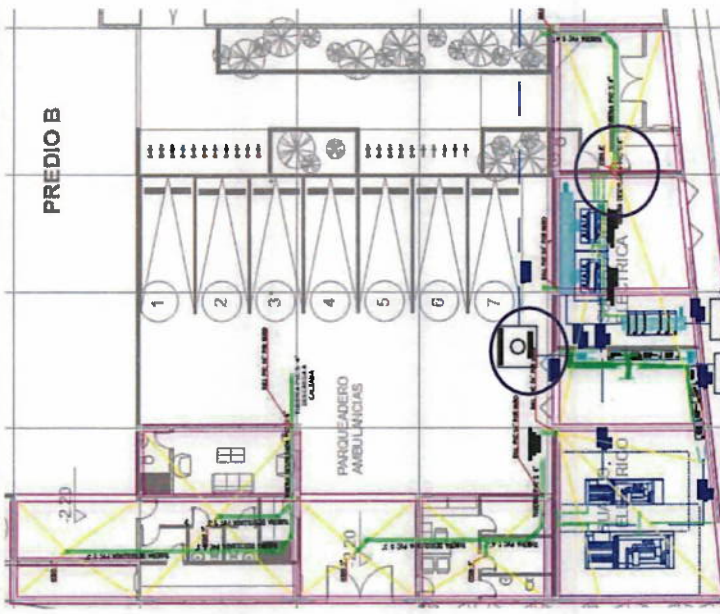
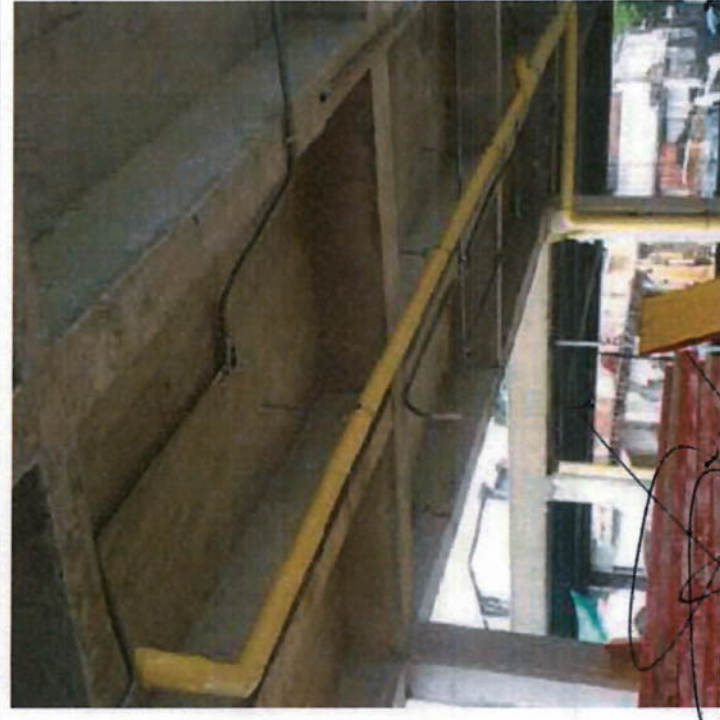
Revisó:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Páez


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 Código: PAFO-30 Versión No. 00 Página 1 de 3 Fecha: 5 4 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
INTERVENTORIA:											
ITEM N°:	28-14.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas aguas lluvias PVC-S Ø4"								
PLAN DESCRPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			EJE 6-10 : A-B SOTANO		Ancho	Longitud	Profundidad		5,00	5,00	
Elaboró:					Revisó:				5,00		
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano								

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha:	Página 3 de 3 5 4 2023
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	26.14.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas aguas lluvias PVC-S Ø4"				OCTUBRE 2025
							UND:
LOCALIZACION SOTANO CARCAMO DIMENSIONES Ancho Longitud Profundidad MEDIDA PARCIAL (m3) N° DE ELEMENTOS MEDIDA TOTAL							
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios							

[illegible]

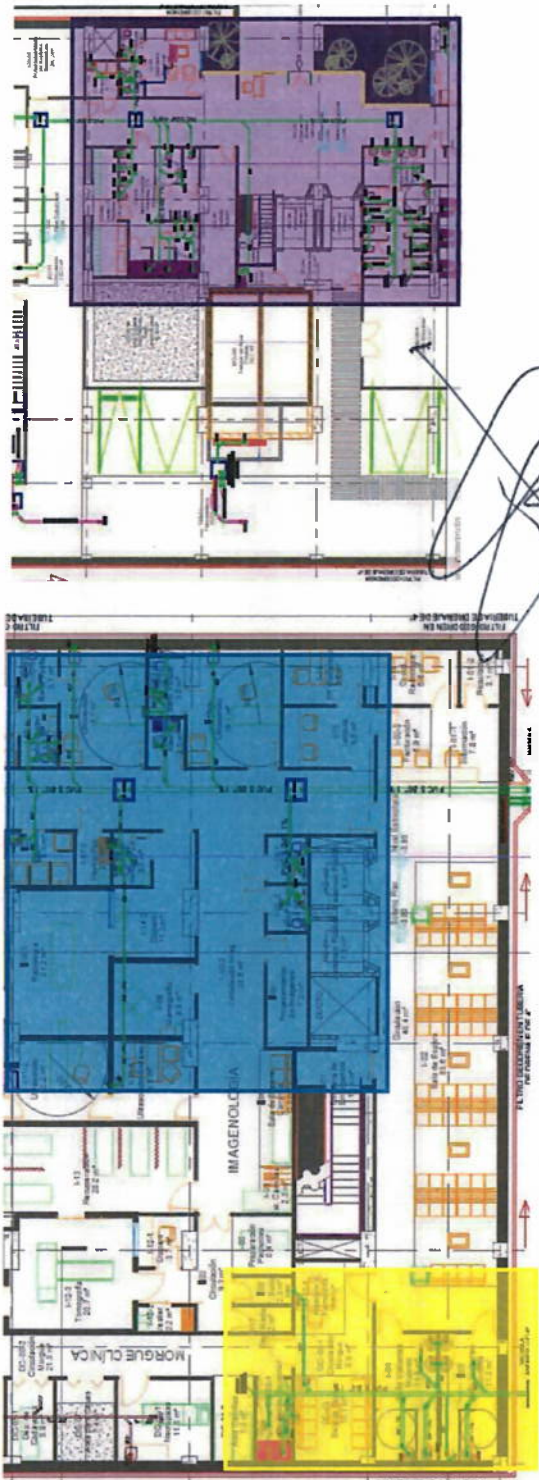

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	26.14.3	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	15	FECHA:
		Pases por placa Ø4" con máquina sacanúcleos			OCTUBRE 2025
UND: UND					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
Elaboró:			Revisó		
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrón			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano		

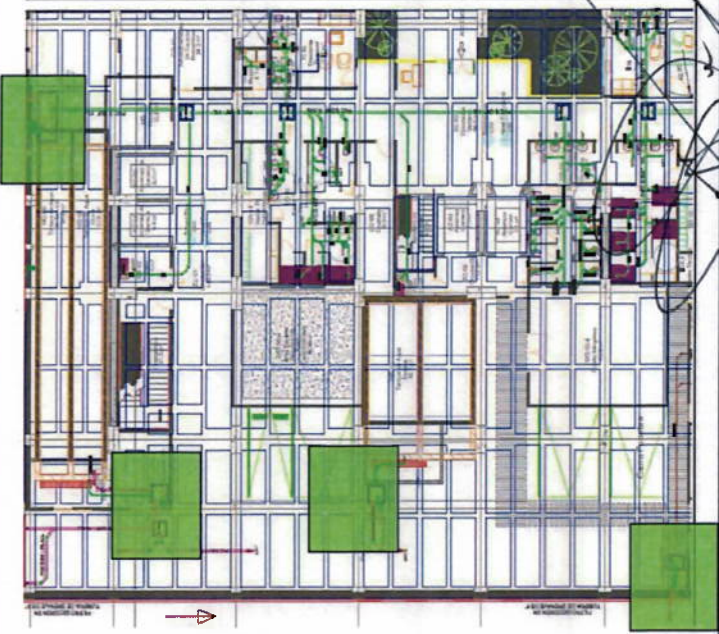
[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL													
Código: PA-FO-30		Versión No. 00										Página 1 de 1			
Fecha:		5										2023			
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.A.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		15		FECHA:		OCTUBRE 2025		UND:		ML	
ITEM N°:		20.15.2		DESCRIPCION ITEM		Tubería tipo alcantarillado Ø6"									
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				LOCALIZACION		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL (m3)		N° DE ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL			
				ENTRE EJE 0-1 Y EJE A-D ENTRE EJE 0-1 Y EJE D-F		Ancho Longitud		Profundidad				9.60 13.00			
Elaboró:				Revisó:				TOTAL PAG		22.60					
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano											

Logo SEI SAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA:		OCTUBRE 2025	
ITEM N°:		26.15.2	DESCRIPCION ITEM		Tubería tipo alcantarillado Ø6"		
					UND:	ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
ENTRE EJE 0-1 Y EJE A-D FAN COIL PVC P Ø3" DESCARGA EYECTOR 3 -1.00 -1.00 ENTRE EJE 0-1 Y EJE D-F ALC Ø6" 0.50% L=12.05m -1.00 -1.00							
Elaboró:		RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barros					
Revisó:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano					

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1		Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
ITEM N°:		26-15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"				UND:	ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
EJE 1-3 ; A-B SOTANO EJE 2-5 ; C-G SOTANO EJE 5-8 ; D-G SOTANO 									
Elaboro:				Reviso:					
RESIDENTE DE OBRA		Arq Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENORIA		Arq Jair Lozano			


EE SAN VICENTE CONSTRUCIONES LTDA		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 5 4 2023			
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE			
ITEM N°:		26.15.7	DESCRIPCION ITEM		Tubería PVC sanitaria Ø2"		UND:	ML	
				CORTE N°:		15	FECHA :	OCTUBRE 2025	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA POZOS EYECTORES EJE 4-10; A-G 									

Elaboró:



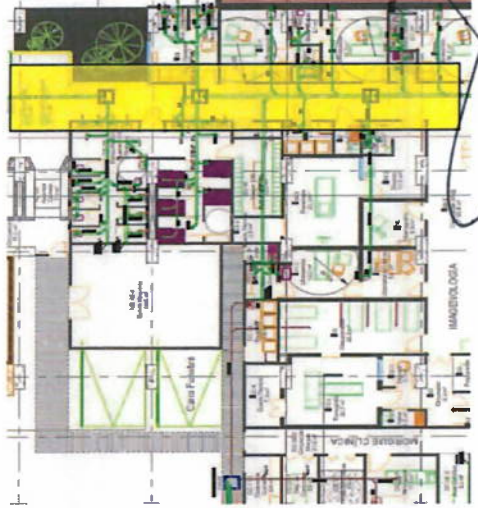
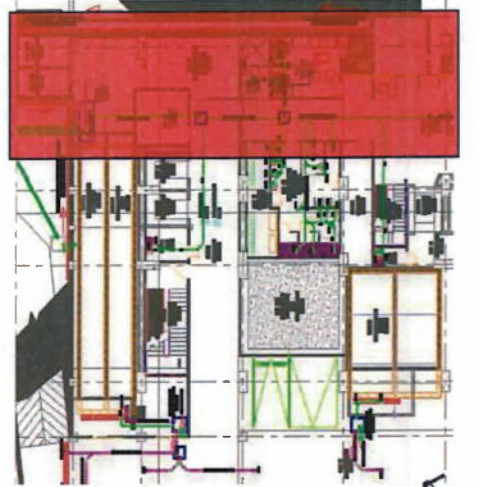

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barrios

Revisó:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lezama

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
						Código: PAFO-30	
						Versión No. 00	
						Página 1 de 1	
						5 4 2023	
						Fecha:	
CONTRATO N°:		080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.E.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	15	FECHA:
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			OCTUBRE 2025		
ITEM N°:		26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø8"			UND:
							UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
EJE 1 - 3 A-G SOTANO		EJE 3 - 6 : A-G SOTANO		EJE 6 - 10 : A-G SOTANO			
							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Arg Francisco Barrios				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg Jair Lozano			

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PAFO-30		Página: 1 de 1		2023				
SAN VICENTE		Versión No. 00		Fecha:		5 4				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:			15	FECHA :	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria 08"							
			UND:			UND:				

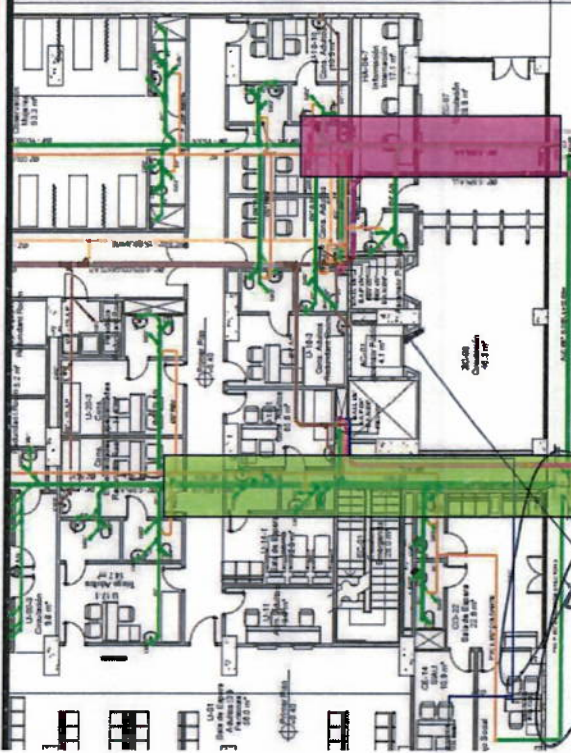
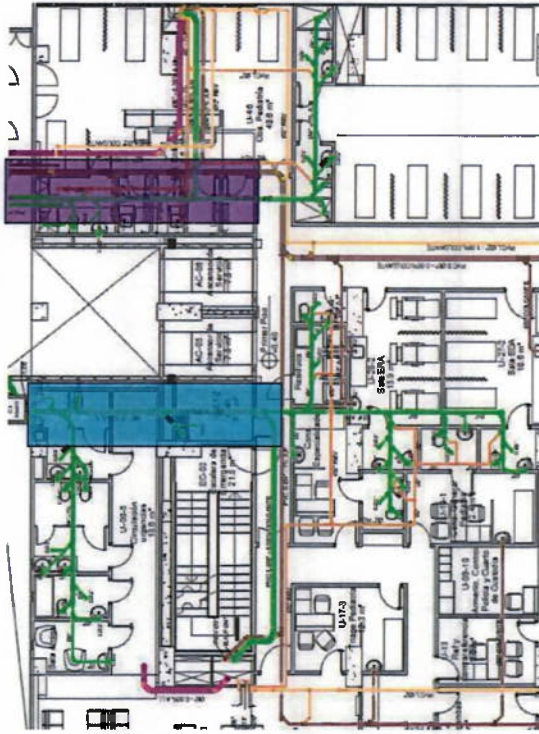
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE EJES 7-10 Y C-F

ENTRE EJE 6-10 Y E-F

ENTRE EJE 1-5 Y C-E

ENTRE EJE 1-2 Y E-F




Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE		Código: PA-FO-30			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Versión No. 00			
INTERVENTORIA:						Página 1 de 1			
ITEM N°:		25.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitarios Ø4"		Fecha: 4 2023			
				CORTE N°:		15	FECHA:		OCTUBRE 2025
						UND:		UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
EJE 6 - 10 ; A-G SOTANO EJE 3 - 6 ; A-G SOTANO EJE 1 - 3 ; A-G SOTANO EJE 6 - 10 ; A-G SOTANO EJE 3 - 6 ; A-G SOTANO EJE 1 - 3 ; A-G SOTANO									
 Elaboró:  Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Lozano									

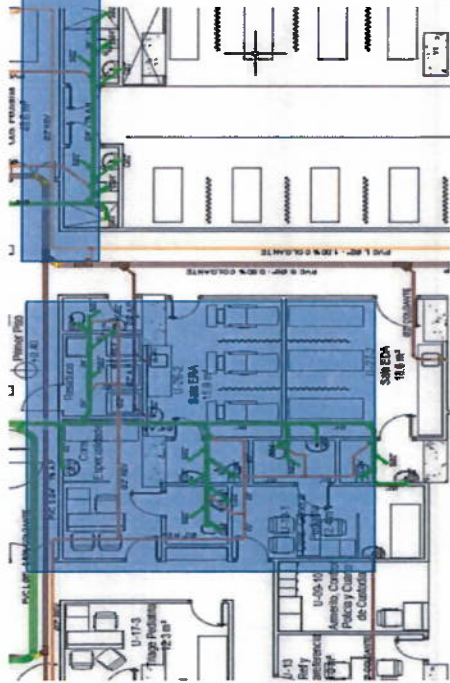
[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2023		
INTERVENTORIA:									
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PRIMER PISO

ENTRE EL 7-10 Y C-F



ENTRE EJE 6-10 Y E-F



ENTRE EJE 1-5 C-E

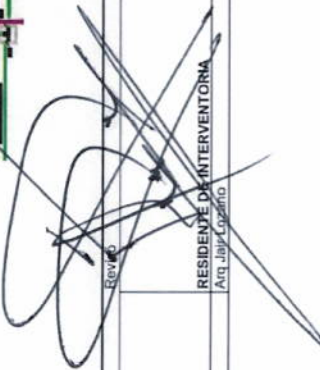
ENTRE EJE 1-5 Y E-F

Elaboró:

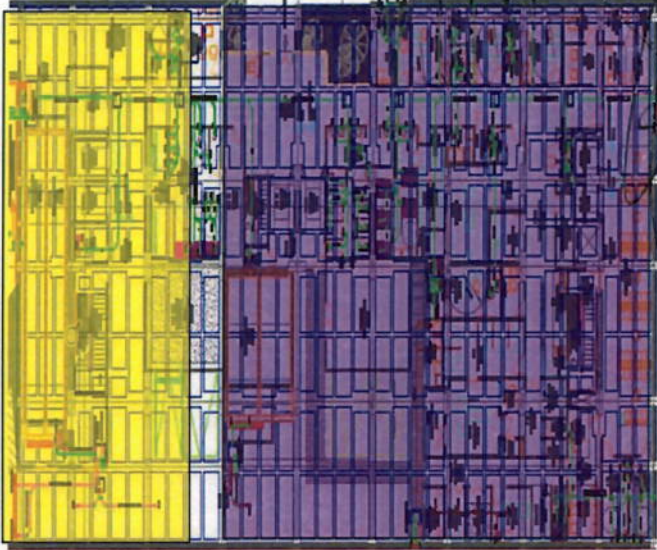



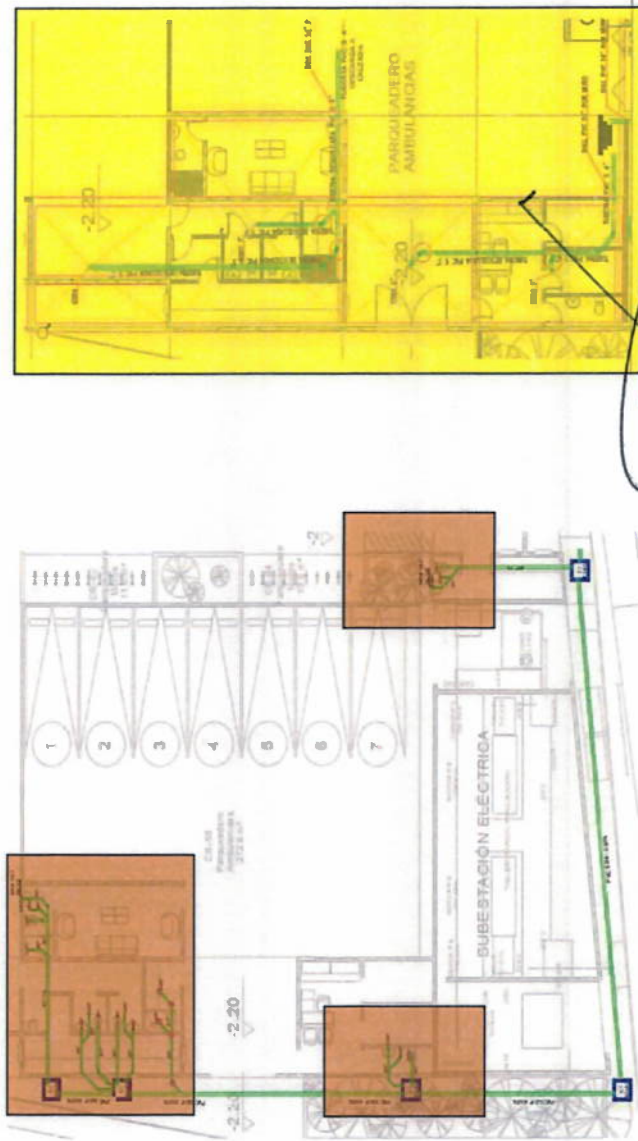

RESIDENTE DE OBRA
Arq Francisco Barros


Revisó:

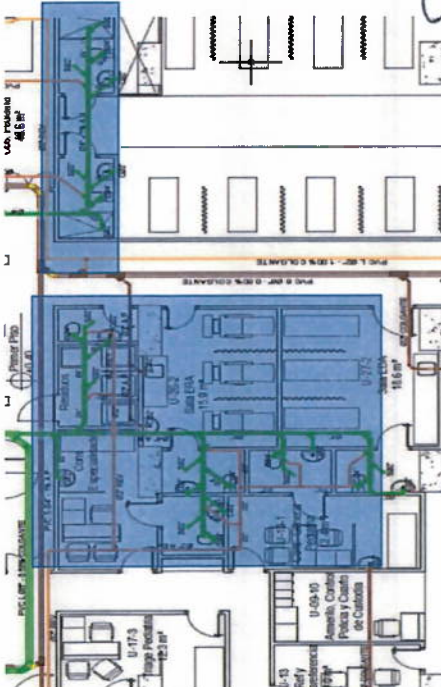



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jairo Cepeda

EJE SAN VICENTE INTERVENTOR MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código PA-FO-30 Version No. 00 Fecha Página 1 de 1 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.A.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	15	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		OCTUBRE 2025		
ITEM N°:	26.15.14	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"		
		UND:	UND		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
EJE 3 - 6 ; A-G SOTANO  EJE 6 - 10 ; A-G SOTANO					
Elaboró:  RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios					
Revisó:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano					

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		Código: PA-FO-30		Versión No. 00		Página 1 de 1	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Fecha:		5		4	
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		26.15.14		CORTE N°:		15		FECHA :	
										OCTUBRE 2025	
										UND:	
										UND:	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
											
Elaboró:											
											
RESIDENTE DE OBRA Arq. Francisco Barrios											
											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano											

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		Código PAFO-30 Versión No. 00 Fecha: 1 de 1 Página 1 de 1 5 4 2023	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
ITEM N°:		26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"		UND:	UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
EJE 1 - 3 : A-G SOTANO EJE 3 - 6 : A-G SOTANO EJE 6 - 10 : A-G SOTANO 							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano					

 SAN VICENTE CONSTRUCTORA		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					Código: PA-FO-30 Versión No.: 00 Página 1 de 1 Fecha: 5/10/2023		
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		15	FECHA:	OCTUBRE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"					UND:	UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
PRIMER PISO ENTRE EL 7-10 Y C-F  ENTRE EJE 6-10 Y E-F ENTRE EJE 1-5 C-E  ENTRE EJE 1-5 Y E-F									
Elaboró:									
									
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barríos									
Revisó:									
									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Juan Lozano									

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL								
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO N°:		15	FECHA :		OCTUBRE 2025	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		ACCESORIOS PVC Sanitaris Ø2"		UND:			UND	
ITEM N°:		26.15.15	DESCRIPCION ITEM							

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SEGUNDO PISO

ENTRE EJE 2-5 Y D-F

ENTRE EJE 6-9 Y E-F

ENTRE EJE 7-8 Y C-D

ENTRE EJE 2 Y C-D

Elaboró:



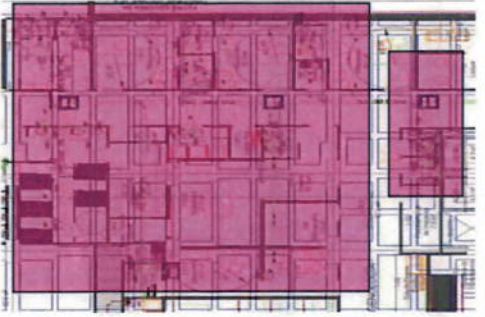
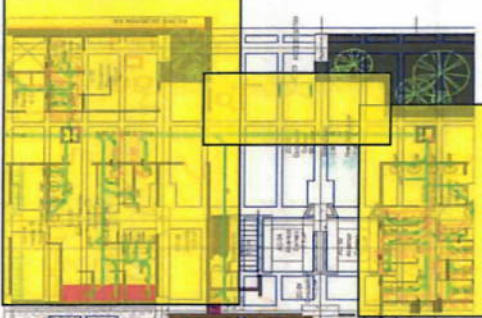
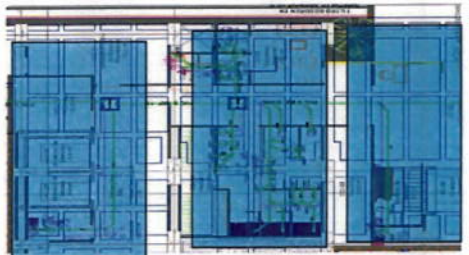

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Francisco Barrios

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Luciani

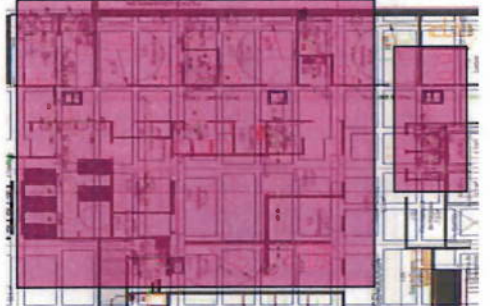
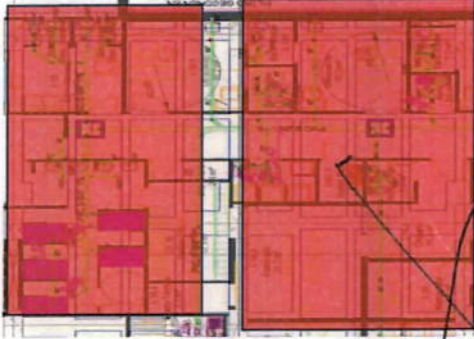
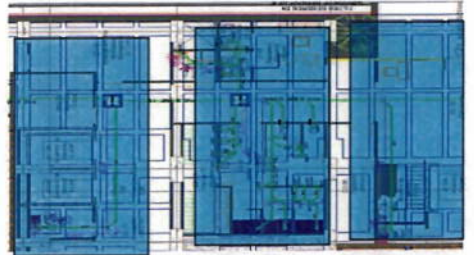
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30	
		Version No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	5 4 2023
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	15
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA :	OCTUBRE 2025
ITEM N°:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera para/trapecio Ø6"
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UNID: UND	
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PRIMER PISO ENTRE EJE 9-10 Y EJE E 5.48 ETAPA 1 PRIMER PISO		LOCALIZACION	
		ANCHO	
		PROFUNDIDAD	
		MEDIDA PARCIAL (m3)	
		N° DE ELEMENTOS	5,00
		MEDIDA TOTAL	5,00
		TOTAL PAG	5,00
Elaboró:		RESIDENTE DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA Ara Francisco Barrios		RESIDENTE DE OBRA Ara Jair Lozano	

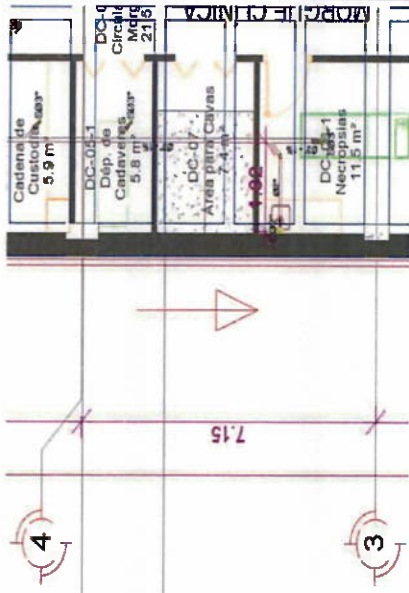

[illegible]

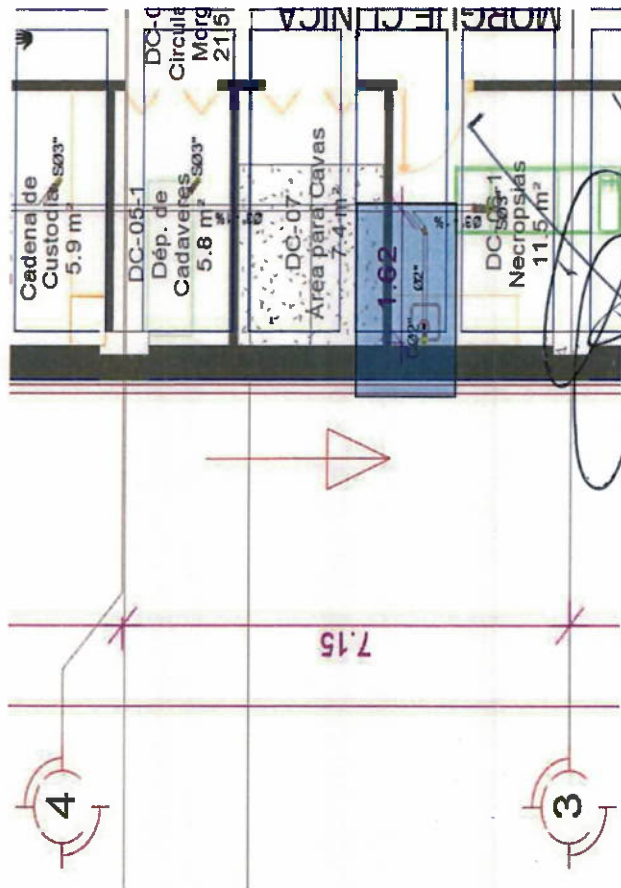
[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		080 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HULA						
CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		15	FECHA:		OCTUBRE 2025
ITEM N°:		26.15.22	DESCRIPCION ITEM		Excavación		UND:		ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA											
EJE 1-3 ; A-B  EJE 2-5; C-G  EJE 5-8; D-G  EJE 3-5; C-G  EJE 6-9; D-G 											
 Elaboro: RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrón  Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano											

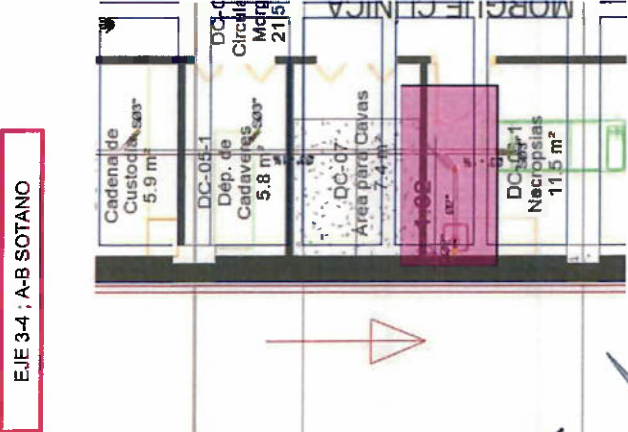
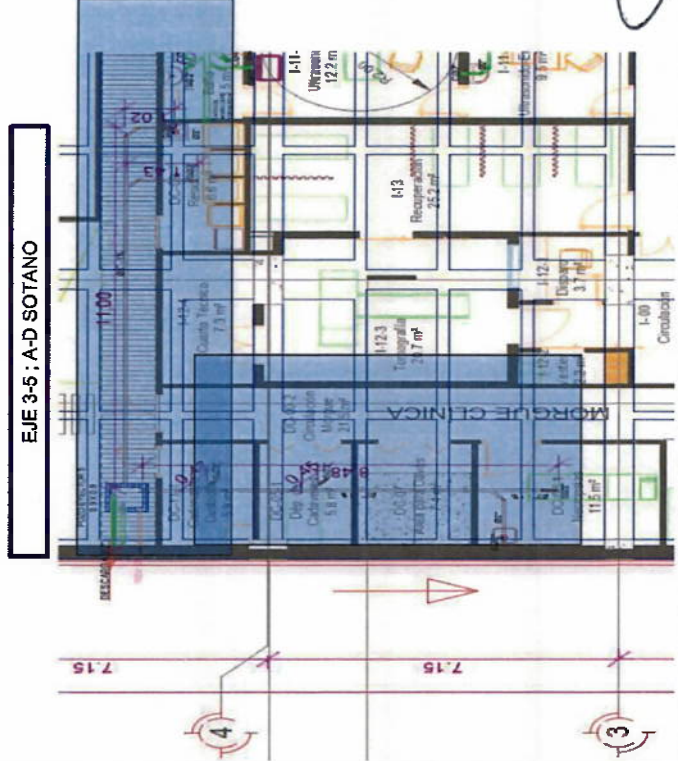
[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.B.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025
ITEM N°:		26.15.25	DESCRIPCION ITEM	Relleno y compactación.		UND:	M3
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
EJE 1-3 : A-B  EJE 2-5; C-G  EJE 5-8; D-G  EJE 3-5; C-G  EJE 6-9; D-G 							
Elaboró:				Residente de Obra		Arq Francisco Barrios	
Residente de Obra		Arq Jair Lozano		Residente de Obra		Arq Jair Lozano	

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	15	FECHA:	OCTUBRE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
INTERVENTORIA:											
ITEM N°:	26-16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"								
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			DIMENSIONES								
			LOCALIZACION		Ancho		Longitud	Profundidad	MEDIDA PARCIAL (m³)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			EJE 3-4 : A-B SOTANO				1.62				
Elaboró:  RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios  RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Cardano TOTAL PAG: 1.62											

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 5 4 2023		
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA: 15		OCTUBRE 2025
ITEM N°: 26.16.13		DESCRIPCION ITEM		ACCESORIOS PVC Sanitaria 02"		UND:		UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
EJE 3.4 : A-B SOTANO 								
Elaboró: 								
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Cárdenas								

[illegible]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión: 00 Página: 1 de 1 Fecha: 4/10/2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE		
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
CORTE N°:		15	FECHA:		OCTUBRE 2025		
ITEM N°:		26.16.21	DESCRIPCION ITEM		Cama arena base soporte tubería		
UND:		ML					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
EJE 3-4 : A-B SOTANO  EJE 3-5 : A-D SOTANO 							
Elaboró:							
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios							
Revisó:							
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jairo Lozano							

