E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 891.180.026-5

ESTADO: **Registrado**

CUENTA X PAGAR Nro. 63896

Fecha Doc Pagos: 6 de mayo de 2026 2019

Nro.Factura/Cta. Cobro: **CSV23**

Fecha Doc Invent:

A: CONSORCIO SAN VICENTE Nit/CC 901785549

DIRECCION: CR 4 2 85 ZONA INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO TELEFONO: 60887168 26 CIUDAD: NEIVA

DETALLE:

FACTURA CSV23, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL No. 17 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0194 DEL 04 DE MAYO DE 2026.

VALOR CAUSACION	729,152,698.00
- VALOR RETEFUENTE	20,832,934.00
- OTRAS RETENCIONES	67,707,037.00
- VALOR RETEIVA	0.00
- VALOR RETEICA	7,291,527.00

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
319 EDIFICACIONES	16150101		EDIFICACIONES	Debito	$ 1,041,646,711.00
302 ANTICIPO ADQUISICION DE SERVICIOS	19960402		ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	Credito	$ 312,494,013.00
914 CONTRIBUCIONES	24402301		CONTRIBUCION 5% LEY 1106 DE 2006	Credito	$ 52,082,336.00
909 RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	$ 20,832,934.00
911 RETEICA POR SERVICIOS	24362702		RETEICA POR COMPRA DE SERVICIOS	Credito	$ 7,291,527.00
128 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24402403		TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Credito	$ 15,624,701.00
TOTAL CUENTA X PAGAR	**24905501**				**$ 633,321,200.00**

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL

Codigo: 2.3.2.01.01.001.02 Valor: 729.152.698

Firma del Responsable

PAGADURIA

Cheque Nro. Electronico. Fecha 07 MAY 2026

Banco DDVA Ahorro 2019.

Firma Pagador

CONTABILIDAD

Firma contador (a)

CONTROL ADMINISTRATIVO

Subdirector administrativo

ORDENADOR DEL GASTO

Gerente

RECIBI CONFORME

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]

GARZÓN 07 05 2026 $ 633,321,200.00

CONSORCIO SAN VICENTE - Documento No.: 901785549

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL

891180026

Fecha Actual : jueves, 07 mayo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000074230

Consecutivo :	000000000074230	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/05/2026 2:37:39 p. m.	Valor :	$ 633,321,200.00
Beneficiario	901785549 CONSORCIO SAN VICENTE		
Detalle :	PAGO ACTA PARCIAL NO.17 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ES.E. PAGO RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCION NO,0194 DEL 04 DE MAYO DE 2026, FACTURA No.CSV 23.	*Numero Nota:*	0705-090

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BBVA COLOMBIA

Numero : Consignar : 05/07/2026 Impuesto X Mil : $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA AHORROS 385262019 CONSTRUCCION NUEVA TORRE HOSPITAL-	901785549	11100641	$ 0.00	$ 633,321,200.00
SERVICIOS	901785549	24905501	$ 633,321,200.00	$ 0.00

IMPUESTOS DESCONTADOS

VALOR RETEFUENTE	20,832,934.00
VALOR RETEIVA	0.00
VALOR RETEICA	7,291,527.00
VALOR OTRAS RETENC	67,707,037.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CSV23	$ 633,321,200.00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque USUARIO 1077856579 LEIDY JOHANA RAMIREZ NIÑO

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON] NIT [891180026-5]

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/May/26 15:16:45

Información del fichero

Referencia:	07/05/2026.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:		Clave:	1610
Fecha de proceso:	07/05/2026	N. Identificación:	0000008911800265
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	HOSPITAL DEPTAL SAN VICENTE DE PAUL
Cuenta a debitar:	AH - 00130385000200262019	Importe Total:	633.321.200,00
Referencia:	07/05/2026.TRA	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CONSORCIO SAN VICENTE	633.321.200,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009017855498
Nombre:	CONSORCIO SAN VICENTE	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	267877108	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PAGO ACTA 17 DEL CONTRATO 090 DE 2024	Concepto 2:	

E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL DEPTAL SAN VICENTE DE PAUL
891180026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Nro 1445

SECCIÓN:	0041	REGIONAL 8000	AÑO FISCAL:	2026
UNIDAD EJECUTORA:	29	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	ESTADO:	Confirmado

FECHA DISPONIBILIDAD: 6 de mayo de 2026 VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
C	2.3.2.01.01.001.02.08.10	1.2.3.3.10	CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS MINISTERIO	729,152,698.00	0.00	0.00	729,152,698.00
						TOTAL:	**729,152,698.00**

OBJETO CDP : CUENTAS POR PAGAR 2025 - FACTURA CSV23, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL No. 17 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO.

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad Usuario: 55070187

E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL DEPTAL SAN VICENTE DE PAUL

891180026

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Nro 1418

Estado: Confirmado

Fecha : 06/05/2026

Tercero: 901785549 CONSORCIO SAN VICENTE

Documento: Contrato CSV23

Detalle : CUENTAS POR PAGAR 2025 - FACTURA CSV23, VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL No. 17 PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA" DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. RECONOCIDO MEDIANTE RESOLUCION No. 0194 DEL 04 DE MAYO DE 2026.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
1445	2.3.2.01.01.001.02.08.10	CUENTAS POR PAGAR - RECURSOS MINISTERIO	1.2.3.3.10 - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FONDOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	C - INVERSION	729,152,698.00	0.00	0.00	729,152,698.00
				Total Compromiso :	**729,152,698.00**			**729,152,698.00**

Usuario: 55070187

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

SAN VICENTE
CONSORCIO

CONSORCIO SAN VICENTE
NIT 901.785.549-8
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO
Tel: (608) 716826
Neiva - Colombia
consorciosanvicente2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSV 23

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON - HUILA		
NIT	891.180.026-5	**Teléfono**	(608) 8332441
Dirección	Calle 7 14-69	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 11:26
Expedición	29/04/2026, 11:26
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE	1.00	801,266,700.77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	801,266,700.77
Administración 22.00%	176,278,674.17
Imprevistos 3.00%	24,038,001.02
Utilidad 5.00%	40,063,335.04
Total a Pagar	1,041,646,711.00

Valor en Letras:

Mil cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos once pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 1,041,646,711.00

Observaciones:

CORTE PARCIAL DE OBRA No 17 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA"
AMORTIZACION ANTICIPO 30% : $ 312.494.013

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070848973 aprobado en 20240517 prefijo CSV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 0ebd3eeed1b46bfd882b7d403aecf08537bed8fc716438baf1d595b82f57279d8864e87b69627bc93d1e3287d7d09f56

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CUMPLIDO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

El suscrito Ing. Argelio Cerquera Araujo identificado con cedula de ciudadania No. 83.238.102 de Yaguara/Huila, en calidad de representante legal del Consorcio **INTERCONSTRUCTORES**, identificado con Nit 901.785.559-1, en desarrollo del contrato de interventoria 091 de 2024, cuyo objeto es: "*Realizar interventoría integral, técnica, administrativa, financiera y ambiental, al contrato de obra que tiene por objeto "construcción de la nueva e.s.e. hospital departamental san vicente de paul del municipio de Garzón- Huila",*se permite **CERTIFICAR**, que:

El contratista **CONSORCIO SAN VICENTE**, identificado con Nit. No. 901.785.549-8, quien ejecuta el contrato de obra 090 de 2024, cuyo objeto es: "Construcción de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul - HDSVP de Garzón/Huila", ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes de parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual **AUTORIZA** el pago de las cantidades de obra y valores ejecutados en el corte de obra **No.17**, que contiene del 1 diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026; por un valor de ***MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.041.646.711)***; los cuales se detallan a continuación:

Concepto	Tipo	Valor
Anticipo de Obra	Obra Civil	$ 26.069.740.423
Acta de Obra N.17	**Obra Civil**	**$ 1.041.646.711**
Amortizacion Anticipo	Obra Civil	$ 312.494.013
Amortizacion Acumulada	Obra Civil	$ 8.195.983.528
Total Acta de corte N.17		**$ 1.041.646.711**

Por lo anterior la Interventoria **AUTORIZA**:

1. Amortizar del **Acta de Corte N.17,** la cual se aprueba por un valor de ***MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.041.646.711)***; el valor equivalente al ***30%*** de la misma, el cual corresponde a ***TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS M/CTE ($312.494.013).***

2. Se autoriza de acuerdo con lo anterior, pago al contratista, por el valor del **Acta de Corte N.17,** correspondiente al mes de diciembre de 2025, menos el valor de la amortización, de ***SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO***

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($729.152.698).

3. Así mismo, se certifica que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el Corte de obra **No.17**, fueron medidos y verificados en su totalidad por interventoría

4. En el mismo sentido se avala que el contratista de obra ha cumplido con las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas descritas en la minuta del contrato 090 de 2024.

La presente certificación se expide en el Municipio de Garzón /Huila, a los dos (2) días, del mes de marzo de 2026.

R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL DE OBRA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL:** _____ **PARCIAL: X No.:17**				
CONTRATO DE:	**OBRA**	**N°:**	**090**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO SAN VICENTE		
	NIT O CC:	901.785.549-8		
	DIRECCIÓN:	CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 VIA PALERMO	**TEL.**	8716826
	CIUDAD:	PALERMO - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA		
	CC:	7.711.612 de Neiva-Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SPGR No 224 RP No 557 - E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE			
CUENTA BANCARIA	N°: 267877108 Tipo de Cuenta: CORRIENTE Banco: BANCO DE OCCIDENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 86.899.134.742			
	Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.			
VALOR ADICIONAL	**N°2**	N.A.		
VALOR TOTAL	OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte. ($ 86.899.134.742)			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	**N°1**	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TREINTA (30) MESES			
FECHA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**N.A.**			
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2 MARZO DE 2026			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	01 DE DICIEMBRE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.			

PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO SAN VICENTE
	NOMBRE	ARGELIO CERQUERA ARAUJO
	EN CALIDAD DE	R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
	NOMBRE:	MARIA ISABEL MEDINA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2. ANEXO FINACIERO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Numero de contrato	090 de 2024
Contratista	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit contratista	901785549-8
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 090 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON - HUILA Y EL CONSORCIO SAN VICENTE
Fecha de suscripción del contrato	ENERO 4 DE 2024
Plazo de ejecución del contrato	30 meses
Fecha de inicio del contrato	MARZO 20 DE 2024
Valor del contrato	$ 86.899.134.742,00
Interventor	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor total del contrato	$	86,899,134,742
Valor pagado en calidad de anticipo	$	26,069,740,422
Valor pagado o causado a la fecha Acta #1	$	208,905,712
Valor pagado o causado a la fecha Acta #2	$	719,606,764
Valor pagado o causado a la fecha Acta #3	$	882,800,683
Valor pagado o causado a la fecha Acta #4	$	390,626,459
Valor pagado o causado a la fecha Acta #5	$	137,838,998
Valor pagado o causado a la fecha Acta #6	$	2.763,579,997
Valor pagado o causado a la fecha Acta #7	$	1.413,817,258
Valor pagado o causado a la fecha Acta #8	$	2.615,751,987
Valor pagado o causado a la fecha Acta #9	$	1.992,727,752
Valor pagado o causado a la fecha Acta #10	$	2.616,459,112
Valor pagado o causado a la fecha Acta #11	$	2.096.315.525
Valor pagado o causado a la fecha Acta #12	$	2.051.064.523
Valor pagado o causado a la fecha Acta #13	$	1.783.406.850
Valor pagado o causado a la fecha Acta #14	$	1.963.166.988

Valor pagado o causado a la fecha Acta # 15	$	3.332.738.472
Valor pagado o causado a la fecha Acta # 16	$	1.309.491.301
Valor acta periodo certificado Acta # 17	$	1.041.646.711
Amortización del anticipo	$	312.494.013
Valor final acta periodo certificado	$	729.152.698
Retención de garantia 10%	$	104.164.671
Valor Neto a pagar	$	624.988.027
Saldo por ejecutar del contrato	$	41.705.432.755

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO SAN VICENTE contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, para constancia adjunto al presente documento se entregan certificados de cumplimiento de aportes.

PLANILLA No. 9497761328 APORTES EN LINEA - CONSORCIO SAN VICENTE		
Total, planilla mes diciembre 2025	Pensión 16%	$ 29.574.400,00
	ARL 6,96%	$ 12.375.100,00
	CCF	$ 7.190.900,00
	Salud 12,5%	$ 7.264.400,00
TOTAL	**$ 56.404.800,00**	

PLANILLA No. 9499634182 APORTES EN LINEA - CONSORCIO SAN VICENTE		
Total, planilla mes enero 2026	Pensión 16%	$ 27.993.400,00
	ARL 6,96%	$ 11.585.600,00
	CCF	$ 6.704.700,00
	Salud 12,5%	$ 6.837.100,00
TOTAL	**$ 53.120.800,00**	

PLANILLA No. 9501416497 APORTES EN LINEA - CONSORCIO SAN VICENTE		
Total, planilla mes febrero 2026	Pensión 16%	$ 27.570.100,00
	ARL 6,96%	$ 11.172.800,00
	CCF	$ 6.819.000,00
	Salud 12,5%	$ 6.798.400,00
TOTAL	**$ 52.360.300,00**	

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizan el siguiente pago: **Acta Parcial No. 17** por un valor de ***MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.041.646.711)***, sin amortizar anticipo; el valor a amortizar del anticipo son ***TRESCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS M/CTE ($312.494.013)***; Una vez amortizado el anticipo el valor neto a pagar son ***SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO***

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($729.152.698).

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 17 (Del 1 de diciembre 2025 al 28 de febrero 2026).

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
R.L CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA

ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
INTERVENTORIA

MARIA ISABEL MEDINA OSORIO
SUPERVISORA

JONATHAN GOMEZ HERNANDEZ
R.L EL VERGEL INGENIERIA S.A.S
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

RESOLUCIÓN No. 0194 DE 2026
(04 de mayo de 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL N°17 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 090 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN Y EL CONSORCIO SAN VICENTE"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la ley 10 del 10 de enero de 1990, y sus decretos reglamentarios, y constitucionales legales, estatutarias y administrativas, y

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007 determina que, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

2. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, es una entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993; la cual presta servicios de salud a la población que lo requiera; la cual además se rige en materia de contratación por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

3. Que mediante la Resolución 1440 de 2024, el Ministerio de Salud estableció nuevos lineamientos para actualizar y fortalecer los mecanismos de contratación dentro de las Empresas Sociales del Estado. Esta resolución tiene como objetivo mejorar los procesos de contratación en aspectos como la sostenibilidad financiera, el uso eficiente de los recursos públicos y el control riguroso de la ejecución contractual.

4. Que el artículo 4 del Acuerdo No. 016 de 2024 – Estatuto de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, establece que la actividad contractual de la entidad buscará el cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo.

5. Que la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN procedió a realizar la Convocatoria Pública No.003 del 2023, en virtud de la cual una vez culminado el proceso de selección, suscribió el contrato de obra pública No. 090 el 04 de enero de 2024, con el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, cuyo objeto es la "*Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón- Huila*", por valor total de **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. Iva Incluido ($86.899.134.742)**, y con un plazo de ejecución de treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. Que la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024, determina como forma de pago que el contratante cancelará al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobados por el interventor y el supervisor, de acuerdo con el avance de obra y el suministro de equipos hasta el noventa y cinco por ciento 95% previa amortización del anticipo en igual proporción al porcentaje pagado.

Vigilado Supersalud

Calle 7 #14-69 - https://portal.hospitalsvpgarzon.gov.co/
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co, calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co

7. Que adicionalmente, el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato de obra pública, reseña que para efectos de los pagos, el contratista debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social; y el parágrafo segundo de la misma, establece que para los mismos efectos, aquel deberá aportar un informe firmado por el interventor que contenga el valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar, sustentando con memorias de cantidades de obras detalladas con los respectivos esquemas y planos de ubicación, aprobados por la interventoría y la supervisión; porcentaje de ejecución física a la fecha; informe de ejecución, avance y estado de la obra con registro fotográfico; el plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones del contrato; vigencias de las garantías de contrato; constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales; cumplimiento de las obligaciones del contrato; la descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de obra; equipos y personal utilizado durante el periodo de la obra; el valor a pagar con el acta de recibo parcial del contrato de obra (con su respectivo informe de avance).

8. Que el parágrafo cuarto de la cláusula quinta del contrato de obra pública, consagra que los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el interventor y el supervisor, cuyo valor corresponderá al resultado multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.

9. Que el Consorcio San Vicente, identificado con NIT 901.785.549-8, presentó cuenta de cobro a la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón por el anticipo correspondiente al 30% del valor del Contrato de Obra No. 090 de 2024, trámite que fue avalado por la interventoría mediante el Oficio ICHDSV-27-2024 y certificado por el Supervisor del Contrato el 9 de abril de 2024, quien verificó que se cumplió con la documentación requerida, incluyendo el visto bueno del Profesional Universitario Almacén; en consecuencia, el pago del anticipo fue girado el 18 de abril de 2024.

10. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 2 y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°001 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($208.905.712.60) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($146.233.999). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0868 del 17 de octubre de 2024.

11. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura CSV No. 3 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No.002 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($719.606.482.40) correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($503.721.537.40) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0916 del 08 de noviembre de 2024.

12. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 6 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 003 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

Vigilado Supersalud

Calle 7 #14-69 - https://portal.hospitalsvpgarzon.gov.co/
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co, calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co

TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. ($882.800.683.70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($617 960.479) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0971 del 05 de diciembre de 2024.

13. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 5 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 004 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($390.626.458.30)., correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($273.438.521), Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión y autorizado mediante la Resolución 0995 del 17 de diciembre de 2024.

14. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 7 y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 005 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. ($137.838.998.70), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($96.487.299,00). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 1014 del 26 de diciembre de 2024.

15. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No CSV 8 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°006 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($2.763.579.997,10), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.934.505.998,00) Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0150 del 21 de marzo de 2025.

16. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 9 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 007 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($1.413.817.258,10), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($989.672.080,00). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el

Vigilado Supersalud

visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0290 del 16 de mayo de 2025.

17. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 10 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 008 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($2.615.751.986 90), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1.831.026.391). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0416 del 11 de julio de 2025.

18. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 11 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°009 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($1.992.727.752,60), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($1.394.909.427). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0428 del 21 de julio de 2025.

19. Que luego, el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 12 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°010 (comprende el periodo del 01 al 31 de mayo de 2025) a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($2.616.459.111,50), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.831.521.378).Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0485 del 05 de agosto de 2025.

20. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 13 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 011 del periodo del 01 al 30 de junio de 2025 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. ($2.096.315.525,20), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.467.420.868). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0545 del 28 de agosto de 2025.

21. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 15 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA N°012 de fecha 16 de septiembre del 2025, la cual comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de DOS

Vigilado Supersalud

MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.051.064.523), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.435.745.166). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0600 del 24 de septiembre de 2025.

22. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con Nit 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 17 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 013 en "octubre del 2025", la cual comprende el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($1.783.406.850), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.248.384.795). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0650 del 10 de octubre de 2025.

23. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con NIT 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 18 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 014 que comprende del 01 al 30 de septiembre del 2025 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.963.166.988), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.374.216.892). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0726 del 19 de noviembre de 2025.

24. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con NIT 901.785.549-8 presentó factura No. CSV 19 Y el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 015 que comprende el 02 al 31 de octubre del 2025 a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN por valor de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.332.738.472,), correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024. De dicho valor, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto a pagar DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($2.332.916.930). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0790 del 22 de diciembre de 2025.

25. Que el CONSORCIO SAN VICENTE con NIT 901.785.549-8 presentó las facturas No. CSV 20 de fecha del 23 de enero de 2026 por valor QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/cte. (559.652.314,oo), y CSV 22 de fecha 27 de enero de 2026, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/cte ($749.838.987,oo); además se suscribió el acta parcial No. 016 correspondiente a un pago parcial del Contrato de Obra No. 090 de 2024, la cual comprendió el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025. De dichos valores, se descontó el 30% para la amortización del anticipo, según lo establecido en la cláusula quinta del contrato, resultando un total neto

Vigilado Supersalud

a pagar NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/cte ($916.643.911,oo). Este pago fue avalado y aprobado por la interventoría, contando con el visto bueno del supervisor y el apoyo técnico a la supervisión, y autorizado mediante la Resolución 0062 del 11 de febrero del 2026.

26. Que posteriormente, el CONSORCIO SAN VICENTE identificado con NIT 901.785.549-8, junto con el interventor de la obra CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES, el apoyo técnico a la supervisión VERGEL INGENIERÍA S.A.S y la supervisora de la interventoría; suscribieron el 02 de marzo del 2026 el ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 017, el cual comprende el periodo del 01 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra pública No. 090 del 2024.

27. Que el CONSORCIO SAN VICENTE mediante factura electrónica de venta No. CSV 23 de fecha 29 de abril de 2026, presentó para pago de avance del contrato de obra, por valor MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/cte. (1.041.646.711,oo).

28. Que una vez cumplidos los requisitos antes expuestos por parte del contratista y conforme al ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 017 del 02 de marzo de 2026, la Entidad autoriza el pago por concepto de pago parcial del contrato de obra pública No. 090 del 2024, por la suma de MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/cte. (1.041.646.711,oo). de los cuales se descontará el 30% para amortización del anticipo de acuerdo con la cláusula quinta del mismo, para un neto de SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte ($729.152.698,oo).

29. Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: **Reconocer a favor del CONSORCIO SAN VICENTE** con NIT 901.785.549-8, la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte ($729.152.698,oo)**, en calidad de pago parcial No. 17 del contrato de obra pública No. 090 de 2024, menos retenciones de ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: **Autorizar** al Pagador de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, para que con cargo a los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución No. 2386 de 2021, pague y transfiera el reconocimiento hecho en el artículo anterior, a la cuenta corriente No. 267877108 del banco de Occidente de propiedad del CONSORCIO SAN VICENTE NIT 901.785.549-8.

Dada en Garzón, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DANIEL MAZABEL CÓRDOBA
Gerente

04/05/2026
Revisó texto legal LFC [redacted]@gmail.com
Asesoría Jurídica Externa

Vigilado Supersalud

Calle 7 #14-69 - https://portal.hospitalsvpgarzon.gov.co/
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co, calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
"UN FUTURO QUE CONSTRUIMOS TODOS"

ACTA PARCIAL DE OBRA # 17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN									ACTA DE PAGO No:	20 Y 21
CONTRATISTA: CONSORCIO									PLAZO:	18 MESES
CONTRATISTA DE OBRA:									FECHA DE TERMINACIÓN:	19-sep-25
CONTRATISTA DE OBRA:									FECHA DEL ACTA:	DICIEMBRE 2024 - FEBRERO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA:									PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE AC:	1,33%
INTERVENTORIA DE OBRA:									PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	73,44%
SUPERVISIÓN:									PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR:	26,56%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 17

PERIODO: DICIEMBRE 2024 - FEBRERO 2025

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MAYORES Y MENORES #61			ACUMULADO PARCIAL		PRESENTE PERIODO CORTE # 17		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANC
1	PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES TECNICOS														
1.1	PRELIMINARES DE OBRA EN LOTE PARAMENTADO														
1.1.1	LOCALIZACION Y TRAZADO														
1.1.1.1	Localización y replanteo	M2	344,00	$ 3.109,00	$ 1.069.496	1.010,00	$ 3.109,00	$ 4.075.490	313,73	$ 975.618,00			313,73	$ 1.069.496,00	26,10%
1.1.1.2	Demolición y limpieza	M2	171,00	$ 7.467,00	$ 1.276.737	1.010,00	$ 7.467,00	$ 11.542.464	313,73	$ 2.342.373,00			313,73	$ 2.342.373,00	20,31%
1.1.2	DEMOLICIONES PARCIALES EN LOTE PARAMENTADO														
1.1.2.1	DEMOLICION Y RETIRO DE ENTRE PARAMENTADO														
1.2.1.1	Demolición estructura existente (Muro, cerramen, placas aéreas, etc...) y retiro de elementos existentes (Puertas, ventanas etc.) incluye cargue y retiro de escombros (viaje a 5km)	M2	84,00	$ 34.007,00	$ 2.855.588	388,24	$ 34.007,00	$ 13.202.136	271,60	$ 9.235.745,00			271,60	$ 9.235.745,00	57,63%
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
1.2.1	EXCAVACIONES														
1.2.1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue mecanico y retiro del material excavado a botaderos) viaje a 5km.	M3	53,00	$ 22.996,00	$ 1.171.896	1.209,00	$ 22.996,00	$ 27.800.732	388,22	$ 8.927.912,00			388,22	$ 8.927.912,00	31,98%
1.2.1.2	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue manual y retiro del material excavado a botaderos) viaje a 5km	M3	102,00	$ 85.938,00	$ 8.765.676	102,00	$ 85.938,00	$ 8.765.676	34,19	$ 2.939.099,00			34,19	$ 2.939.099,00	34,19%
1.2.2	RELLENO														
1.2.2.1	Suministro granular B-200 m	M3	39,00	$ 109.000,00	$ 4.485.732	219,00	$ 109.000,00	$ 23.847.420	219,40	$ 23.920.600,00			219,40	$ 23.920.600,00	99,85%
1.4	CIMENTACION														
1.4.1	PILAS DE PENDULA														
1.4.1.1	Base de Neopreno #18 con Concreto 3000 PSI	M3	19,00	$ 30.000,00	$ 2.004.432	100,00	$ 30.000,00	$ 3.000.000	67,00	$ 6.020.000,00			67,00	$ 6.020.000,00	67,00%
1.4.3	JUNTAS Y VIAS DE CONVERSION														
1.4.3.1	Gaviña	M3	73,00	$ 1.119.567,00	$ 14.341.731	77,00	$ 1.119.567,00	$ 23.248.750	12,80	$ 14.812.139,00			12,80	$ 14.812.139,00	63,71%
1.4.3.2	Agua de conservación sobre terreno	M3	21,00	$ 1.000.000,00	$ 46.241.731	46,24	$ 1.000.000,00	$ 44.425.763	31,20	$ 31.121.000,00			31,20	$ 31.121.000,00	70,07%
1.4.4	PLACA DE CONTRAPISO Y PLACA DE ENTREPISO														
1.4.4.1	Placa de 0.15 espesor de 12 mm con polipropileno	M2	203,00	$ 107.747,00	$ 21.870.429	1.367,74	$ 107.747,00	$ 147.381.181	200,00	$ 21.549.400,00			200,00	$ 21.549.400,00	27,73%
1.4.4.3	Placa placa Aligerada Concreto 4000 PSI	M2	203,00	$ 481.574,00	$ 108.922.594	400,00	$ 481.574,00	$ 172.629.600	272,00	$ 144.000.000,00	72,40	$ 34.850.400,00	272,00	$ 144.000.000,00	83,41%
1.4.4.3	Juntas de contracción	ML	1044,00	$ 37.358,00	$ 7.745.501	750,00	$ 37.358,00	$ 7.745.501	50,00	$ 1.867.900,00			50,00	$ 1.867.900,00	12,05%
1.4.5	TANQUE														
1.4.5.1	Muros, placa para tanque	M3	86,00	$ 2.220.467,00	$ 144.576.315,00	64,84	$ 2.220.467,00	$ 172.696.157,00	48,00	$ 106.582.416,00			48,00	$ 106.582.416,00	73,73%
1.5	ESTRUCTURA														
1.5.1	COLUMNAS Y MUROS														
1.5.1.1	Columnas en concreto	M3	0,00	$ 3.350.000,00	$ 10.700.000	10,00	$ 3.350.000,00	$ 33.500.000	6,00	$ 21.267.000,00			6,00	$ 21.267.000,00	63,50%
1.6	ENTREPISOS														
1.6.1	SUPERESTRUCTURA ALTURAS Y ESCALERAS														
1.6.1.1	Viga de Amarre de concreto para Muro de Contención	M3	616,00	$ 123.600,00	$ 21.511.200	615,00	$ 123.600,00	$ 131.001.900	371,00	$ 46.000.000,00			371,00	$ 46.000.000,00	35,01%
1.6.2	SUPERESTRUCTURA ESTRUCTURAS														
1.6.2.2	Escalera en concreto para Muro de Contención	M3	0,00	$ 1.540.000,00	$ 3.130.200	0,00	$ 1.540.000,00	$ 3.130.200	2,40	$ 3.700.000,00			2,40	$ 3.700.000,00	67,50%
1.8	PISOTES														
1.8.1	PISOTES INTERIORES														
1.8.1.1	Relleno interior Pisotones	M3	946,00	$ 30.000,00	$ 28.380.480,00	946,00	$ 30.000,00	$ 28.380.480	130,00	$ 4.000.000,00	130,00	$ 4.000.000,00	130,00	$ 4.000.000,00	20,11%
1.8.3	PISOTES EXTERIORES														
1.8.3.1	Pisotes exterior Muro Frontal	M3	320,00	$ 40.000,00	$ 21.900.000,00	320,00	$ 40.000,00	$ 40.000.000,00	320,00	$ 11.000.000,00	320,00	$ 11.000.000,00	320,00	$ 11.000.000,00	55,00%
1.8.3.2	Pisotes exterior Muro Lateral	M3	197,00	$ 22.000,00	$ 1.400.000,00	197,00	$ 22.000,00	$ 2.400.000,00	131,00	$ 2.000.000,00	131,00	$ 2.000.000,00	131,00	$ 2.000.000,00	83,33%
1.8.4	PILAS DENTELLON PARAPETO														
1.8.4.1	Pilas sencillas parapeto	M3	90,00	$ 15.000,00	$ 700.000,00	90,00	$ 15.000,00	$ 700.000,00	90,00	$ 700.000,00	90,00	$ 700.000,00	90,00	$ 700.000,00	100,00%
1.8.5	PISOS EN CONCRETO														
1.8.5.1	Piso en concreto endurecido superficialmente, terminado, (incluye refuerzo)	M2	249,00	$ 69.345,00	$ 17.267.981	1.367,74	$ 69.345,00	$ 94.840.909	276,47	$ 19.173.674,00			276,47	$ 19.173.674,00	20,21%
2	MAMPOSTERIA PRETENSADA														
2.1	LEVANTAMIENTO PRELIMINAR														
2.1.1	Levantamiento preliminar muro bloque h=2.10 m	ML	173,00	$ 347.220,00	$ 60.107.000	370,00	$ 347.220,00	$ 128.481.000	330,00	$ 114.600.000,00			330,00	$ 114.600.000,00	89,20%
2.1.2	Puesta en obra concreto 3.000 psi m3	UND	1,00	$ 1.822.429,00	$ 1.822.429	1,00	$ 1.822.429,00	$ 1.822.429	0,00	$ 1.822.429,00	0,00	$ 1.822.429,00	0,00	$ 1.822.429,00	100,00%
2.2	MUROS EN MAMPOSTERIA CONFINADA														
2.2.1	Cerramiento de mampostería y Muro de arquitectura sin pega con bocadillo, con base superior de arquitectura, para prevención de robo.	M2	237,00	$ 312.708,00	$ 74.111.796	240,00	$ 312.708,00	$ 75.049.920	176,70	$ 55.265.223,00			176,70	$ 55.265.223,00	73,79%
2.3	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS														
2.3.1	Demolición estructura existente (Muro, cerramen, placas aéreas, etc...) y retiro de elementos existentes (Puertas, ventanas etc.) incluye cargue y retiro de escombros (viaje a 5km)	M2	616,00	$ 34.007,00	$ 20.955.312	2.434,25	$ 34.007,00	$ 82.780.000	2.399,20	$ 82.642.150,00			2.399,20	$ 82.642.150,00	99,81%
3	VALLADAS Y REJAS DE CONTENCION														
3.1	EXCAVACION DE CIMIENTOS														
3.1.1	Excavacion en placa de zampeados existente. Para excavacion y proceso constructivo de pilotes.	M2	80,00	$ 34.007,00	$ 1.022.210	2.098,89	$ 34.007,00	$ 40.887.330	2.040,00	$ 69.340.314,00			2.040,00	$ 69.340.314,00	98,20%
3.2	PROCESOS														
3.2.1	Pilotaje pilotes Dm1.0 en concreto para de agua como fuente	M3	36,00	$ 4.477.363,00	$ 1.207.988.480	240,00	$ 4.477.363,00	$ 1.740.128.000	348,00	$ 1.738.000.000,00			348,00	$ 1.738.000.000,00	99,88%
3.2.2	Muro de contención	M3	540,00	$ 3.979.278,00	$ 325.000.000	240,00	$ 3.512.278,00	$ 839.805.000	108,00	$ 401.116.444,00			108,00	$ 401.116.444,00	47,75%
3.2.3	Pavimentos de pilotes (incluye cargue y retiro)	M3	2500	$ 134.873,00	$ 5.000.000	25,00	$ 134.873,00	$ 3.371.825	19,00	$ 2.564.000,00			19,00	$ 2.564.000,00	82,00%
4	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
4.1	EXCAVACIONES Y RETIRO														
4.1.1	Localizacion y replanteo	M2	11.500,00	$ 3.109,00	$ 37.115.954	16.367,74	$ 3.109,00	$ 50.888.114	4.011,00	$ 12.471.099,00			4.011,00	$ 12.471.099,00	25,02%
4.2	EXCAVACIONES														
4.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue mecanico y retiro del material excavado a botaderos) viaje a 5km.	M3	6.736,00	$ 22.996,00	$ 193.021.600	8.409,00	$ 22.996,00	$ 193.000.944	6911,34	$ 152.710.418,00			6911,34	$ 152.710.418,00	79,12%
4.2.2	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue manual y retiro del material excavado a botaderos) viaje a 5km	M3	1.021,00	$ 85.134,00	$ 78.935.814	919,00	$ 85.134,00	$ 80.181.817	454,70	$ 41.888.597,00			454,70	$ 41.888.597,00	56,46%
4.2.3	Protección de talud en morteros (cemento gris y gravilla)	M2	437,00	$ 37.358,00	$ 16.328.346	943,00	$ 37.358,00	$ 35.888.600	291,00	$ 10.748.727,00			291,00	$ 10.748.727,00	30,40%
4.3	RELLENO														
4.3.1	Sub-base granular W=0 m	M3	936,00	$ 109.000,00	$ 93.575.010	1.107,00	$ 109.000,00	$ 106.000.000	521,00	$ 45.807.000,00			521,00	$ 45.807.000,00	37,57%

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MAYORES Y MENORES #01			ACUMULADO PARCIAL			PRESENTE PERIODO CORTE # 17			ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	% INCID
1.	CIMENTACION																
1.1	BASE DE LIMPIEZA																
1.1.1	Base de limpieza e=5 cm, Concreto 2000 PSI	M2	2.200,00	$ 38.447,20	$ 84.583.840	718,47	$ 29.430,00	$ 21.146.468	1000,00	$ 19.740.000,00					1000,00	$ 19.740.000,00	100,00%
1.2	ANCLA Y viaje DE CIMENTACION																
1.2.1	Viga de amarre/cinta sobre terreno, Concreto 4000 PSI	M3	661,00	$ 1.907.733,00	$ 1.260.729.513	755,01	$ 1.907.733,00	$ 1.440.316.917	755,01	$ 1.125.353.000,00					755,01	$ 1.125.353.000,00	57,01%
1.3	PLACA DE CONTRAPISO																
1.3.1.3	Placa de contrapiso de 20 cm con sobreancho Concreto 4000 PSI CON REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL DE ALMACEN			$ 372.631,20		1.960,86	$ 372.631,20	$ 1.103.107.232	1972,20	$ 1.095.360.000,00					1972,20	$ 1.095.360.000,00	57,01%
1.4	TANQUE																
1.4.1	Viguea, placa para tanque Concreto 4000 PSI	M3	210,00	$ 2.208.713,00	$ 467.806.736	210,00	$ 2.208.713,00	$ 467.806.736	81,00	$ 181.576.000,00					81,00	$ 181.576.000,00	43,00%
2.0	PISOS DE ALMACENAR																
2.0.1	Viguea, placa para tanq Concreto 4000 PSI	M3	77,00	$ 2.167.714,00	$ 31.110.800	14,51	$ 2.167.171,00	$ 31.810.491	14,51	$ 31.467.000,00					14,51	$ 31.467.000,00	98,00%
3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
3.1	PLACAS ARMADO																
3.1.1	Placa aligerada Concreto 4000 PSI	M2	11.144,00	$ 388.980,00	$ 4.334.345.536	13.391,00	$ 388.980,00	$ 5.617.703.818	9771,00	$ 3.800.400.000,00					9771,00	$ 3.800.400.000,00	67,01%
3.2	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI																
3.2.1	Vigas aereas en Concreto 4000 PSI	M3	80,00	$ 2.159.184,00	$ 237.960.472	1.645,10	$ 2.159.184,00	$ 4.457.333.013	1.645,10	$ 3.554.467.617,00					1.645,10	$ 3.554.467.617,00	61,01%
3.3	COLUMNAS Y MUROS																
3.3.1	Columnas en concreto Concreto 4000 PSI	M2	921,00	$ 1.215.000,00	$ 1.000.000.000	960,71	$ 2.208.038,00	$ 2.121.189.691	960,71	$ 1.167.713.818,00					960,71	$ 1.167.713.818,00	36,00%
3.3.2	Muros varios Concreto 4000 PSI	M3	213,00	$ 2.084.788,00	$ 444.079.987	100,00	$ 2.084.788,00	$ 208.477.800	100,00	$ 204.467.000,00					100,00	$ 204.467.000,00	99,00%
3.4	ESCALERAS Y RAMPAS																
3.4.1	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI	M3	151,00	$ 2.241.400,00	$ 338.396.399	70,83	$ 2.240.999,00	$ 172.244.400	81,00	$ 181.547.000,00	81,00	$ 181.547.000,00			81,00	$ 181.547.000,00	84,00%
3.4.2	Rampas en concreto Concreto 4000 PSI	M3	11,00	$ 2.125.800,00	$ 23.383.800	25,46	$ 2.125.699,00	$ 54.130.647	11,00	$ 24.313.000,00					11,00	$ 24.313.000,00	85,00%
7.	CUBIERTAS																
7.1	MUROS DE TIPO EXTERIOR																
7.1.1	Muro en bloque de arcilla N° 4 tolvaja Graff 4hue, perforado, anclajes y refuerzo epoxico	M2	583,00	$ 44.035,00	$ 25.682.053	583,00	$ 44.035,00	$ 25.682.053	800,00	$ 35.500.000,00					800,00	$ 35.500.000,00	100,00%
7.1.2	Muro en bloque de arcilla N° 4 tolvaja Graff 4hue, perforado, anclajes y refuerzo epoxico +RIGID	ML	19,00	$ 25.560,00	$ 485.640	19,00	$ 25.560,00	$ 485.640	11,00	$ 280.840,00	4,00	$ 102.200,00		15,00	$ 382.225,00	52,00%
7.1.3	Muro en bloque de concreto gris tolete 9to12x24 cm	M2	3.460,00	$ 123.836,00	$ 428.464.136	2.460,00	$ 123.836,00	$ 304.563.120	2460,00	$ 304.563.120,00	980,00	$ 121.314.800,00		3441,00	$ 426.000.000,00	99,00%
7.1.4	Muro en bloque de concreto gris tolete 9to12x24 cm +RIGID	ML	345,00	$ 87.217,00	$ 30.079.648	350,00	$ 87.217,00	$ 30.579.648	4,00	$ 401.100,00					4,00	$ 401.100,00	1,00%
7.2	DUCTILFIX																
7.2.1	Ductilconcreto 3000, 12 cm x 10 cm	M	31,00	$ 60.840,00	$ 1.876.040	31,00	$ 60.840,00	$ 1.876.040	2,48	$ 167.721,20	31,00	$ 1.900.000,00		33,48	$ 2.279.647,20	46,00%
7.3	ACUEDUCTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES																
7.3.1	Columnetas 15x15 cm, 3000 psi	M	360,00	$ 73.094,00	$ 32.807.998	360,00	$ 73.094,00	$ 27.301.439	374,00	$ 27.373.100,00					374,00	$ 27.373.100,00	56,01%
7.3.2	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi	M	1.414,00	$ 60.840,00	$ 114.441.398	1.800,00	$ 60.974,00	$ 86.968.198	900,00	$ 54.811.000,00					900,00	$ 54.811.000,00	54,00%
7.3.3	Dovela en Dovela encontrado geodesia de Bloc	M2	16,00	$ 3.345.361,00	$ 14.805.054,00	14,00	$ 1.645.357,00	$ 14.806.413	13,71	$ 12.768.000,00					13,71	$ 12.768.000,00	97,01%
7.8.8	Anclaje epoxico 3/8"	UNID	2.000,00	$ 60.240,00	$ 60.276.120	2.000,00	$ 60.240,00	$ 60.276.120	800,00	$ 48.192.000,00					800,00	$ 48.192.000,00	100,00%
8.	ACABADOS																
8.1	ACABADOS INTERIORES																
8.1.1	Pulido interior liso varios	M2	5.981,00	$ 60.240,00	$ 360.237.871,00	5.981,00	$ 60.240,00	$ 360.237.871	1284,00	$ 47.500.000,00	2000,00	$ 80.000.000,00		3284,00	$ 127.500.000,00	35,00%
8.1.2	Pulido liso interior 20 cm	M	800,00	$ 20.880,00	$ 16.408.240,00	800,00	$ 20.880,00	$ 16.480.000	37,00	$ 772.560,00	247,00	$ 5.157.000,00		284,00	$ 5.774.417.000	42,00%
8.2	ACABADOS PARA MUROS INTERIORES																
8.2.1	Pulido impermeabilizado interiores	M2	5.402,00	$ 48.768,00	$ 115.118.000,00	5.402,00	$ 48.768,00	$ 115.118.000	226,42	$ 11.038.387,00	1000,00	$ 48.800.000,00		1226,42	$ 59.838.387,00	43,00%
8.2.2	Pulido impermeabilizado cuartos oficina	M	800,00	$ 20.771,00	$ 17.409.198,00	800,00	$ 20.771,00	$ 17.409.198	26,00	$ 777.000,00	200,00	$ 7.800.000,00		226,00	$ 8.577.000,00	48,00%
8.4	PISOS PISOS Y ENCHAPES																
8.4.1	Piso cerrillo pulidos	ML	2.000,00	$ 11.000,00	$ 21.800.000,00	2.000,00	$ 10.900,00	$ 21.800.000			1.760,00	$ 19.360.000,00		1760,00	$ 19.360.000,00	88,01%
10.	MUROS Y PISOS																
10.1	PISOS DE CONCRETO																
10.1.2	Muñeco en bajo tanque	M2	170,00	$ 39.000,00	$ 7.039.000	170,00	$ 39.000,00	$ 7.039.000	11,00	$ 429.000,00					11,00	$ 429.000,00	46,01%
11.0	MUROS PISOS																
11.0.0	Bordillo en concreto gris 20cm por 10x10 cm, fisura para de contención en perfil y colocado	ML	2300,00	$ 175.591,00	$ 40.208.340,00	229,00	$ 175.591,00	$ 40.208.340			1734,11	$ 304.500.000,00		1734,11	$ 304.500.000,00	99,00%
12.	MUROS Y PISOS																
12.1	MUROS DE CONCRETO																
12.1.1	Muro en el Bomb e varios, placa tanque, Vigas y similar concentrado	M3	210,00	$ 48.720,00	$ 20.308.716	210,00	$ 48.720,00	$ 20.308.716	271,13	$ 13.210.000,00					271,13	$ 13.210.000,00	97,01%
13.	PISOS, REVESTIMIENTOS Y CIELOS																
26.0.0	RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA POTABLE																
26.0.1.1	Tubería PVC presión Ø1 1/4"	ML	27,00	$ 38.137,20	$ 708.699	27,00	$ 38.137,20	$ 708.699	7,40	$ 271.140,00					7,40	$ 271.140,00	38,00%
26.0.1.2	Tubería PVC presión Ø1"	ML	26,00	$ 26.000,00	$ 677.500	26,00	$ 26.057,00	$ 677.500	14,17	$ 369.123,00					14,17	$ 369.123,00	52,00%
26.0.1.3	Tubería PVC Presión Ø3/4"	ML	37,00	$ 23.936,00	$ 885.632	37,00	$ 24.048,00	$ 867.500	7,00	$ 170.149,00					7,00	$ 170.149,00	20,00%
26.0.1.4	Tubería PVC presión Ø1/2"	ML	40,00	$ 19.996,00	$ 800.000	40,00	$ 20.000,00	$ 800.000									0,00%
26.0.2.5	Registro bola Ø1/2"	UNID	0,00	$ 38.764,00	$ 346.676	9,00	$ 38.764,00	$ 348.876	4,00	$ 155.000,00					4,00	$ 155.000,00	44,44%
26.0.2.6	Registro roscado plástico con tapón removible	ML	212,00	$ 5.181,00	$ 1.098.372	212,00	$ 5.181,00	$ 1.098.372	44,17	$ 228.840,00					44,17	$ 228.840,00	20,00%
26.0.2.14	Registro bola Ø3/4"	UNID	1,00	$ 51.081,00	$ 51.081	1,00	$ 51.081,00	$ 51.081	1,00	$ 51.081,00					1,00	$ 51.081,00	100,00%
26.0.3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA POTABLE																
26.0.3.1	Punto hidráulico Ø PVC-P Ø1/2"	UNID	14,00	$ 58.380,00	$ 817.000	14,00	$ 58.380,00	$ 817.000	13,00	$ 760.000,00					13,00	$ 760.000,00	93,00%
26.0.3.2	Registro con palanca (no incluye tornillo)	UNID	0,00	$ 8.191,00	$ 46.000	5,00	$ 8.191,00	$ 46.000	0,00	$ 46.000,00					0,00	$ 46.000,00	100,00%
26.0.3.3	Llegada de agua en PVC P Ø1/2" Roscar y Teflon en A/Cs	UNID	14,00	$ 13.000,00	$ 182.000	14,00	$ 13.000,00	$ 182.000	13,00	$ 169.000,00					13,00	$ 169.000,00	93,00%
26.0.4	RED RED SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS																
26.0.4.1	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"	UNID	0,00	$ 60.000,00	$ 465.772	0,00	$ 60.000,00	$ 465.772	0,00	$ 313.000,00					0,00	$ 313.000,00	67,01%
26.0.4.2	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"	UNID	14,00	$ 54.000,00	$ 755.400	14,00	$ 53.934,00	$ 755.400	11,00	$ 594.000,00	11,00	$ 594.000,00		22,00	$ 1.188.000,00	79,01%
26.0.4.4	Sifones de pisos 2" Ø, 3" y Ø"	UNID	20,00	$ 8.177,00	$ 163.540	20,00	$ 8.177,00	$ 163.540	12,00	$ 97.000,00					12,00	$ 97.000,00	60,00%
26.0.5	REDES AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS																
26.0.5.1	Tubería tipo sanitaria Ø4"	ML	60,00	$ 47.000,00	$ 2.820.000	60,00	$ 47.000,00	$ 2.820.000	28,00	$ 1.316.000,00					28,00	$ 1.316.000,00	46,00%
26.0.5.2	Tubería PVC sanitaria Ø6"	ML	0,00	$ 59.000,00	$ 479.031	0,00	$ 59.000,00	$ 479.031	0,00	$ 479.031,00					0,00	$ 479.031,00	100,00%
26.0.5.3	Tubería PVC sanitaria Ø2"	ML	14,00	$ 30.000,00	$ 420.128	14,00	$ 30.000,00	$ 420.128	14,00	$ 420.128,00					14,00	$ 420.128,00	100,00%
26.0.5.4	Excavación	M3	60,00	$ 73.181,00	$ 1.914.044	60,00	$ 73.181,00	$ 1.914.044	75,00	$ 1.710.000,00					75,00	$ 1.710.000,00	93,00%
26.0.5.5	Cajas aguas lluvia rejilla galvanizada	M3	60,00	$ 46.120,00	$ 2.767.248	60,00	$ 46.120,00	$ 2.767.248	77,00	$ 3.578.767,00					77,00	$ 3.578.767,00	99,00%
26.0.5.7	Relleno y compactación	M3	40,00	$ 58.870,00	$ 2.366.000	40,00	$ 58.870,00	$ 2.366.000	73,00	$ 4.300.000,00	73,00	$ 4.300.000,00		146,00	$ 8.600.000,00	97,00%
26.0.5.8	Prueba de Agua	UNID	5,00	$ 220.130,00	$ 1.100.600	5,00	$ 220.130,00	$ 1.100.600	5,00	$ 460.000,00	5,00	$ 460.000,00		10,00	$ 920.000,00	80,00%
26.0.6	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO																
26.0.6.2	Excavación para muro	M3	7,00	$ 119.971,00	$ 839.804	7,00	$ 119.971,00	$ 839.804	8,00	$ 960.000,00	8,00	$ 960.000,00		16,00	$ 1.920.000,00	97,00%
26.2	ACUEDUCTOS																
26.2.9	Llave Pasamuros Acero Inox. Ø2"	UNID	0,00	$ 748.000,00	$ 2.200.000	3,00	$ 748.000,00	$ 2.244.000	3,00	$ 2.244.000,00					3,00	$ 2.244.000,00	100,00%
26.3	INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE																
26.3.10	Llave Pasamuros Acero Inox. Ø4"	UNID	2,00	$ 1.199.999,00	$ 2.561.101	2,00	$ 1.199.051,00	$ 2.397.102	2,00	$ 2.398.000,00					2,00	$ 2.398.000,00	100,00%
26.3.11	Llave Pasamuros Acero Inox. Ø1 1/2"	UNID	1,00	$ 700.607,00	$ 700.607	1,00	$ 700.607,00	$ 700.607	1,00	$ 700.607,00					1,00	$ 700.607,00	100,00%
26.4	INSTALACION EQUIPO PRESION AGUA FRIA POTABLE																
26.4.10	Llave Pasamuros Acero Inox. Ø4"	UNID	2,00	$ 1.599.581,00	$ 3.199.162	2,00	$ 1.599.581,00	$ 3.199.162	2,00	$ 3.199.000,00					2,00	$ 3.199.000,00	100,00%
26.4.11	Llave Pasamuros Acero Inox. Ø1 1/2"	UNID	1,00	$ 700.607,00	$ 700.607	1,00	$ 700.607,00	$ 700.607	1,00	$ 700.607,00					1,00	$ 700.607,00	100,00%
29.0	INSTALACION EQUIPOS ESPECIALES																
29.0.2	Tubería PVC presión Ø1"	ML	19,00	$ 51.394,00	$ 1.000.018	19,00	$ 51.394,00	$ 1.000.018	8,00	$ 400.000,00					8,00	$ 400.000,00	40,00%
29.0	REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES																
29.0.4	Tubería PVC presión Ø2"	ML	421,00	$ 42.600,00	$ 18.937.800	421,00	$ 42.600,00	$ 18.937.800	9,00	$ 381.600,00	9,00	$ 381.600,00		18,00	$ 763.200,00	1,00%
29.0.11	Accesorios presion Ø2"	UNID	31,00	$ 72.796,00	$ 1.819.748	31,00	$ 72.346,00	$ 1.818.246	9,00	$ 654.000,00	9,00	$ 654.000,00		18,00	$ 1.308.000,00	72,00%
29.0.12	Accesorios presion Ø2 1/2"	UNID	7,00	$ 37.887,00	$ 267.208,00	7,00	$ 37.887,00	$ 267.208,00	0,00	-					0,00	$ 0,00	0,00%
29.0.13	Accesorios presion Ø3"	UNID	200,00	$ 47.745,00	$ 9.570.510	200,00	$ 47.745,00	$ 9.549.000	0,00	$ 41.475,00					0,00	$ 41.475,00	20,00%
29.0.14	Accesorios presion Ø1 1/2"	UNID	100,00	$ 13.687,00	$ 1.368.714,00	100,00	$ 13.687,00	$ 1.368.714	0,00	-					0,00	$ 0,00	0,00%

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MAYORES Y MENORES #01			ACUMULADO PARCIAL		PRESENTE PERIODO CORTE # 17		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE
26.6.15	Accesorios gravitax ø1 1/4"	UND	28,00	$ 63.560,00	$ 263.173	28,00	$ 63.560,00	$ 263.173	7,00	$ 65.700,00			7,00	$ 65.700,00	25,00%
26.6.16	Accesorios gravitax ø1"	UND	72,00	$ 53.280,00	$ 385.348	72,00	$ 53.280,00	$ 385.348	0,00	$ 56.400,00			0,00	$ 56.400,00	0,00%
26.6.17	Accesorios gravitax ø3/4"	UND	230,00	$ 32.850,00	$ 1.228.418	230,00	$ 32.850,00	$ 1.228.418	53,00	$ 35.100,00			53,00	$ 35.100,00	5,00%
26.6.18	Accesorios gravitax ø1/2"	UND	4.811,00	$ 32.850,00	$ 14.364.696	4.811,00	$ 32.850,00	$ 14.364.696	58,00	$ 177.450,00			58,00	$ 177.450,00	0,40%
26.6.21	Accesorios para hidrante ø1"	UND	27,00	$ 72.134,00	$ 561.639	27,00	$ 72.134,00	$ 561.639	3,00	$ 108.204,00			3,00	$ 108.204,00	19,27%
26.6.22	Accesorios para hidrante ø3/4"	UND	203,00	$ 63.134,00	$ 2.308.808	203,00	$ 63.134,00	$ 2.308.808	6,00	$ 94.674,00			6,00	$ 94.674,00	4,10%
26.6.23	Accesorios para hidrante ø1/2"	UND	2.415,00	$ 63.134,00	$ 22.119.084	2.415,00	$ 63.134,00	$ 22.119.084	53,00	$ 110.400,00			53,00	$ 110.400,00	0,42%
26.6	REDES DE CONDUCTO DE AGUA CALIENTE														
26.6.6	Tubería CPVC AL TO IMPACTO ø1 1/4"	ML	30,00	$ 60.820,00	$ 1.824.600,00	30,00	$ 60.820,00	$ 1.824.600,00			23,00	$ 1.398.860,00	23,00	$ 1.398.860,00	76,67%
26.6.7	Tubería CPVC AL TO IMPACTO ø1"	ML	48,00	$ 36.464,00	$ 1.750.848,00	48,00	$ 36.464,00	$ 1.750.848,00			13,00	$ 474.032,00	13,00	$ 474.032,00	27,08%
26.6.8	Tubería CPVC AL TO IMPACTO ø3/4"	ML	337,00	$ 24.466,00	$ 12.414.402,00	337,00	$ 24.466,00	$ 12.414.402,00			53,00	$ 1.318.382,00	53,00	$ 1.318.382,00	9,94%
26.6.9	Tubería CPVC AL TO IMPACTO ø1/2"	ML	1.414,00	$ 17.710,00	$ 25.117.828,00	1.414,00	$ 17.710,00	$ 25.117.828,00			80,00	$ 1.417.600,00	80,00	$ 1.417.600,00	4,01%
26.6.12	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO ø1 1/4"	UND	15,00	$ 87.966,00	$ 1.319.490,00	15,00	$ 87.966,00	$ 1.319.490,00			11,00	$ 1.019.226,00	11,00	$ 1.019.226,00	77,23%
26.6.13	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO ø1"	UND	30,00	$ 33.186,00	$ 995.580,00	30,00	$ 33.186,00	$ 995.580,00			13,00	$ 431.418,00	13,00	$ 431.418,00	43,33%
26.6.14	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO ø3/4"	UND	189,00	$ 6.972,00	$ 1.317.708,00	189,00	$ 6.972,00	$ 1.317.708,00			80,00	$ 557.760,00	80,00	$ 557.760,00	42,33%
26.6.15	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO ø1/2"	UND	2.173,00	$ 4.741,00	$ 10.302.793,00	2.173,00	$ 4.741,00	$ 10.302.793,00			80,00	$ 379.280,00	80,00	$ 379.280,00	3,68%
26.6.17	Registro bola ø1/2"	UND	460,00	$ 38.774,00	$ 17.836.040,00	460,00	$ 38.774,00	$ 17.836.040,00			11,00	$ 426.514,00	11,00	$ 426.514,00	2,39%
26.6.26	Abrazaderas para hidrante ø1 1/4"	UND	30,00	$ 12.480,00	$ 374.400,00	30,00	$ 12.480,00	$ 374.400,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.6.25	Abrazaderas para hidrante ø1"	UND	40,00	$ 13.134,00	$ 525.360,00	40,00	$ 13.134,00	$ 525.360,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.6.24	Abrazaderas para hidrante ø3/4"	UND	472,00	$ 11.118,00	$ 5.247.696,00	472,00	$ 11.118,00	$ 5.247.696,00			60,00	$ 667.080,00	60,00	$ 667.080,00	12,71%
26.6.23	Abrazaderas para hidrante ø1/2"	UND	1.228,00	$ 11.958,00	$ 14.683.704,00	1.228,00	$ 11.958,00	$ 14.683.704,00			80,00	$ 956.640,00	80,00	$ 956.640,00	6,52%
26.7	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (CON_Y SIN_)														
26.8.1	Punto Hidraulico PP PVC-P ø1/2"	UND	460,00	$ 58.000,00	$ 26.681.000,00	460,00	$ 58.000,00	$ 26.681.000,00							
26.10	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA RESIDENCIAL										116,00	$ 7.308.000,00	116,00	$ 7.308.000,00	26,81%
26.10.1	Punto Hidraulico PP PVC-P ø1 1/4"	UND	304,00	$ 75.736,00	$ 23.023.744,00	304,00	$ 75.736,00	$ 23.023.744,00							
26.11	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE										60,00	$ 4.500.480,00	60,00	$ 4.500.480,00	37,50%
26.11.1	Punto Hidraulico AC CPAC ø1/2"	UND	194,00	$ 73.018,00	$ 14.165.492,00	194,00	$ 73.018,00	$ 14.165.492,00			53,00	$ 3.869.954,00	53,00	$ 3.869.954,00	26,77%
26.12	VALVULAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS														
26.12.1	Valvula Sanitaria PVC-E ø4"	UND	105,00	$ 83.618,00	$ 15.205.462	105,00	$ 83.618,00	$ 15.205.462	39,00	$ 7.591.170,00	39,00	$ 7.591.170,00	39,00	$ 7.591.170,00	49,93%
26.12.2	Valvula Sanitaria PVC-E ø2"	UND	317,00	$ 83.618,00	$ 26.507.482	317,00	$ 83.618,00	$ 26.507.482	247,00	$ 20.214.096,00	247,00	$ 20.214.096,00	247,00	$ 20.214.096,00	76,25%
26.12.6	Tapones de presion ø4", ø3" y ø2"	UND	167,00	$ 3.750,00	$ 3.734.574	167,00	$ 3.750,00	$ 3.734.574	167,00	$ 3.817.734,00	52,00	$ 3.817.734,00	52,00	$ 3.817.734,00	100,00%
26.12.7	Pasen por placa ø6" con empalme accesorios	UND	100,00	$ 94.097,00	$ 15.594.347	165,00	$ 94.097,00	$ 15.594.347	181,00	$ 17.405.757,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.12.8	Pasen por placa ø6" con empalme accesorios	UND	100,00	$ 94.097,00	$ 15.594.347	165,00	$ 94.097,00	$ 15.594.347	181,00	$ 17.405.757,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.13	VALVULAS SANITARIAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS														
26.13.3	Sifones Sanitarios PVC-S ø3"	UND	168,00	$ 59.564,00	$ 9.908.512	168,00	$ 59.564,00	$ 9.908.512	25,00	$ 1.489.100,00	25,00	$ 1.489.100,00	25,00	$ 1.489.100,00	15,03%
26.13.2	Tapones de presion ø3" y ø6"	UND	169,00	$ 5.177,00	$ 867.740	169,00	$ 5.177,00	$ 867.740	169,00	$ 875.130,00	169,00	$ 875.130,00	169,00	$ 875.130,00	100,00%
26.13.8	Pasen por placa ø6" con empalme accesorios	UND	3,00	$ 77.206,00	$ 142.478	3,00	$ 77.206,00	$ 142.478	3,00	$ 142.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.13.9	Pasen por placa ø6" con empalme accesorios	UND	183,00	$ 80.134,00	$ 9.396.112	183,00	$ 80.134,00	$ 9.396.112	183,00	$ 9.794.100,00	23,00	$ 1.840.200,00	23,00	$ 1.840.200,00	19,59%
26.14	SALIDAS AGUAS LLUVIAS														
26.14.1	Sifones aguas lluvias PVC-S ø4"	UND	30,00	$ 83.618,00	$ 7.660.320	30,00	$ 83.618,00	$ 7.660.320	12,00	$ 960.192,00	12,00	$ 960.192,00	12,00	$ 960.192,00	12,53%
26.14.2	Tapones de presion ø4"	UND	30,00	$ 5.177,00	$ 474.240	30,00	$ 5.177,00	$ 474.240	15,00	$ 77.655,00	15,00	$ 77.655,00	15,00	$ 77.655,00	16,38%
26.14.3	Pasen por placa ø4" con empalme accesorios	UND	30,00	$ 84.765,00	$ 7.660.320	30,00	$ 84.765,00	$ 7.660.320	0,00	$ 960.192,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.15	REDES AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS Y RESIDENCIALES														
26.15.1	Tubería Sch de alcantarillado ø6"	ML	6,00	$ 124.000,00	$ 999.480	6,00	$ 124.000,00	$ 999.480	6,00	$ 999.480,00	6,00	$ 999.480,00	6,00	$ 999.480,00	100,00%
26.15.2	Tubería Sch de alcantarillado ø4"	ML	76,00	$ 87.307,00	$ 8.997.000	76,00	$ 87.307,00	$ 8.997.000	76,00	$ 8.997.000,00	76,00	$ 8.997.000,00	76,00	$ 8.997.000,00	100,00%
26.15.4	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	141,00	$ 167.891,00	$ 15.115.761	141,00	$ 167.891,00	$ 15.115.761	66,00	$ 11.108.406,00	66,00	$ 11.108.406,00	66,00	$ 11.108.406,00	73,49%
26.15.5	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	540,00	$ 53.121,00	$ 33.997.440	540,00	$ 53.121,00	$ 33.997.440	113,00	$ 6.001.482,00	113,00	$ 6.001.482,00	113,00	$ 6.001.482,00	17,65%
26.15.6	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	11,00	$ 40.003,00	$ 440.033,20	11,00	$ 40.003,00	$ 440.033,20	11,00	$ 440.033,00	11,00	$ 440.033,00	11,00	$ 440.033,00	100,00%
26.15.7	Tubería PVC sanitaria ø2"	ML	99,00	$ 32.004,00	$ 3.696.816	99,00	$ 32.004,00	$ 3.696.816	99,00	$ 3.696.816,00	99,00	$ 3.696.816,00	99,00	$ 3.696.816,00	100,00%
26.15.10	Tubería PVC ventilación ø2"	ML	869,00	$ 44.085,00	$ 38.302.013	869,00	$ 44.085,00	$ 38.302.013	204,00	$ 11.913.300,00	204,00	$ 11.913.300,00	204,00	$ 11.913.300,00	31,10%
26.15.12	Accesorios PVC Sanitaria ø6"	UND	149,00	$ 125.837,00	$ 17.378.977	149,00	$ 125.837,00	$ 17.378.977	38,00	$ 4.781.806,00	38,00	$ 4.781.806,00	38,00	$ 4.781.806,00	27,52%
26.15.13	Accesorios PVC Sanitaria ø4"	UND	1.999,00	$ 21.213,00	$ 41.802.786	1.999,00	$ 21.213,00	$ 41.802.786	630,00	$ 13.373.190,00	630,00	$ 13.373.190,00	630,00	$ 13.373.190,00	32,00%
26.15.14	Accesorios PVC Sanitaria ø3"	UND	68,00	$ 10.301,00	$ 1.240.080	68,00	$ 10.301,00	$ 1.240.080	20,00	$ 247.224,00	20,00	$ 247.224,00	20,00	$ 247.224,00	19,93%
26.15.15	Accesorios PVC Sanitaria ø2"	UND	1.999,00	$ 5.911,00	$ 11.815.089	1.999,00	$ 5.911,00	$ 11.815.089	539,00	$ 3.172.464,00	539,00	$ 3.172.464,00	539,00	$ 3.172.464,00	26,85%
26.15.19	Abrazadera para hidrante ø6"	UND	71,00	$ 30.274,00	$ 2.148.454	71,00	$ 30.274,00	$ 2.148.454	5,00	$ 151.370,00	5,00	$ 151.370,00	5,00	$ 151.370,00	7,04%
26.15.17	Abrazadera para hidrante ø4"	UND	934,00	$ 20.211,00	$ 7.883.535,00	934,00	$ 20.211,00	$ 7.883.535,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.15.18	Abrazadera para hidrante ø3"	UND	51,00	$ 19.084,00	$ 972.791	51,00	$ 19.084,00	$ 972.791	8,00	$ 152.672,00	8,00	$ 152.672,00	8,00	$ 152.672,00	15,70%
26.15.16	Abrazadera para hidrante ø2"	UND	443,00	$ 14.219,00	$ 6.297.889,00	443,00	$ 14.219,00	$ 6.297.889,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.15.20	Abrazadera reversible ø6"	UND	13,00	$ 57.483,00	$ 745.000,00	13,00	$ 57.483,00	$ 745.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.15.21	Abrazadera reversible ø4"	UND	46,00	$ 59.807,00	$ 2.724.742,00	46,00	$ 59.807,00	$ 2.724.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.15.22	Excavacion	ML	210,00	$ 20.324,00	$ 7.250.440	210,00	$ 20.324,00	$ 7.250.440	210,00	$ 8.318.297,00	210,00	$ 8.318.297,00	210,00	$ 8.318.297,00	100,00%
26.15.24	Cajas entre tapa segun tuberia	M	210,00	$ 40.120,00	$ 14.297.200	210,00	$ 40.120,00	$ 14.297.200	210,00	$ 11.897.201,00	210,00	$ 11.897.201,00	210,00	$ 11.897.201,00	83,21%
26.15.25	Relleno y compactacion	M3	136,00	$ 99.879,00	$ 13.465.420	136,00	$ 99.879,00	$ 13.465.420	60,00	$ 5.994.000,00	60,00	$ 5.994.000,00	60,00	$ 5.994.000,00	44,51%
26.15.27	Prueba de Agua	UND	5,00	$ 293.130,00	$ 1.465.650	5,00	$ 293.130,00	$ 1.465.650	5,00	$ 1.465.650,00	5,00	$ 1.465.650,00	5,00	$ 1.465.650,00	100,00%
26.16	REDES AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS Y INDUSTRIALES														
26.16.3	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	77,00	$ 107.769,00	$ 8.297.213,00	77,00	$ 107.769,00	$ 8.297.213,00			60,00	$ 6.465.420,00	60,00	$ 6.465.420,00	77,92%
26.16.4	Tubería PVC sanitaria ø4"	ML	170,00	$ 64.556,00	$ 10.348.452,00	170,00	$ 64.556,00	$ 10.348.452,00			170,00	$ 10.974.520,00	170,00	$ 10.974.520,00	106,04%
26.16.5	Tubería PVC sanitaria ø3"	ML	114,00	$ 46.199,00	$ 7.060.851	153,00	$ 46.199,00	$ 7.060.851	23,00	$ 919.401,00	23,00	$ 919.401,00	23,00	$ 919.401,00	13,02%
26.16.6	Tubería PVC sanitaria ø2"	ML	467,00	$ 30.699,00	$ 14.314.333	467,00	$ 30.699,00	$ 14.314.333	7,00	$ 49.017,00	467,00	$ 14.314.333,00	467,00	$ 14.314.333,00	100,00%
26.16.9	Tubería PVC ventilación ø2"	ML	92,00	$ 47.720,00	$ 4.391.560,00	92,00	$ 47.720,00	$ 4.391.560,00			92,00	$ 4.391.560,00	92,00	$ 4.391.560,00	100,00%
26.16.8	Tubería PVC ventilación ø3"	ML	428,00	$ 44.181,00	$ 18.909.468,00	428,00	$ 44.181,00	$ 18.909.468,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.16.11	Accesorios PVC Sanitaria ø6"	UND	10,00	$ 116.742,00	$ 1.167.420,00	10,00	$ 116.742,00	$ 1.167.420,00			10,00	$ 1.167.420,00	10,00	$ 1.167.420,00	100,00%
26.16.11	Accesorios PVC Sanitaria ø4"	UND	206,00	$ 21.272,00	$ 4.381.432,00	206,00	$ 21.272,00	$ 4.381.432,00			206,00	$ 4.381.432,00	206,00	$ 4.381.432,00	100,00%
26.16.13	Accesorios PVC Sanitaria ø3"	UND	218,00	$ 13.301,00	$ 2.900.618	218,00	$ 13.301,00	$ 2.900.618	15,00	$ 199.515,00	170,00	$ 2.261.170,00	170,00	$ 2.261.170,00	78,00%
26.16.13	Accesorios PVC Sanitaria ø2"	UND	1.060,00	$ 5.973,00	$ 6.331.518	1.060,00	$ 5.973,00	$ 6.331.518	0,00	$ 0,00	460,00	$ 2.747.580,00	460,00	$ 2.747.580,00	43,40%
26.16.14	Adaptadores para hidrante ø6"	UND	19,00	$ 58.274,00	$ 1.107.206,00	26,00	$ 58.274,00	$ 1.107.206,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.16.15	Adaptadores para hidrante ø4"	UND	124,00	$ 25.212,00	$ 3.126.288,00	124,00	$ 25.212,00	$ 3.126.288,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.16.16	Adaptadores para hidrante ø3"	UND	124,00	$ 18.981,00	$ 2.354.244,00	124,00	$ 18.981,00	$ 2.354.244,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.16.17	Adaptadores para hidrante ø2"	UND	445,00	$ 14.076,00	$ 6.266.820,00	445,00	$ 14.076,00	$ 6.266.820,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26.16.18	Excavacion	ML	112,00	$ 20.324,00	$ 2.277.264	112,00	$ 20.324,00	$ 2.277.264	34,00	$ 690.716,00	34,00	$ 690.716,00	34,00	$ 690.716,00	30,34%
26.16.21	Cajas entre tapa segun tuberia	ML	112,00	$ 40.120,00	$ 4.493.440	112,00	$ 40.120,00	$ 4.493.440	24,00	$ 1.157.280,00	24,00	$ 1.157.280,00	24,00	$ 1.157.280,00	25,75%
26.16.23	Relleno y compactacion	M3	81,00	$ 99.879,00	$ 8.093.511	81,00	$ 99.879,00	$ 8.093.511	4,00	$ 342.360,00	4,00	$ 342.360,00	4,00	$ 342.360,00	4,23%
26.16.26	Prueba de Agua	UND	5,00	$ 293.130,00	$ 1.465.650	5,00	$ 293.130,00	$ 1.465.650	2,00	$ 469.008,00	2,00	$ 469.008,00	2,00	$ 469.008,00	40,00%
26.17	REDES DE AGUAS LLUVIAS														
26.17.2	Tubería PVC sanitaria ø6"	ML	168,00	$ 53.538,00	$ 8.967.384	168,00	$ 53.538,00	$ 8.967.384	74,00	$ 3.960.612,00	74,00	$ 3.960.612,00	74,00	$ 3.960.612,00	44,16%
26.17.3	Accesorios PVC Sanitaria ø6"	UND	165,00	$ 21.272,00	$ 3.509.364	165,00	$ 21.272,00	$ 3.509.364	40,00	$ 850.880,00	40,00	$ 850.880,00	40,00	$ 850.880,00	24,24%
26.17.6	Abrazaderas para hidrante ø6"	UND	154,00	$ 15.084,00	$ 2.321.856	154,00	$ 15.084,00	$ 2.321.856	33,00	$ 497.772,00	33,00	$ 497.772,00	33,00	$ 497.772,00	14,34%
26.17.17	Excavacion	ML	83,00	$ 20.324,00	$ 1.687.000	83,00	$ 20.324,00	$ 1.687.000	27,00	$ 549.072,00	27,00	$ 549.072,00	27,00	$ 549.072,00	32,55%
26.17.18	Cajas entre tapa segun tuberia	ML	83,00	$ 40.120,00	$ 3.761.544	83,00	$ 40.120,00	$ 3.761.544	37,00	$ 1.484.440,00	37,00	$ 1.484.440,00	37,00	$ 1.484.440,00	39,46%
26.17.19	Relleno y compactacion	M3	59,00	$ 99.879,00	$ 5.892.861	59,00	$ 99.879,00	$ 5.892.861	5,00	$ 499.395,00	5,00	$ 499.395,00	5,00	$ 499.395,00	8,47%
26.17.20	Prueba de Agua	UND	2,00	$ 293.130,00	$ 586.260	2,00	$ 293.130,00	$ 586.260	2,00	$ 586.260,00	2,00	$ 586.260,00	2,00	$ 586.260,00	100,00%
26.18	ACCESORIOS DE CONEXION														
27.	INSTALACIONES ESPECIALES														
27.1	RED GENERAL CONTRAINCENDIO														
27.1.1	Tubería acero cedula SCH 10 ø6"	ML	147,00	$ 161.344,00	$ 23.718.768,00	147,00	$ 161.344,00	$ 23.718.768,00			113,00	$ 18.230.672,00	113,00	$ 18.230.672,00	76,89%
27.1.2	Tubería acero cedula SCH 10 ø4"	ML	811,00	$ 111.161,00	$ 90.150.371,00	811,00	$ 111.161,00	$ 90.150.371,00	66,00	$ 7.336.626,00	66,00	$ 7.336.626,00	66,00	$ 7.336.626,00	8,14%
27.1.3	Tubería acero cedula SCH 10 ø3"	ML	707,00	$ 89.921,00	$ 63.577.627,00	707,00	$ 89.921,00	$ 63.577.627,00	166,00	$ 14.924.886,00	166,00	$ 14.924.886,00	166,00	$ 14.924.886,00	23,48%
27.1.4	Accesorios ACERO ø6"	UND	46,00	$ 473.766,00	$ 21.877.236,00	46,00	$ 473.766,00	$ 21.877.236,00	46,00	$ 21.877.236,00	46,00	$ 21.877.236,00	46,00	$ 21.877.236,00	100,00%

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MAYORES Y MENORES #01			ACUMULADO PARCIAL		PRESENTE PERIODO CORTE # 07		ACUMULADO TOTAL		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANZ
27.1.10	Acometida ACERO 2P"	UND	204.00	$ 172,500.00	$ 35,070,000.00	108.00	$ 172,500.00	$ 18,630,000.00			40.00	$ 6,900,000.00	148.00	$ 25,530,000.00	72.80%
27.1.11	ACOMETIDA ACERO 3P"	UND	274.00	$ 85,871.00	$ 19,985,734.00	254.00	$ 85,871.00	$ 19,985,734.00			200.00	$ 19,974,200.00	200.00	$ 19,974,200.00	100.00%
27.1.20	Abrazadera para hipoquete 2P"	UND	74.00	$ 30,274.00	$ 2,240,276.00	74.00	$ 30,274.00	$ 2,240,276.00			47.00	$ 1,422,878.00	47.00	$ 1,422,878.00	63.50%
27.1.25	Abrazadera para hipoquete 3P"	UND	306.00	$ 30,272.00	$ 9,194,672.00	306.00	$ 30,272.00	$ 9,194,672.00			31.00	$ 938,432.00	31.00	$ 938,432.00	10.21%
27.1.27	Abrazadera para hipoquete 4P"	UND	219.00	$ 78,064.00	$ 17,097,216.00	219.00	$ 78,064.00	$ 17,097,216.00			47.00	$ 3,669,008.00	47.00	$ 3,669,008.00	21.47%
27.1.33	Acometa acometa/tierra long.flexible 2P"	UND	8.00	$ 201,126.00	$ 1,761,833.00	8.00	$ 220,238.00	$ 1,761,833.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
27.1.37	Conecta acometa/tierra lateral 2P"	UND	12.00	$ 201,126.00	$ 2,242,746.00	12.00	$ 220,238.00	$ 2,642,746.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
27.3	ESTACIONES DE CONTROL														
27.3.1	Valvula Mariposa acometida con sello indicador certificada CLAPH 2P"	UND	3.00	$ 972,308.00	$ 2,916,924.00	3.00	$ 972,308.00	$ 2,916,924.00			4.00	$ 3,889,232.00	7.00	$ 6,806,156.00	233.33%
27.3.2	Valvula Mariposa acometida con sello indicador certificada CLAPH 3P"	UND	4.00	$ 695,715.00	$ 2,782,860.00	4.00	$ 695,715.00	$ 2,782,860.00			1.00	$ 695,715.00	5.00	$ 3,478,575.00	125.00%
27.3.10	Chapa encerrojada cilindro sencillo 2P"	UND	3.00	$ 564,113.00	$ 1,692,339.00	3.00	$ 564,113.00	$ 1,692,339.00			1.00	$ 564,113.00	4.00	$ 2,256,452.00	133.33%
27.3.11	Chapa encerrojada cilindro sencillo 3P"	UND	4.00	$ 538,412.00	$ 2,153,648.00	4.00	$ 538,412.00	$ 2,153,648.00			1.00	$ 538,412.00	5.00	$ 2,692,060.00	125.00%
28.	OBRAS ACTUACIONES Y CENTRALES VELEROS														
29.1	CUBIERTAS														
29.3.1	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA Suministro e instalación de cubierta en lamina galvanizada (Alcon TEC, teja/ga galvalit, zinc/alex Metalcolor o similares)														
29.3.1.1	CALLE	M2	8,515.00	$ 76,717.00	$ 730,447,255.00	5,809.00	$ 76,717.00	$ 673,981,333.00			1,722.47	$ 132,140,941.00	7,531.47	$ 1,106,487,291.00	151.72%
29.3.1.2	CARRERA	M2	1,994.00	$ 84,857.00	$ 37,077,138.00	450.00	$ 84,857.00	$ 38,178,650.00			371.40	$ 31,520,113.00	821.40	$ 69,698,763.00	87.10%
29.3.2	MOVIMIENTO TERRENO EXCESO Suministro e instalación del sobrante Excesos de tierra sobrantes (Botiga, alcantar, pegado, e instalación)														
29.3.2.1	ATEX Dust Wipe	M2	8,515.00	$ 16,401.00	$ 139,664,265.00	5,809.00	$ 25,408.00	$ 146,254,672.00			1,722.47	$ 28,230,941.00	7,531.47	$ 174,485,613.00	124.91%
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVIL				$ 1,010,184,348.00			$ 930,836,255.00		$ 93,837,275,781.00		$ 201,236,711.00		$ 93,439,845,054.00	54.39%
	ADMINISTRACION			5%	$ 75,837,967.80		5%	$ 71,835,212.77		$ 4,916,164,189.00	5%	$ 157,375,674	53.99%	$ 5,036,879,172	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1,516,759.36		2%	$ 1,784,247.10		$ 1,784,247,108	2%	$ 34,238,810	2.99%	$ 113,715,459	
	UTILIDAD			5%	$ 3,034,946.24		5%	$ 2,872,913.43		$ 2,872,913,433	5%	$ 55,123,270	6.99%	$ 1,931,927,123	
	VALOR TOTAL AIU			12%	$ 87,233,053.40		12%	$ 77,492,873.30		$ 8,803,752,201.00	12%	$ 246,737,754	73.99%	$ 7,117,852,317	
	TOTAL OBRA				$ 74,870,226,274			$ 71,833,297,697		$ 93,839,454,282.00		$ 7,447,846,711		$ 93,839,454,282.00	54.39%
	PRESUPUESTO EQUIPOS														
	SUMINISTRO Y PRUEBA														
30.	SUMINISTRO EQUIPOS														
30.1	EQUIPOS VERTICALES														
30.1.1	SUMINISTRO ASCENSOR 1	UND	1.00	$ 207,159,408.44	$ 207,159,408.44	1.00	$ 207,159,408.44	$ 207,159,408.44	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
30.1.2	SUMINISTRO ASCENSOR 2	UND	1.00	$ 207,159,408.44	$ 207,159,408.44	1.00	$ 207,159,408.44	$ 207,159,408.44	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
30.1.3	SUMINISTRO ASCENSOR 3	UND	1.00	$ 201,284,893.07	$ 201,284,893.07	1.00	$ 201,284,893.07	$ 201,284,893.07	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
30.1.4	SUMINISTRO ASCENSOR 4	UND	1.00	$ 219,466,473.09	$ 219,466,473.09	1.00	$ 219,466,473.09	$ 219,466,473.09	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
30.1.5	SUMINISTRO ASCENSOR 5	UND	1.00	$ 240,047,337.60	$ 240,047,337.60	1.00	$ 240,047,337.60	$ 240,047,337.60	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
30.1.6	SUMINISTRO ASCENSOR 6	UND	1.00	$ 240,047,337.60	$ 240,047,337.60	1.00	$ 240,047,337.60	$ 240,047,337.60	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00%
	TOTAL COSTO EQUIPOS				$ 93,839,454,282.00			$ 93,839,454,282.00		$ 7,717,695,773.00		$ 0.00		$ 7,717,695,773.00	
	ADMINISTRACION				$ 2,317,338,468.60			$ 2,317,338,468.60		$ 2,317,338,468.60		$ 0.00		$ 2,317,338,468.60	
	TOTAL EQUIPOS				$ 96,156,792,750.60			$ 96,156,792,750.60		$ 10,035,034,241.60		$ 0.00		$ 10,035,034,241.60	7.87%
	TOTAL OBRA				$ 74,870,226,274			$ 71,833,297,697		$ 93,839,454,282.00		$ 7,447,846,711		$ 93,839,454,282.00	54.39%
	TOTAL EQUIPOS				$ 96,156,792,750.60			$ 96,156,792,750.60		$ 10,035,034,241.60		$ 0.00		$ 10,035,034,241.60	7.87%
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 171,027,019,024.60			$ 167,990,090,447.60		$ 103,874,488,523.60		$ 7,447,846,711.00		$ 103,874,488,523.60	61.85%
	CONTRATACION ITEM 1 plaza				$ 10,000,000			$ 21,666,000							
	CONTRATACION ITEM SUBESTACION ASCENSORES MT ACOMETIDA MT TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS DE USO FINAL UPS time 1 plaza				$ 10,000,000			$ 10,000,000						$ -	0.00%
	CONTRATACION ITEM 2 plaza				$ 21,666,000			$ 21,666,000						$ -	0.00%
	CONTRATACION ITEM SUBESTACION ASCENSORES MT ACOMETIDA MT TABLEROS GENERALES TABLEROS PARCIALES SALIDAS DE USO FINAL UPS time 1 plaza				$ 33,936,000			$ 33,936,000						$ -	0.00%
	CONTRATACION ITEM 3 plaza				$ 18,900,000			$ 18,900,000						$ -	0.00%
	CONSUMOS DE CONEXION PROVISIONAL ENERGIA AREA SUBESTACION TECNICA				$ 863,484			$ 863,484						$ -	0.00%
	INSTALACIONES PROVISIONAL DE ENERGIA AREAS SUBESTACION TECNICA				$ 1,470,000			$ 1,470,000						$ -	0.00%
	INSTALACIONES PROVISIONAL DE ENERGIA (CERRAMIENTO)				$ 4,731,746			$ 4,731,746						$ -	0.00%
	TOTAL CONTRATACIONES				$ 103,470,230			$ 103,470,230		$ -		$ -		$ -	0.00%
	ANTICIPO CLIENTE (-)														
	AMORTIZACION DE ANTICIPO	30.00%			$ 34,809,740,407					$ 7,643,846,473.00		$ 372,999,210		$ 8,016,845,683	23.03%
	TOTAL PROYECTO				$ 96,816,124,740			$ 93,839,454,282		$ 15,539,208,273.60		$ 723,999,210		$ 16,263,207,483	

Ing. Angelo Campos Arapo
Representante Legal de Inversiones
CONSTRUCCIONES INTERCONECTELECTRICAS

Angelo Alejandro Campos Mendoza
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SAN VICENTE

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA"

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 22

CONTRATO N°090 DE 2024

DICIEMBRE 2025

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN VICENTE

GARZÓN HUILA

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA"

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISÓ	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
01	78	Diciembre	**Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo**		Informe de gestión diciembre de 2025

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

TABLA DE CONTENIDO

COMPONENTE TECNICO 3

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 3

1.2 INFORMACION FINANCIERA 4

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO 4

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN 4

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 4

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B 5

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A 6

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO 16

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES 16

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 18

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B 18

1.4.4 EXTERIORES 19

1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS. 21

1.4.6 EQUIPOS. 21

1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS 23

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA 24

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 24

1.5.2 BITACORA DE OBRA 25

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA 25

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA 25

1.6.1 CORRESPONDENCIA 25
1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO 26
1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO 27
1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO 27
2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30
2.1 MARCO NORMATIVO 30
2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL 31
2.2.1 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE 32
2.2.2 PERSONAL CASETÓN 34
2.2.3 PERSONAL HIDROSANITARIAS 34
2.2.4 PERSONAL ELÉCTRICO 34
2.2.5 PERSONAL TOPOGRAFÍA 35
2.2.6 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1. 35
2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL 36
2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 37
2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST 38
2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD 39
2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES 39
2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 39
2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 40
2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS 40
2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 40
2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS 41
2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 41

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO 42
2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO 42
2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 42
2.17 INFORME PROVEEDORES 42
2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 43
2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 43
2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA 43
2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 43
2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR 43
2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES 43
2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES 44
2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 44
3 GESTIÓN AMBIENTAL 45
3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 45
3.1.1 MARCO NORMATIVO 45
3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 51
3.2.1 INFORME AMBIENTAL 51
3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 51
3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES 51
3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO 52
3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES 52
3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 52
3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS 52
3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN 53

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO 53
3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 53
3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 53
3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION 56
3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 56
3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN 56
3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 57
3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 57
3.8 MANEJO DE RCD 57
3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 57
3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 57
3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD 58
3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN 58
3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD 58
3.8.6 TRANSPORTE 59
3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 59
3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO 59
3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL 59
3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 59
3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA 59
3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD 59
3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES 60
3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES 60
3.10.5 VÍAS DE ACCESO 60

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 60
3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 61
3.11.1 SUMIDEROS 61
3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS 61
3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 61
3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA 62
3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES 62
3.11.6 CUERPOS DE AGUA 62
3.11.7 CONTROL DE VECTORES 62
3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 62
3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA 62
3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES 63
3.14 ORDEN Y ASEO 63
3.14.1 JORNADAS DE ASEO 63
3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA 64
3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 64
3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS 64
3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES 64
3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO. 64
4. CONCLUSIONES 65

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto 2
Ilustración 2. Fundida losa y muros tanque RCI. 5

Ilustración 3. Fundida tapa RCI. 5
Ilustración 4. Armado de mampostería 7
Ilustración 5. Elementos de confinamiento 8
Ilustración 6. Armado de mampostería fachada 8
Ilustración 7. Pañetes 9
Ilustración 8. Instalación ductería para tomas en muros / marquillado de tuberías. 10
Ilustración 9. Instalación de ductería EMT y cajas de paso bajo placa. 10
Ilustración 10. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 5. 11
Ilustración 11. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa sótano y piso 3. 12
Ilustración 12. Red principal de suministro sótano. 12
Ilustración 13. Armado e instalación de ductos sótano y piso 1 13
Ilustración 14. Ensamble cuelga y recubrimiento de ductos de suministro. 13
Ilustración 15. Rampa vehicular. 14
Ilustración 16. Escalera. 14
Ilustración 17. Fundida y acero escalera. 14
Ilustración 18. Foto general 15
Ilustración 19. Puntos de control asentamientos 16
Ilustración 20. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B 19
Ilustración 21. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7° 20
Ilustración 22. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso 21
Ilustración 23. Bomba estacionaria 22
Ilustración 24 sistema de encofrado STEM 22
Ilustración 25. Grúa auto desplegable 23
Ilustración 26. Brazo distribuidor de concreto 23
Ilustración 27. Publicaciones ambientales 63
Ilustración 28. Orden y aseo 64

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 3
Tabla 2 Resumen de actas 4

Tabla 3. Comités de Obra mensuales. 26
Tabla 4. Otras reuniones....27
Tabla 5. Pólizas 27
Tabla 6. Equipos y herramientas....28
Tabla 7. Personal que laboro durante el periodo....28
Tabla 8. Marco normativo SST....30
Tabla 9. Personal CSV....32
Tabla 10. Personal Icoconstruccion 34
Tabla 11. Personal Hidrosanitario 34
Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño....34
Tabla 13. Personal Topografía....35
Tabla 14. Tabla Personal Mampostería #1....35
Tabla 15. Cumplimiento EMO ingresos....36
Tabla 16. Capacitaciones y charlas....37
Tabla 17 Cumplimiento charlas y capacitaciones....38
Tabla 18. Inducciones....39
Tabla 19. Cumplimiento EPI....40
Tabla 20. Cumplimiento kit señalización SST 40
Tabla 21. Relación agua potable....41
Tabla 22. Cumplimiento Kit de emergencias 41
Tabla 23. Personal con incapacidad por AT....42
Tabla 24. Marco legal gestión ambiental....45
Tabla 25. Relación de materiales e insumos....52
Tabla 26. Relación de materiales pétreos 52
Tabla 27. Relación Ingreso de concreto....52
Tabla 28. Sustancias químicas usadas 54
Tabla 29. Retiro RCD....58
Tabla 30. Reporte RCD 2025....58
Tabla 31. Vehículos retiro RCD....59
Tabla 32. Volquetas entrada y movimiento de material 60

Tabla 33. Relación maquinaria en obra....61
Tabla 34 Relación consumo de agua....61
Tabla 35. Relación de temas ambientales....63

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Informe control asentamientos....16
Anexo 2. Reporte de ensayos....24
Anexo 3. Bitácora de obra....25
Anexo 4. Programación de obra....25
Anexo 5. Actas de comité de obra....26
Anexo 6. Pólizas de garantía....27
Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales....31
Anexo 8. Soportes afiliaciones y retiros....36
Anexo 9. Soporte pagos de seguridad social....36
Anexo 10. Capacitaciones y charlas de seguridad....37
Anexo 11. Comités de apoyo....38
Anexo 12. Recomendaciones médicas....39
Anexo 13. Inducción y reinducción....39
Anexo 14. Entrega de dotación y EPI....39
Anexo 15. Inspecciones....40
Anexo 16. Indicadores y reporte de accidentes....42
Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS....42
Anexo 18. Informe Acciones del periodo....42
Anexo 19. Informe de contratista....42
Anexo 20. Solicitud cierres temporales PMT....43
Anexo 21. Acta Apertura Buzón PQRS....43
Anexo 22. Registro fotográfico SST....44
Anexo 23. Indicadores ambientales....52
Anexo 24.Control de material....53
Anexo 25. Inspección acopio y consumo combustible....56
Anexo 26. Control de material RCD....58

Anexo 27. Control aseo de baños 61
Anexo 28. Control de plagas y roedores 62
Anexo 29. Registro de charlas 63
Anexo 30. Inspección de orden y aseo 64
Anexo 31. Registro fotográfico Ambiental 64

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE
	AÑO: 2025
	VERSION 001

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN". cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 31 de diciembre del 2025**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNUICIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto

COMPONENTE TECNICO

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información general del contrato

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	***"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"***
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

1.2 INFORMACION FINANCIERA

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, en el presente periodo ninguno de estos se llevó a cabo a través de la Fiducia.

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado **dieciséis (16)** actas de corte de obra, verificadas por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas.

Tabla 2 Resumen de actas

# ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	NETO A GIRAR
ACTA #1	$ 208.905.712,00	$ 62.671.713,60	$ 146.233.998,40
ACTA #2	$ 719.606.482,00	$ 215.881.944,60	$ 503.724.537,40
ACTA #3	$ 882.800.683,00	$ 264.840.204,90	$ 617.960.478,10
ACTA #4	$ 390.626.459,00	$ 117.187.937,70	$ 273.438.521,30
ACTA #5	$ 137.838.996,00	$ 41.351.699,40	$ 96.487.296,60
ACTA #6	$ 2.763.579.997,00	$ 829.073.999,10	$ 1.934.505.997,90
ACTA #7	$ 1.413.817.258,00	$ 424.145.177,40	$ 989.672.080,60
ACTA #8	$ 2.615.751.987,00	$ 784.725.596,10	$ 1.831.026.390,90
ACTA #9	$ 1.992.727.752,00	$ 597.818.325,60	$ 1.394.909.426,40
ACTA #10	$ 2.616.459.112,00	$ 784.937.733,60	$ 1.831.521.378,40
ACTA #11	$ 2.096.315.525,00	$ 628.894.657,50	$ 1.467.420.867,50
ACTA #12	$ 2.051.064.523,00	$ 615.319.356,90	$ 1.435.745.166,10
ACTA #13	$ 1.783.406.850,00	$ 535.022.055,00	$ 1.248.384.795,00
ACTA #14	$ 1.963.166.860,00	$ 588.950.058,00	$ 1.374.216.802,00
ACTA #15	$ 3.332.738.472,00	$ 999.821.541,60	$ 2.332.916.930,40
ACTA #16	$ 1.311.743.750,00	$ 393.523.125,00	$ 918.220.625,00

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina

"3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas, validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B

Se realizaron trabajos de mampostería y pañete perimetral en área de edificio 1 y 2 destinados para la subestación eléctrica e ingreso de ambulancias, por otra parte se aplica concreto pobre para solado en área de tanque RCI y se procede con la instalación del acero de refuerzo y fundida de placa inferior, muros y tapa de este.

Ilustración 2. Fundida losa y muros tanque RCI.

Ilustración 3. Fundida tapa RCI.

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

Se desarrollaron actividades de elementos estructurales a nivel de piso 1 a piso 7 específicamente en columnas, muros pantalla, placas de entrepiso y escaleras dando cumplimiento al cronograma de obra establecido de igual forma dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto

- **Armado de acero:** Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales

  - **Escaleras en concreto:** Se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de las escaleras de piso 6 a piso 7 en los ejes 9 C-D, escaleras de piso 6 a cubierta en los ejes 6 entre D-E, escaleras de piso 5 a piso 6 en los ejes 2 C-D.
  - **Rampas en concreto:** Se realizó el armado y amarre de acero de refuerzo según especificaciones técnicas y planos estructurales de la rampa vehicular ingreso a sótano.

- **Vaciado de concreto:**
  - Vaciado de concreto de las escaleras de piso 6 a piso 7 en los ejes 9 C-D, escaleras de piso 6 a cubierta en los ejes 6 entre D-E, escaleras de piso 5 a piso 6 en los ejes 2 C-D.
  - Concreto de la rampa vehicular ingreso a sótano.

- **Mampostería:**
  Durante el mes de diciembre se dio continuidad a las actividades de mampostería en pisos 1, 2, 3 y 4 a su vez continuamos con pañetes en el área de sótano y fachada piso 3 eje 9. Se ejecutó el cierre de elementos de confinamiento hasta una altura de 4,20 m. De igual manera, en estas mismas áreas se desarrolló el armado de mampostería en los muros perimetrales, Adicionalmente, se adelantó el armado de los elementos de confinamiento en dichos muros perimetrales hasta la viga superior.

  En el piso 1 se dio continuidad a la mampostería interior, La mampostería se ha trabajado a una altura de 3,00 m, incluyendo la conformación de sus elementos de confinamiento y se continua con en armado y fundida de elementos de confinamiento.

  En el piso 2, durante el periodo se ejecutaron las actividades de cimbra, forme y liberación para el posterior armado de mampostería en las áreas húmedas (baños,

trabajo sucio, trabajo limpio, entre otras), las cuales se desarrollan en mampostería de arcilla, conforme a las modificaciones aprobadas respecto a las referencias constructivas según su uso y servicio. De manera simultánea, a medida que avanza la mampostería, se ejecuta el armado y fundida de los elementos de confinamiento, garantizando la correcta integración estructural.

En los pisos 3 y 4, continuamos con la mampostería de fachada y zonas húmedas, y el armado de acero y fundida de los elementos de confinamiento.

Se trabaja en mampostería en bloque de cemento para fachadas edificio asistencial.

- **Pañete:**

Durante este periodo se da continuidad al pañete en sótano y fachada.

Ilustración 4. Armado de mampostería

Ilustración 5. Elementos de confinamiento

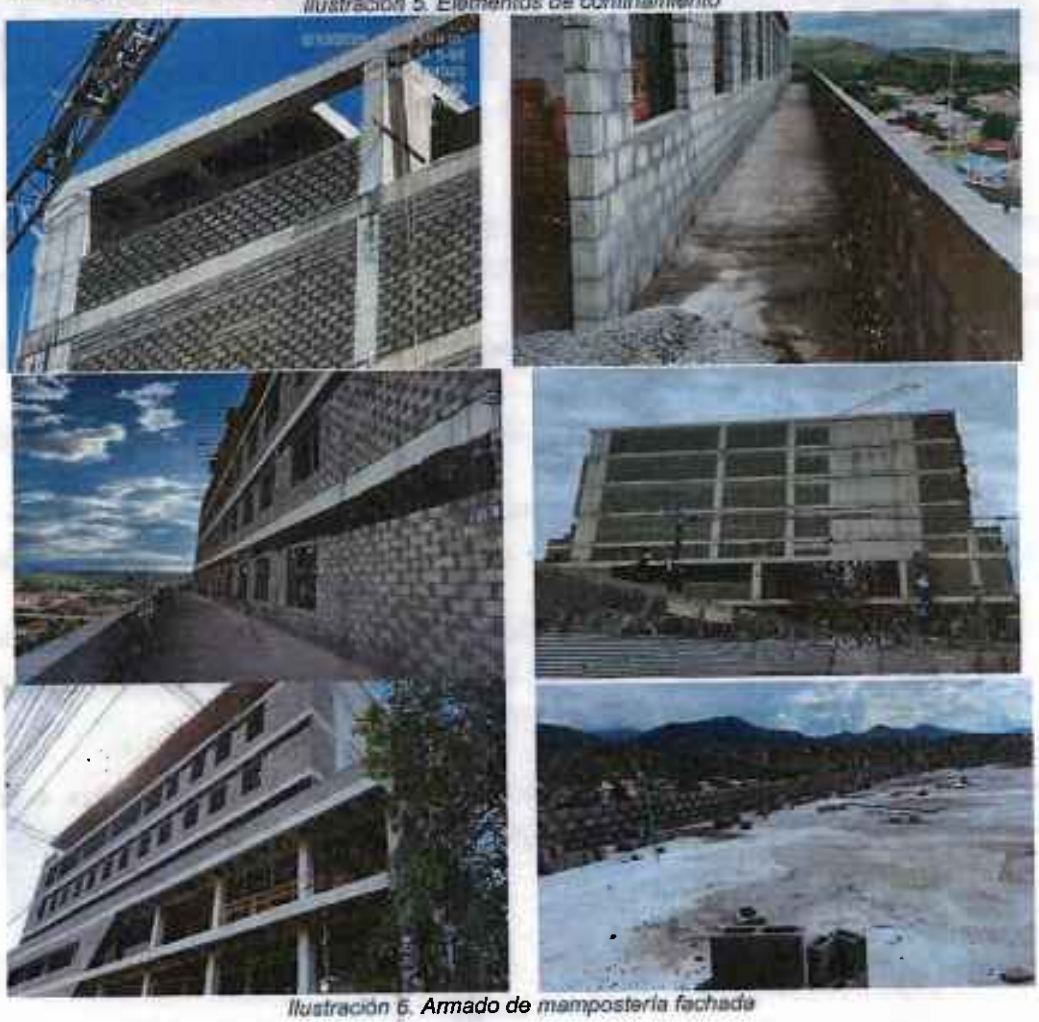

Ilustración 6. Armado de mampostería fachada

Ilustración 7. Pañetes

➢ **Redes y especialidades eléctricas.**

Durante el mes, el personal eléctrico ha continuado con el avance de las actividades correspondientes al sistema eléctrico del proyecto en piso 1 y 2, entre las cuales se destacan:

- Tendido de tubería EMT de 3/4" para los sistemas de iluminación, tomas eléctricas y especialidades.
- Aseguramiento de la correcta sujeción, alineación y separación según normas RETIE y NTC 2050.
- Montaje de cajas EMT bajo placa y muros.
- Marcación, localización y replanteo de puntos eléctricos en cada uno de los espacios del proyecto.
- Cimbrado de muros para permitir la correcta colocación de los puntos eléctricos
- Instalación, tendido y distribución de bandejas porta cables para la recolección y organización de los circuitos eléctricos.

Se realizaron Inspecciones conjuntas a las tuberías y bandejas instaladas a fin de verificar continuidad, alineación, fijación y cumplimiento normativo.

Ilustración 8. Instalación ductería para tomas en muros / marquillado de tuberías.

Ilustración 9. Instalación de ductería EMT y cajas de paso bajo placa.

- **Redes y especialidades hidrosanitaria**

Durante el presente periodo, el personal del frente hidrosanitario desarrolló diversas actividades correspondientes al avance de las redes sanitarias, patógenas, pluviales e hidráulicas del proyecto, dando continuidad al cronograma establecido y asegurando la correcta ejecución de los sistemas conforme a los planos y especificaciones técnicas.

Finalizando mes del mes se inició con la perforación de placa en el sexto piso, actividad necesaria para la correcta interconexión vertical de las tuberías sanitarias, de ventilación y aguas lluvias. Una vez concluidos los perfores previstos para este nivel, se procedió con la instalación completa de la tubería sanitaria, patógena, de ventilación y aguas lluvias, garantizando la fijación, sellado y pendientes adecuadas según el diseño.

De manera paralela, se continuó en el sótano y piso 1 con la instalación de redes hidráulicas para baterías sanitarias y red principal (anillo), labores que incluyen la identificación de rutas, profundidades y alineaciones para evitar interferencias con otros sistemas.

la instalación de la tubería patógena y aguas lluvias, con continuidad programada hacia los siguientes niveles conforme a los tiempos establecidos.

En general, el frente hidrosanitario mantuvo un avance constante, cumpliendo las actividades orientadas al cierre de niveles y preparando las condiciones para la continuidad del montaje en los pisos superiores.

Ilustración 10. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa piso 5.

Ilustración 11. Descuelgue y tendido de red sanitaria bajo placa sótano y piso 3.

Ilustración 12. Red principal de suministro sótano.

➢ **SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC**

Durante el presente periodo se continuo con las actividades correspondientes al Sistema de Ventilación Mecánica, conforme a la planimetría suministrada para ejecución en lo referente a los ductos en lámina para los diferentes equipos de ventilación.

El frente de trabajo continuó las labores en el nivel sótano, avanzando de manera progresiva hacia los puntos de conexión vertical previstos en el diseño; de igual forma se realizó armado y tendido de ductos de suministro y extracción en área de piso 1.

Este proceso incluyó el armado, montaje y fijación de los ductos en los tramos horizontales iniciales, asegurando alineaciones, pendientes y sujeciones adecuadas conforme a los estándares técnicos y normativos aplicables.

Durante la ejecución se ha generado la necesidad de realizar ajustes en los recorridos de los ductos a fin de generar articulación con las especialidades eléctricas e hidrosanitarias.

Ilustración 13. Armado e instalación de ductos sótano y piso 1.

Ilustración 14. Ensamble cuelga y recubrimiento de ductos de suministro.

➢ **ESTRUCTURA**

Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que

cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Ilustración 15. Rampa vehicular.

Ilustración 16. Escalera.

Ilustración 17. Fundida y acero escalera.

Ilustración 18. Foto general

CONTROL TOPOGRAFICO

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.

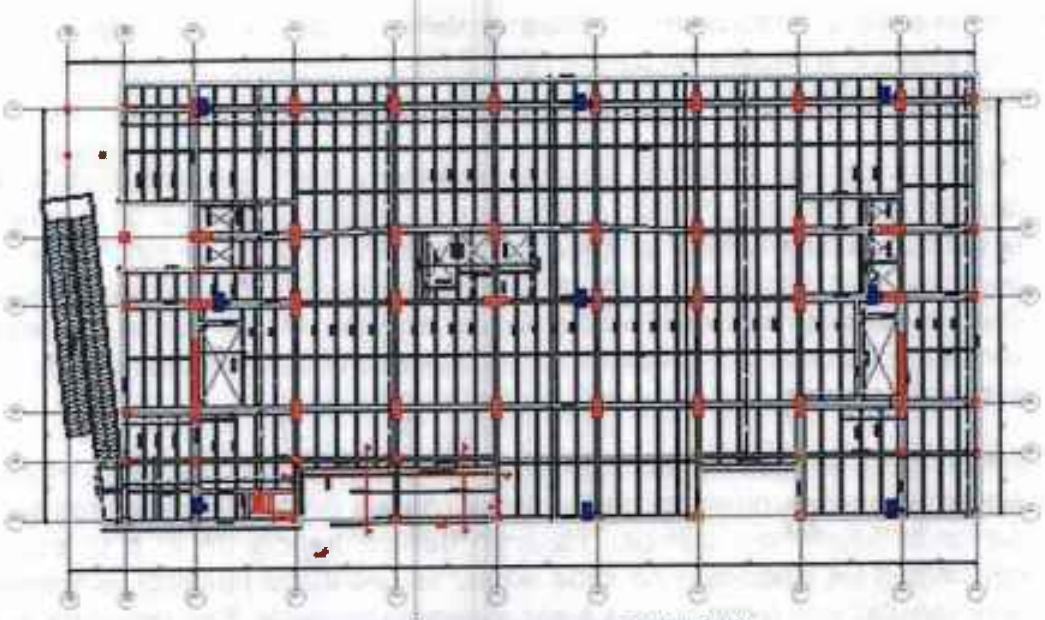

Ilustración 19. Puntos de control asentamientos

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos para el edificio asistencial como para el edificio lote B.

Anexo 1. Informe control asentamientos

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

Durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversas situaciones que requieren atención específica por parte del constructor, la interventoría y la supervisión. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados hasta el momento, organizados por especialidad, así como aquellos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación por los responsables correspondientes.

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES

- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, verificando los diseños del proyecto.

- Se presentó a interventoría el Balance del proyecto, incluyendo los ítems no previstos (NPs) necesarios para el normal proceso de obra, conservando el valor inicial del contrato.

- Para el sistema de ventilación mecánica se indicó a la entidad contratante a través de la interventoría del proyecto que aunque los chillers seleccionados cuentan con la flexibilidad para ampliar su capacidad tanto en frío como en calor y, desde el punto de vista energético y operativo; podrán previa verificación del diseñador consultor atender las demandas futuras del proyecto en caso que se requieran, la verdadera limitación no radica en los equipos sino en la infraestructura hidráulica asociada.

  Por tal razón se hace necesario precisar que, si las tuberías instaladas en la fase actual no quedan previstas desde ahora con los diámetros requeridos para la demanda futura—por ejemplo, pasando de una tubería de 4" a 6" según lo determinen los cálculos— no sería viable, en una etapa posterior, simplemente abrir válvulas y conectar nuevas áreas al sistema existente. Esto generaría déficits de caudal, problemas de operación, inestabilidad en las bombas y afectación directa en la capacidad total del sistema. Se solicitó a la entidad contratante emitir el alcance definitivo del sistema en referencia, incluyendo la revisión técnica y los ajustes que resulten pertinentes, realizados por el profesional responsable del diseño o equipo que dicha entidad considere competente. Una vez definidos, se requiere que el ajuste correspondiente sea entregado al Consorcio San Vicente, a fin de proceder con su adecuada implementación y ejecución dentro del proyecto.

- Para el sistema de gases medicinales, se solicitó a la entidad contratante validar, ratificar y formalizar la aprobación del sistema en referencia, en atención a las observaciones tratadas en el Comité de Obra No. 73, llevado a cabo el 19 de diciembre de 2025, en el cual se evidenció que por parte del apoyo a la supervisión persisten imprecisiones técnicas y vacíos en la definición del alcance, particularmente en lo relacionado con los ajustes y la propuesta técnica previamente aprobada.

- Se reitero la necedad en la entrega por parte de la entidad contratante de la información técnica detallada requerida para la correcta selección, evaluación, y cotización del equipo "planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas tipo compacta" puesto que, a la fecha, no se ha recibido la documentación

necesaria, lo cual imposibilita avanzar en los procesos de adquisición dentro de los plazos establecidos

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación se mantiene la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega.

Verificar las jornadas extra-tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (placas de entrepiso, columnas-pantallas y escaleras).

Buscar la estrategia para culminar la placa de cubierta del edificio asistencial, garantizando los progresos requeridos en la programación.

En relación con el avance de obra, se reitera la solicitud hecha a la interventoría de contar con la revisión, validación, y aprobación de observaciones para actividades relacionadas con el avance estructural de las Edificaciones Pendientes para el Lote B que involucran adicionalmente la consolidación del Balance de obra para la Etapa 1 del proyecto, bajo las siguientes consideraciones que se detallan como sigue:

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B

- Petar y central de gases medicinales

A partir del planteamiento de ubicación de los equipos para PETAR nueva y existente, CENTRAL DE GASES MEDICINALES, TANQUE RCI, entregada por la Consultoría del proyecto Sergo Arquitectura SAS a través de la Supervisión e Interventoría, para lo cual y teniendo en cuenta la reubicación y separación de la cimentación y estructura para la edificación N°3, se solicitó a interventoría el apoyo para agilizar con quien corresponda los ajuste o nuevos diseños estructurales para la Petar y Central de Gases Medicinales, esto fundamentados en que los diseños originales unen por medio de zapatas y columnas las dos estructuras. (ver Ilustración N°1 Planta de Cimentación).

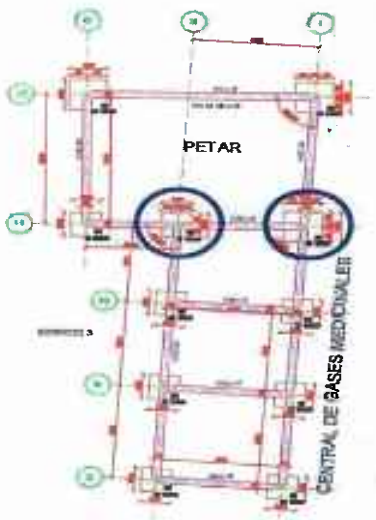

Ilustración 20. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B

1.4.4 EXTERIORES

- Rampa acceso peatonal costado norte

Para el acceso peatonal del costado norte sobre la calle 7 y en relación con los cambios de nivel, se identifica e interpreta en planos de Planta arquitectónica de piso 1° una rampa peatonal de acceso hacia la plazoleta central del proyecto, información y planimetría que no se encuentra resuelta en el proyecto estructural tanto en planos estructurales, detalles y memorias de cálculo, entre otros, situación que no permite claridad tanto para su ejecución como para su cuantificación, por lo cual y de la manera más cordial, les solicitamos sean ubicados y remitidos al Consorcio San Vicente lo antes posible esta documentación.

Ilustración 21. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7°

- Muros Contención Plazoleta Central

En la plazoleta exterior que según planos arquitectónicos, específicamente en la Planta de Piso 1°, se identifica unos esquemas que representan según nuestra interpretación desde el punto de vista arquitectónico, unos muros que contendrán el terreno en los diferentes cambios de nivel que se muestran esquemáticamente en los planos de las secciones transversales o cortes arquitectónicos, sin embargo esto no es suficiente información puesto que no se cuenta, ni se ha ubicado dentro de los archivos entregados al inicio del proyecto, los correspondientes detalles, plantas, despieces, especificaciones y memorias en el proyecto estructural y al igual que el punto anterior, les solicitamos de la manera más cordial sea ubicada y remitidos toda esta información al Consorcio San Vicente lo antes posible, con el fin de lograr desde el área técnica la revisión, planeación y cuantificación de todas las actividades dentro del proceso constructivo.

Ilustración 22. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso

1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.

Según balance, diseño y programación presentada por el consorcio San Vicente y conciliada junto con la interventoría y la Supervisión de la ESE, se desarrollan los siguientes procesos:

- Para garantizar los tiempos establecidos en la programación continuamos con la propuesta ya presentada en los informes anteriores; se incrementa la jornada laboral en dos horas extras de lunes a viernes y el sábado una jornada de 6:00 am a 2 pm, por último, un domingo intermedio se trabajará de 6:00 am a 2:00 pm.

1.4.6 EQUIPOS.

El Consorcio San Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto de marca Putzmeister de gran capacidad de bombeo, adicional

se cuenta con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entrepiso del sistema STEM llegando a 1.800 m2. Se adquiere una grúa auto desplegable MIDI 16/20 y un brazo para colocación de concreto, este complementa la bomba de concreto su nombre Placing boom BHD 18R3.

Ilustración 23. Bomba estacionaria

Ilustración 24 sistema de encofrado STEM

Ilustración 25. Grúa auto desplegable

Ilustración 26. Brazo distribuidor de concreto

1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con la interventoría, con el propósito de ajustar y unificar los criterios de presentación, así como la necesidad y justificación de las actividades ejecutadas. En el marco de estas

reuniones, se realizaron los ajustes correspondientes a las memorias técnicas presentadas, las cuales fueron posteriormente validadas con el acompañamiento de la supervisión.

Adicionalmente, se efectuaron ajustes en las cantidades de los materiales correspondientes a guarda escoba, media caña, pintura tipo 1 y pintura de alta asepsia, definiéndose sus ubicaciones de acuerdo con el uso previsto; dichos cambios quedaron debidamente consignados en los planos de trabajo.

Asimismo, se desarrolló una mesa de trabajo para la verificación de los APU correspondientes a los ítems no previstos, durante la cual se recibieron observaciones, correcciones y recomendaciones a la información presentada, actividad que se encuentra actualmente en proceso de revisión y aprobación por parte de la E.S.E e Interventoría.

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.

Para los insumos con certificados de conformidad como los aceros son suministrados por el fabricante con cada pedido entregado a obra.

Anexo 2. Reporte de ensayos.

1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionadas con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

Anexo 3. Bitácora de obra

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Este documento o programación fue ajustado este año y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

Anexo 4. Programación de obra

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría interconstructoresconsorcio@gmail.com, así mismo se confirma que el

correo para la recepción de comunicados por parte del Consorcio San Vicente es consorciosanvicente2024@gmail.com, que corresponde al correo oficial implementado por el Consorcio San Vicente.

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

De acuerdo con los requerimientos contractuales y lo indicado por la Interventoría, en el periodo se llevan a cabo las diferentes reuniones de comité técnico de obra, que les precede al correspondiente recorrido de obra, las cuales, de acuerdo con lo establecido desde el inicio de obra; se convocó por la Interventoría del contrato, una reunión semanal de comité de obra, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con especialistas para tratar temas puntuales o específicos.

Tabla 3. Comités de Obra mensuales.

No. ACTA	FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS COMITÉ
#72	11/12/2025	➢ Supervisión HSVDP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Radicación de Acta Parcial No. 15 ante la supervisión el 10 de diciembre de 2025. ➢ Reporte de avance de obra. ➢ Se requiere definición de la futura proyección de HVAC. ➢ Revisión de los estados de seguridad en obra y acopio de materiales sobrantes. ➢ Cierre de la obra en cubierta (Mampostería y punto fijo escalera No. 2). ➢ Compromiso de reprogramación de las actividades del año debido a alerta de Gesproy.
#73	19/12/2025	➢ Supervisión HSVDP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Radicación a interventoría de Informe mensual No. 21 y Acta Parcial No. 16 (18 de diciembre de 2025). ➢ Aprobación de diseño eléctrico del proyecto. ➢ Revisión y ajuste del balance con participación de la supervisión del área de apoyo. ➢ Acuerdo en la implementación del ajuste del diseño de Gases Medicinales del proyecto presentado por CSV. ➢ El CSV hace especial énfasis en la necesidad de validación y aprobación del balance para seguridad jurídica y financiera.

Anexo 5. Actas de comité de obra

Tabla 4. Otras reuniones

No. ACTA	FECHA	PARTICIPANTES	TEMA
-	04/12/2025	➢ Representante Min. Salud ➢ Gerencia HDSVP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Presentación estado de contrato.
-	22/12/2025	➢ Gerencia HDSVP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Avance de Balance de obra.
-	26/12/2025	➢ Gerencia HDSVP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Avance de Balance de obra.
-	30/12/2025	➢ Gerencia HDSVP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Avance de Balance de obra.

1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 5. Pólizas

POLIZAS / COBERTURAS	No POLIZA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AB001298	19/03/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB001301	19/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		19/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES		19/09/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA		19/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		19/09/2031

Anexo 6. Pólizas de garantía

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO

Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

Tabla 6. Equipos y herramientas

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	UND	CANTIDAD
VOLQUETA SENCILLA	UND	1
BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO	UND	1
TORRE GRUA	UND	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	2
RETROCARGADOR JCB	UND	1
APISONADOR TIPO CANGURO	UND	1
VIBRADOR PARA CONCRETO	UND	6
SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA	UND	6
ROTOMARTILLOS	UND	3
AMOLADORAS ANGULARES	UND	5
SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)	UND	1
COMPRESOR NEUMATICO	UND	0
EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)	M2	1800
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS)	SEC	36
MOTOBOMBA 2"	UND	1
MOTOBOMBA 4"	UND	1
BOMBA EYECTORA 2"	UND	2
ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)	UND	1
BRAZO HIDRULICO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO	UND	1

Tabla 7. Personal que laboro durante el periodo

PERSONAL / CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	3
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1
RESIDENTE DE ACTAS	1
PROFESIONAL SST	2
INSPECTOR DE OBRA	1
TECNICO SST	2
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	1
MAESTRO DE OBRA (EJERO)	1
OFICIALES	41
AYUDANTES	35

PLOMEROS	9
ELECTRICOS	4
MAMPOSTEROS	21
OPERADORES MAQUINARIA	2
CONDUCTORES VOLQUETAS	1

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 8. Marco normativo SST

Ley 9/79:	Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
Decreto Ley 1295/94:	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 1616/13:	Ley de salud mental.
Decreto Ley 1562/15:	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto 1072/15:	Decreto único reglamentario del sector trabajo.
Resolución 2400/79:	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013/86:	Comité paritario de salud ocupacional.
Resolución 2346 de 2007:	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.
Resolución 2646 de 2008	Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial
Resolución 1918 de 2009	Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 652/12:	Comité de convivencia laboral.
Resolución 0312/19:	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores
Resolución 0491 de 2020	Trabajo en espacios confinados
Resolución 4272 de 2021	Trabajo en alturas
Resolución 773 de 2021	Sistema Globalmente Armonizado
Resolución 2764 de 2022	Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo.

Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 31 de diciembre del 2025.

- ✔ En el presente periodo se presentó 1 ingreso de CONSORCIO SAN VICENTE.
- ✔ 2 ingresos de American global SAS.

- ✔ 3 ingresos de mamposteros DS Losada.
- ✔ 2 ingresos de IcoConstrucciones.

2.2.1 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 9. Personal CSV

NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHON JAIRO CABRERA ARDILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	2/07/2024	23/12/2025
LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	19/07/2024	
WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHONATANT MEDINA POLO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO MURCIA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	23/10/2024	
WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDWIN LEONARDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
EDWIN ALEXANDER DEVIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO SANCHEZ VERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
GERMAIN INOJOSA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
JULIO CESAR RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	23/12/2025
DIDIER CAMPOS ARDILA	OFICIAL HERRERO	7/01/2025	
NIDA LUCERO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DEIBI ALEJANDRO PASCUAS BERMEO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDILBER SALGADO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/01/2025	
JUAN CARLOS PENNA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIAN ANDRES SALGADO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
LUIS ERNESTO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
AILER VIUCHE CORDOBA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	03/12/2025
JULIO CESAR AYALA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ	ARMADOR	03/02/2025	23/12/2025
FRANCISCO PRADA RAMOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	03/02/2025	

DIEGO ARMANDO SIERRA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
MAURICIO MANRIQUE MEDINA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/02/2025	
MEDARDO ANDRES SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/02/2025	
DAIMER ALEXIS MUÑOZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
JHANER MURCIA GALINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
LUIS PARMENIDES HURTADO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
WILLIAM ALEXANDER GUERRERO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JOINER STIVEN GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
LUIS FERNANDO PARRA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JORGE MARIO GOMEZ	OFICIAL HERRERO	12/03/2025	23/12/2025
ADOLFO NAGLES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
JACKSON BORJA MOSQUERA	OFICIAL HERRERO	20/03/2025	
NILSON BAÑOS SURMAY	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	23/12/2025
YEISON ANTONIO NARVAEZ	OFICIAL HERRERO	25/03/2025	23/12/2025
ALBERTO MAHECHA BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ALEJANDRO ELIZALDE URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	18/12/2025
LEONARDO SAENZ PIMENTEL	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ARGEMIRO RAYO URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	22/04/2025	
DESIDERIO LOAIZA	OFICIAL HERRERO	22/04/2025	23/12/2025
JOSE ALBEIRO CORDOBA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
CARLOS MARIO DE AVILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
HELMER ARLEY PASTRANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/05/2025	
JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JAIME GONZALEZ TRUJILLO	OPERADOR	12/06/2025	
MEDARDO VALENZUELA PERDOMO	APAREJADOR	07/07/2025	
ELVER ADOLFO BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	16/07/2025	
JAIME CHAVARRO RAMOS	OFICIAL DE OBRA	5/08/2025	
DIEGO ALEJANDRO PEDROZA PERDOMO	OFICIAL	20/08/2025	
RONALD NARVAEZ MARTINEZ	HERRERO	20/08/2025	23/12/2025
CHRISTIAN DAVID NAVAS ROJAS	AYUDANTE	25/08/2025	
ANDERSON URRIAGO SERRATE	AYUDANTE	25/08/2025	
JESUS ANDRES OSORIO	OFICIAL	18/09/2025	
WILSON MIGUEL PARRA	AYUDANTE	18/09/2025	
YEFFERSON LOPEZ GOMEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RAFAEL DIONISIO FERNANDEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RODOLFO CERQUERA OSORIO	AYUDANTE	1/10/2025	13/12/2025
FLORENTINO NAGLES VARGAS	OFICIAL	1/10/2025	
MIGUEL ARTURO RIOS MONJE	OFICIAL	1/10/2025	

MARLON FELIPE OLAYA PIAMBA	OFICIAL	1/10/2025	
JUAN DAVID RIVAS PIÑACUE	AYUDANTE	1/10/2025	23/12/2025
WILINTON MUÑOZ RUIZ	AYUDANTE	1/10/2025	
JOSE ILIER ORDOÑEZ GAITAN	AYUDANTE	15/10/2025	
CRISTIAN CAMILO MAYA CORTES	AYUDANTE	24/10/2025	
EDUARD IGNACIO TRUJILLO	AYUDANTE	24/10/2025	
KEVIN MIGUEL ORTIZ TELLEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
CRISTIAN CAMILO CHAVARRO GRILLO	AYUDANTE	4/11/2025	
JOSE RICARDO RODRIGUEZ GARCIA	AYUDANTE	4/11/2025	
GIOVANNY DEVIA MUÑOZ	AYUDANTE	4/11/2025	
JOHAN SEBASTIAN FRAGUA RODRIGUEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
EDINSON ANDRES SIERRA RAMOS	AYUDANTE	4/11/2025	
WILLIAM ANDREY MOLANO	AYUDANTE	4/11/2025	
PABLO ANDRES POLO POLO	AYUDANTE	18/11/2025	

2.2.2 PERSONAL CASETÓN

Tabla 10. Personal Icoconstruccion

NOMBRE	CARGO
ERNESLEY LIZCANO	OFICIAL
DIEGO ANDRES MORALES	AUXILIAR
FELIX ANDRES TRIVIÑO	AUXILIAR
DUVAN ANDRES HURTADO	AUXILIAR

2.2.3 PERSONAL HIDROSANITARIAS

Tabla 11. Personal Hidrosanitario

NOMBRE	CARGO
ALEJANDRA PIZO RIVERA	PROFESIONAL SST
CARLOS EDUARDO BELTRAN	OFICIAL PLOMERIA
JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO	AYUDANTE DE PLOMERIA
LUIS NIGRINIS MATTA	OFICIAL PLOMERIA
RODOLFO JAVIER LEIVA	SUPERVISOR DE OBRA
JUAN DIEGO SANCHEZ PERDOMO	AYUDANTE PLOMERIA
MIGUEL ANTONIO ESPITIA	OFICIAL PLOMERIA
PABLO CESAR PALENCIA	OFICIAL PLOMERIA
JOSE LUIS CUBILLOS	AYUDANTE PLOMERIA
JULIAN ANDRES HERNANDEZ	AYUDANTE PLOMERIA
ANDER SMITH ALVARADO	AYUDANTE PLOMERIA

2.2.4 PERSONAL ELÉCTRICO

Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño

NOMBRE	CARGO
OMAR JAVIER RODRIGUEZ	OFICIAL ELECTRICO
NELSON ROJAS GARZON	AUXILIAR ELECTRICO
FREDY FIERRO MEDINA	AUXILIAR ELECTRICO
OMAR ALEJANDRO SILVA	AUXILIAR ELECTRICO
DIEGO FERNANDO TORRENTE	AUXILIAR ELECTRICO
LUIS MIGUEL SOTO MENESES	AUXILIAR ELECTRICO

2.2.5 PERSONAL TOPOGRAFÍA

Tabla 13. Personal Topografia

NOMBRE	CARGO
SEGUNDO ANDRADE ANDRADE	TOPOGRAFO

2.2.6 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.

Tabla 14. Tabla Personal Mamposteria #1

NOMBRE	CARGO
LUIS ANTONIO PINZON	INGENIERO
JOSE YONATHAN NARVAEZ	CORTADOR
CARLOS NARVAEZ RODRIGUEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
ARMANDO ELIZALDE	OFICIAL PLUMERO
JACI ALEJANDRO LOPEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
ROBINSON GONZALEZ ASPRILLA	OFICIAL MAMPOSTERO
LUIS ENEL VALENCIA	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
CARLOS JULIO PIÑACUE	OFICIAL MAMPOSTERO
FERNANDO IMBRECH	AYUDANTE MAMPOSTERO
JHON ARCESIO JARAMILLO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA
JORGE ELIECER PAEZ	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
FRANCISCO GUTIERREZ	OFICIAL MAMPOSTERO
JUAN SEBASTIAN RUIZ	OFICIAL MAMPOSTERO
VICTOR DAMIR MORENO	OFICIAL MAMPOSTERO
JAIDER JAMES FERRER	OFICIAL MAMPOSTERO
JORGE DANEY MELO	OFICIAL MAMPOSTERO
CRISTIAN FELIPE FERRO	AYUDANTE MAMPOSTERO
SERGIO LUIS CEBALLOS	OFICIAL MAMPOSTERO
JOSE DILFREDO CUMBE	AYUDANTE MAMPOSTERO

ALEX DAVID OLAYA	AYUDANTE MAMPOSTERO
EDWIN RIVAS TAMAYO	PAÑETADOR
LUIS HERNANDO CORZO	OFICIAL MAMPOSTERO
JAVIER MENDOZA	OFICIAL MAMPOSTERO
ELIAS RAFAEL ALVARO	AYUDANTE MAMPOSTERO
EDWIN ALBEIRO MOLINA	OFICIAL MAMPOSTERO
JEAN CARLOS CARRASCAL	AYUDANTE MAMPOSTERO
JHON EVERSON GARCIA	AYUDANTE MAMPOSTERO

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Dando cumplimento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

Resaltar que cuando un colaborador renuncia o es retirado del Consorcio San Vicente, se realiza su respectivo trámite a exámenes de egreso y paz y salvo.
En el periodo se realiza examen médico periódico al personal que corresponda.
Anexo 8. Soportes afiliaciones y retiros

Tabla 15. Cumplimiento EMO ingresos

INDICADOR	CUMPLIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO
Indicador de Calificación	(No. evaluación médica ocupacional realizados /No. evaluación médica ocupacionales programados) X 100%
	(8/8) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador cumple, se realizaron ocho (8) evaluaciones médicas ocupacionales al personal que ingresó a Consorcio San Vicente.

De igual manera, mensualmente se realiza el pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal directo y la respectiva validación de los pagos realizados por el mismo concepto de los proveedores.
Anexo 9. Soporte pagos de seguridad social

2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del cronograma de actividades del CONSORCIO SAN VICENTE se realizaron charlas y capacitaciones. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 10. Capacitaciones y charlas de seguridad

Tabla 16. Capacitaciones y charlas

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD			
TEMA	**FECHA**	**CANTIDAD DE PARTICIPANTES**	**DURACIÓN**
Socialización de permisos de trabajo y ATS	01-12-2025	60	10 minutos
Acciones inmediatas y de evacuación en caso de sismo.	02-12-2025	68	10 minutos
Respeto y buen trato entre compañeros	03-12-2025	63	10 minutos
Peligros y riesgos definición y medidas de control	04-12-2025	67	10 minutos
Conservar y acatar la señalización de seguridad	05-12-2025	61	10 minutos
Aseo y orden en obra	06-12-2025	05	15 minutos
Importancia del diligenciamiento de Permisos y ATS	08-12-2025	24	10 minutos
ATS, orden y aseo	09-12-2025	10	15 minutos
Socialización de permisos de trabajo	09-12-2025	70	10 minutos
Comunicación para trabajo seguro	10-12-2025	10	15 minutos
Respetar la señalización en obra	10-12-2025	66	15 minutos
Resolución de Conflictos en obra	11-12-2025	9	20 minutos
Resolución de Conflictos en obra	11-12-2025	69	10 minutos
Manejo de cargas en el trabajo	12-12-2025	12	15 minutos
Concientizar al personal sobre los riesgos en sus actividades.	12-12-2025	67	15 minutos
Uso de EPCC y obligación de mantener anclados	12-12-2025	2	10 minutos
Normas de seguridad en obra	13-12-2025	8	15 minutos
ATS: Importancia de conocer los riesgos y controles	15-12-2025	11	15 minutos
Uso adecuado de la dotación y EPP	15-12-2025	67	15 minutos
Cuidado de equipos de trabajo y material de obra	16-12-2025	11	15 minutos
Socialización de las funciones del Comité de convivencia laboral COCOLAB	16-12-2025	80	15 minutos
Normas en obra y solución de conflictos	17-12-2025	12	15 minutos

Precaución en actividades de encofrado de escaleras	17-12-2025	75	15 minutos
Aseo en obra y acogimiento al reglamento interno	18-12-2025	10	15 minutos
Capacidad de la torre grúa y recomendaciones	18-12-2025	76	10 minutos
Conductas inseguras: Omitir el anclaje a línea de vida	19-12-2025	10	15 minutos
Riesgo de actividades con lluvia	20-12-2025	6	15 minutos
Recomendaciones sobre el uso de accesorios en obra	20-12-2025	39	10 minutos
Registro ATS y Recomendaciones para trabajo en alturas	22-12-2025	9	10 minutos
Firma de permisos y ATS / Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	22-12-2025	66	15 minutos
Aseo y acopio de RCD en el lugar adecuado	23-12-2025	4	15 minutos
Recomendaciones de seguridad para festividades	24-12-2025	52	15 minutos
Recomendaciones de seguridad para festividades	24-12-2025	3	15 minutos
Uso adecuado de los EPP y Jornada de Aseo	26-12-2025	60	15 minutos
Calistenia y ejercicios de estiramiento	27-12-2025	52	15 minutos
Cuidado de EPP y EPCC	29-12-2025	4	15 minutos
Uso adecuado de las unidades sanitarias	29-12-2025	63	15 minutos
Calistenia y ejercicios de estiramiento	30-12-2025	65	15 minutos

Tabla 17 Cumplimiento charlas y capacitaciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD
Indicador de Calificación	(No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%
	(38/38) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron treinta y ocho (38) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente.

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual de los comités el día 15/12/2025.

También se presenta informe trimestral y anual del Comité de convivencia laboral.
Anexo 11. Comités de apoyo

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

Anexo 12. Recomendaciones médicas

2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

El proceso de inducción y reinducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 13. Inducción y reinducción

Tabla 18. Inducciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDUCCION AL TRABAJADOR
Indicador de Calificación	(No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%
	(8/8) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se realizaron ocho (8) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente.

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

Anexo 14. Entrega de dotación y EPI

Tabla 19. Cumplimiento EPI

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de Calificación	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
	(85/85) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS
Indicador de Calificación	(No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100%
	(65/65) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%.

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. **Ver Registro fotográfico**

Tabla 20. Cumplimiento kit señalización SST

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT SEÑALIZACIÓN SST
Indicador de Calificación	(No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%
	(25/25) *100%= 100%
Análisis	Durante este periodo se realizó la instalación de veinticinco (25) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo.

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones preoperacionales a los equipos, máquinas, herramientas, como también a los equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

Anexo 15. Inspecciones

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Consorcio San Vicente cuenta con servicios sanitarios para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales

Tabla 21. Relación agua potable

PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Del 02 al 11 de diciembre	Botellón 20 L	35 unds
12 al 18 de diciembre	Botellón 20 L	26 unds

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS

CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones preoperacionales a los equipos, máquinas, herramientas, como también a los equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.
Anexo 15. Inspecciones.

Tabla 22. Cumplimiento Kit de emergencias

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS
Indicador de Calificación	(No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100%
	(5/5) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se cuenta con cinco (5) kit de emergencias uno (1) en campamento y cuatro (4) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto.

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

En el periodo se presentaron dos (2) accidentes de trabajo no graves ni mortal, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

Tabla 23. Personal con incapacidad por AT

INCAPACIDADES POR ATEL			
Número AT Periodo	2	Total días de incapacidad por AT	5
Nombres y Apellidos del trabajador	Cargo		Días de incapacidad del periodo
JAIME CHAVARRO	Oficial		3
CRISTIAN CAMILO MAYA	Ayudante		2

Anexo 16. Indicadores y reporte de accidentes

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan en el Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS

Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS.

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría. Ver Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS. **Ver Registro Fotográfico.**

2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

El CONSORCIO SAN VICENTE realiza la detección, documentación, verificación de plan y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de asegurar la eficacia del sistema de gestión SST y prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como para optimizar continuamente las condiciones de trabajo.

Anexo 18. Informe Acciones del periodo

2.17 INFORME PROVEEDORES

Para el presente periodo el proveedor de mampostería presenta informes de las actividades ejecutadas, que incluye capacitación y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo, entre de elementos de protección personal y dotación.

Anexo 19. Informe de contratista

2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo se llevó a cabo actividad de seguimiento y orientación al trabajador en Prevención del Riesgo cardiovascular a cargo de la profesional Hamara Páez, Nutricionista. Ver Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales y **Ver Registro fotográfico.**

2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

En desarrollo de las actividades del PMT en el proceso constructivo en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. **Ver Registro fotográfico**

2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

Anexo 20. Solicitud cierres temporales PMT

2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:

2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 014 del 29/12/2025

Anexo 21. Acta Apertura Buzón PQRS

2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el

Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. **Ver registro fotográfico**

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:

-Diligenciamiento de registro de visitantes

-Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.

-Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores como es la celebración de navidad y la celebración de los cumpleaños del mes. **Ver Registro fotográfico.**

2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Anexo 22. Registro fotográfico SST

3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN".

3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 24. Marco legal gestión ambiental

NORMAS GENERALES	Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.
	Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales.
	Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.
	Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.

NORMAS REGLAMENTARIAS	Constitución política del 1991: • Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. • Art 58:" La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica". • Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables." • Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano". • Art 80: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. • Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. • Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc. • Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos náurales no renovables.
	Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.
	Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
	Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.
	Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos.
	Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto

AIRE	Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
	Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
	Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
	Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.
SUELO	Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
AGUA	Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.
	Ley 99 de 1993. Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.
	Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.
	Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.

	Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.
	Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.
RESIDUOS SÓLIDOS	Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.
	Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos
	Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
	Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
	Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
	Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
	Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
	Resolución 472 del 2017: Donde ser reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que derogo expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.

FAUNA	Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.
	Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.
	Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre
	Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
FLORA	Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
	Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana
	Certificado de Incentivo Forestal – CIF: Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.
PAISAJE	Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS	Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.
	Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.
	Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
	Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
	Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.
	Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.
	Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos

ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
	Ley 1152 de 2007.Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones
	Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas.
	Decreto 879 de 1998. Articulo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.
	Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial
RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial.
	Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas.
	Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional
	Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.
	Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.
	Ley 99 de 1993: articulos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres.
	Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias
	Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional
	Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo
ARQUEOLOGIA	Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de

	investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico
	Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial.
	Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.

3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2025, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

En el presente ítem, se detallan los indicadores ambientales correspondientes al segundo semestre, conforme a lo establecido en las fichas ambientales.

Anexo 23. Indicadores ambientales.

3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

Para el presente periodo se utilizaron materiales pétreos para las diferentes actividades constructivas.

3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

Tabla 25. Relación de materiales e insumos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
Maderas Ordoñez	Tabla burra	76 unidades
Maderas Ordoñez	Chaflones 12.5 x 12.5	22 unidades
EDS Gasoil	Gasolina	3 galones
EDS Gasoil	ACPM	342.671 galones

Tabla 26. Relación de materiales pétreos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
DF Construcciones y servicios SAS	Arena	84 m3
DF Construcciones y servicios SAS	Triturado	19 m3
Masseq	Triturado	19.46 Ton

Tabla 27. Relación Ingreso de concreto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE CONDUCTOR	VOLQUETA PLACAS	M3
04/12/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-839	4.5
05/12/2025	CONVENCIONAL	WILLIAM TRUJILLO	VKK-758	6
05/12/2025	CONVENCIONAL	JOHAN ACHIPIS	SRD-713	8
10/12/2025	CONVENCIONAL	OSCAR OLAYA	WOW-039	5

10/12/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-839	4.75
18/12/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-839	4.5
22/12/2025	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-839	3.75
	TOTAL			36.4 m3

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.

Anexo 24.Control de material

3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo. En el presente periodo se realiza fundida de estructura con concreto premezclado.

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.

Tabla 28. Sustancias químicas usadas

SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS	
CEMENTO	Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).
ACPM	Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación.
GASOLINA	El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía. Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor.
PEGANTE PVC	Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías. Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.
DESMOLDANTE PARA FORMALETA	Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico. Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.
EPOTOC 1	Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.

TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE	Es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.
DURAL 452 GEL	Adhesivo epóxico de dos componentes, 100% sólido, de alto módulo, diseñado para aplicaciones de unión estructural que requieren un material que no se descuelgue o deslice.
ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Ha sido específicamente diseñado para proveer una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base. Es apropiado para resistir cargas medianas y altas, tanto estáticas, como de viento o sísmicas en tensión y cortante en aplicaciones estructurales y no estructurales.
LIMPIADOR PVC	Producto químico diseñado para limpiar y preparar superficies de cloruro de polivinilo (PVC) antes de aplicar adhesivos o selladores.
ESMALTE AMARILLO	Es un tipo de pintura que se utiliza para dar un acabado brillante y protector a diversas superficies.
CURASEAL ANTISOL	Solución coloidal, disponible en rojo, blanco o transparente, que se utiliza para el curado, sellado y endurecimiento de concreto y mortero
ENDURECEDOR PARA PISOS	Formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas.
MORTERO ACRILICO	Material transpirable y de alta resistencia compuesto de resinas acrílicas y pigmentos.
ET-3G	Se utiliza para anclar varillas roscadas y barras de refuerzo en concreto y mampostería, siendo ideal para aplicaciones generales, incluso en condiciones secas o húmedas y en concreto agrietado o no agrietado.

3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continua el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.
- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.

Anexo 25. Inspección acopio y consumo combustible

3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.

3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo con el código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

3.8 MANEJO DE RCD

3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

En el presente periodo se dispuso 56 m3 de RCD. Residuos que fueron depositados y dispuestos en el sitio definido por la empresa y mencionado en el anterior ítem.

Estas disposiciones fueron realizadas por Consorcio San Vicente y el proveedor de volquetas DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 901359095-1.
Cabe resaltar que la salida de volquetas en obra siempre es carpada con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

En este periodo se realizó disposición final de RCD lo cual se generaron reportes mensuales de sobrantes, dichos residuos fueron dispuestos en el sitio establecido y autorizado.

Tabla 29. Retiro RCD

FECHA	SALIDA DE MATERIAL	PLACA VOLQUETA	M3	VIAJES	TOTAL, M3
2/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7
3/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7
9/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7
9/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7
10/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7
11/12/2025	ESCOMBROS	XMC-971	7	1	7
11/12/2025	ESCOMBROS	XMC-971	7	1	7
12/12/2025	ESCOMBROS	OXB-074	7	1	7

En la siguiente tabla, se relaciona de manera trimestral el reporte de disposición final de RCD generados en el 2025.

Tabla 30. Reporte RCD 2025

PERIODO	SALIDA DE MATERIAL	TOTAL, M3
Ene - mar	Escombros y excavación	1252
Abr - Jun	Escombros	7
Jul - Sep	Escombros	426
Oct - Dic	Escombros	243

3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombro, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.

3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizo ningún material en obra ya que todo los RCD generados en obra fueron dispuestos en sitio.

Anexo 26. Control de material RCD

3.8.6 TRANSPORTE

Durante este periodo se realizó cargue y/o transporte de RCD, dichos sobrantes fueron transportados por las siguientes volquetas.

Tabla 31. Vehiculos retiro RCD

PLACA	M3
XMC-971	14
OXB-074	42

3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se programa nuevamente su retiro y disposición final.

3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL

Durante el período mencionado, no se efectuó la entrega de materiales a la empresa gestora responsable de la recolección y disposición final ambiental de los residuos generados ni se realizaron donaciones.

3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES

Durante el presente periodo, se realizaron las labores de humectación de superficies mediante riego controlado, aplicadas principalmente en actividades como el barrido de placas, con el fin de minimizar la emisión de polvo y mantener las condiciones adecuadas de limpieza. Estas acciones se ejecutan bajo criterios de uso eficiente del recurso hídrico, evitando el desperdicio de agua y en coherencia con las campañas internas de ahorro y consumo responsable.

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de corte de ladrillo bajo condiciones controladas, aplicando humectación previa del material con el propósito de minimizar la generación y dispersión de material particulado. Asimismo, se adecuó un área específica para el corte, cubierta con poli sombra, que actúa como barrera física para evitar la propagación de polvo hacia otras zonas de trabajo. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la prevención de impactos al entorno y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente

3.10.5 VÍAS DE ACCESO

En este periodo, las vías de acceso a la obra Hospital Departamental San Vicente de Paúl se mantienen en óptimas condiciones, libres de acumulación o dispersión de material particulado. Al finalizar cada jornada o actividad que implique movimiento de materiales o tránsito de vehículos, se realizan barridos y limpieza preventiva en las vías de acceso, con el fin de remover el material particulado o residuos sueltos generados durante las labores. Estas acciones contribuyen al control ambiental del área de influencia, asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra volquetas para realizar trasiego de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así, autorizar su ingreso.

Tabla 32. Volquetas entrada y movimiento de material

PLACA	LINEA	MODELO
XMC-971	KODIAK-157	2009
WHA-003	SIN LINEA	1946
OXB-074	BRIGADIER-151	1984

Tabla 33. Relación maquinaria en obra

CLASE	LINEA	MODELO
BOMBA ESTACIONARIA	PUTZMEISTER	BSA 1004
TORRE GRUA MOVIL	-	ACRS13-L
PLANTA ELECTRICA	-	P-100
TORRE GRUA	-	CM4810

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de los mismos.

3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

Tabla 34 Relación consumo de agua

Factura No.	Código interno	Consumo m3
3553151	00185097	52

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.

Anexo 27. Control aseo de baños

3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

En el presente periodo se implementaron acciones de control para prevenir la dispersión de material particulado y el derrame de residuos en las vías de acceso. Cuando se requiere, a las volquetas se les realiza el lavado de llantas mediante riego controlado, evitando el arrastre de material hacia el exterior de la obra. Asimismo, el lavado de los mixers se efectúa en un área acondicionada con dique de contención, lo que permite retener los residuos sólidos y evitar vertimientos directos sobre el suelo. Los residuos generados durante estas actividades son recolectados y trasladados a las áreas de acopio temporal, donde se almacenan de manera segura para su posterior disposición final.

3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

3.11.6 CUERPOS DE AGUA

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.7 CONTROL DE VECTORES

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

Anexo 28. Control de plagas y roedores

3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.

Ilustración 27. Publicaciones ambientales

3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo la siguientes charlas y capacitaciones:

Tabla 35. Relación de temas ambientales

No.	Tema	Fecha	Duración
1	Orden y aseo en obra	06/12/2025	10 min
2	Manejo de recolección de los residuos peligrosos en obra	13/12/2025	30 min
3	Retiro de puntillas de la madera y clasificación de RCD	16/12/2025	10 min
4	Gestión de residuos en obra	23/12/2025	10 min
5	Orden y aseo en obra	26/12/2025	15 min
6	Organización de áreas de trabajo	31/12/2025	10 min

Anexo 29. Registro de charlas

3.14 ORDEN Y ASEO

3.14.1 JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.

Ilustración 28. Orden y aseo

Anexo 30. Inspección de orden y aseo

3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS

Durante el presente periodo no se recibió visita de ningún ente o autoridad ambiental.

3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de noviembre, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

Anexo 31. Registro fotográfico Ambiental

4. CONCLUSIONES

- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E., verificando los diseños y ajustes necesarios para el proyecto en cumplimiento de las consideraciones de normativa hospitalaria y de habilitación, dispuestas por las Resoluciones 3100 de 2015 y Resolución 1633 de 2025.

- Se han presentado a Interventoría para consideración y aprobación el Acta de mayores y menores con inclusión de ítems no previstos o NPs necesarios para el normal desarrollo de las actividades y proceso de obra, dentro de un Balance presupuestal de obra que permita conservar el valor inicial del contrato.

- En este periodo dentro de la planeación interna del Consorcio se dio continuidad a la actividad de fabricación y montaje de ductos para el Sistema de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado, para lo cual mediante coordinación de planos de arquitectura y proyectos técnicos se evidenció la necesidad de realizar ajustes en los recorridos de los ductos del sistema de ventilación HVAC, particularmente en el pisos del el área destinada a los tanques de almacenamiento de agua potable y tanques de servicios. Actividades concertadas y aprobadas por la interventoría del proyecto.

- El Consorcio San Vicente se encuentra a la espera de una confirmación por escrito por parte de la interventoría y de la entidad contratante (E.S.E. HDSVP), respecto a la solicitud de implementar y dejar previsto una ampliación del sistema HVAC inicial, para lo cual es urgente contar con esta definición y los ajustes en planos para ejecución de obra, especificación de equipos y memorias de cálculo, con el fin de poder generar una gestión de compra por el Consorcio, y de igual manera poder establecer la continuidad de las actividades, que pretenden atender consideraciones futuras de acondicionamiento de aire para el área de hospitalización comprendida por los pisos cuarto, quinto, sexto y séptimo.

- El Consorcio San Vicente ha realizado los requerimientos de precisiones técnicas y de diseño para la conexión de los diferentes Sistema HVAC, Gases Medicinales, PETAR y subestación Eléctrica, generadas por un Banco Ductos que conecte las dos Etapas del proyecto incluidos los bloques 1, 2 y 3 del Lote B.

- Para el sistema de gases medicinales, se solicitó a la entidad contratante validar, ratificar y formalizar la aprobación del sistema en referencia, en atención a las observaciones tratadas en el Comité de Obra No. 73, llevado a cabo el 19 de diciembre de 2025, en el cual se evidenció que por parte del apoyo a la supervisión persisten imprecisiones técnicas y vacíos en la definición del alcance, particularmente en lo relacionado con los ajustes y la propuesta técnica previamente aprobada.

- El Consorcio San Vicente ha venido reiterando que la información suministrada para cotizar el equipo comunitario (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR) es insuficiente, aspecto técnico que ha sido ratificado adicionalmente por el especialista de Interventoría y para lo cual aún no se ha presentado una solución y respuesta efectiva, resaltando que el aspecto determinante en la actualidad es la demanda de la planta.

- Para el sistema de ventilación mecánica se indicó a la entidad contratante a través de la interventoría del proyecto que aunque los chillers seleccionados cuentan con la flexibilidad para ampliar su capacidad tanto en frío como en calor y, desde el punto de vista energético y operativo; podrán previa verificación del diseñador consultor atender las demandas futuras del proyecto en caso que se requieran, la verdadera limitación no radica en los equipos sino en la infraestructura hidráulica asociada.

- En lo relacionado con las actividades del área SST y Ambiental durante el mes de diciembre de 2025 y cerrando el año 2025, el Plan de Trabajo fue ejecutado de manera satisfactoria, alcanzando un nivel de cumplimiento del 95,8 %, lo que evidencia una adecuada planificación, seguimiento y compromiso por parte de las áreas involucradas. Este resultado refleja una gestión eficiente de las actividades programadas y el cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos para el período evaluado.

  De igual manera el Programa de Capacitación presentó un nivel de cumplimiento del 87 %, lo cual evidencia un avance significativo en la ejecución de las actividades formativas planificadas y el compromiso de la organización con el fortalecimiento de las competencias del personal.

- Durante el desarrollo de las actividades en obra en el presente periodo, el componente ambiental se ha gestionado de manera adecuada y conforme a lo establecido en la normatividad vigente y a los lineamientos internos del proyecto. Sin presentar inconvenientes ambientales de consideración o afectaciones significativas al entorno. Las actividades se han ejecutado manteniendo medidas de prevención, control y seguimiento, lo que ha permitido un desempeño ambiental satisfactorio y continuo.

- A la fecha del presente informe el Consorcio San Vicente ha realizado la entrega de las diferentes versiones que comprenden los ajustes, complementación y atención de las recomendaciones para la presentación definitiva y suscripción del Acta de mayores y menores que incluye ítems no previstos, respecto a la cual no se ha recibido pronunciamiento técnico alguno o aprobación por parte de la Interventoría. Esta falta de respuesta impide avanzar con la programación de actividades, ajustes presupuestales y procesos de compra, ya que los ítems y cantidades a mayores no han sido aprobados para su correspondiente ejecución en obra.

- A la fecha del presente informe se destaca que las actividades de mampostería húmeda y confinamientos, la instalación de tubería eléctrica del tipo EMT embebidas en muros para los sistemas eléctrico y especialidades, se encuentran suspendidos al haber llegado al tope máximo de cantidades indicadas contractualmente, para lo cual es necesario y fundamental contar con el trámite y aprobación del Acta de mayores y menores cantidades de obra.

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA"

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 23

CONTRATO N°090 DE 2024

ENERO 2026

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN VICENTE

GARZÓN HUILA

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA"

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISÓ	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
01	79	Enero	**Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo**		Informe de gestión enero de 2026

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

TABLA DE CONTENIDO

COMPONENTE TECNICO 3

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 3

1.2 INFORMACION FINANCIERA 4

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO 4

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN 4

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 5

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B 5

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A 5

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO 14

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES 15

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 16

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B 17

1.4.4 EXTERIORES 18

1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS. 20

1.4.6 EQUIPOS. 20

1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS 23

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA 26

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 26

1.5.2 BITACORA DE OBRA 26

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA 26

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA 27

1.6.1 CORRESPONDENCIA 27
1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO 27
1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO 28
1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO 29
2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31
2.1 MARCO NORMATIVO 31
2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL 32
2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE 33
2.2.2 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE 33
2.2.3 PERSONAL CASETÓN 35
2.2.4 PERSONAL HIDROSANITARIAS 35
2.2.5 PERSONAL ELÉCTRICO 36
2.2.6 PERSONAL TOPOGRAFÍA 36
2.2.7 ERSONAL MAMPOSTERÍA #1 36
2.2.8 PERSONAL AIRES ACONDICIONADOS 37
2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL 37
2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 38
2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST 39
2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD 39
2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES 40
2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 40
2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 41
2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS 41
2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 41

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS 42
2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 42
2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO 43
2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO 43
2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 43
2.17 INFORME PROVEEDORES 43
2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 43
2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 44
2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA 44
2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 44
2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR 44
2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES 44
2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES 45
2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 45
3 GESTIÓN AMBIENTAL 46
3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 46
3.1.1 MARCO NORMATIVO 46
3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 53
3.2.1 INFORME AMBIENTAL 53
3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 53
3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES 53
3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO 53
3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES 53
3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 53

3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS 53
3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN 54
3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO 54
3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 54
3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 55
3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION 57
3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 58
3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN 58
3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 58
3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 58
3.8 MANEJO DE RCD 58
3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 58
3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 59
3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD 59
3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN 60
3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD 60
3.8.6 TRANSPORTE 60
3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 60
3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO 60
3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL 60
3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 61
3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA 61
3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD 61
3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES 61

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES 61
3.10.5 VÍAS DE ACCESO 62
3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 62
3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 63
3.11.1 SUMIDEROS 63
3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS 63
3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 63
3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA 63
3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES 64
3.11.6 CUERPOS DE AGUA 64
3.11.7 CONTROL DE VECTORES 64
3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 64
3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA 64
3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES 65
3.14 ORDEN Y ASEO 65
3.14.1 JORNADAS DE ASEO 65
3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA 66
3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 66
3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS 66
3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES 66
3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO. 66
4. CONCLUSIONES 67

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto 2
Ilustración 2. Armado de mampostería. 7
Ilustración 3. Elementos de confinamiento. 7
Ilustración 4. Armado de mampostería fachada. 8
Ilustración 5. Pañetes 8
Ilustración 6. Instalación ductería para tomas en muros / marquillado de tuberías. 9
Ilustración 7. Instalación de ductería EMT 10
Ilustración 8. Descuelgue y tendido de red hidráulica bajo placa piso 2. 11
Ilustración 9. Tendido de red de agua caliente e instalación de registros. 11
Ilustración 10. Armado e instalación de ductos sótano y piso 1 12
Ilustración 11. Ensamble cuelga y recubrimiento de ductos de suministro. 12
Ilustración 12. Fundida y acero escalera. 13
Ilustración 13. Foto general. 13
Ilustración 14. Puntos de control asentamientos 14
Ilustración 15. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B 18
Ilustración 16. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7° 19
Ilustración 17. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso 20
Ilustración 18. Bomba estacionaria 21
Ilustración 19 sistema de encofrado STEM 21
Ilustración 20. Grúa auto desplegable 22
Ilustración 21. Brazo distribuidor de concreto 22
Ilustración 22. Planimetría contractual piso 2 área salas de cirugía 23
Ilustración 23. Modificación piso 2 salas de cirugía 24
Ilustración 24. Modulación Fachada Carrera 14 25
Ilustración 25. Modulación Fachada calle 7 25
Ilustración 26. Publicaciones ambientales 65
Ilustración 27. Orden y aseo 66

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 3

Tabla 2 Resumen de actas 4
Tabla 3. Comités de Obra mensuales. 28
Tabla 4. Pólizas 28
Tabla 5. Equipos y herramientas 29
Tabla 6. Personal que laboro durante el periodo 29
Tabla 7. Marco normativo SST 31
Tabla 8. Personal Administrativo CSV 33
Tabla 9. Personal Operativo CSV 33
Tabla 10. Personal Icoconstruccion 35
Tabla 11. Personal Hidrosanitario 35
Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño 36
Tabla 13. Personal Topografía 36
Tabla 14. Tabla Personal Mampostería #1 36
Tabla 15. Tabla Personal Aires Acondicionados. 37
Tabla 16. Cumplimiento EMO ingresos 38
Tabla 17. Capacitaciones y charlas 38
Tabla 18 Cumplimiento charlas y capacitaciones 39
Tabla 19. Inducciones 40
Tabla 20. Cumplimiento EPI 40
Tabla 21. Cumplimiento kit señalización SST 41
Tabla 22. Relación agua potable 41
Tabla 23. Cumplimiento Kit de emergencias 42
Tabla 24. Personal con incapacidad por AT 42
Tabla 25. Marco legal gestión ambiental 46
Tabla 26. Relación de materiales e insumos 54
Tabla 27. Relación de materiales pétreos 54
Tabla 28. Relación Ingreso de concreto 54
Tabla 29. Sustancias químicas usadas 55
Tabla 30. Retiro RCD 59
Tabla 31. Reporte RCD 2025 59

Tabla 32. Vehículos retiro RCD....60
Tabla 33. Volquetas entrada y movimiento de material....62
Tabla 34. Relación maquinaria en obra....62
Tabla 35 Relación consumo de agua....63
Tabla 36. Relación de temas ambientales....65

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Oficio CHDSVP-OBRA-760-02-2026.... 5
Anexo 2. Informe control asentamientos....14
Anexo 3. Reporte de ensayos.....26
Anexo 4. Certificados de Calidad.....26
Anexo 5. Bitácora de obra....26
Anexo 6. Programación de obra....27
Anexo 7. Actas de comité de obra....28
Anexo 8. Pólizas de garantía....29
Anexo 9. Cumplimiento Requisitos Legales....32
Anexo 10. Soportes afiliaciones y retiros....37
Anexo 11. Soporte pagos de seguridad social....38
Anexo 12. Capacitaciones y charlas de seguridad....38
Anexo 13. Comités de apoyo....39
Anexo 14. Recomendaciones médicas....40
Anexo 15. Inducción y reinducción....40
Anexo 16. Entrega de dotación y EPI....40
Anexo 17. Inspecciones....41
Anexo 18. Indicadores y reporte de accidentes....43
Anexo 19. Permisos de trabajo y ATS....43
Anexo 20. Informe Acciones del periodo....43
Anexo 21. Informe de contratista....43
Anexo 22. Solicitud cierres temporales PMT....44
Anexo 23. Acta Apertura Buzón PQRS....44
Anexo 24. Registro fotográfico SST....45

Anexo 25.Control de material.....54
Anexo 26. Inspección acopio y consumo combustible.....57
Anexo 27. Control de material RCD.....60
Anexo 28. Acta de entrega.....61
Anexo 29. Control aseo de baños.....63
Anexo 30. Control de plagas y roedores.....64
Anexo 31. Registro de charlas.....65
Anexo 32. Inspección de orden y aseo.....66
Anexo 33. Registro fotográfico Ambiental.....66

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN". cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 31 de enero del 2026**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNUICIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto

COMPONENTE TECNICO

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información general del contrato

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	***"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"***
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

1.2 INFORMACION FINANCIERA

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, en el presente periodo ninguno de estos se llevó a cabo a través de la Fiducia.

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado **dieciséis (16)** actas de corte de obra, verificadas por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas.

Tabla 2 Resumen de actas

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO	
Vr. Contrato	$ 88.899.134.742,00
Vr. Amnticipo	$ 26.069.740.423,00
Vr. Pagado	$ 18.394.808.865,00
Saldo cont.	$ 42.434.585.454,00

# ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	NETO A GIRAR	ESTADO
ACTA #1	$ 208.905.712	$ 62.671.714	$ 146.233.998	PAGADAS
ACTA #2	$ 719.606.764	$ 215.882.029	$ 503.724.735	
ACTA #3	$ 882.800.683	$ 264.840.205	$ 617.960.478	
ACTA #4	$ 390.626.459	$ 117.187.938	$ 273.438.521	
ACTA #5	$ 137.838.998	$ 41.351.699	$ 96.487.299	
ACTA #6	$ 2.763.579.997	$ 829.073.999	$ 1.934.505.998	
ACTA #7	$ 1.413.817.258	$ 424.145.177	$ 989.672.081	
ACTA #8	$ 2.615.751.987	$ 784.725.596	$ 1.831.026.391	
ACTA #9	$ 1.992.727.752	$ 597.818.326	$ 1.394.909.426	
ACTA #10	$ 2.616.459.112	$ 784.937.734	$ 1.831.521.378	
ACTA #11	$ 2.096.315.525	$ 628.894.658	$ 1.467.420.867	
ACTA #12	$ 2.051.064.523	$ 615.319.357	$ 1.435.745.166	
ACTA #13	$ 1.783.406.850	$ 535.022.055	$ 1.248.384.795	
ACTA #14	$ 1.963.166.988	$ 588.950.096	$ 1.374.216.892	
ACTA #15	$ 3.332.738.472	$ 999.821.542	$ 2.332.916.930	
ACTA #16	$ 1.309.491.301	$ 392.847.391	$ 916.643.910	
TOTAL	$ 26.278.298.381	$ 7.883.489.516	$ 18.394.808.865	

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina "3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas, validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B

Durante el presente periodo no se ejecutaron actividades en el frente de obra en el lote B debido a la falta de definiciones (alcance, ajustes de diseño y lineamientos técnicos) de PTAR y Central de Gases Medicinales, tal y como se manifiesta en el oficio CHDSVP-OBRA-760-02-2026.

Anexo 1. Oficio CHDSVP-OBRA-760-02-2026

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

Se desarrollaron actividades de elementos estructurales a nivel de piso 6 a piso 7 específicamente en escaleras dando cumplimiento al cronograma de obra establecido de igual forma dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.

- **Armado de acero:** Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para los diferentes elementos estructurales:
  - **Escaleras en concreto:** Armado de acero para escalera de emergencia EC-01 del sexto a séptimo piso, en el eje 2 entre los ejes C-D.

- **Vaciado de concreto:**
  - Vaciado de concreto para escalera de emergencia EC-01, de sexto a séptimo piso en el eje 2 entre los ejes C-D.

- **Mampostería:**

  Durante el mes de enero se dio continuidad a las actividades de mampostería en pisos 2, 3 y 4 a su vez continuaron los pañetes en el área de piso 1 y fachada piso 4 al 8 en el eje 9. Se ejecutó el cierre de elementos de confinamiento hasta una altura de 4,20 m. De igual manera, en estas mismas áreas se desarrolló el armado de mampostería en los muros perimetrales, Adicionalmente, se adelantó el armado

de los elementos de confinamiento en dichos muros perimetrales hasta la viga superior.

En los pisos 2, 3 y 4 se dio continuidad a la mampostería interior, La mampostería se ha trabajado a una altura de 3,00 m, incluyendo la conformación de sus elementos de confinamiento y se continua con en armado y fundida de elementos de confinamiento.

En los pisos 2 y 3, durante el periodo se ejecutaron las actividades de cimbra, forme y liberación para el posterior armado de mampostería en las áreas húmedas (baños, trabajo sucio, trabajo limpio, entre otras), las cuales se desarrollan en mampostería de arcilla, conforme a las modificaciones aprobadas respecto a las referencias constructivas según su uso y servicio. De manera simultánea, a medida que avanza la mampostería, se ejecuta el armado y fundida de los elementos de confinamiento, garantizando la correcta integración estructural.

En los pisos 2, 3 y 4, continúa la mampostería de fachada y zonas húmedas, y el armado de acero y fundida de los elementos de confinamiento.

Se trabaja en mampostería en bloque de cemento para fachadas edificio asistencial.

- **Pañete:**

Durante este periodo se da continuidad al pañete en piso 1 y fachada.

Ilustración 2. Armado de mampostería.

Ilustración 3. Elementos de confinamiento.

Ilustración 4. Armado de mampostería fachada.

Ilustración 5. Pañetes.

➢ **Redes y especialidades eléctricas.**

Durante el mes, el personal eléctrico ha continuado con el avance de las actividades correspondientes al sistema eléctrico del proyecto en piso 3 y 4, entre las cuales se destacan:

- Tendido de tubería EMT de 3/4" para los sistemas de iluminación, tomas eléctricas y especialidades.
- Aseguramiento de la correcta sujeción, alineación y separación según normas RETIE y NTC 2050.
- Montaje de cajas EMT bajo placa y muros para canalización de iluminación.
- Marcación, localización y replanteo de puntos eléctricos en cada uno de los espacios del proyecto bajo placa.
- Cimbrado de muros para permitir la correcta colocación de los puntos eléctricos

Se realizaron Inspecciones conjuntas a las tuberías y bandejas instaladas a fin de verificar continuidad, alineación, fijación y cumplimiento normativo.

Ilustración 6. Instalación ductería para tomas en muros / marquillado de tuberías.

Ilustración 7. Instalación de ductería EMT.

➢ **Redes y especialidades hidrosanitaria**

Durante presente periodo se llevaron a cabo diversas labores de adecuación y montaje en las redes hidrosanitarias del proyecto, orientadas a garantizar la correcta distribución de agua potable fría y caliente, y la coordinación con otras especialidades como aire acondicionado. Asimismo, se realizaron ajustes en instalaciones existentes y adecuaciones en el segundo piso para permitir la integración de la nueva red hidráulica proyectada, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos:

- Se ejecutó la instalación de la red de agua potable fría en el primer piso, destinada a servicios generales y consumo humano.
- Se complementó con la instalación de la red de agua caliente, incluyendo el registro de 1/2" para control y mantenimiento.
- Se colocaron los bajantes correspondientes, asegurando continuidad hidráulica y conexión con el sistema de disposición previsto.
- Se realizó el redireccionamiento de tubería sanitaria para permitir el paso de ductos de aire acondicionado, coordinando con el área de climatización para evitar interferencias.
- Las labores incluyeron corte, retiro y disposición de tubería, con registro fotográfico de las modificaciones.
- Se ejecutó la profundización de regatas en muros y pisos del segundo nivel, con el fin de dar paso a la nueva red hidráulica proyectada.

- Las regatas fueron verificadas en dimensiones y alineación, asegurando espacio suficiente para tubería y accesorios.

Ilustración 8. Descuelgue y tendido de red hidráulica bajo placa piso 2.

Ilustración 9. Tendido de red de agua caliente e instalación de registros.

➢ **SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC**

En el marco de la ejecución del sistema de ventilación mecánica, se continuó con las labores de ductería de suministro y retorno, empleando lámina galvanizada como material principal para garantizar resistencia y durabilidad. Las actividades incluyeron el corte y ensamble de piezas para el armado de los ductos, asegurando uniones herméticas y alineadas con los recorridos previamente definidos en la planificación. Paralelamente, se avanzó en la instalación de las líneas de refrigeración y retorno en

el primer piso, coordinando su disposición con las demás redes técnicas para evitar interferencias y optimizar el espacio disponible.

Como parte del proceso de aislamiento térmico, diseñado para mejorar la eficiencia energética del sistema y reducir pérdidas de temperatura en la conducción del aire. Estas tareas se complementaron con una coordinación detallada de los recorridos de ductos y tuberías, ajustando trazados y verificando compatibilidad con la arquitectura y las demás instalaciones del proyecto. El desarrollo de estas actividades se realizó bajo criterios técnicos de calidad, seguridad y cumplimiento normativo, asegurando que el sistema de ventilación avance conforme a los estándares establecidos y responda adecuadamente a las necesidades operativas del edificio.

Ilustración 10. Armado e instalación de ductos sótano y piso 1.

Ilustración 11. Ensamble cuelga y recubrimiento de ductos de suministro.

➢ ESTRUCTURA

Estas actividades se desarrollaron de acuerdo con el cronograma del proyecto bajo la supervisión y acompañamiento del equipo de trabajo interventor a fin de asegurar que cada etapa fuera inspeccionada y validada para cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Ilustración 12. Fundida y acero escalera.

Ilustración 13. Foto general.

CONTROL TOPOGRAFICO

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.

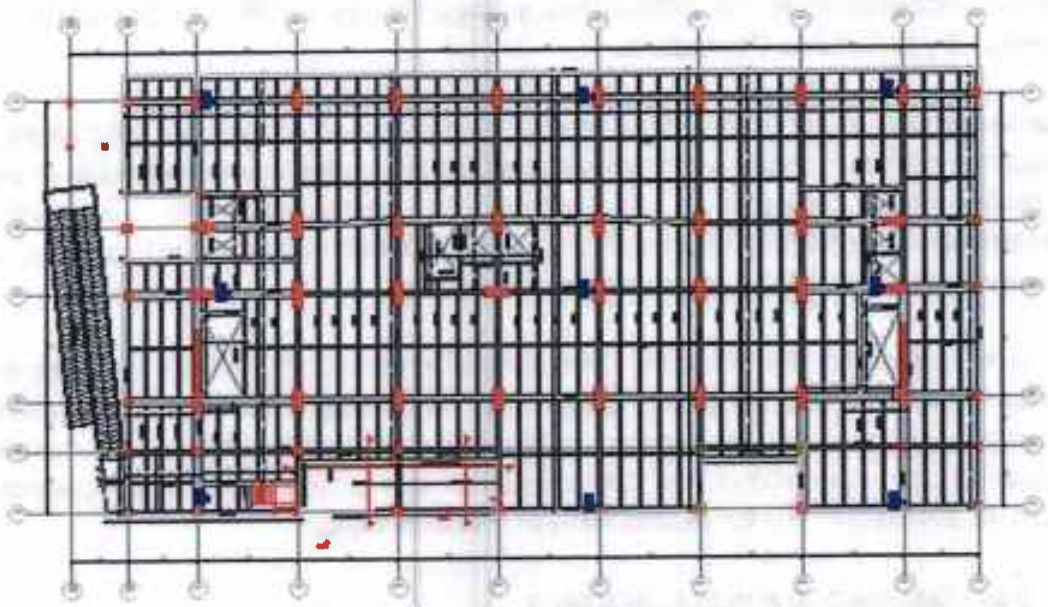

Ilustración 14. Puntos de control asentamientos

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos para el edificio asistencial como para el edificio lote B.

Anexo 2. Informe control asentamientos

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

En relación con el balance presupuestal presentado por el Contratista, el cual ha sido radicado en diferentes versiones durante el desarrollo del proyecto —siendo la correspondiente al mes de diciembre la más reciente— para su respectivo análisis y validación por parte de la Interventoría y la Entidad Contratante, y habiendo culminado el periodo de enero de 2026, a la fecha no se ha emitido pronunciamiento formal alguno respecto a su aprobación ni frente a la definición clara y definitiva del alcance real y actualizado del contrato.

Esta situación prolonga un escenario de indefinición técnica, administrativa y financiera que afecta de manera directa la planeación, programación, ejecución y control de las actividades contractuales. Tal como se ha reiterado en comunicaciones previas y mesas de trabajo, la ausencia de decisiones oportunas ha generado retrasos en la ejecución, reprogramaciones, mayores permanencias en obra, incremento en costos indirectos, tiempos improductivos y ajustes logísticos que no son imputables al Contratista, por depender exclusivamente de definiciones y lineamientos pendientes por parte de la Interventoría y la Entidad Contratante.

En consecuencia, el Contratista deja expresa constancia en el presente informe de que los impactos en plazo, costos y rendimiento derivados de esta falta de definición deberán ser reconocidos conforme a lo establecido contractualmente, reservándose expresamente el derecho de presentar las reclamaciones formales a que haya lugar para la preservación del equilibrio económico del contrato.

Durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversas situaciones que requieren atención específica por parte del constructor, la interventoría y la supervisión. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados hasta el momento, organizados por especialidad, así como aquellos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación por los responsables correspondientes.

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES

- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, verificando los diseños del proyecto.

- Se está a la espera por parte del Consorcio San Vicente la entrega de los diseños arquitectónicos y estructurales ajustados y aprobados para la PTAR y la Central de Gases medicinales. Así mismo la definición oficial del alcance constructivo y configuración estructural final de las edificaciones del Lote B.

- Para el sistema de gases medicinales, tal como fue tratado en el Comité de Obra No. 75, celebrado el pasado 15 de enero, se dejó claramente establecido que resulta imperiosamente prioritario contar con una definición clara, formal y oficial del alcance, toda vez que esta es indispensable para establecer el alcance real del

proyecto, consolidar el balance presupuestal y permitir el inicio efectivo de las actividades correspondientes al sistema de gases medicinales

- Es importante dejar constancia de que las actividades de esta especialidad no han sido iniciadas, debido exclusivamente a la falta de definiciones técnicas y contractuales formales, situación que no es imputable al contratista y que continúa afectando la planificación técnica, la programación del cronograma, la gestión de compras, la contratación de proveedores especializados y la coordinación con otras disciplinas del proyecto.

- Se reitero la necedad en la entrega por parte de la entidad contratante de la información técnica detallada requerida para la correcta selección, evaluación, y cotización del equipo "planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas tipo compacta" puesto que, a la fecha, no se ha recibido la documentación necesaria, lo cual imposibilita avanzar en los procesos de adquisición dentro de los plazos establecidos

- Para este frente de obra denominado lote B aún no se encuentra definida la infraestructura requerida para el paso de ductos que integrará y/o comunicará el et frente de obra con la torre asistencial de las diferentes especialidades. En la planimetría y diseños correspondientes a la Etapa 1 de construcción no se incluyen detalles estructurales ni constructivos que permitan materializar la conexión entre el Lote B y el edificio asistencial. Esta conexión resulta crítica, considerando que debe atravesar la Calle 6 e integrar, entre otros, los siguientes sistemas:

  - Red de gases medicinales.
  - Sistema de agua helada para ventilación mecánica

- La información anteriormente mencionada constituye un insumo técnico indispensable para evaluar la viabilidad constructiva, definir procedimientos de ejecución, establecer secuencias de obra y realizar la planificación de recursos, equipos y adquisiciones asociadas.

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación se mantiene la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que

puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega.

Verificar las jornadas extra-tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (escaleras).

En relación con el avance de obra, se reitera la solicitud hecha a la interventoría de contar con la revisión, validación, y aprobación de observaciones para actividades relacionadas con el avance estructural de las Edificaciones Pendientes para el Lote B que involucran adicionalmente la consolidación del Balance de obra para la Etapa 1 del proyecto, bajo las siguientes consideraciones que se detallan como sigue:

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B

- Petar y central de gases medicinales

A partir del planteamiento de ubicación de los equipos para PETAR nueva y existente, CENTRAL DE GASES MEDICINALES, TANQUE RCI, entregada por la Consultoría del proyecto Sergo Arquitectura SAS a través de la Supervisión e Interventoría, para lo cual y teniendo en cuenta la reubicación y separación de la cimentación y estructura para la edificación N°3, se solicitó a interventoría el apoyo para agilizar con quien corresponda los ajuste o nuevos diseños estructurales para la Petar y Central de Gases Medicinales, esto fundamentados en que los diseños originales unen por medio de zapatas y columnas las dos estructuras. (ver Ilustración N°1 Planta de Cimentación).

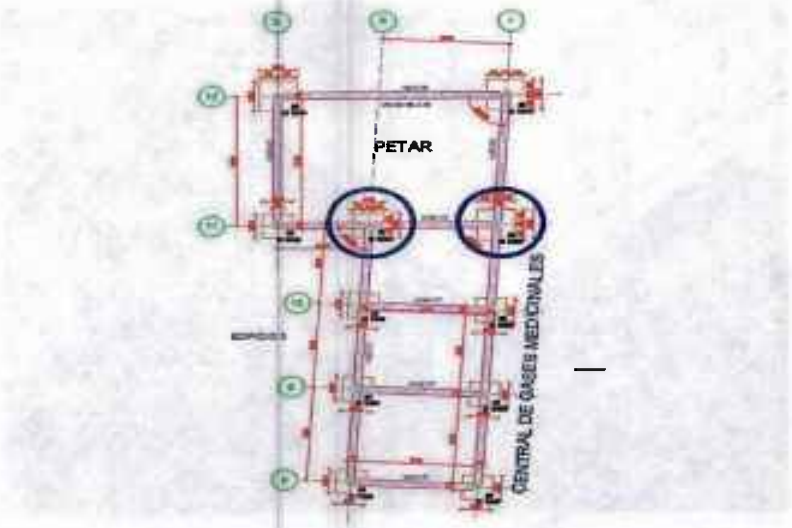

Ilustración 15. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B

1.4.4 EXTERIORES

- Rampa acceso peatonal costado norte

Para el acceso peatonal del costado norte sobre la calle 7 y en relación con los cambios de nivel, se identifica e interpreta en planos de Planta arquitectónica de piso 1° una rampa peatonal de acceso hacia la plazoleta central del proyecto, información y planimetría que no se encuentra resuelta en el proyecto estructural tanto en planos estructurales, detalles y memorias de cálculo, entre otros, situación que no permite claridad tanto para su ejecución como para su cuantificación, por lo cual y de la manera más cordial, les solicitamos sean ubicados y remitidos al Consorcio San Vicente lo antes posible esta documentación.

Ilustración 16. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7°

- Muros Contención Plazoleta Central

En la plazoleta exterior que según planos arquitectónicos, específicamente en la Planta de Piso 1°, se identifica unos esquemas que representan según nuestra interpretación desde el punto de vista arquitectónico, unos muros que contendrán el terreno en los diferentes cambios de nivel que se muestran esquemáticamente en los planos de las secciones transversales o cortes arquitectónicos, sin embargo esto no es suficiente información puesto que no se cuenta, ni se ha ubicado dentro de los archivos entregados al inicio del proyecto, los correspondientes detalles, plantas, despieces, especificaciones y memorias en el proyecto estructural y al igual que el punto anterior, les solicitamos de la manera más cordial sea ubicada y remitidos toda esta información al Consorcio San Vicente lo antes posible, con el fin de lograr desde el área técnica la revisión, planeación y cuantificación de todas las actividades dentro del proceso constructivo.

Ilustración 17. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso

1.4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA EDIFICIO ASISTENCIAL DE 7 PISOS.

Según balance, diseño y programación presentada por el consorcio San Vicente y conciliada junto con la interventoría y la Supervisión de la ESE, se desarrollan los siguientes procesos:

- Para garantizar los tiempos establecidos en la programación continuamos con la propuesta ya presentada en los informes anteriores; se incrementa la jornada laboral en dos horas extras de lunes a viernes y el sábado una jornada de 6:00 am a 2 pm, por último, un domingo intermedio se trabajará de 6:00 am a 2:00 pm.

1.4.6 EQUIPOS.

El Consorcio San Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto de marca Putzmeister de gran capacidad de bombeo, adicional

se cuenta con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entrepiso del sistema STEM llegando a 1.800 m2. Se adquiere una grúa auto desplegable MIDI 16/20 y un brazo para colocación de concreto, este complementa la bomba de concreto su nombre Placing boom BHD 18R3.

Ilustración 18. Bomba estacionaria

Ilustración 19 sistema de encofrado STEM

Ilustración 20. Grúa auto desplegable

Ilustración 21. Brazo distribuidor de concreto

Los equipos se mantienen dispuestos para el momento en el que haya actividades del lote B, una vez se hayan realizado las definiciones (alcance, ajustes de diseño y lineamientos técnicos) de PTAR y Central de Gases Medicinales.

1.4.7 ARQUITECTURA Y ACABADOS

Durante el proceso de ejecución, se han identificado discrepancias técnicas en los diseños arquitectónicos originales frente a los requerimientos normativos y funcionales del área de Cirugía ubicada en el piso 2. Se detectó que la planimetría inicial no contemplaba el espacio físico ni la infraestructura necesaria para la integración de componentes críticos de la red eléctrica y de fluidos, tales como:

- Ubicación de tableros de aislamiento y paneles de alarmas.
- Cajas de paso y puntos de control de gases medicinales.
- Posicionamiento estratégico de lavamanos quirúrgicos.

A fin de garantizar la funcionalidad clínica y el cumplimiento estricto de la normativa vigente (en materia de seguridad eléctrica hospitalaria y control de infecciones), se procedió a realizar ajustes de diseño donde se realizó ajuste de muros dando paso a nichos técnicos para albergar los tableros de aislamiento y paneles de monitoreo sin obstruir las rutas de circulación, garantizando las medidas mínimas exigidas para el funcionamiento de las salas de cirugía, se tuvo en cuenta adicional a los tableros de aislamiento el posicionamiento de las cajas de paso de gases medicinales para asegurar la accesibilidad como lo solicita la norma, asimismo se redistribuye la ubicación de puntos hidrosanitarios de los lavamanos quirúrgicos.

Estas modificaciones aseguran el cumplimiento técnico mitigando riesgos operativos futuros, garantizando que el área quirúrgica cumpla con los estándares de habilitación exigidos.

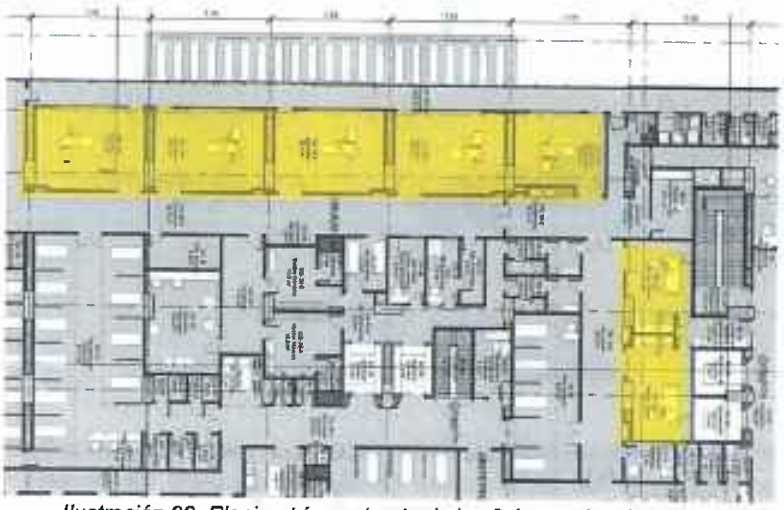

Ilustración 22. Planimetría contractual piso 2 área salas de cirugía

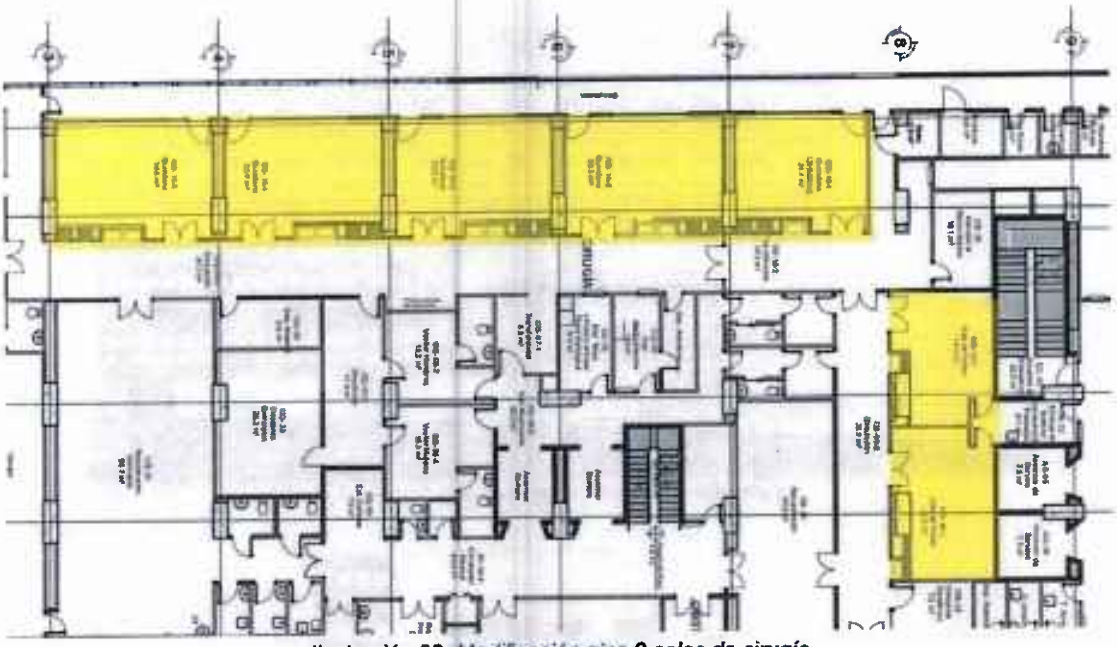

Ilustración 23. Modificación piso 2 salas de cirugía

Durante el periodo reportado se realizó la evaluación y definición técnica de la modulación arquitectónica de la fachada tipo piel de vidrio, con el propósito de garantizar la adecuada continuidad del proceso constructivo.

Previamente, se ejecutó la instalación de una muestra en obra, a partir de la cual se efectuaron ajustes a la perfilería, logrando su correcta contención entre placas estructurales y asegurando uniformidad superficial y adecuada transición con la mampostería.

Como resultado de la revisión técnica en campo, se identificó que la planimetría contractual no contemplaba la articulación precisa entre la modulación de fachada, los niveles de placas estructurales, cielorrasos y elementos arquitectónicos adyacentes. En consecuencia, se propuso una modulación técnica desarrollada a partir del despiece conforme a dimensiones comerciales, alineando la perfilería con los niveles estructurales y arquitectónicos del proyecto, garantizando homogeneidad compositiva, continuidad estética y viabilidad constructiva, sin modificar las especificaciones contractuales de perfilería, color ni referencia de vidrio.

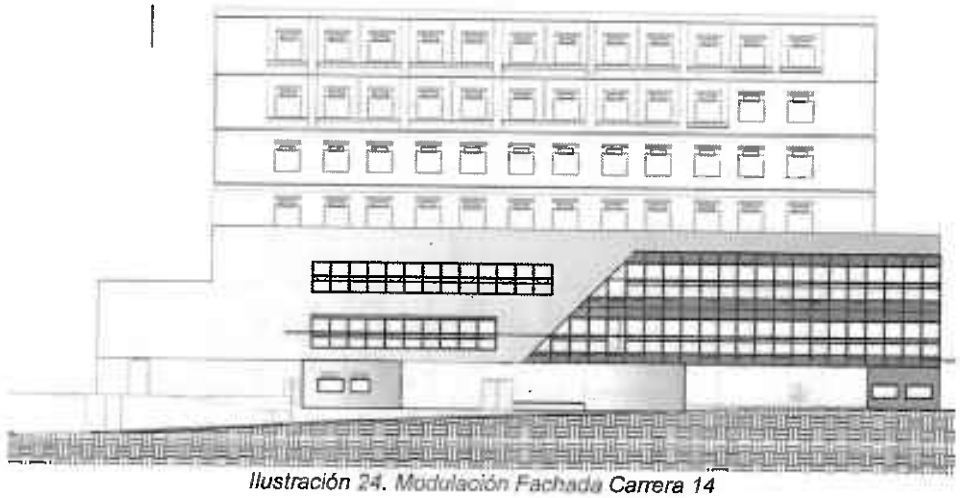

Ilustración 24. Modulación Fachada Carrera 14

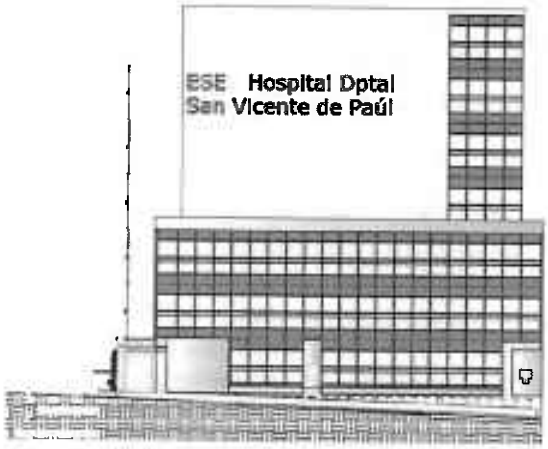

Ilustración 25 Modulación Fachada calle 7

La modulación propuesta fue revisada y aprobada por la Interventoría, permitiendo dar inicio formal al proceso de fabricación de la fachada tipo piel de conforme a las especificaciones contractuales y a los vanos ejecutados en obra.

Adicionalmente, se presentó ajuste dimensional para la ventana tipo AV-04 en zonas húmedas, debido a su inviabilidad técnica en las dimensiones originalmente previstas, manteniendo las condiciones técnicas generales del sistema, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.

Anexo 3. Reporte de ensayos.

Para los insumos con certificados de conformidad como las tuberías para redes hidrosanitarias y RCI son suministrados por el fabricante con cada pedido entregado a obra.

Anexo 4. Certificados de Calidad.

1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionadas con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

Anexo 5. Bitácora de obra

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los

plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Este documento o programación fue ajustado este año y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

Anexo 6. Programación de obra

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría interconstructoresconsorcio@gmail.com, así mismo se confirma que el correo para la recepción de comunicados por parte del Consorcio San Vicente es consorciosanvicente2024@gmail.com, que corresponde al correo oficial implementado por el Consorcio San Vicente.

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

De acuerdo con los requerimientos contractuales y lo indicado por la Interventoría, en el periodo se llevan a cabo las diferentes reuniones de comité técnico de obra, que les precede al correspondiente recorrido de obra, las cuales, de acuerdo con lo establecido desde el inicio de obra, se convocó por la Interventoría del contrato, una reunión semanal de comité de obra, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con especialistas para tratar temas puntuales o específicos.

Tabla 3. Comités de Obra mensuales

No. ACTA	FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS COMITÉ
#74	08/01/2026	➢ Supervisión HSVDP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Se realizó el reporte de estado de actividades de piso, fachada y redes. ➢ El CSV definió una lista de 38 actividades críticas que se requieren para no afectar el proyecto. ➢ Se definieron los límites financieros para las adiciones contractuales (Balance). ➢ Se decidió concentrar todos los esfuerzos en entregar la etapa 1 de forma funcional y habitable. ➢ Se reportó la gestión de las actas y pagos. ➢ Se tomaron decisiones respecto a temas técnicos de redes eléctricas y gases medicinales.
#75	15/01/2026	➢ Supervisión HSVDP ➢ Interventoría Consorcio Interconstructores ➢ Consorcio San Vicente	➢ Se acordó incluir red de gases medicinales en el balance sobre los 86 mil. ➢ Se recomendó mantener el diseño original de la subestación eléctrica. ➢ El CSV toma el compromiso de entregar el consolidado de cantidades y APU del balance. ➢ La interventoría toma el compromiso de emitir el concepto técnico sobre la viabilidad de la central de gases y aprobación de bomba de RCI. ➢ La supervisión/gerencia se compromete a socializar con los asesores jurídicos y el gerente la decisión sobre la parte eléctrica. ➢ Se toma la decisión de iniciar el trámite para la inclusión del ajuste de diseño de la PTAR como ítem no previsto.

Anexo 7. Actas de comité de obra

1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 4. Pólizas

POLIZAS / COBERTURAS	No POLIZA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AB001298	19/03/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB001301	19/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		19/03/2027

PRESTACIONES SOCIALES		19/09/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA		19/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		19/09/2031

Anexo 8. Pólizas de garantía

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO

Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

Tabla 5. Equipos y herramientas

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	UND	CANTIDAD
VOLQUETA SENCILLA	UND	1
BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO	UND	1
TORRE GRUA	UND	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	2
RETROCARGADOR JCB	UND	1
APISONADOR TIPO CANGURO	UND	1
VIBRADOR PARA CONCRETO	UND	6
SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA	UND	6
ROTOMARTILLOS	UND	3
AMOLADORAS ANGULARES	UND	5
SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)	UND	1
COMPRESOR NEUMATICO	UND	0
EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)	M2	1800
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS)	SEC	36
MOTOBOMBA 2"	UND	1
MOTOBOMBA 4"	UND	1
BOMBA EYECTORA 2"	UND	2
ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)	UND	1
BRAZO HIDRULICO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO	UND	1

Tabla 6. Personal que laboro durante el periodo

PERSONAL / CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	3
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1

RESIDENTE DE ACTAS	1
PROFESIONAL SST	2
INSPECTOR DE OBRA	1
TECNICO SST	2
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	1
MAESTRO DE OBRA (EJERO)	1
OFICIALES	41
AYUDANTES	35
PLOMEROS	9
ELECTRICOS	4
MAMPOSTEROS	21
OPERADORES MAQUINARIA	2
CONDUCTORES VOLQUETAS	1

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 7. Marco normativo SST

Ley 9/ 1979	Código Sanitario Nacional de Colombia Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
Ley 100/1993	Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. Regula los regímenes de salud (EPS), pensiones (público/privado), riesgos laborales (ARL) y servicios sociales.
Decreto Ley 1295/1994	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
Ley 1616/13	Ley de salud mental.
Decreto Ley 1562/2012	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SST.
Decreto 1072/ 2015	Decreto único reglamentario del sector trabajo.
Resolución 2400/79	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013/86	Comité paritario de salud ocupacional.
Resolucion 2346 de 2007	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.
Resolución 2646 de 2008	Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial
Resolución 1918 de 2009	Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 3461 de 2025	Establece lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
Resolución 0312/19:	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores
Resolución 0491 de 2020	Trabajo en espacios confinados
Resolución 4272 de 2021	Trabajo en alturas
Resolución 773 de 2021	Sistema Globalmente Armonizado
Resolución 2764 de 2022	Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.
Ley 2365 de 2024	Adopta medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral.
Ley 2466 de 2025	Modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia.
Decreto 0728 de 2025	Prevención de problemas mentales y consumo de sustancias en el trabajo, que deben integrarse al SG-SST y ejecutarse en coordinación con las ARL.
Resolución 908 de 2025	Establece los requisitos y el procedimiento para la expedición, renovación y cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución 3461 de 2025	Lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo.

Anexo 9. Cumplimiento Requisitos Legales

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 31 de enero del 2026. En el presente periodo se presentaron:

- ✓ 2 ingresos de American global SAS.
- ✓ 4 ingresos de mamposteros JDV construcciones.

2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 8. Personal Administrativo CSV

NOMBRE	CARGO
FRANCISCO BARRIOS BAHAMON	RESIDENTE DE OBRA
JOSE ARNULFO SALCEDO	RESIDENTE DE INSTALACIONES
GABRIEL ORLANDO MARTINEZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO
DANNA CAROLINA VALDERRAMA ROMERO	RESIDENTE SST/AMB
JAMES YOEL MONTIEL CAPERA	INSPECTOR DE OBRA CIVIL
RIGOBERTO TAVERA	RESIDENTE INSPECTOR OBRA
NAYDALY GALINDO GALINDO	RESIDENTE SST
FABIO OCHOA MOLINA	ALMACENISTA
CLAUDIA PATRICIA OVALLE	RESIDENTE
ALEXIS CARTAGENA	INSPECTOR SST
CRISTIAN FELIPE SANCHEZ ALMARIO	INSPECTOR OBRA
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ CAMACHO	RESIDENTE DE ACTAS
EDWARD ARMANDO TORRES	INSPECTOR SST
MARIA DANIELA TORRES	RESIDENTE SST

2.2.2 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 9. Personal Operativo CSV

NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	19/07/2024	
WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHONATANT MEDINA POLO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO MURCIA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	23/10/2024	
WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	

DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDWIN LEONARDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
EDWIN ALEXANDER DEVIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO SANCHEZ VERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
GERMAIN INOJOSA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
DIDIER CAMPOS ARDILA	OFICIAL HERRERO	7/01/2025	
NIDA LUCERO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DEIBI ALEJANDRO PASCUAS BERMEO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDILBER SALGADO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/01/2025	
JUAN CARLOS PENNA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIAN ANDRES SALGADO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
LUIS ERNESTO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIO CESAR AYALA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
FRANCISCO PRADA RAMOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	03/02/2025	
DIEGO ARMANDO SIERRA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
MAURICIO MANRIQUE MEDINA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/02/2025	
MEDARDO ANDRES SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/02/2025	
DAIMER ALEXIS MUÑOZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
JHANER MURCIA GALINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
LUIS PARMENIDES HURTADO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
WILLIAM ALEXANDER GUERRERO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JOINER STIVEN GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
LUIS FERNANDO PARRA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
ADOLFO NAGLES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
JACKSON BORJA MOSQUERA	OFICIAL HERRERO	20/03/2025	
ALBERTO MAHECHA BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
LEONARDO SAENZ PIMENTEL	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ARGEMIRO RAYO URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	22/04/2025	
JOSE ALBEIRO CORDOBA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
CARLOS MARIO DE AVILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
HELMER ARLEY PASTRANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/05/2025	
JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JAIME GONZALEZ TRUJILLO	OPERADOR	12/06/2025	
MEDARDO VALENZUELA PERDOMO	APAREJADOR	07/07/2025	
ELVER ADOLFO BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	16/07/2025	

JAIME CHAVARRO RAMOS	OFICIAL DE OBRA	5/08/2025	
DIEGO ALEJANDRO PEDROZA PERDOMO	OFICIAL	20/08/2025	
CHRISTIAN DAVID NAVAS ROJAS	AYUDANTE	25/08/2025	
ANDERSON URRIAGO SERRATE	AYUDANTE	25/08/2025	
JESUS ANDRES OSORIO	OFICIAL	18/09/2025	
WILSON MIGUEL PARRA	AYUDANTE	18/09/2025	
YEFFERSON LOPEZ GOMEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RAFAEL DIONISIO FERNANDEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
FLORENTINO NAGLES VARGAS	OFICIAL	1/10/2025	30/12/2025
MIGUEL ARTURO RIOS MONJE	OFICIAL	1/10/2025	
MARLON FELIPE OLAYA PIAMBA	OFICIAL	1/10/2025	
WILINTON MUÑOZ RUIZ	AYUDANTE	1/10/2025	
JOSE ILIER ORDOÑEZ GAITAN	AYUDANTE	15/10/2025	
CRISTIAN CAMILO MAYA CORTES	AYUDANTE	24/10/2025	
EDUARD IGNACIO TRUJILLO	AYUDANTE	24/10/2025	
KEVIN MIGUEL ORTIZ TELLEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
CRISTIAN CAMILO CHAVARRO GRILLO	AYUDANTE	4/11/2025	
JOSE RICARDO RODRIGUEZ GARCIA	AYUDANTE	4/11/2025	
GIOVANNY DEVIA MUÑOZ	AYUDANTE	4/11/2025	
JOHAN SEBASTIAN FRAGUA RODRIGUEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
EDINSON ANDRES SIERRA RAMOS	AYUDANTE	4/11/2025	
WILLIAM ANDREY MOLANO	AYUDANTE	4/11/2025	
PABLO ANDRES POLO POLO	AYUDANTE	18/11/2025	

2.2.3 PERSONAL CASETÓN

Tabla 10. Personal Icoconstruccion

NOMBRE	CARGO
ERNESLEY LIZCANO	OFICIAL
DIEGO ANDRES MORALES	AUXILIAR
FELIX ANDRES TRIVIÑO	AUXILIAR
DUVAN ANDRES HURTADO	AUXILIAR
JEFFERSON GONZALEZ	AUXILIAR

2.2.4 PERSONAL HIDROSANITARIAS

Tabla 11. Personal Hidrosanitario

NOMBRE	CARGO
ALEJANDRA PIZO RIVERA	PROFESIONAL SST
CARLOS EDUARDO BELTRAN	OFICIAL PLOMERIA
JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO	AYUDANTE DE PLOMERIA

LUIS NIGRINIS MATTA	OFICIAL PLOMERIA
RODOLFO JAVIER LEIVA	SUPERVISOR DE OBRA
JUAN DIEGO SANCHEZ PERDOMO	AYUDANTE PLOMERIA
MIGUEL ANTONIO ESPITIA	OFICIAL PLOMERIA
PABLO CESAR PALENCIA	OFICIAL PLOMERIA
JOSE LUIS CUBILLOS	AYUDANTE PLOMERIA
JULIAN ANDRES HERNANDEZ	AYUDANTE PLOMERIA
ANDER SMITH ALVARADO	AYUDANTE PLOMERIA

2.2.5 PERSONAL ELÉCTRICO

Tabla 12. Personal YM Seguridad, control y diseño

NOMBRE	CARGO
OMAR JAVIER RODRIGUEZ	OFICIAL ELECTRICO
NELSON ROJAS GARZON	AUXILIAR ELECTRICO
FREDY FIERRO MEDINA	AUXILIAR ELECTRICO
OMAR ALEJANDRO SILVA	AUXILIAR ELECTRICO
DIEGO FERNANDO TORRENTE	AUXILIAR ELECTRICO
LUIS MIGUEL SOTO MENESES	AUXILIAR ELECTRICO

2.2.6 PERSONAL TOPOGRAFÍA

Tabla 13. Personal Topografia

NOMBRE	CARGO
SEGUNDO ANDRADE ANDRADE	TOPOGRAFO

2.2.7 ERSONAL MAMPOSTERÍA #1.

Tabla 14. Tabla Personal Mamposteria #1

NOMBRE	CARGO
ARMANDO ELIZALDE	OFICIAL PLUMERO
CARLOS JULIO PIÑACUE	OFICIAL MAMPOSTERO
FERNANDO IMBRECH	AYUDANTE MAMPOSTERO
JORGE ELIECER PAEZ	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA
FRANCISCO GUTIERREZ	OFICIAL MAMPOSTERO
JUAN SEBASTIAN RUIZ	OFICIAL MAMPOSTERO
VICTOR DAMIR MORENO	OFICIAL MAMPOSTERO
JAIDER JAMES FERRER	OFICIAL MAMPOSTERO
JORGE DANEY MELO	OFICIAL MAMPOSTERO
CRISTIAN FELIPE FERRO	AYUDANTE MAMPOSTERO
SERGIO LUIS CEBALLOS	OFICIAL MAMPOSTERO
JOSE DILFREDO CUMBE	AYUDANTE MAMPOSTERO

ALEX DAVID OLAYA	AYUDANTE MAMPOSTERO
EDWIN RIVAS TAMAYO	PAÑETADOR
JAVIER MENDOZA	OFICIAL MAMPOSTERO
EDWIN ALBEIRO MOLINA	OFICIAL MAMPOSTERO
JEAN CARLOS CARRASCAL	AYUDANTE MAMPOSTERO
YERSON FERNEY NARVAEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
ROBI SMITH LEON	SUPERVISOR DE OBRA
ANA SOFIA PEREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

2.2.8 PERSONAL AIRES ACONDICIONADOS

Tabla 15. Tabla Personal Aires Acondicionados.

NOMBRE	CARGO
EDDINSON STIVEN ORJUELA	CONTRATISTA
AMADEO ORJUELA	SUPERVISOR
OSCAR DE JESUS AGUIRRE	TECNICO DE MONTAJE
EDINSON SILVINO AMAYA	TECNICO DE MONTAJE
PABLO CESAR BERANO	TECNICO DE MONTAJE
FELIX CHAVERRA	AUXILIAR DE MONTAJE
IVAN ANDRES CIFUENTES MORA	AUXILIAR DE MONTAJE
MARCO LOMBANA	TECNICO DE MONTAJE
JUAN STIVEN JIMENEZ	AUXILIAR DE MONTAJE

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Dando cumplimento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

Resaltar que cuando un colaborador renuncia o es retirado del Consorcio San Vicente, se realiza su respectivo trámite a exámenes de egreso y paz y salvo.
En el periodo se realiza examen médico periódico al personal que corresponda.
Anexo 10. Soportes afiliaciones y retiros

Tabla 16. Cumplimiento EMO ingresos

INDICADOR	CUMPLIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO
Indicador de Calificación	(No. evaluación médica ocupacional realizados /No. evaluación médica ocupacionales programados) X 100%
	(6/6) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador cumple, se realizaron seis (6) evaluaciones médicas ocupacionales al personal que ingresó a Consorcio San Vicente.

De igual manera, mensualmente se realiza el pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal directo y la respectiva validación de los pagos realizados por el mismo concepto de los proveedores.

Anexo 11. Soporte pagos de seguridad social

2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del cronograma de actividades del CONSORCIO SAN VICENTE se realizaron charlas y capacitaciones. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 12. Capacitaciones y charlas de seguridad

Tabla 17. Capacitaciones y charlas

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD			
TEMA	**FECHA**	**CANTIDAD DE PARTICIPANTES**	**DURACIÓN**
Recomendaciones de seguridad inicio nuevo año	02-01-2026	46	10 minutos
Uso obligatorio de los equipos para trabajo en alturas en actividades fijas y fachadas	03-01-2026	46	10 minutos
Firmas de permisos, ATS, preoperacionales y condiciones de salud.	05-01-2026	66	15 minutos
Respeto señalización y mallas de seguridad	06-01-2026		15 minutos
Prohibición de rayar o dañar las estructuras de obra	07-01-2026	68	15 minutos
Cuidado al realizar actividades con otros trabajos ya ejecutados.	08-01-2026	67	10 minutos
Importancia de la inspección del arnés	09-01-2026	70	15 minutos
Primeros Auxilios: Cuidado de las lesiones leves	10-01-2026	59	10 minutos
Capacitación y practica: Armado y recomendaciones de seguridad andamio colgante	13-01-2026	19	3 horas 30 minutos
Bromas pesadas son actos inseguros	13-01-2026	72	15 minutos
Pasillos libres de material	15-01-2026	71	15 minutos
Cuidado de la visión Uso de gafas de seguridad	16-01-2026	70	10 minutos
Recomendaciones ATS de trabajo con grúa	16-01-2026	1	5 minutos
Uso seguro de escaleras portátiles	17-01-2026	87	10 minutos

Cooperación en SST	19-01-2026	74	10 minutos
Que hacer en caso de fuego	21-01-2026	71	10 minutos
Reconociendo los síntomas del estrés laboral	22-01-2026	73	15 minutos
Riesgo eléctrico: Inspección de extintores y tableros eléctricos.	24-01-2026	59	15 minutos
Manipulación de cargas manual	26-01-2026	60	10 minutos
Prevención de golpes de calor	27-01-2026	65	10 minutos
Métodos de limpieza del oído medio y externo	28-01-2026	70	10 minutos
Los 5 trastornos musco-esqueléticos más comunes	29-01-2026	57	10 minutos
Capacitación: Funciones y responsabilidades del COPASST	29-01-2026	6	45 minutos
Capacitación: Funciones y responsabilidades del COCOLAB	29-01-2026	7	45 minutos
Canales de Comunicación y ofertas de empleo	31-01-2026	61	15 minutos

Tabla 18 Cumplimiento charlas y capacitaciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD
Indicador de Calificación	(No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%
	(25/25) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron veinticinco (25) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente.

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual de los comités el día 30/01/2026.

También se presenta informe trimestral del Comité de convivencia laboral en los meses de marzo, junio y septiembre; e informe anual de la gestión del Comité de convivencia laboral.

Anexo 13. Comités de apoyo

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de

accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

Anexo 14. Recomendaciones médicas

2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

El proceso de inducción y reinducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 15. Inducción y reinducción

Tabla 19. Inducciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDUCCION AL TRABAJADOR
Indicador de Calificación	(No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%
	(6/6) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se realizaron seis (6) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente.

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

Anexo 16. Entrega de dotación y EPI

Tabla 20. Cumplimiento EPI

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de Calificación	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
	(80/80) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS
Indicador de Calificación	(No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100%
	(65/65) *100%= 100%

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de Calificación	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
	(80/80) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%

Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%.

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. **Ver Registro fotográfico**

Tabla 21. Cumplimiento kit señalización SST

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT SEÑALIZACION SST
Indicador de Calificación	(No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%
	(30/30) *100%= 100%
Análisis	Durante este periodo se realizó la instalación de treinta (30) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo.

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones preoperacionales a los equipos, máquinas, herramientas, como también a los equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

Anexo 17. Inspecciones

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Consorcio San Vicente cuenta con servicios sanitarios para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales

Tabla 22. Relación agua potable

PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Del 05 al 19 de enero	Botellón 20 L	26 unds
Del 20 al 30 de enero	Botellón 20 L	35 unds

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS

CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el **Anexo 17. Inspecciones.**

Tabla 23. Cumplimiento Kit de emergencias

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS
Indicador de Calificación	(No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100%
	(5/5) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se cuenta con cinco (5) kit de emergencias, uno (1) en campamento y cuatro (4) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto.

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

En el periodo se presentaron cero (0) accidentes de trabajo no graves ni mortal, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

Tabla 24. Personal con incapacidad por AT

INCAPACIDADES POR ATEL			
Número AT Periodo	0	Total días de incapacidad por AT	5
Nombres y Apellidos del trabajador	Cargo		Días de incapacidad del periodo

Anexo 18. Indicadores y reporte de accidentes

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan en el **Anexo 19. Permisos de trabajo y ATS**

Anexo 19. Permisos de trabajo y ATS.

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría. Ver **Anexo 19. Permisos de trabajo y ATS. Ver Registro Fotográfico.**

2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

El CONSORCIO SAN VICENTE realiza la detección, documentación, verificación de plan y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de asegurar la eficacia del sistema de gestión SST y prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como para optimizar continuamente las condiciones de trabajo.

Anexo 20. Informe Acciones del periodo

2.17 INFORME PROVEEDORES

Para el presente periodo el proveedor de mampostería presenta informes de las actividades ejecutadas, que incluye capacitación y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo, entre de elementos de protección personal y dotación.

Anexo 21. Informe de contratista

2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo se llevó a cabo actividad de charla de seguridad denominada Métodos de Limpieza del oído medio y externo. **Anexo 12. Capacitaciones y charlas de seguridad.** Ver **Anexo 9. Cumplimiento Requisitos Legales** y **Ver Registro fotográfico.**

2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

En desarrollo de las actividades del PMT en el proceso constructivo en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. **Ver Registro fotográfico**

2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

Anexo 22. Solicitud cierres temporales PMT

2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:

2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 015 del 30/01/2026 y Oficio dirigido a la comunidad sobre canales de atención y ofertas de empleo, publicado en emisora Sabambu de Garzon. **Ver Registro fotográfico.**

Anexo 23. Acta Apertura Buzón PQRS

2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental

San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. **Ver registro fotográfico**

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:

-Diligenciamiento de registro de visitantes

-Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.

-Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores como es la celebración de los cumpleaños del mes. **Ver Registro fotográfico.**

2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Anexo 24. Registro fotográfico SST

3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN".

3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 25. Marco legal gestión ambiental

NORMAS GENERALES	Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.
	Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales.
	Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.
	Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.

	Constitución política del 1991: • Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. • Art 58:" La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica". • Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables." • Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano". • Art 80: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. • Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. • Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc. • Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos náurales no renovables.
	Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.
	Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
	Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.

NORMAS REGLAMENTARIAS	Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo, Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos.
	Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto
AIRE	Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
	Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
	Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
	Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.
SUELO	Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
AGUA	Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.
	Ley 99 de 1993. Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.
	Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.

	Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.
	Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.
RESIDUOS SÓLIDOS	Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.
	Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos
	Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
	Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
	Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
	Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

	Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
	Resolución 472 del 2017: Donde ser reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que derogo expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.
FAUNA	Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.
	Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.
	Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre
	Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
FLORA	Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
	Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana
	Certificado de Incentivo Forestal – CIF: Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.
PAISAJE	Decreto 1715 de 1978: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS	Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.

	Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.
	Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
	Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
	Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.
	Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.
	Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
	Ley 1152 de 2007.Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones
	Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas.
	Decreto 879 de 1998. Artículo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.
	Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial
RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial.
	Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas.
	Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional

	Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.
	Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.
	Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres.
	Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias
	Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional
	Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo
ARQUEOLOGIA	Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico
	Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial.
	Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.

3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2026, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

En el presente periodo se garantiza el seguimiento y cumplimiento a las fichas ambientales establecidas en el PMA. Los indicadores se presentan de manera semestral.

3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

Para el presente periodo se utilizaron materiales pétreos para las diferentes actividades constructivas.

3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

Tabla 26. Relación de materiales e insumos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
EDS Gasoil	ACPM	174 galones

Tabla 27. Relación de materiales pétreos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
DF Construcciones y servicios SAS	Arena	77 m3
DF Construcciones y servicios SAS	Arenilla	14 m3
Masseq	Triturado	40 toneladas

Tabla 28. Relación Ingreso de concreto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE CONDUCTOR	VOLQUETA PLACAS	M3
07/01/2026	CONVENCIONAL	CARLOS QUINTERO	KZV-839	4.5
		TOTAL		4.5 m3

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.

Anexo 25.Control de material

3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo. En el presente periodo se realiza fundida de estructura con concreto premezclado.

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.

Tabla 29. Sustancias químicas usadas

SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS	
CEMENTO	Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).
ACPM	Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación.
GASOLINA	El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía. Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor.
PEGANTE PVC	Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías. Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.

DESMOLDANTE PARA FORMALETA	Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico. Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.
EPOTOC 1	Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.
TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE	Es un liquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.
DURAL 452 GEL	Adhesivo epóxico de dos componentes, 100% sólido, de alto módulo, diseñado para aplicaciones de unión estructural que requieren un material que no se descuelgue o deslice.
ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Ha sido específicamente diseñado para proveer una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base. Es apropiado para resistir cargas medianas y altas, tanto estáticas, como de viento o sísmicas en tensión y cortante en aplicaciones estructurales y no estructurales.
LIMPIADOR PVC	Producto químico diseñado para limpiar y preparar superficies de cloruro de polivinilo (PVC) antes de aplicar adhesivos o selladores.
ESMALTE AMARILLO	Es un tipo de pintura que se utiliza para dar un acabado brillante y protector a diversas superficies.
CURASEAL ANTISOL	Solución coloidal, disponible en rojo, blanco o transparente, que se utiliza para el curado, sellado y endurecimiento de concreto y mortero

ENDURECEDOR PARA PISOS	Formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas.
MORTERO ACRILICO	Material transpirable y de alta resistencia compuesto de resinas acrílicas y pigmentos.
ET-3G	Se utiliza para anclar varillas roscadas y barras de refuerzo en concreto y mampostería, siendo ideal para aplicaciones generales, incluso en condiciones secas o húmedas y en concreto agrietado o no agrietado.

3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continua el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.
- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.

Anexo 26. Inspección acopio y consumo combustible

3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.

3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo con el código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

3.8 MANEJO DE RCD

3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

En el presente periodo se dispuso 72 m3 de RCD. Residuos que fueron depositados y dispuestos en el sitio definido por la empresa y mencionado en el anterior ítem.

Estas disposiciones fueron realizadas por Consorcio San Vicente y el proveedor de volquetas DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 901359095-1.
Cabe resaltar que la salida de volquetas en obra siempre es carpada con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

En este periodo se realizó disposición final de RCD lo cual se generaron reportes mensuales de sobrantes, dichos residuos fueron dispuestos en el sitio establecido y autorizado.

Tabla 30. Retiro RCD

FECHA	SALIDA DE MATERIAL	PLACA VOLQUETA	M3	VIAJES	TOTAL, M3
7/01/2026	ESCOMBROS	WHA - 003	7	1	7
19/01/2026	ESCOMBROS	XMC-971	7	1	7
24/01/2026	ESCOMBROS	SWK - 353	8	1	8
26/01/2026	ESCOMBROS	SWK - 353	8	1	8
26/01/2026	ESCOMBROS	ABL -519	7	1	7
27/01/2026	ESCOMBROS	WHA - 003	7	1	7
29/01/2026	ESCOMBROS	WHA - 003	7	1	7
29/01/2026	ESCOMBROS	WHA - 003	7	1	7
29/01/2026	ESCOMBROS	WHA - 003	7	1	7
30/01/2026	ESCOMBROS	SWK - 353	7	1	7

En la siguiente tabla, se relaciona de manera trimestral el reporte de disposición final de RCD generados en el 2026.

Tabla 31. Reporte RCD 2025

PERIODO	SALIDA DE MATERIAL	TOTAL, M3
Enero	Escombros	72

3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombro, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.

3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizo ningún material en obra ya que todo los RCD generados en obra fueron dispuestos en sitio.

Anexo 27. Control de material RCD

3.8.6 TRANSPORTE

Durante este periodo se realizó cargue y/o transporte de RCD, dichos sobrantes fueron transportados por las siguientes volquetas.

Tabla 32. Vehículos retiro RCD

PLACA	M3
SWK-353	23
WHA-003	35
ABL-519	7
XMC-971	7

3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se realiza entrega para su disposición final.

3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL

En el mes de enero, se realizó la tercera entrega de residuos industriales a la empresa Serviambiental S.A E.S.P. quien ofrece sistemas de tratamiento (incineración) y disposición final de toda clase de residuos. Los residuos dispuestos en el per fueron los siguientes:

- Elementos de protección individual usados y dañados.
- Bolsas de cemento

- Material contaminado (epóxido para anclajes)
- Filtros contaminados

Durante el transcurso del mes de febrero se realizará la radicación del certificado de disposición final, toda vez que el proveedor emite dicho certificado una vez culminado el mes, conforme a la disposición de los residuos generados.

En el presente periodo, los restos de madera, cartón y plástico generados y acopiados en obra fueron donados a personas, quienes manifestaron su interés en reutilizarlo, quedando constancia de dicha entrega.
Anexo 28. Acta de entrega.

3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES

Durante el presente periodo, se realizaron las labores de humectación de superficies mediante riego controlado, aplicadas principalmente en actividades como el barrido de placas, con el fin de minimizar la emisión de polvo y mantener las condiciones adecuadas de limpieza. Estas acciones se ejecutan bajo criterios de uso eficiente del recurso hídrico, evitando el desperdicio de agua y en coherencia con las campañas internas de ahorro y consumo responsable.

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de corte de ladrillo bajo condiciones controladas, aplicando humectación previa del material con el propósito de

minimizar la generación y dispersión de material particulado. Asimismo, se adecuó un área especifica para el corte, cubierta con poli sombra, que actúa como barrera física para evitar la propagación de polvo hacia otras zonas de trabajo. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la prevención de impactos al entorno y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

3.10.5 VÍAS DE ACCESO

En este periodo, las vías de acceso a la obra Hospital Departamental San Vicente de Paúl se mantienen en óptimas condiciones, libres de acumulación o dispersión de material particulado. Al finalizar cada jornada o actividad que implique movimiento de materiales o tránsito de vehículos, se realizan barridos y limpieza preventiva en las vías de acceso, con el fin de remover el material particulado o residuos sueltos generados durante las labores. Estas acciones contribuyen al control ambiental del área de influencia, asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra volquetas para realizar trasiego de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así, autorizar su ingreso.

Tabla 33. Volquetas entrada y movimiento de material

PLACA	LINEA	MODELO
XMC-971	KODIAK-157	2009
WHA-003	SIN LINEA	1946
ABL-519	KODIAK 157	2006
SWK-353	KODIAK 7500	2007

Tabla 34. Relación maquinaria en obra

CLASE	LINEA	MODELO
BOMBA ESTACIONARIA	PUTZMEISTER	BSA 1004
TORRE GRUA MOVIL	-	ACRS13-L
PLANTA ELECTRICA	-	P-100
TORRE GRUA	-	CM4810

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de estos.

3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

Tabla 35 Relación consumo de agua

Factura No.	Código interno	Consumo m3
3569951	00185097	68

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.
Anexo 29. Control aseo de baños

3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

En el presente periodo se implementaron acciones de control para prevenir la dispersión de material particulado y el derrame de residuos en las vías de acceso. Cuando se requiere, a las volquetas se les realiza el lavado de llantas mediante riego controlado, evitando el arrastre de material hacia el exterior de la obra. Asimismo, el lavado de los mixers se efectúa en un área acondicionada con dique de contención, lo que permite retener los residuos sólidos y evitar vertimientos directos sobre el suelo. Los residuos generados durante estas actividades son recolectados y trasladados a las áreas de acopio temporal, donde se almacenan de manera segura para su posterior disposición final.

3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

3.11.6 CUERPOS DE AGUA

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.7 CONTROL DE VECTORES

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

En el presente periodo se llevó a cabo un refuerzo de las actividades de fumigación y control de vectores y roedores en las áreas correspondientes al sótano y primer piso del Lote A, con el fin de prevenir la proliferación y garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

Anexo 30. Control de plagas y roedores

3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.

Ilustración 26. Publicaciones ambientales

3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de enero, se llevó a cabo la siguientes charlas y capacitaciones:

Tabla 36. Relación de temas ambientales

No.	Tema	Fecha	Duración
1	Orden y aseo – clasificación de residuos	06/01/2026	10 min
2	Manejo y disposición de los envases de productos químicos	14/01/2026	10 min
3	Aguas residuales y sus efectos contaminantes	20/01/2026	15 min
4	Manejo integral de RCD	28/01/2026	10 min
5	Control de material particulado - polvo	29/01/2026	15 min

Anexo 31. Registro de charlas

3.14 ORDEN Y ASEO

3.14.1 JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.

Ilustración 27. Orden y aseo

Anexo 32. Inspección de orden y aseo

3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS

Durante el presente periodo no se recibió visita de ningún ente o autoridad ambiental.

3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de enero, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

Anexo 33. Registro fotográfico Ambiental

4. CONCLUSIONES

- Se continuaron adelantando comités de obra y mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, verificando los diseños del proyecto.

- Se está a la espera por parte del Consorcio San Vicente la entrega de los diseños arquitectónicos y estructurales ajustados y aprobados para la PTAR y la Central de Gases medicinales. Así mismo la definición oficial del alcance constructivo y configuración estructural final de las edificaciones del Lote B.

- Para el sistema de gases medicinales, tal como fue tratado en el Comité de Obra No. 75, celebrado el pasado 15 de enero, se dejó claramente establecido que resulta imperiosamente prioritario contar con una definición clara, formal y oficial del alcance, toda vez que esta es indispensable para establecer el alcance real del proyecto, consolidar el balance presupuestal y permitir el inicio efectivo de las actividades correspondientes al sistema de gases medicinales

- Es importante dejar constancia de que las actividades de esta especialidad no han sido iniciadas, debido exclusivamente a la falta de definiciones técnicas y contractuales formales, situación que no es imputable al contratista y que continúa afectando la planificación técnica, la programación del cronograma, la gestión de compras, la contratación de proveedores especializados y la coordinación con otras disciplinas del proyecto.

- Se reitero la necedad en la entrega por parte de la entidad contratante de la información técnica detallada requerida para la correcta selección, evaluación, y cotización del equipo "planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas tipo compacta" puesto que, a la fecha, no se ha recibido la documentación necesaria, lo cual imposibilita avanzar en los procesos de adquisición dentro de los plazos establecidos

- Para este frente de obra denominado lote B aún no se encuentra definida la infraestructura requerida para el paso de ductos que integrará y/o comunicará el et frente de obra con la torre asistencial de las diferentes especialidades. En la planimetría y diseños correspondientes a la Etapa 1 de construcción no se incluyen detalles estructurales ni constructivos que permitan materializar la conexión entre

el Lote B y el edificio asistencial. Esta conexión resulta crítica, considerando que debe atravesar la Calle 6 e integrar, entre otros, los siguientes sistemas:

- Red de gases medicinales.
- Sistema de agua helada para ventilación mecánica

- La información anteriormente mencionada constituye un insumo técnico indispensable para evaluar la viabilidad constructiva, definir procedimientos de ejecución, establecer secuencias de obra y realizar la planificación de recursos, equipos y adquisiciones asociadas.

- En cumplimiento de las actividades del Plan Trabajo Anual SST en el periodo se ejecuta el 100% de las actividades programadas.

- En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, el ausentismo del periodo fue solo por incapacidad de origen común.

- En el presente periodo, se implementan medidas de prevención, control y mitigación de impactos. No se han presentado incidentes ambientales. Asimismo, se ha realizado una adecuada gestión de residuos, control de emisiones de polvo y manejo responsable de los recursos, evidenciando el compromiso del proyecto con la protección del medio ambiente y el mejoramiento continuo en sus procesos.

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN-HUILA"

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No 24

CONTRATO N°090 DE 2024

FEBRERO 2026

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN VICENTE

GARZÓN HUILA

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON-HUILA"

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	REVISÓ	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
01	80	Febrero	**Ing. Zaida Carine Aljure Naranjo**		Informe de gestión febrero de 2026

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

TABLA DE CONTENIDO

COMPONENTE TECNICO 3

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 3

1.2 INFORMACION FINANCIERA 4

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO 4

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN 4

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 5

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B 5

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A 5

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO 15

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES 16

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 17

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B 17

1.4.4 EXTERIORES 18

1.4.5 EQUIPOS. 20

1.4.6 ARQUITECTURA Y ACABADOS 22

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA 24

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 24

1.5.2 BITACORA DE OBRA 24

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA 24

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA 25

1.6.1 CORRESPONDENCIA 25

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO 25

1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO 31

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO 32

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 34

2.1 MARCO NORMATIVO 34

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL 35

2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE 36

2.2.2 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE 36

2.2.3 PERSONAL CASETÓN 38

2.2.4 PERSONAL HIDROSANITARIAS 38

2.2.5 PERSONAL ELÉCTRICO 39

2.2.6 PERSONAL TOPOGRAFÍA 39

2.2.7 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1. 39

2.2.8 PERSONAL AIRES ACONDICIONADOS 40

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL 40

2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 41

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST 42

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD 42

2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES 42

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 43

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 43

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS 44

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 44

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS 44

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 44

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO 45

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO 45
2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 45
2.17 INFORME CONTRATISTAS/ PROVEEDORES 46
2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 46
2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 46
2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA 46
2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 46
2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR 46
2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES 47
2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES 47
2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 47
3 GESTIÓN AMBIENTAL 48
3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 48
3.1.1 MARCO NORMATIVO 48
3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 55
3.2.1 INFORME AMBIENTAL 55
3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 55
3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES 55
3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO 55
3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES 55
3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 55
3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS 55
3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN 56
3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO 56

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 56
3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 56
3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION 59
3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 59
3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN 59
3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 60
3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 60
3.8 MANEJO DE RCD 60
3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD 60
3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 60
3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD 61
3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN 61
3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD 62
3.8.6 TRANSPORTE 62
3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 62
3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO 62
3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL 62
3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 62
3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA 63
3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD 63
3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES 63
3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES 63
3.10.5 VÍAS DE ACCESO 63
3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 64

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 64
3.11.1 SUMIDEROS 64
3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS 65
3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 65
3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA 65
3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES 65
3.11.6 CUERPOS DE AGUA 66
3.11.7 CONTROL DE VECTORES 66
3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 66
3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA 66
3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES 66
3.14 ORDEN Y ASEO 67
3.14.1 JORNADAS DE ASEO 67
3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA 67
3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 67
3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS 67
3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES 67
3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO. 68
4. CONCLUSIONES 69

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto 2
Ilustración 2. Armado de mampostería. 8
Ilustración 3. Elementos de confinamiento. 8
Ilustración 4. Armado de mampostería fachada. 9

Anexo 4. Programación de obra....25
Anexo 5. Acta de mesa técnica....31
Anexo 6. Pólizas de garantía....32
Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales....35
Anexo 8. Soportes afiliaciones y retiros....40
Anexo 9. Soporte pagos de seguridad social....40
Anexo 10. Capacitaciones y charlas de seguridad....41
Anexo 11. Comités de apoyo....42
Anexo 12. Recomendaciones médicas....42
Anexo 13. Inducción y reinducción....42
Anexo 14. Entrega de dotación y EPI....43
Anexo 15. Inspecciones....44
Anexo 16. Indicadores y reporte de accidentes....45
Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS....45
Anexo 18. Informe Acciones del periodo....45
Anexo 19. Informe de contratista....46
Anexo 20. Solicitud cierres temporales PMT....46
Anexo 21. Acta Apertura Buzón PQRS....47
Anexo 22. Registro fotográfico SST....47
Anexo 23.Control de material....56
Anexo 24. Inspección acopio y consumo combustible....59
Anexo 25. Control de material RCD....62
Anexo 26. Acta de entrega....62
Anexo 27. Control aseo de baños....65
Anexo 28. Control de plagas y roedores....66
Anexo 29. Registro de charlas....66
Anexo 30. Inspección de orden y aseo....67
Anexo 31. Registro fotográfico Ambiental....68

SAN VICENTE CONSORCIO	INFORME DE GESTION
	CONTRATO 090 DEL 2024
	PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO
	AÑO: 2026
	VERSION 001

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad reportar las actividades para el proyecto adjudicado mediante contrato No. 090 de 2024 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN". cual resume los indicadores de cumplimiento correspondientes a las actividades realizadas en el **periodo del 01 al 28 de febrero del 2026**. La ejecución de este proyecto demanda una obra totalmente nueva que arranca con replanteo, excavaciones, pilotaje, retiros, rellenos, cimentación, estructura en concreto, mampostería, carpintería metálica (puertas y ventanas), estructura metálica de cubierta, acabados de obras hidrosanitarias, de red de contra incendio, gas, obras eléctricas, voz y datos e instalación de equipos (Bomba contra incendio y equipos de presión constante).

En agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl.

En Agosto 1° de 1.994, mediante Decreto Ordenanza No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón , como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatuto.

Garzón es un municipio colombiano, localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace en el este con una región montañosa que corresponde al flanco occidental de la cordillera Oriental, y otra al oeste, plana que hace parte del valle del río Magdalena. Su extensión territorial es de 692 km², su altura es de 830 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 24 °C. Cuenta con una población de 101.562 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2022. Hace parte de la región Subcentro del departamento.

El proyecto de construcción para el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, Bajo el contrato de obra pública N°090 de 2024 "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNUICIO DE GARZÓN-HUILA, se encuentra ubicado en la calle 7 N°14-69, Municipio de Garzón Departamento del Huila.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto

COMPONENTE TECNICO

1.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información general del contrato

Numero de contrato	090 DE 2024
Fecha de suscripción	04/01/2024
Organización contratante	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON HUILA
Proyecto	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE D EPAUL
Objeto del contrato	***"CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMNETAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNUICIO DE GARZON-HUILA"***
Domicilio contractual	CR 4 No 2-85 Zona Industrial vía palmero
Contratista de obra	CONSORCIO SAN VICENTE
Nit. del contratista de obra	901.785.549-8
Representante legal	WILLAM ALEXANDER POLO POLANIA
CC. del representante legal	7.711.612
Director de obra	ZAIDA CARINE ALJURE NARANJO
Valor del contrato	$ 86.899.134.742
Plazo de ejecución	30 MESES
Fecha de inicio	20/03/2024
Fecha de Suspensión	N. A
Fecha de Terminación	19/09/2026
Prorroga	N. A
Fecha de reinicio	N. A
Fecha de terminación	N. A

1.2 INFORMACION FINANCIERA

1.2.1 INFORME MANEJO DE ANTICIPO

En el presente periodo se realizó adquisición de materiales y pagos relacionados con prestación de servicios, en el presente periodo ninguno de estos se llevó a cabo a través de la Fiducia.

1.2.2 INFORME FACTURACIÓN

Al cierre del presente periodo, el Consorcio san Vicente ha tramitado **dieciséis (16)** actas de corte de obra, verificadas por la Interventoría y validadas para el correspondiente pago por la Supervisión de la E.S.E.

En la siguiente tabla resumen se detalla los pagos realizados de acuerdo con el histórico de actas de corte de obra tramitadas, aprobadas.

Tabla 2 Resumen de actas

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO	
Vr. Contrato	$ 68.683.134.742,00
Vr. Amnticipo	$ 26.029.740.423,00
Vr. Pagado	$ 18.394.809.865,00
Saldo cont.	$ 42.434.585.454,00

# ACTA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	NETO A GIRAR	ESTADO
ACTA #1	$ 208.905.712	$ 62.671.714	$ 146.233.998	PAGADAS
ACTA #2	$ 719.606.764	$ 215.882.029	$ 503.724.735	
ACTA #3	$ 882.800.683	$ 264.840.205	$ 617.960.478	
ACTA #4	$ 390.626.459	$ 117.187.938	$ 273.438.521	
ACTA #5	$ 137.838.998	$ 41.351.699	$ 96.487.299	
ACTA #6	$ 2.763.579.997	$ 829.073.999	$ 1.934.505.998	
ACTA #7	$ 1.413.817.258	$ 424.145.177	$ 989.672.081	
ACTA #8	$ 2.615.751.987	$ 784.725.596	$ 1.831.026.391	
ACTA #9	$ 1.992.727.752	$ 597.818.326	$ 1.394.909.426	
ACTA #10	$ 2.616.459.112	$ 784.937.734	$ 1.831.521.378	
ACTA #11	$ 2.096.315.525	$ 628.894.658	$ 1.467.420.867	
ACTA #12	$ 2.051.064.523	$ 615.319.357	$ 1.435.745.166	
ACTA #13	$ 1.783.406.850	$ 535.022.055	$ 1.248.384.795	
ACTA #14	$ 1.963.166.988	$ 588.950.096	$ 1.374.216.892	
ACTA #15	$ 3.332.738.472	$ 999.821.542	$ 2.332.916.930	
ACTA #16	$ 1.309.491.301	$ 392.847.391	$ 916.643.910	
TOTAL	**$ 26.278.298.381**	**$ 7.883.489.516**	**$ 18.394.808.865**	

1.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

En el presente periodo se continuo la ejecución de las actividades de obra de acuerdo con versión de reprogramación aprobada en el mes de enero de 2025 y que se denomina "3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025", resaltando que todas las actividades programadas y ejecutadas fueron revisadas, validadas y liberadas por la Interventoría dentro del proceso de seguimiento técnico y de construcción que se ha implementado desde el inicio de la obra

1.3.1 EDIFICIO LOTE PREDIO B

- Durante el presente periodo no se ejecutaron actividades en el frente de obra en el lote B debido a la falta de definiciones PTAR Y CENTRAL DE GASES MEDICINALES Teniendo en cuenta la reubicación y separación de las estructuras del lote B, se solicita a esta interventoría su apoyo para gestionar, ante las instancias correspondientes, la agilización de los diseños estructurales y arquitectónicos de la PTAR y de la Central de Gases Medicinales. Lo anterior, considerando que los diseños iniciales integran ambas estructuras mediante zapatas y columnas compartidas, que al comparar y sobreponer estos planos estructurales con el plano en archivo PDF remitido por la Interventoría mediante correo electrónico de julio 08 de 2025 se puede establecer que la edificación de la Central de Gases Medicinales y la PTAR que estructuralmente comprenden una sola edificación, ver figura N°1, en esta solución arquitectónica han sido separadas
- **CONEXIÓN LOTE B Y EDIFICIO ASISTENCIAL**
  En la planimetría y en los diseños entregados para la etapa 1 de construcción no se incluyen los detalles estructurales ni constructivos necesarios para realizar la conexión entre el Lote B y el edificio asistencial.
  Lo anterior es especialmente relevante considerando que dicha conexión debe atravesar la Calle 6 e incorporar los sistemas de gases medicinales, la red contra incendios y el sistema de agua helada para la ventilación mecánica.
  La información mencionada es indispensable para poder evaluar adecuadamente la viabilidad de su construcción e implementación.

1.3.2 EDIFICIO ASISTENCIAL LOTE A

- **Mampostería:**

Durante el mes de febrero se dio continuidad a las actividades de mampostería en el sótano, culminando los muros pendientes. De igual manera, la mampostería correspondiente a los pisos 1 y 2 quedó ejecutada al 100%, mientras que en el piso 3 se alcanzó un avance del 90% y en el piso 4 un progreso aproximado del 50%.

Es importante precisar que cada tramo de mampostería incluye la ejecución de sus respectivas columnetas y vigas de confinamiento. Asimismo, se continuó con la mampostería en bloque de cemento para las fachadas, incorporando las dovelas correspondientes.

En relación con lo anterior, se presenta la siguiente novedad:

Las actividades de mampostería hasta el piso 4 se encuentran a dos (2) semanas de su culminación; no obstante, a la fecha no se cuenta con las definiciones correspondientes a las redes en general.

En consecuencia, el Consorcio San Vicente deja constancia formal de que, una vez finalizadas las actividades de mampostería, el edificio asistencial quedará prácticamente suspendido en su totalidad, debido a la falta de definición y aprobación del alcance técnico y económico de las actividades relacionadas con el sistema eléctrico, los gases medicinales y la instalación de válvulas o sistemas de accionamiento por pulsación en zonas húmedas.

Es preciso reiterar, tal como se indicó en el oficio CHDSVP-OBRA-771-02-2026, que las actividades de pañetes internos se encuentran actualmente suspendidas. Esta situación viene generando afectaciones al plazo contractual, así como a la permanencia de personal, equipos y a la estructura administrativa del proyecto.

Finalmente, se deja constancia de que las demoras derivadas de la ausencia de definiciones técnicas, documentales y de diseño están produciendo impactos directos en la programación de obra, en la disponibilidad de recursos humanos y en la estructura de costos del proyecto. En tal sentido, el Consorcio San Vicente se reserva el derecho de presentar las reclamaciones contractuales a que haya lugar por concepto de mayores permanencias, tiempos improductivos, afectaciones económicas y eventuales ampliaciones de plazo derivadas de la presente situación, precisando que los sobrecostos asociados a dichas indefiniciones no serán asumidos por el contratista, por cuanto no corresponden a su ámbito de control ni de responsabilidad.

➢ **Pañete:**

Durante este periodo se da continuidad al pañete en sótano, piso 1 y fachada, presentando la siguiente novedad:

el Consorcio San Vicente se permite dejar constancia formal de la suspensión parcial de las actividades correspondientes a los pañetes internos, como consecuencia de la falta de definición y aprobación del alcance técnico y económico de actividades relacionadas con el sistema eléctrico, gases medicinales y la instalación de válvulas o sistemas de accionamiento por pulsación en zonas húmedas, estos deben ejecutarse con anterioridad a los trabajos de pañete.

En atención a lo anterior, nos vemos en la obligación de retirar el personal asignado a la ejecución de los pañetes internos. Esta situación está generando afectaciones en el plazo contractual, así como en la permanencia de personal, equipos y en la estructura administrativa del proyecto.

Finalmente, se deja constancia de que las demoras derivadas de la falta de definición técnica, documental y de diseño están produciendo impactos directos en la programación de obra, en la disponibilidad de recursos humanos y en la estructura de costos del proyecto. En tal sentido, el Consorcio San Vicente se reserva el derecho de presentar las reclamaciones contractuales a que haya lugar por concepto de mayores permanencias, tiempos improductivos, afectaciones económicas y eventuales ampliaciones de plazo que se deriven de esta situación, precisando que los sobrecostos asociados a dichas indefiniciones no serán asumidos por el contratista, por cuanto no corresponden a su esfera de control ni de responsabilidad.

Ilustración 2. Armado de mampostería.

Ilustración 3. Elementos de confinamiento.

Ilustración 4. Armado de mampostería fachada.

Ilustración 5. Pañetes.

- **Redes y especialidades eléctricas.**

Durante el mes, el personal eléctrico ha continuado con el avance de las actividades correspondientes al sistema eléctrico del proyecto en piso 3 y 4, entre las cuales se destacan:

- Tendido de tubería EMT de 3/4" para los sistemas de iluminación, y detección de incendios
- Instalación de soportería para bandejas tipo ducto porta cable en piso 2 y 3
- Montaje de cajas EMT bajo placa y muros para canalización de iluminación.

- Marcación, localización y replanteo de puntos eléctricos en cada uno de los espacios del proyecto bajo placa.
- Cimbrado de muros para permitir la correcta colocación de los puntos eléctricos

Se realizaron Inspecciones conjuntas a las tuberías y bandejas instaladas a fin de verificar continuidad, alineación, fijación y cumplimiento normativo.

Ilustración 6. Instalación ductería bajo placa para iluminación.

Ilustración 7. Instalación de ductería EMT bajo placa y soporte para bandejas porta cable.

➢ **Redes y especialidades hidrosanitaria**

Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron diversas actividades correspondientes a las instalaciones hidrosanitarias e hidráulicas del proyecto. Los trabajos se ejecutaron de manera progresiva en los diferentes niveles de la edificación, con el objetivo de garantizar la correcta disposición de las redes de agua potable, agua de servicio, agua caliente y sistemas sanitarios, así como la coordinación necesaria con otras especialidades como la eléctrica, ventilación mecánica y red contra incendios A continuación, se presenta el detalle de las labores realizadas en cada piso.

Primer piso

- Movimientos de tubería sanitaria para dar paso a instalaciones eléctricas.
- Instalación de tubería de agua fría potable.
- Instalación de tubería de agua fría de servicio.
- Instalación de tubería de agua caliente.
- Prueba de presión en tubería de agua de servicio, con recibo a satisfacción de la interventoría.

Segundo piso

- Instalación de tubería de agua fría potable.
- Instalación de tubería de agua de servicio.
- Instalación de tubería de agua caliente.
- Instalación de registros de ½".

Tercer piso

- Instalación de tubería de agua fría potable.
- Instalación de tubería de agua de servicio.
- Instalación de tubería de agua caliente.

Ilustración 8. Descuelgue y tendido de red hidráulica bajo placa piso 2.

Ilustración 9. Tendido de red de sanitaria.

➢ **SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC**

En el marco de la ejecución del sistema de ventilación mecánica, se continuó con las labores de ductería de suministro y retorno, empleando lámina galvanizada como material principal para garantizar resistencia y durabilidad. Las actividades incluyeron el corte y ensamble de piezas para el armado de los ductos, asegurando uniones herméticas y alineadas con los recorridos previamente definidos en la planificación. Paralelamente, se avanzó en la instalación de las líneas de refrigeración y retorno en el primer piso, coordinando su disposición con las demás redes técnicas para evitar interferencias y optimizar el espacio disponible.

Se desarrollaron actividades en los diferentes pisos:

- Area de sótano se desarrolló instalación de ductos de suministro desde cuarto de maquinar hasta área de tomografía y sala de espera.
- Area de piso 1 se realizó reorganización de ruta de ductos para evitar cruces con las especialidades eléctricas y sistema contra incendios ducto de suministro observación.
- Area de piso 2 instalación de ductos de suministro a salas de cirugía.

Ilustración 10. Instalación de ductos piso 1

Ilustración 11. Instalación de ductos y recubrimiento de ductos piso 1.

➢ **SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO**

Durante el mes de febrero se inició la instalación de la red del sistema contra incendios, avanzando con el tendido de las tuberías principales destinadas a alimentar los rociadores y gabinetes. Estas tuberías, en diámetros de 3 y 4 pulgadas, fueron dispuestas en el área de sótano y cuentan con el soporte adecuado para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento. La ejecución se ha realizado conforme a lo establecido en los planos constructivos entregados por la Entidad Contratante, asegurando que cada actividad se ajuste a los lineamientos técnicos definidos para el proyecto.

Es importante destacar que en el proceso de ejecución se ha contado con el acompañamiento y verificación permanente del personal de Interventoría en campo, lo cual ha permitido validar la correcta instalación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Estado actual:

- Tendido de tuberías principales en sótano.
- Soportes instalados y verificados.
- Actividades ejecutadas conforme a planos aprobados.

La coordinación con la especialidad eléctrica, hidráulica, ventilación mecánica y arquitectónica será fundamental en las siguientes fases, a fin de garantizar la correcta integración del sistema contra incendios con las demás instalaciones del proyecto.

Ilustración 12. Instalación de Red Contra Incendios.

➢ **CONTROL TOPOGRAFICO**

Teniendo en cuenta la cota desde BM (niveleta en poste cota 807.10), hasta escalera acceso a sótano C1 cota 804.215 (punto provisional). A partir del BM designado se realizó nivelación de precisión y se determinaron cotas de comparación en cada una de las 9 niveletas.

Ubicación inicial de niveletas sobre columnas sótano.

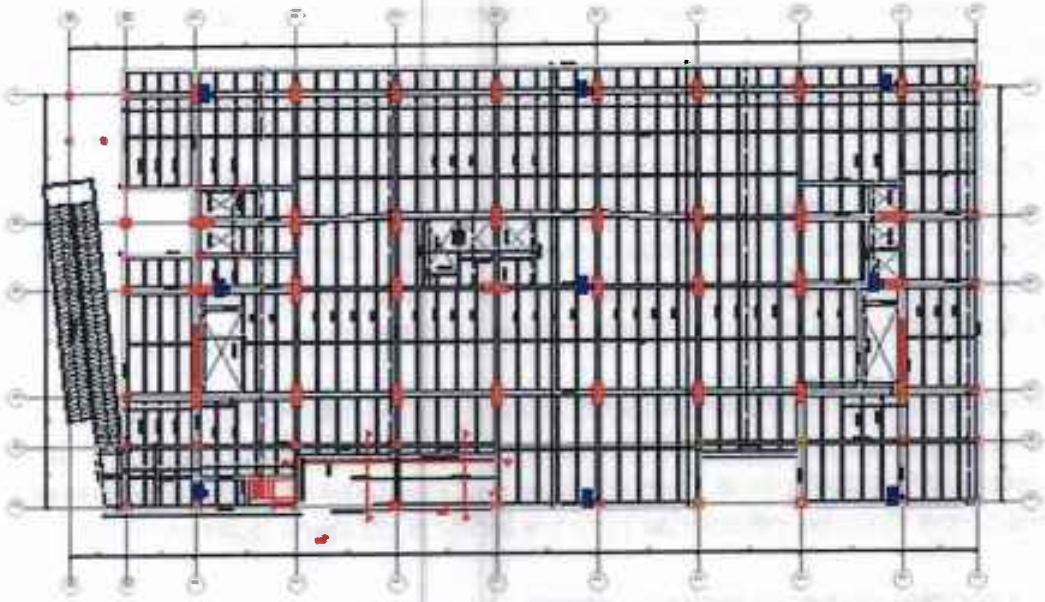

Ilustración 13. Puntos de control asentamientos

Dado lo anterior nos permitimos presentar el, informe topográfico con la relación de control de asentamientos para el edificio asistencial como para el edificio lote B.

Anexo 1. Informe control asentamientos

1.4 ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRESENTE PERIODO

En relación con el balance presupuestal que se ha venido trabajando de manera conjunta entre el Consorcio San Vicente y la Interventoría, y tomando como referencia la reunión sostenida en enero de 2026 en las oficinas de Regalías Departamental, se realizaron los ajustes solicitados conforme a las directrices impartidas en dicho espacio. Estos ajustes fueron presentados para verificación y consideración de la Entidad Contratante y la Interventoría.

Sin embargo, habiendo culminado el mes de febrero de 2026, a la fecha no se ha emitido pronunciamiento formal respecto a su aprobación ni frente a la definición clara y definitiva del alcance real y actualizado del contrato.

Esta ausencia de decisiones ha prolongado un escenario de indefinición técnica y financiera que afecta directamente el desarrollo del proyecto. Se evidencia un desbalance económico para el Consorcio San Vicente, derivado de la imposibilidad de abrir nuevos frentes de obra y ejecutar actividades que, aunque contempladas en el

alcance contractual, requieren aprobación expresa de mayores cantidades por parte de la Interventoría.

Los hechos descritos configuran una alteración sobreviniente del equilibrio económico contractual, en tanto el Contratista ha debido asumir cargas adicionales sin contraprestación ni posibilidad de ejecución productiva. Es importante resaltar que esta situación no obedece a decisiones autónomas del Contratista ni a circunstancias imputables a su gestión, sino a la falta de insumos técnicos cuya provisión corresponde a la Entidad dentro del marco de la planeación contractual.

En consecuencia, el Contratista deja constancia de que los impactos en plazo, costos y rendimiento derivados de esta falta de definición deberán ser reconocidos conforme a lo establecido contractualmente, reservándose expresamente el derecho de presentar las reclamaciones formales necesarias para preservar el equilibrio económico del contrato.

1.4.1 ESPECIALIDADES E INSTALACIONES

- Se está a la espera por parte del Consorcio San Vicente la entrega de los diseños arquitectónicos y estructurales ajustados y aprobados para la implantación y ejecución de las áreas destinadas a PTAR y la Central de Gases medicinales. Así mismo la definición oficial del alcance constructivo y configuración estructural final de las edificaciones del Lote B.

- Es importante dejar constancia y resaltar de que las actividades para el sistema de gases medicinales no han sido iniciadas, debido exclusivamente a la falta de definiciones técnicas y contractuales formales, situación que no es imputable al contratista y que continúa afectando la planificación técnica, la programación del cronograma, la gestión de compras, la contratación de proveedores especializados y la coordinación con otras disciplinas del proyecto.

- Se reitero la necedad en la entrega por parte de la entidad contratante de la información técnica detallada requerida para la correcta selección, evaluación, y cotización del equipo "planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas tipo compacta" puesto que, a la fecha, no se ha recibido la documentación necesaria, lo cual imposibilita avanzar en los procesos de adquisición dentro de los plazos establecidos

- Para este frente de obra denominado lote B aún no se encuentra definida la infraestructura requerida para el paso de ductos que integrará y/o comunicará este frente de obra con la torre asistencial de las diferentes especialidades. En la planimetría y diseños correspondientes a la Etapa 1 de construcción no se incluyen detalles estructurales ni constructivos que permitan materializar la conexión entre el Lote B y el edificio asistencial. Esta conexión resulta crítica, considerando que debe atravesar la Calle 6 e integrar, entre otros, los siguientes sistemas:

  - Red de gases medicinales.
  - Sistema de agua helada para ventilación mecánica.

1.4.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Con el fin de adelantar y ganar tiempos en la programación se mantiene la implementación del Plan de trabajo presentados en informes anteriores cuyo objetivo fundamental es establecer las acciones generales para la actuación ante eventuales situaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, operacional y legal que puedan generar un traslado en los tiempos de ejecución de algunas de las actividades establecidas en la programación de obra y por lo tanto pueden llegar a afectar las fechas de inicio y final de entrega.

Verificar las jornadas extra-tiempo o adicional requeridas para garantizar la construcción de las estructuras (escaleras).

En relación con el avance de obra, se reitera la solicitud hecha a la interventoría de contar con la revisión, validación, y aprobación de observaciones para actividades relacionadas con el avance estructural de las Edificaciones Pendientes para el Lote B que involucran adicionalmente la consolidación del Balance de obra para la Etapa 1 del proyecto, bajo las siguientes consideraciones que se detallan como sigue:

1.4.3 ESTRUCTURA LOTE B

- Petar y central de gases medicinales

A partir del planteamiento de ubicación de los equipos para PETAR nueva y existente, CENTRAL DE GASES MEDICINALES, TANQUE RCI, entregada por la Consultoría del proyecto Sergo Arquitectura SAS a través de la Supervisión e Interventoría, para lo cual y teniendo en cuenta la reubicación y separación de la cimentación y estructura para la

edificación N°3, se solicitó a interventoría el apoyo para agilizar con quien corresponda los ajuste o nuevos diseños estructurales para la Petar y Central de Gases Medicinales, esto fundamentados en que los diseños originales unen por medio de zapatas y columnas las dos estructuras. (ver Ilustración N°1 Planta de Cimentación).

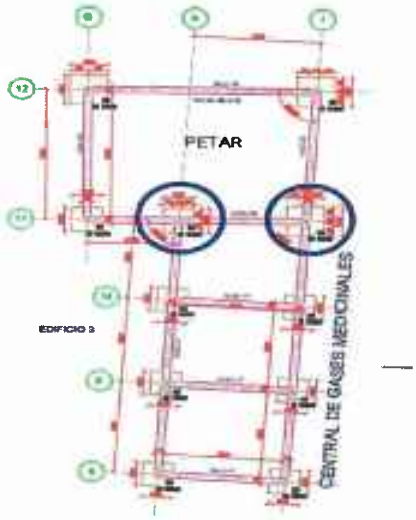

Ilustración 14. Planta de Cimentación Edificio 3 Lote B

1.4.4 EXTERIORES

- Rampa acceso peatonal costado norte

Para el acceso peatonal del costado norte sobre la calle 7 y en relación con los cambios de nivel, se identifica e interpreta en planos de Planta arquitectónica de piso 1° una rampa peatonal de acceso hacia la plazoleta central del proyecto, información y planimetría que no se encuentra resuelta en el proyecto estructural tanto en planos estructurales, detalles y memorias de cálculo, entre otros, situación que no permite claridad tanto para su ejecución como para su cuantificación, por lo cual y de la manera más cordial, les solicitamos sean ubicados y remitidos al Consorcio San Vicente lo antes posible esta documentación.

Ilustración 15. Panorámica de Exteriores y Acceso Peatonal Calle7ª

- Muros Contención Plazoleta Central

En la plazoleta exterior que según planos arquitectónicos, específicamente en la Planta de Piso 1°, se identifica unos esquemas que representan según nuestra interpretación desde el punto de vista arquitectónico, unos muros que contendrán el terreno en los diferentes cambios de nivel que se muestran esquemáticamente en los planos de las secciones transversales o cortes arquitectónicos, sin embargo esto no es suficiente información puesto que no se cuenta, ni se ha ubicado dentro de los archivos entregados al inicio del proyecto, los correspondientes detalles, plantas, despieces, especificaciones y memorias en el proyecto estructural y al igual que el punto anterior, les solicitamos de la manera más cordial sea ubicada y remitidos toda esta información al Consorcio San Vicente lo antes posible, con el fin de lograr desde el área técnica la revisión, planeación y cuantificación de todas las actividades dentro del proceso constructivo.

Ilustración 16. Panorámica de Exteriores y Plazoleta Central de Acceso

1.4.5 EQUIPOS.

El Consorcio San Vicente cuenta con una bomba de exclusividad para el proyecto, la cual, se adquiere en condición de compra, el equipo en mención es una bomba estacionaria de concreto de marca Putzmeister de gran capacidad de bombeo, adicional se cuenta con un incremento del 50% del equipo de formaleta y armadura de entrepiso del sistema STEM llegando a 1.800 m2. Se adquiere una grúa auto desplegable MIDI 16/20 y un brazo para colocación de concreto, este complementa la bomba de concreto su nombre Placing boom BHD 18R3.

Ilustración 17. Bomba estacionaria

Ilustración 18 sistema de encofrado STEM

Ilustración 19. Grúa auto desplegable

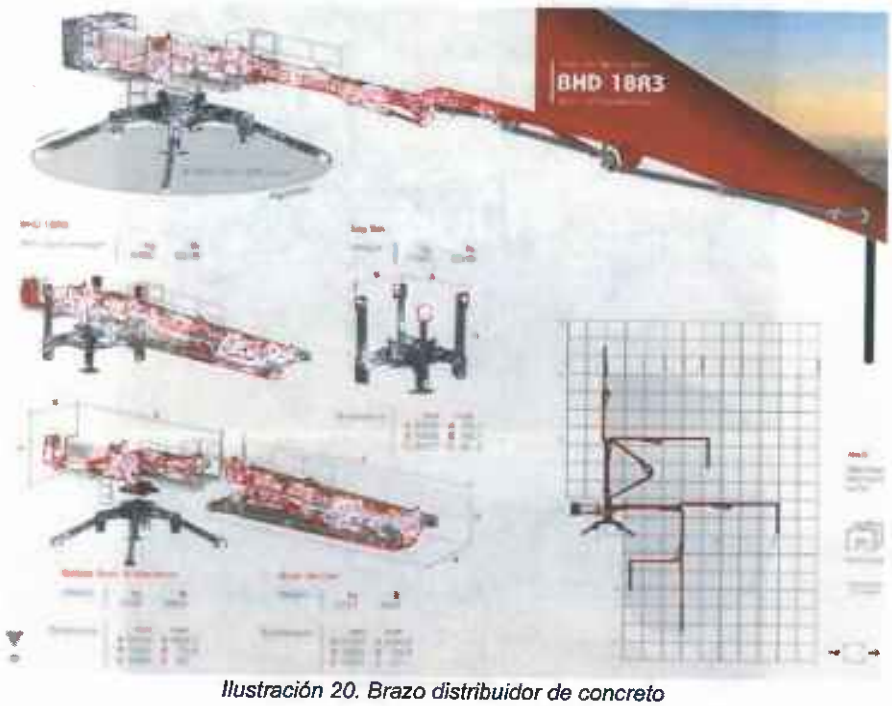

Ilustración 20. Brazo distribuidor de concreto

Los equipos se mantienen dispuestos para el momento en el que haya actividades del lote B, una vez se hayan realizado las definiciones (alcance, ajustes de diseño y lineamientos técnicos) de PTAR y Central de Gases Medicinales.

1.4.6 ARQUITECTURA Y ACABADOS

Como es de conocimiento de todas las partes interesadas, el balance general de obra y el acta de mayores y menores, incluyendo los ítems no previstos (N.P.), se viene desarrollando de manera exhaustiva desde el mes de septiembre. Durante este periodo, el Consorcio San Vicente ha presentado de manera reiterada diversas versiones del documento, incorporando los ajustes solicitados por la interventoría y atendiendo cada una de las observaciones técnicas formuladas.

En el marco de este proceso se han efectuado revisiones detalladas de las memorias de cálculo, verificación de cantidades de obra, análisis técnico de los ítems no previstos y elaboración de sus respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), actividades que se han desarrollado con el objetivo de garantizar la correcta estructuración del balance contractual y la viabilidad técnica de las soluciones constructivas requeridas para la culminación del proyecto. Así mismo, las cantidades han sido ajustadas y soportadas

con sus respectivas sustentaciones técnicas y verificaciones en campo, coincidiendo entre las partes en la necesidad de incorporar determinados ítems no previstos para asegurar la correcta ejecución de las actividades.

No obstante, lo anterior, a la fecha el acta de mayores, menores e ítems no previstos no ha sido aprobada, situación que genera afectaciones directas en la continuidad y programación de las actividades de obra.

En consecuencia, el estado actual del proyecto refleja las limitaciones operativas derivadas de esta falta de aprobación, evidenciándose principalmente en la imposibilidad de iniciar varias actividades correspondientes a la fase de acabados, aun cuando diferentes áreas del proyecto ya se encuentran técnicamente habilitadas para su ejecución. Entre dichas actividades se encuentra, la ejecución de mampostería liviana, estucos sobre mampostería tradicional, la instalación de enchapes en zonas húmedas, la instalación de acabados de pisos generales y demás trabajos asociados a la etapa de terminación de la obra.

Adicionalmente, la indefinición presupuestal derivada de la no aprobación del acta impide adelantar los procesos de adquisición de materiales, los cuales dependen directamente de la validación de las cantidades definitivas y de la inclusión formal de los ítems no previstos requeridos para la ejecución de estas actividades. Es importante señalar que los procesos de suministro de materiales contemplan etapas de cotización, gestión de órdenes de compra, fabricación por parte de proveedores, alistamiento y despacho, las cuales requieren tiempos específicos de gestión que deben ser programados con la debida anticipación para no afectar la continuidad del proyecto.

Como resultado de lo anterior, la programación general de obra se encuentra actualmente condicionada, generando restricciones en el avance de las actividades subsecuentes y afectando la secuencia constructiva prevista para el desarrollo de las etapas finales del proyecto.

En este sentido, se deja constancia en el presente informe que la no aprobación del acta de mayores, menores e ítems no previstos constituye a la fecha un factor determinante que limita el avance normal de la obra, con las consecuentes implicaciones sobre la

programación, la logística de suministros y el desarrollo oportuno de las actividades pendientes para la culminación del proyecto.

1.5 CONTROL DE CALIDAD Y OBRA

1.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de concreto son fundamentales para garantizar que el material cumpla con las normativas y especificaciones técnicas establecidas en los proyectos de construcción. Estos ensayos permiten verificar la resistencia, durabilidad y calidad del concreto, asegurando que las propiedades mecánicas y físicas del material sean las adecuadas para soportar las cargas y condiciones a las que estará expuesto.

La realización de estos ensayos en fases clave del proceso de producción y durante la ejecución de la obra contribuye a la confiabilidad y seguridad de la infraestructura construida, minimizando riesgos y optimizando el rendimiento del concreto en su aplicación práctica.

Anexo 2. Reporte de ensayos.

1.5.2 BITACORA DE OBRA

El proyecto cuenta con una bitácora de obra en la cual se registra a diario de manera conjunta Contratista e Interventoría del proyecto, las novedades, avances y dificultades que se presentaron en el presente periodo para la ejecución de las actividades relacionadas con la cimentación, estructura, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y afines, así como aquellas relacionadas con la mampostería y obra gris el cual ha sido conforme con el desarrollo diario del proyecto.

Anexo 3. Bitácora de obra

1.5.3 PROGRAMACION DE OBRA

El proyecto cuenta con una programación de obra elaborada bajo la plataforma Microsoft Project, dicha programación se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y contempla las actividades previstas, los plazos de ejecución, los hitos principales y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Este documento o programación fue ajustado este año y el mismo ha sido presentado y revisado por el equipo técnico de la firma interventora y la supervisión. La nueva reprogramación entregada, que se denomina 3. DIAGRAMA DE RED PERT-CPM v1 LCR AJUSTADO CON FECHAS ENERO 2025, desde el mes de enero de 2025 viene siendo implementada por la Interventoría una vez fue avalado y aprobado este documento por la Entidad, el cual es utilizado como una herramienta guía para el seguimiento y control del avance físico de la obra, el mismo que puede ser nuevamente ajustado en función de nuevas consideraciones o eventualidades detectadas, analizadas y advertidas por el Contratista, la Interventoría y la ESE, las que de igual manera deben ser debidamente justificadas y aprobadas por la interventoría o entidad contratante dentro del marco contractual.

Anexo 4. Programación de obra

1.6 GESTION ADMINISTRATIVA

1.6.1 CORRESPONDENCIA

Los correos establecidos como oficiales para la emisión de comunicados son, por la interventoría interconstructoresconsorcio@gmail.com, así mismo se confirma que el correo para la recepción de comunicados por parte del Consorcio San Vicente es consorciosanvicente2024@gmail.com, que corresponde al correo oficial implementado por el Consorcio San Vicente.

1.6.2 REUNIONES TÉCNICAS Y DE SEGUIMIENTO

1.6.2.1 COMITÉS TÉCNICOS DE OBRA

Durante el presente periodo no se realizaron reuniones formales de comité de obra, en razón a que la prioridad de las partes se ha concentrado en la revisión, ajuste y consolidación del acta de mayores, menores e inclusión de ítems no previstos. En este contexto, durante el periodo se desarrollaron diversas mesas técnicas de trabajo entre el Consorcio San Vicente y la interventoría, orientadas a la verificación y validación de los soportes técnicos, administrativos y presupuestales que conforman el acta en sus diferentes componentes y especialidades.

Estas mesas de trabajo han permitido realizar un proceso detallado de revisión de memorias de cálculo, ajuste de cantidades de obra, verificación técnica de los ítems no previstos y validación de los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), así como la revisión integral del balance general del contrato. Como resultado de este proceso de concertación y análisis técnico, el documento ha alcanzado un nivel de maduración técnica y administrativa que permite su próxima formalización y suscripción por parte de las instancias correspondientes.

De igual manera, la estructuración y consolidación del acta se ha desarrollado en estricto cumplimiento de los lineamientos y parámetros establecidos por la interventoría y por el Sistema General de Regalías, garantizando la trazabilidad de la información, la debida sustentación técnica de los ajustes planteados y la consistencia presupuestal del balance contractual.

Así mismo, durante el periodo se llevaron a cabo mesas de trabajo y jornadas de revisión técnica en las instalaciones de Regalías en la ciudad de Neiva, con el propósito de socializar los avances del documento, validar los soportes presentados y continuar con el proceso de revisión interinstitucional requerido para su aprobación.

Durante los días 23, 24 y 25 de febrero de 2026 se llevaron a cabo mesas de trabajo técnicas entre el Consorcio San Vicente, la interventoría y las entidades de apoyo institucional, con el propósito de realizar la revisión técnica del balance de mayores y menores incluidos ítems no previstos (NPS) requeridos para la adecuada continuidad del proyecto.

Las sesiones estuvieron orientadas a revisar de manera detallada cada uno de los componentes del balance, verificando memorias de cantidades, análisis de precios unitarios (APU), especificaciones técnicas y coherencia documental, garantizando que los ajustes propuestos se encuentren debidamente sustentados desde el punto de vista técnico y presupuestal.

MESA DE TRABAJO – ARQUITECTURA, OBRA GRIS Y EXTERIORES
23 de febrero de 2026

Durante estas sesiones se realizó la revisión integral del componente de arquitectura, obra gris y exteriores, donde se analizó la sábana de cantidades del balance, se verificaron las memorias de cálculo y los APUs asociados a los ítems no previstos así mismo se discutió la necesidad de estos.

Como resultado de la revisión se identificaron los siguientes aspectos a ajustar:

Ítem 11.5.5: – Acabado de escaleras:
Se debe corregir la memoria y ajustar las cantidades para la escalera central, esta escalera deberá tener acabado en enchape. A diferencia de las escaleras de servicio que por su condición se empleara el acabado de concreto pulido.

Capítulo 14 y 18 – Puertas
Se evidenció un error en la unidad de medida inicialmente planteada. En consecuencia, y previa consulta con el consultor original del proyecto, se acordó eliminar las actividades inicialmente contempladas y formular nuevos APUs acordes con la correcta unidad de medida y alcance técnico.

MESA DE TRABAJO – INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALIDADES
Fecha: 24 de febrero de 2026

En esta jornada se revisaron las instalaciones eléctricas y especialidades, iniciando con una socialización general del proyecto a cargo del director de Interventoría, Arquitecto Juan Camilo Gil, quien explicó la estructura del proyecto y sus fases de ejecución. Posteriormente, el consultor externo, representado por los ingenieros Yesid Zuain y Fabián Morales, expuso los criterios técnicos aplicados para el ajuste del diseño eléctrico conforme a la actualización normativa RETIE 2024.

Durante la revisión técnica se establecieron las siguientes observaciones:

- Ajuste y mayor detalle en las memorias de cantidades.

- Elaboración de cuadros comparativos de precios para los ítems no previstos, soportados con mínimo tres (3) cotizaciones.

- Ajuste de la especificación y costos asociados al sistema de apantallamiento, particularmente en las bajantes en aluminio.

- Revisión del porcentaje de desperdicio de materiales, limitándolo estrictamente a lo técnicamente justificable.

- Verificación de los rendimientos de mano de obra asociados a los ítems de estructura de media tensión.

- Revisión de los valores presupuestales de las cajas de inspección.

- Ajuste en la descripción técnica del cable 3x12 en los APUs.

MESA DE TRABAJO – INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y GASES MEDICINALES
Fecha: 25 de febrero de 2026

La sesión inició con la participación del Ingeniero Roberto Castañeda, especialista hidráulico designado por el Ministerio de Salud, quien asistió en representación de la Gobernación para la revisión técnica del componente hidrosanitario. Evidenciándose el estado actual de la obra:
La estructura del edificio asistencial de siete niveles se encuentra completamente finalizada, incluyendo la losa de cubierta.

- Existen avances significativos en fachadas, mampostería interna y pañetes.

- Se registra progreso en redes eléctricas, sanitarias, voz y datos, bandejas de cableado y red contra incendios.

- El componente hidrosanitario presenta un avance considerable en su ejecución.

Revisión del capítulo hidrosanitario

Durante la revisión del capítulo de Instalaciones Hidrosanitarias y Gas, el contratista explicó que los ajustes presentados no corresponden a modificaciones del diseño

aprobado, sino a ajustes derivados de interferencias entre especialidades detectadas durante la ejecución de obra.

Estas interferencias se originan principalmente por la falta de coordinación entre disciplinas en la etapa de diseño, lo cual ha obligado a realizar desvíos en las tuberías para evitar elementos estructurales, ductos de ventilación o bandejas eléctricas.

Estos cambios han generado:

- Incremento en el número de accesorios (codos, uniones, tees, etc.)
- Ajustes en la longitud de tramos de tubería
- Modificación en algunos recorridos de las redes
- Observaciones técnicas

Entre los principales ajustes acordados se encuentran:

- Corrección de unidades de medida en ítems de tubería (metros lineales vs unidades).
- Inclusión de atraques faltantes en tubería C-900 de la red contra incendios.
- Ajuste en el ítem de lavado de tanques, aplicando desinfección únicamente a los tanques de agua potable.
- Redacción más precisa del ítem de montaje de fluxómetro para orinal.
- Actualización de los planos oficiales para incluir el trazado de la nueva tubería de desagüe de autoclaves en CPVC Corzan.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO DE GASES MEDICINALES

En relación con el capítulo de gases medicinales, se estableció que el especialista del Ministerio de Salud no tenía competencia directa sobre dicha especialidad.

Sin embargo, se informó que el aval técnico ya había sido otorgado por el área de salud del hospital, con el acompañamiento de la asesora externa Dra. Claudia Marcela Cabrera.

En consecuencia, se acordó:

- Dar por revisado el capítulo de gases medicinales.

- Realizar únicamente una verificación presupuestal por parte de la interventoría para garantizar la coherencia de los valores en el consolidado final.

COMPROMISOS

Como resultado de las mesas de trabajo se establecieron los siguientes compromisos a cargo del Consorcio San Vicente:

- Entregar acta actualizada del balance de mayores, menores e ítems no previstos.

- Presentar memorias de cantidades ajustadas, incorporando todas las observaciones realizadas durante las mesas técnicas.

- Entregar APUs de los ítems no previstos, soportados con mínimo tres cotizaciones por ítem.

CONCLUSIONES

- Las mesas de trabajo desarrolladas permitieron avanzar en la revisión técnica del balance de mayores, menores e inclusión de ítems no previstos, garantizando que los ajustes propuestos se encuentren debidamente sustentados desde el punto de vista técnico, constructivo y presupuestal.

- El proceso de revisión interinstitucional permitió identificar ajustes menores en las memorias, especificaciones y unidades de medida, así como validar técnicamente la necesidad de los cambios derivados de las interferencias detectadas durante la ejecución de obra.

- En términos generales, las sesiones permitieron consolidar un mayor nivel de madurez técnica del documento del balance, condición necesaria para continuar con el proceso de revisión final y eventual aprobación por parte de las entidades competentes. Sin embargo, a la fecha no se ha establecido una versión definitiva del balance del proyecto.

Anexo 5. Acta de mesa técnica.

Ilustración 21. Mesa de trabajo técnica para revisión de balance de mayores, menores y NPS.

1.6.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

El Consorcio San Vicente cuenta con las pólizas de seguro emitidas por la compañía EQUIDAD SEGUROS identificada bajo el Nit N°860.028.415, las cuales para el presente periodo se encuentran vigentes y sin afectaciones o requerimientos.

Tabla 3. Pólizas

POLIZAS / COBERTURAS	No POLIZA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	AB001298	19/03/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB001301	19/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO		19/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES		19/09/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA		19/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		19/09/2031

Anexo 6. Pólizas de garantía

1.6.4 EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADOS EN EL PERIODO

Para el presente periodo el Consorcio San Vicente dispuso de los equipos y personal listados a continuación.

Tabla 4. Equipos y herramientas

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	UND	CANTIDAD
VOLQUETA SENCILLA	UND	1
BOMBA ESTACIONARIA PARA CONCRETO	UND	1
TORRE GRUA	UND	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	2
RETROCARGADOR JCB	UND	1
APISONADOR TIPO CANGURO	UND	1
VIBRADOR PARA CONCRETO	UND	6
SIERRAS CIRCULARES PARA MADERA	UND	6
ROTOMARTILLOS	UND	3
AMOLADORAS ANGULARES	UND	5
SIERRA DE BANCO (TRONZADORA)	UND	1
COMPRESOR NEUMATICO	UND	0
EQUIPO DE ENCOFRADO (FORMALETAS)	M2	1800
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES (CERTIFICADOS)	SEC	36
MOTOBOMBA 2"	UND	1
MOTOBOMBA 4"	UND	1
BOMBA EYECTORA 2"	UND	2
ALLANADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO)	UND	1
BRAZO HIDRULICO DISTRIBUIDOR DE CONCRETO	UND	1

Tabla 5. Personal que laboro durante el periodo

PERSONAL / CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	3
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1
RESIDENTE DE ACTAS	1
PROFESIONAL SST	2

INSPECTOR DE OBRA	1
TECNICO SST	2
ALMACENISTA	1
TOPOGRAFO	1
MAESTRO DE OBRA (EJERO)	1
OFICIALES	41
AYUDANTES	35
PLOMEROS	9
ELECTRICOS	4
MAMPOSTEROS	21
OPERADORES MAQUINARIA	2
CONDUCTORES VOLQUETAS	1

2 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión social que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 6. Marco normativo SST

Ley 9/ 1979	Código Sanitario Nacional de Colombia Título III y otros Obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
Ley 100/1993	Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. Regula los regímenes de salud (EPS), pensiones (público/privado), riesgos laborales (ARL) y servicios sociales.
Decreto Ley 1295/1994	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
Ley 1616/13	Ley de salud mental.
Decreto Ley 1562/2012	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SST.
Decreto 1072/ 2015	Decreto único reglamentario del sector trabajo.
Resolución 2400/79	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolución 2013/86	Comité paritario de salud ocupacional.
Resolución 2346 de 2007	Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y valoraciones complementarias.
Resolución 2646 de 2008	Reglamenta la evaluación de riesgo psicosocial
Resolución 1918 de 2009	Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 3461 de 2025	Establece lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
Resolución 0312/19:	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para todas las empresas, de acuerdo con el nivel de riesgo y números de trabajadores
Resolución 0491 de 2020	Trabajo en espacios confinados
Resolución 4272 de 2021	Trabajo en alturas
Resolución 773 de 2021	Sistema Globalmente Armonizado
Resolución 2764 de 2022	Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.
Ley 2365 de 2024	Adopta medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral.
Ley 2466 de 2025	Modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia.
Decreto 0728 de 2025	Prevención de problemas mentales y consumo de sustancias en el trabajo, que deben integrarse al SG-SST y ejecutarse en coordinación con las ARL.
Resolución 908 de 2025	Establece los requisitos y el procedimiento para la expedición, renovación y cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución 3461 de 2025	Lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, atendiendo la declaración de emergencia sanitaria por fiebre amarilla según la resolución 00691 del 16 de abril de 2025, se realizó limpieza semanal de fosos de ascensores, eliminación de aguas estancadas y control de vectores como mosquitos y zancudos mediante fumigación información disponible en el numeral 3 correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el periodo.

Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales

2.2 BASE DE DATOS SST PERSONAL

Dado cumplimiento a la información solicitada por el cliente, el CONSORCIO SAN VICENTE lleva a cabo el registro de la base de datos SST del 100% del personal en obra con fecha de 28 de febrero del 2026. En el presente periodo se presentaron:

- ✓ 2 ingresos de CCG Montaje Técnico SAS
- ✓ 4 ingresos de DyM Plomería y Redes Contra Incendios SAS
- ✓ 1 ingreso de Instalaciones hidrosanitarias HB
- ✓ 4 ingresos de JDV Ingeniería y construcciones SAS
- ✓ 2 ingresos de Ventanas y cristales

2.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 7. Personal Administrativo CSV

NOMBRE	CARGO
JOSE ARNULFO SALCEDO	RESIDENTE DE INSTALACIONES
DANNA CAROLINA VALDERRAMA ROMERO	RESIDENTE SST/AMB
JAMES YOEL MONTIEL CAPERA	INSPECTOR DE OBRA CIVIL
RIGOBERTO TAVERA	RESIDENTE INSPECTOR OBRA
NAYDALY GALINDO GALINDO	RESIDENTE SST
FABIO OCHOA MOLINA	ALMACENISTA
CLAUDIA PATRICIA OVALLE	RESIDENTE
ALEXIS CARTAGENA	INSPECTOR SST
CRISTIAN FELIPE SANCHEZ ALMARIO	INSPECTOR OBRA
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ CAMACHO	RESIDENTE DE ACTAS
EDWARD ARMANDO TORRES	INSPECTOR SST
MARIA DANIELA TORRES	RESIDENTE SST

2.2.2 PERSONAL OPERATIVO DIRECTO CONSORCIO SAN VICENTE

Tabla 8. Personal Operativo CSV

NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
JESUS ORLANDO ORDOÑEZ CARLOSAMA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
ANDRES FELIPE LOPEZ SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	2/07/2024	
JORGE IVAN MURILLO MANJARREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
LUIS ARIEL GUERRERO LOZANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	19/07/2024	08/02/2026
WISTON JOSE BOHORQUEZ VITAL	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
JHONATANT MEDINA POLO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
FERNANDO MURCIA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	23/10/2024	
WILINTON MUÑOZ ARTUNDUAGA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DIEGO FELIPE RINCON MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDWIN LEONARDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
EDWIN ALEXANDER DEVIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	7/01/2025	

FERNANDO SANCHEZ VERA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
GERMAIN INOJOSA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/11/2024	
DIDIER CAMPOS ARDILA	OFICIAL HERRERO	7/01/2025	
NIDA LUCERO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
DEIBI ALEJANDRO PASCUAS BERMEO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	7/01/2025	
EDILBER SALGADO GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDY ANDRES MURCIA CERQUERA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	12/12/2024	
FREDDY COLLAZOS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	13/01/2025	
JUAN CARLOS PENNA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/01/2025	
NENCER ARTUNDUAGA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIAN ANDRES SALGADO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
LUIS ERNESTO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/02/2025	
JULIO CESAR AYALA	OFICIAL HERRERO	03/02/2025	
FRANCISCO PRADA RAMOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	03/02/2025	
DIEGO ARMANDO SIERRA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	04/02/2025	
MAURICIO MANRIQUE MEDINA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/02/2025	
MEDARDO ANDRES SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	11/02/2025	
DAIMER ALEXIS MUÑOZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
JHANER MURCIA GALINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	20/02/2025	
LUIS PARMENIDES HURTADO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
WILLIAM ALEXANDER GUERRERO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
JOINER STIVEN GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
LUIS FERNANDO PARRA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	3/03/2025	
ADOLFO NAGLES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	14/03/2025	
JACKSON BORJA MOSQUERA	OFICIAL HERRERO	20/03/2025	
ALBERTO MAHECHA BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
LEONARDO SAENZ PIMENTEL	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/04/2025	
ARGEMIRO RAYO URRIAGO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	22/04/2025	
JOSE ALBEIRO CORDOBA	OFICIAL HERRERO	25/04/2025	
CARLOS MARIO DE AVILA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	06/05/2025	
HELMER ARLEY PASTRANA	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	19/05/2025	
JORGE ANDRES NUÑEZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	9/06/2025	
JAIME GONZALEZ TRUJILLO	OPERADOR	12/06/2025	
MEDARDO VALENZUELA PERDOMO	APAREJADOR	07/07/2025	
ELVER ADOLFO BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA CIVIL	16/07/2025	
JAIME CHAVARRO RAMOS	OFICIAL DE OBRA	5/08/2025	28/02/2026
DIEGO ALEJANDRO PEDROZA PERDOMO	OFICIAL	20/08/2025	
CHRISTIAN DAVID NAVAS ROJAS	AYUDANTE	25/08/2025	

ANDERSON URRIAGO SERRATE	AYUDANTE	25/08/2025	
JESUS ANDRES OSORIO	OFICIAL	18/09/2025	
WILSON MIGUEL PARRA	AYUDANTE	18/09/2025	
YEFFERSON LOPEZ GOMEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
RAFAEL DIONISIO FERNANDEZ	AYUDANTE	1/10/2025	
MIGUEL ARTURO RIOS MONJE	OFICIAL	1/10/2025	
MARLON FELIPE OLAYA PIAMBA	OFICIAL	1/10/2025	
WILINTON MUÑOZ RUIZ	AYUDANTE	1/10/2025	
JOSE ILIER ORDOÑEZ GAITAN	AYUDANTE	15/10/2025	
CRISTIAN CAMILO MAYA CORTES	AYUDANTE	24/10/2025	
EDUARD IGNACIO TRUJILLO	AYUDANTE	24/10/2025	
KEVIN MIGUEL ORTIZ TELLEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
CRISTIAN CAMILO CHAVARRO GRILLO	AYUDANTE	4/11/2025	28/02/2026
JOSE RICARDO RODRIGUEZ GARCIA	AYUDANTE	4/11/2025	
GIOVANNY DEVIA MUÑOZ	AYUDANTE	4/11/2025	
JOHAN SEBASTIAN FRAGUA RODRIGUEZ	AYUDANTE	4/11/2025	
EDINSON ANDRES SIERRA RAMOS	AYUDANTE	4/11/2025	
WILLIAM ANDREY MOLANO	AYUDANTE	4/11/2025	
PABLO ANDRES POLO POLO	AYUDANTE	18/11/2025	

2.2.3 PERSONAL CASETÓN

Tabla 9. Personal Icoconstruccion

NOMBRE	CARGO
ERNESLEY LIZCANO	OFICIAL
DIEGO ANDRES MORALES	AUXILIAR
FELIX ANDRES TRIVIÑO	AUXILIAR
DUVAN ANDRES HURTADO	AUXILIAR
JEFFERSON GONZALEZ	AUXILIAR

2.2.4 PERSONAL HIDROSANITARIAS

Tabla 10. Personal Hidrosanitario

NOMBRE	CARGO
ALEJANDRA PIZO RIVERA	PROFESIONAL SST
CARLOS EDUARDO BELTRAN	OFICIAL PLOMERIA
JHON ALEXANDER FONSECA ROMERO	AYUDANTE DE PLOMERIA
LUIS NIGRINIS MATTA	OFICIAL PLOMERIA
RODOLFO JAVIER LEIVA	SUPERVISOR DE OBRA
JUAN DIEGO SANCHEZ PERDOMO	AYUDANTE PLOMERIA
MIGUEL ANTONIO ESPITIA	OFICIAL PLOMERIA
PABLO CESAR PALENCIA	OFICIAL PLOMERIA

JOSE LUIS CUBILLOS	AYUDANTE PLOMERIA
JULIAN ANDRES HERNANDEZ	AYUDANTE PLOMERIA
ANDER SMITH ALVARADO	AYUDANTE PLOMERIA
URIEL QUIZA ORDOÑEZ	OFICIAL PLOMERIA

2.2.5 PERSONAL ELÉCTRICO

Tabla 11. Personal YM Seguridad, control y diseño

NOMBRE	CARGO
OMAR JAVIER RODRIGUEZ	OFICIAL ELECTRICO
NELSON ROJAS GARZON	AUXILIAR ELECTRICO
FREDY FIERRO MEDINA	AUXILIAR ELECTRICO
DIEGO FERNANDO TORRENTE	AUXILIAR ELECTRICO
LUIS MIGUEL SOTO MENESES	AUXILIAR ELECTRICO

2.2.6 PERSONAL TOPOGRAFÍA

Tabla 12. Personal Topografia

NOMBRE	CARGO
SEGUNDO ANDRADE ANDRADE	TOPOGRAFO

2.2.7 PERSONAL MAMPOSTERÍA #1.

Tabla 13. Tabla Personal Mamposteria #1

NOMBRE	CARGO
ALEXANDER LEON	CONTRATISTA
ROBI SMITH LEON	SUPERVISOR DE OBRA
ANA SOFIA PEREZ	AUX ADMINISTRATIVA
EDWIN ALVEIRO MOLINA	OFICIAL MAMPOSTERO
JEAN CARLOS CARRASCAL	AYUDANTE MAMPOSTERO
ALEX DAVID OLAYA	AYUDANTE MAMPOSTERO
CARLOS JULIO PIÑACUE	AYUDANTE MAMPOSTERO
CRISTIAN FELIPE FERRO	AYUDANTE MAMPOSTERO
FRANCISCO GUTIERREZ MAYORGA	OFICIAL MAMPOSTERO
JORGE ELIECER PAEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
JOSE DILFREDO CUMBE	AYUDANTE MAMPOSTERO
JUAN SEBASTIAN RUIZ	AYUDANTE MAMPOSTERO
VICTOR DAMIR MORENO	OFICIAL MAMPOSTERO
EDWIN RIVAS TAMAYO	PAÑETADOR
ARMANDO ELIZALDE	OFICIAL MAMPOSTERO
JAIDER JAIMES FERRER	PAÑETADOR
JORGE DANEY MELO	PAÑETADOR
YERSON FERNEY NARVAEZ	OFICIAL MAMPOSTERO
JAVIER ELPIDIO MENDOZA	OFICIAL MAMPOSTERO
LUIS VILLAMIZAR ALBARRACIN	PAÑETADOR
LEANDRO ANAYA RAMIREZ	PAÑETADOR
HELI GUTIERREZ MAYORGA	PAÑETADOR
SANTIAGO SOCHE CHAVARRO	AYUDANTE MAMPOSTERO

2.2.8 PERSONAL AIRES ACONDICIONADOS

Tabla 14. Tabla Personal Aires Acondicionados.

NOMBRE	CARGO
EDDINSON STIVEN ORJUELA	CONTRATISTA
AMADEO ORJUELA	SUPERVISOR
OSCAR DE JESUS AGUIRRE	TECNICO DE MONTAJE
EDINSON SILVINO AMAYA	TECNICO DE MONTAJE
PABLO CESAR BERANO	TECNICO DE MONTAJE
FELIX CHAVERRA	AUXILIAR DE MONTAJE
MARCO LOMBANA	TECNICO DE MONTAJE
JUAN STIVEN JIMENEZ	AUXILIAR DE MONTAJE
ALVARO ERNESTO RINCON	OFICIAL DE CORTE

2.3 SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN DEL PERSONAL

Dando cumplimento a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 1409 de 2012, CONSORCIO SAN VICENTE realiza las respectivas afiliaciones y evaluaciones médicas ocupacionales, remitiendo a interventoría de la siguiente manera por trabajador:

- Cédula de ciudadanía
- Afiliaciones EPS, AFP, ARL y CCF.
- Exámenes médicos de ingreso
- Exámenes médicos de egreso (cuando aplique)

Resaltar que cuando un colaborador renuncia o es retirado del Consorcio San Vicente, se realiza su respectivo trámite a exámenes de egreso y paz y salvo.

En el periodo se realiza examen médico periódico al personal que corresponda.
Anexo 8. Soportes afiliaciones y retiros

Tabla 15. Cumplimiento EMO ingresos

INDICADOR	CUMPLIMIENTO EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO
Indicador de Calificación	(No. evaluación médica ocupacional realizados /No. evaluación médica ocupacionales programados) X 100%
	(13/13) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador cumple, se realizaron trece (13) evaluaciones médicas ocupacionales al personal que ingresó a Consorcio San Vicente.

De igual manera, mensualmente se realiza el pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal directo y la respectiva validación de los pagos realizados por el mismo concepto de los proveedores.
Anexo 9. Soporte pagos de seguridad social

2.4 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del cronograma de actividades del CONSORCIO SAN VICENTE se realizaron charlas y capacitaciones. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 10. Capacitaciones y charlas de seguridad

Tabla 16. Capacitaciones y charlas

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD			
TEMA	**FECHA**	**CANTIDAD DE PARTICIPANTES**	**DURACIÓN**
Seguridad vial fuera de obra	02-02-2026	62	15 minutos
Prohibido el uso de accesorios en obra	03-02-2026	61	10 minutos
Prohibido el uso de celular en obra	04-02-2026	51	15 minutos
Uso adecuado y limpieza de EPP	05-02-2026	67	10 minutos
Manejo seguro de RESPEL	06-02-2026	66	15 minutos
Recomendaciones de orden, aseo y señalización	07-02-2026	75	10 minutos
Socialización política SST	09-02-2026	63	10 minutos
Señalización y limitación del área de trabajo	10-02-2026	62	15 minutos
Socialización Comunicado Prohibición del uso del celular	11-02-2026	61	15 minutos
Autocuidado en las actividades diarias	12-02-2026	65	15 minutos
Riesgos en el trabajo por lluvias	13-02-2026	65	10 minutos
Uso adecuado de andamios (armado)	14-02-2026	57	15 minutos
Funciones del Comité de Convivencia Laboral COCOLAB	16-02-2026	50	15 minutos
Comunicación sobre mi estado de salud	17-02-2026	53	15 minutos
Responsabilidades a todos los niveles de la organización en el SG-SST/ Objetivos SG SST	19-02-2026	62	10 minutos
Cuidado de la gripe en el trabajo	20-02-2026	61	15 minutos
Capacitación: Prevención de la obesidad y el sobrepeso	20-02-2026	65	45 minutos
Uso correcto de las pulidoras	21-02-2026	64	5 minutos
Prevención de lesiones de espalda y movimientos repetitivos	23-02-2026	62	6 minutos
Respeto a los animales de obra	24-02-2026	63	15 minutos
Manejo de sustancias y almacenamiento adecuado	25-02-2026	64	10 minutos
Fatiga en el trabajo, sobreesfuerzo del cuerpo	26-02-2026	63	15 minutos
Capacitación: Izaje de cargas	26-02-2026	12	60 minutos
Riesgo público: Seguridad Vial	27-02-2026	63	20 minutos
Hábitos para fortalecer los pulmones	28-02-2026	57	15 minutos

Tabla 17 Cumplimiento charlas y capacitaciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE SEGURIDAD
Indicador de Calificación	(No. Charlas de seguridad ejecutadas /No. Charlas de seguridad programadas) X 100%
	(25/25) *100%= 100%
Análisis	En el periodo el indicador se cumple 100% se realizaron veinticinco (25) capacitaciones y charlas de seguridad a los trabajadores de obra que laboran en el Consorcio San Vicente.

2.5 COMITÉS DE APOYO AL SG-SST

CONSORCIO SAN VICENTE garantizando y promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene conformado y activo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLAB); para este periodo se cumple con la realización de la reunión mensual de los comités el día 20/02/2026.

También se presenta informe trimestral del Comité de convivencia laboral en los meses de marzo, junio y septiembre; e informe anual de la gestión del Comité de convivencia laboral.

Anexo 11. Comités de apoyo

2.6 RECOMENDACIONES DE SALUD

CONSORCIO SAN VICENTE ha realizado las respectivas recomendaciones de salud de acuerdo con los resultados arrojados de las valoraciones médicas ocupacionales de ingreso y periódicos presentados, como también las recomendaciones médicas por eventos de accidentes de trabajo y eventos de origen común. Así mismo, se viene realizando el seguimiento a estas condiciones y recomendaciones a fin de buscar la mejora continua en la salud de nuestros colaboradores.

Anexo 12. Recomendaciones médicas

2.7 INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES

El proceso de inducción y reinducción tiene por finalidad dar a conocer las características de interacción que el colaborador tendrá con la organización y el proyecto para el cual se le está contratando, se busca dar a conocer el panorama de los riesgos a los cuales está expuesto con las respectivas medidas de control. Adicionalmente, se busca familiarizar al nuevo trabajador con los diferentes procesos que rigen dentro de la organización, desde el reglamento interno de trabajo, procedimientos y programas. **Ver Registro fotográfico**

Anexo 13. Inducción y reinducción

Tabla 18. Inducciones

INDICADOR	CUMPLIMIENTO INDUCCION AL TRABAJADOR
Indicador de Calificación	(No. Trabajadores que ingresaron /No. De Inducciones ejecutadas) X 100%
	(13/13) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se realizaron trece (13) inducciones correspondientes al personal que ingresó a laborar a Consorcio San Vicente.

2.8 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, en el periodo se realizó la entrega de dotación y elementos de protección individual de primera vez y de reposición. Ver Registro fotográfico

Anexo 14. Entrega de dotación y EPI

Tabla 19. Cumplimiento EPI

INDICADOR	CUMPLIMIENTO ENTREGA DE EPI
Indicador de Calificación	(No. de Kit de EPI entregados/ No. de trabajadores operativos del periodo) X 100%
	(80/80) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS
Indicador de Calificación	(No. de kit para trabajos en alturas disponibles/ No. de kit para trabajos en alturas programados) X 100%
	(48/48) *100%= 100%
Análisis	En este periodo el indicador cumple 100%.

2.9 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE mantiene la señalización y demarcación en los lugares de trabajo, como una de las medidas para prevenir los diferentes factores de riesgos asociados a las actividades y con el fin de garantizar la realización de los trabajos en forma segura. **Ver Registro fotográfico**

Tabla 20. Cumplimiento kit señalización SST

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT SEÑALIZACIÓN SST
Indicador de Calificación	(No. de kit señalización SST instalados/ No. de kit señalización SST programados) X 100%
	(32/32) *100%= 100%
Análisis	Durante este periodo se realizó la instalación de treinta y dos (32) kits de señalización y demarcación SST en donde se estipulan medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo.

2.10 INSPECCIONES A INSTALACIONES, MÁQUINAS O EQUIPOS

En el periodo el CONSORCIO SAN VICENTE realizó inspecciones preoperacionales a los equipos, máquinas, herramientas, como también a los equipos contra caídas y de emergencias, con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades y prevenir los accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

Anexo 15. Inspecciones

2.11 AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Consorcio San Vicente cuenta con servicios sanitarios para campamento y obra. De igual manera, se realiza la respectiva disposición de residuos, en los puntos de acopio que se encuentran en obra. Además, el agua potable es suministrada por el proveedor AQUAFRESH DEL HUILA SAS, quien cumple con la normatividad y requisitos legales

Tabla 21. Relación agua potable

PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Del 05 al 19 de enero	Botellón 20 L	26 unds
Del 20 al 30 de enero	Botellón 20 L	35 unds

2.12 GESTIÓN EN EMERGENCIAS

CONSORCIO SAN VICENTE en el presente periodo, realiza inspección de equipos y elementos disponibles para la atención de emergencias, información que se relaciona en el **Anexo 15. Inspecciones.**

Tabla 22. Cumplimiento Kit de emergencias

INDICADOR	CUMPLIMIENTO KIT DE EMERGENCIAS
Indicador de Calificación	(No. de kit de emergencias instalados/No. de kit de emergencias programados) X 100%
	(5/5) *100%= 100%
Análisis	En el periodo se cuenta con cinco (5) kit de emergencias, uno (1) en campamento y cuatro (4) en obra con el fin de atender las emergencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del proyecto.

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN SST, ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Del periodo se presentan los Indicadores de desempeño del Sistema de Gestión SST según el Decreto 1072 de 2015 y los indicadores propuestos por la Resolución 0312/19 artículo 30, los anteriores con el fin de verificar objetivamente, el avance o cumplimiento en la gestión SST y comportamiento de la accidentalidad y ausentismo, como también comparar el resultado obtenido con un nivel de referencia preestablecido. La verificación para este periodo no señala desviación sobre la cual se pueden implementar acciones

correctivas o preventivas para asegurar que se alcancen los resultados y metas propuestas.

En el periodo se presentaron cero (0) accidentes de trabajo no graves ni mortal, es de resaltar que CONSORCIO SAN VICENTE realiza el respectivo reporte mediante el formato único de reporte de presunto accidente de trabajo - FURAT a la ARL dentro de las 48 horas ocurrido el evento. De igual manera, realiza la debida caracterización, investigación, mejora y cierre la cual irá en este apartado del informe.

Tabla 23. Personal con incapacidad por AT

INCAPACIDADES POR ATEL			
Número AT Periodo	0	Total días de Incapacidad por AT	0
Nombres y Apellidos del trabajador		Cargo	Días de incapacidad del periodo

Anexo 16. Indicadores y reporte de accidentes

2.14 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y TAREAS DE ALTO RIESGO

En el presente periodo se realizaron actividades de alto riesgo correspondiente a trabajos en alturas, y trabajos de excavación manual y con maquinaria. En el presente informe se anexan en el **Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS**

Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS.

2.15 PRÁCTICAS PARA GARANTIZAR TRABAJO SEGURO

En el presente periodo se continúan realizando los controles y filtros en obra con el fin de identificar casos sospechosos, para enviar a prueba de alcoholimetría. Ver **Anexo 17. Permisos de trabajo y ATS. Ver Registro Fotográfico.**

2.16 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

El CONSORCIO SAN VICENTE realiza la detección, documentación, verificación de plan y cierre de acciones preventivas, correctivas y de mejora, con el fin de asegurar la eficacia del sistema de gestión SST y prevenir la recurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como para optimizar continuamente las condiciones de trabajo.

Anexo 18. Informe Acciones del periodo

2.17 INFORME CONTRATISTAS/ PROVEEDORES

Para el presente periodo se presentan informes de las actividades ejecutadas de las actividades de instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, HVAC, RCI y mampostería, que incluye capacitación y charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo, entre elementos de protección personal y dotación.

Anexo 19. Informe de contratista

2.18 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el desarrollo y fomento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los trabajadores en el periodo se llevó a cabo actividad de charla de seguridad. **Anexo 10. Capacitaciones y charlas de seguridad.** Ver **Anexo 7. Cumplimiento Requisitos Legales** y **Ver Registro fotográfico.**

2.19 ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

En desarrollo de las actividades del PMT en el proceso constructivo en el periodo se llevaron a cabo actividades como señalización, control de tráfico y cierre temporal de vías. **Ver Registro fotográfico**

2.20 AUTORIZACIONES CIERRES PARCIALES Y TEMPORALES DE VÍA

El Consorcio San Vicente cuenta con el permiso generado por la Alcaldía de Garzón específicamente por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para cierres parciales y temporales de la carrera 14, calle 6 y 7 con el fin de recepción y descargar materiales para obra.

Anexo 20. Solicitud cierres temporales PMT

2.21 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO SAN VICENTE en el propósito de cumplir sus obligaciones realiza despliegue para en el periodo atender las siguientes actividades:

2.21.1 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN PARA PQR

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, en el periodo se dispuso de personal en campamento para atención a la comunidad y también se realizó la apertura de los buzones instalados y creados para recibir, gestionar la PQRS por parte del Consorcio San Vicente así:

Acta de apertura de buzón físico y correo electrónico No. 016 del 27/02/2026.
Anexo 21. Acta Apertura Buzón PQRS

2.21.2 ACOMPAÑAMIENTO A VISITANTES

En la ejecución de las actividades del contrato es rutinario la atención de visitantes y recorridos de obra con las partes interesadas como son el Cliente representado por el Gerente, junta directiva del Hospital y Supervisión del contrato por parte del hospital, Veeduría ciudadana, delegados del Ministerio de Salud, autoridades del orden Departamental y delegados de la gobernación, Alcaldía, diputados y concejales, como también entes de control como Contraloría Departamental. Adicionalmente se recibieron visitas por parte de la ARL Sura, profesional ambiental y SST del Hospital Departamental San Vicente de Paul, como también periodistas y camarógrafos de los medios de comunicación local. **Ver registro fotográfico**

A todos los anteriores y con el objetivo de mantener nuestros estándares de seguridad se les socializan las recomendaciones de seguridad antes de ingresar a la zona de obra (Patio A y Patio B) las cuales básicamente son:

-Diligenciamiento de registro de visitantes

-Uso obligatorio de casco, calzado cerrado y en lo posible que sea calzado de seguridad.

-Cumplir las normas de seguridad: Mantenerse en grupo, atender la señalización, estar atento a las superficies de circulación y vecindades, usar solo el sendero peatonal y desplazarse únicamente por los lugares que el área SST le indique.

2.22 ACTIVIDADES DE BIENESTAR A LOS TRABAJADORES

En el presente periodo, se realizan actividades de bienestar a los trabajadores como es la celebración de los cumpleaños del mes. **Ver Registro fotográfico.**

2.23 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Con el fin de dejar registro de las actividades de forma ilustrativa se adjunta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.
Anexo 22. Registro fotográfico SST

3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

En este capítulo se realiza descripción del marco jurídico y normativo aplicable al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN".

3.1.1 MARCO NORMATIVO

El país cuenta con una amplia normatividad (normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes), que aplican para las actividades que integran la Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión Social.

A continuación, se realiza una descripción de la normatividad aplicable de acuerdo con los componentes del área o recursos del medio ambiente que posiblemente se intervienen durante la ejecución del proyecto:

Tabla 24. Marco legal gestión ambiental

NORMAS GENERALES	Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional.
	Ley 99 de 1993: Artículo 3 y 52 Relacionado con Desarrollo sostenible y Licencias Ambientales.
	Decreto 1220 de 2005: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.
	Decreto 500 de 2006: Reglamentación Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambientales.

	Constitución política del 1991: • Art 8: Impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales. • Art 58:" La propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica". • Art 63: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables." • Art 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano". • Art 80: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. • Art 95: Es deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente. • Art 209: Función administrativa con principios de igualdad, moralidad eficacia etc. • Art 332: El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos náurales no renovables.
	Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente.
	Decreto 1076 del 2015: Por el Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
	Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo facultades al presidente de la Republica para expedir el Código de los Recursos Naturales.

NORMAS REGLAMENTARIAS	Resolución 2202 de 2005: Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo, Territorial, adopción formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales. Resolución 541 de 1994, Manejo de Residuos de Construcción y Demolición. Decreto 4741 de 2005, Manejo de Residuos Peligrosos.
	Ley 633 de 2000: Gestión de permisos requeridos para el proyecto
AIRE	Resolución 610 de 2010 del MADS: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 601 del 2006 del MADS: Norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
	Resolución 627 de 2006 del MADS: Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
	Resolución 415 de 1998 del MADS: Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
	Decreto 1697 de 1997: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
	Resolución 909 de 1996 del MADS: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 sobre niveles permisibles de emisión de contaminantes de fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición y se adoptan otras disposiciones.
SUELO	Ley 388 de 1997, Art. 33. Ordenamiento territorial. Usos del suelo.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
AGUA	Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua.
	Ley 99 de 1993, Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas.
	Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua.

	Decreto 1594 de 1984. Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 4728 de 2010: Modifica parcialmente el Decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 1979 y capítulo II del título VI parte III Libro II del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
	Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.
	Ley 142 de 1994: Regímenes de servicios públicos domiciliarios y otras disposiciones.
RESIDUOS SÓLIDOS	Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.
	Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta, entre otras, la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos
	Decreto 838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
	Resolución 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
	Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
	Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

	Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
	Resolución 472 del 2017: Donde ser reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y Demolición (RCD), normativa que derogo expresamente el Decreto 541 de 1994, y en su lugar, contemplo la nueva regulación sobre el tema.
FAUNA	Resolución 383 del 2010. Especies silvestres que se encuentran amenazadas en Colombia.
	Decreto Ley 2811 de 1974 Parte IX. Protección y conservación de fauna silvestre.
	Resolución 2078 de 2009. Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la conservación, tenencia, uso y aprovechamiento de la fauna silvestre
	Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
FLORA	Ley 1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.
	Decreto 2811 de 1974 parte VII. Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.
	Ley 299 de 1996: Protección de la Flora colombiana
	Certificado de Incentivo Forestal – CIF; Se crea el Certificado de Incentivo Forestal y se dictan otras disposiciones.
PAISAJE	Decreto 1715 de 1978: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS	Decreto 763 de 2009: Se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por Ley 1185 de 2008 respecto al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.

	Ley 134 de 1994: Norma sobre mecanismos de participación ciudadana.
	Decreto 330 de 2007: Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.
	Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
	Decreto 1277 de 1996. Zonas de reservas campesinas.
	Ley 70 de 1993. Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras.
	Ley 472 de 1998: Desarrollo artículo 88 de la Constitución Política, relacionado con acciones populares y de Grupos
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
	Ley 1152 de 2007.Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se dictan otras disposiciones
	Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamenta el Ordenamiento territorial rural y las licencias urbanísticas.
	Decreto 879 de 1998. Artículo 11. Reglamentación de planes de ordenamiento territorial.
	Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial
RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. Ley de Infraestructura vial.
	Ley 1228 del 16 de Julio de 2008. Se trata de hacer controles sobre los retiros de las fajas públicas.
	Decreto 48 de 2001. Planificación Ambiental Regional

	Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derramen de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.
	Decreto 1319 de 1994. Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84.
	Ley 99 de 1993: artículos 1, 5, 7, 9 y 12. Crea la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de desastres.
	Ley 46 de 1988. Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias
	Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional
	Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo. Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo
ARQUEOLOGIA	Circular ICANH 2009. Obligatoriedad de efectuar intervenciones arqueológicas en las obras civiles. Obligatoriedad, para los entes territoriales, de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos o actividades de investigación, protección, valoración y divulgación del patrimonio arqueológico
	Decreto reglamentario 763 de 2009. Reglamenta la 1185. Se crea el sistema nacional de información cultural y se define de manera explícita la obligatoriedad de investigaciones arqueológicas y el registro e inventario de colecciones arqueológicas. Uno de los principios de la ley y su decreto reglamentario es que un bien de interés cultural, en este caso arqueológico, no requiere declaratoria previa. Igualmente, está por encima de los planes de ordenamiento territorial.
	Ley 1185 de 2008. Modifica varios artículos de la 397 al igual que da facultades a secretarías de gobierno, curadurías y secretarías de cultura para exigir el componente arqueológico en las obras que lo requieran.

3.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.2.1 INFORME AMBIENTAL

Se realiza entrega del informe ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2026, con el fin de dar cumplimiento a todos los aspectos ambientales.

3.2.2 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

En este periodo hemos cumplido con la documentación ambiental contractual, como oficios radicados a entes con los cuales se requiera algún trámite, información de canteras e información del gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y gestores de residuos ordinarios.

3.2.3 PERMISOS AMBIENTALES

En la ejecución de este periodo no se requiere adelantar permisos ambientales ya que no se va a realizar intervenciones que se requiera hacer tramites en cuanto a aprovechamiento forestales, ocupaciones de cauces, permisos de emisiones atmosféricas ni permiso de vertimientos.

3.2.4 OTROS PARÁMETROS RELEVANTES E INHERENTES AL PROYECTO

No aplican otros parámetros para este periodo de ejecución del contrato.

3.3 SEGUIMIENTO A FICHAS AMBIENTALES

En el presente periodo se garantiza el seguimiento y cumplimiento a las fichas ambientales establecidas en el PMA. Los indicadores se presentan de manera semestral.

3.4 MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

3.4.1 PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS

Para el presente periodo se utilizaron materiales pétreos para las diferentes actividades constructivas.

3.4.1.1 CONTROL DE MATERIAL EN OBRA

Tabla 25. Relación de materiales e insumos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
EDS Gasoil	ACPM	350.551 galones
Depósito de maderas Juan Pablo II	Tabla 25 x 2 x 3	50 unidades

Tabla 26. Relación de materiales pétreos

PROVEEDOR	MATERIAL	CANTIDADES
DF Construcciones y servicios SAS	Arenilla	112 m3
Masseq	Triturado	40 toneladas

Para dar cumplimiento y seguimiento a la ficha ambiental manejo de materiales e insumos establecido en el PMA se adjunta las remisiones emitidas por el proveedor del material ingresado en obra.

Anexo 23.Control de material

3.4.2 ACOPIO DE MATERIALES E INSUMOS – ALMACÉN

Dentro de la obra, se cuenta con un sitio definido como almacén, para acopiar insumos y materiales de obra, este espacio cuenta con señalización, orden y aseo.

3.4.3 MEZCLA DE CONCRETO

La mezcla para el concreto a la hora de la preparación se realiza sobre áreas que no contaminen el recurso suelo. Es de aclarar, que en la preparación de concreto se hace en obra tomando todas las medidas necesarias para evitar generar un impacto significativo.

3.5 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.5.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante el presente informe, se lleva un control en caso de uso, en cuanto al uso de sustancias químicas como cemento, ACPM, pegante PVC, desmoldante, gasolina, sellador para juntas de mampostería, entre otros.

Con respecto a la manipulación, los empleados usan los elementos de protección personal adecuados con el fin de minimizar los riesgos a los cuales se pueden ver

expuestos al utilizar dicha sustancia química lo cual a futuro pueda ocasionar enfermedades laborales. Además, se está implementando el Sistema Global Armonizado (SGA) por cada sustancia que ingresa a obra, dichas sustancias contarán con Ficha de seguridad y etiqueta donde se evidencia toda la información de esta sustancia.

Tabla 27. Sustancias químicas usadas

SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS	
CEMENTO	Cemento de altas resistencias tempranas para la elaboración de concreto y morteros para fines estructurales. Ideal para elaborar prefabricados. Cumple con los requisitos de la NTC 121 y lo establecido en la NSR (Norma Sismo Resistente Colombiana).
ACPM	Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N° 2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel. Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo, puede estar coloreado para identificación.
GASOLINA	El combustible es un material que, cuando es quemado tiene la capacidad de producir calor, luz o energía. Cuando esto sucede, alcanza un estado potencial utilizable ya sea de forma directa o indirecta produciendo residuos de calor.
PEGANTE PVC	Es generalmente una disolución de disolventes que lo que hacen es fundir y soldar químicamente las tuberías. Este material se caracteriza por su alta resistencia a los químicos y al calor, además de su gran ligereza.
DESMOLDANTE PARA FORMALETA	Agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal, madera y plástico. Se fabrica a partir de productos que generan una película que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado.

EPOTOC 1	Es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) que se utiliza para adherir concreto nuevo a concreto endurecido o para reparaciones estructurales. Es de baja sensibilidad a la humedad y 100% sólido, lo que lo hace ideal para aplicaciones en construcción.
TOXEMENT 1A IMPERMEABILIZANTE	Es un líquido color amarillo, a base de sellantes orgánicos, e inorgánicos utilizado como impermeabilizante para hormigón y mortero.
DURAL 452 GEL	Adhesivo epóxico de dos componentes, 100% sólido, de alto módulo, diseñado para aplicaciones de unión estructural que requieren un material que no se descuelgue o deslice.
ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJES	Adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Ha sido específicamente diseñado para proveer una alta resistencia para uso en condiciones secas, húmedas e inundadas en numerosos materiales de base. Es apropiado para resistir cargas medianas y altas, tanto estáticas, como de viento o sísmicas en tensión y cortante en aplicaciones estructurales y no estructurales.
LIMPIADOR PVC	Producto químico diseñado para limpiar y preparar superficies de cloruro de polivinilo (PVC) antes de aplicar adhesivos o selladores.
ESMALTE AMARILLO	Es un tipo de pintura que se utiliza para dar un acabado brillante y protector a diversas superficies.
CURASEAL ANTISOL	Solución coloidal, disponible en rojo, blanco o transparente, que se utiliza para el curado, sellado y endurecimiento de concreto y mortero
ENDURECEDOR PARA PISOS	Formulación a base de partículas metálicas con granulometría controlada, aglomerantes y plastificantes que proporcionan un excelente blindaje con características metálicas a las superficies expuestas a tráfico intenso, abrasión, impacto y altas cargas.

MORTERO ACRILICO	Material transpirable y de alta resistencia compuesto de resinas acrílicas y pigmentos.
ET-3G	Se utiliza para anclar varillas roscadas y barras de refuerzo en concreto y mampostería, siendo ideal para aplicaciones generales, incluso en condiciones secas o húmedas y en concreto agrietado o no agrietado.

3.6 ACOPIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y SEÑALIZACION

En este periodo se continua el uso del acopio de bolsas de cemento en bolsas para mantenerlas acopladas correctamente y poder realizar su respectivo retiro, el acopio del combustible se mantiene en isotanque, estos acopios cuentan con lo siguiente:

- Cubierto, con ventilación e iluminación.
- Señalización de acceso restringido solo personal autorizado
- Pictogramas

Se implementará el Sistema Global Armonizado según el Decreto 1496 del 2018 que se basa en el etiquetado y clasificación de los productos químicos considerados peligrosos, cada sustancia acopiada cuenta con su ficha de seguridad y cuentan con etiquetas para las sustancias químicas utilizadas dichas etiquetas contienen la siguiente información.

- Palabra de aviso. La palabra de aviso indica el nivel de peligro.
- Símbolos **GHS** (Pictogramas de peligro).
- Información del fabricante.
- Indicaciones de precaución/Primeros auxilios.
- Indicaciones de peligro.
- Nombre del producto o identificadores.

Anexo 24. Inspección acopio y consumo combustible

3.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

3.7.1 RECOLECCIÓN EN OBRA Y CLASIFICACIÓN

En el presente periodo, en obra se cuenta con tres puntos ecológicos conformados por 3 canecas de color blanco, verde y negra lo cual facilitan el adecuado uso y disposición de residuos por parte de los trabajadores y todo el personal operativo que encuentra al

interior de la obra. Así mismo, se acopian los residuos ordinarios en un lugar optimo donde se encuentre cubierto, con ventilación, iluminación y señalización.

El gestor encargado de la recolección, transporte y disposición final de los residuos ordinarios y orgánicos es a través de la empresa INTER ASEO, los días de recolección son los martes, jueves y sábados a las 7:00 a.m.

Constantemente en obra se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza desarrolladas por un personal de obra. Entre estas labores se tienen recolección de residuos de obra, barridos de zonas, organización de bodega-almacén y mantenimiento de los puntos ecológicos.

3.7.2 ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza el acopio dentro de las mismas canecas plásticas separadas de acuerdo con el código de colores según la Resolución 2184 de 2019 verde, blanco y negro. Así mismo, se destinó un sitio de acopio temporal de residuos.

3.7.3 DISPOSICIÓN Y GESTOR DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realiza la gestión ante INTER ASEO, encargados de la recolección, transporte y disposición final de los residuos.

3.8 MANEJO DE RCD

3.8.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El sitio definido para la disposición final de los escombros es el sitio ubicado en la Vereda sector Huacanas, municipio de Garzón identificado con matrícula inmobiliaria No. 202-71163.

3.8.2 CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

En el presente periodo se dispuso 63 m3 de RCD. Residuos que fueron depositados y dispuestos en el sitio definido por la empresa y mencionado en el anterior ítem.

Estas disposiciones fueron realizadas por Consorcio San Vicente y el proveedor de volquetas DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 901359095-1.
Cabe resaltar que la salida de volquetas en obra siempre es carpada con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

3.8.3 REPORTE MENSUAL DE RCD

En este periodo se realizó disposición final de RCD lo cual se generaron reportes mensuales de sobrantes, dichos residuos fueron dispuestos en el sitio establecido y autorizado.

Tabla 28. Retiro RCD

FECHA	SALIDA DE MATERIAL	PLACA VOLQUETA	M3	VIAJES	TOTAL, M3
6/02/2026	ESCOMBROS	ABL-519	7	1	7
12/02/2026	ESCOMBROS	ABL-519	7	1	7
12/02/2026	ESCOMBROS	ABL-519	7	1	7
17/02/2026	ESCOMBROS	XMC-971	7	1	7
17/02/2026	ESCOMBROS	XMC-971	7	1	7
19/02/2026	ESCOMBROS	OWH-742	7	1	7
19/02/2026	ESCOMBROS	OWH-742	7	1	7
27/02/2026	ESCOMBROS	OWH-742	7	1	7
27/02/2026	ESCOMBROS	OWH-742	7	1	7

En la siguiente tabla, se relaciona de manera trimestral el reporte de disposición final de RCD generados en el 2026.

Tabla 29. Reporte RCD 2025

PERIODO	SALIDA DE MATERIAL	TOTAL, M3
Enero - Feb	Escombros	135

3.8.4 CLASIFICACIÓN ACOPIO Y PROTECCIÓN

Durante el presente periodo, se realizó la clasificación de los residuos de escombro, chatarra y madera. De igual manera acopio de acero y cemento.

3.8.5 REUTILIZACIÓN DE RCD

Con respecto a este ítem para este periodo no se reutilizo ningún material en obra ya que todo los RCD generados en obra fueron dispuestos en sitio.
Anexo 25. Control de material RCD

3.8.6 TRANSPORTE

Durante este periodo se realizó cargue y/o transporte de RCD, dichos sobrantes fueron transportados por las siguientes volquetas.

Tabla 30. Vehículos retiro RCD

PLACA	M3
OWH-742	28
XMC-971	28
ABL-519	7

3.9 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

3.9.1 CLASIFICACIÓN Y ACOPIO

Durante el presente periodo del informe, se realizó manejo de material contaminado realizando su adecuado embalaje, señalizado y almacenando de tal forma que no genere impacto ambiental mientras se realiza entrega para su disposición final.

3.9.2 DISPOSICIÓN FINAL

Durante el presente periodo, se radicó a la interventoría el certificado de disposición final de los residuos entregados a Serviambiental correspondientes al mes de enero.

Los restos de madera, cartón y plástico generados y acopiados en obra fueron donados a personas, quienes manifestaron su interés en reutilizarlo, quedando constancia de dicha entrega.
Anexo 26 Acta de entrega.

3.10 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

3.10.1 CERRAMIENTO DE OBRA

El frente de obra cuenta con cerramiento fijo perimetral, en la parte posterior o de acceso de obra se encuentra construido en zinc con su puerta metálica para garantizar un óptimo encerramiento que impida el ingreso de personal no autorizado.

3.10.2 CUBRIMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD

Se cuenta con un sitio de acopio y almacenamiento para el material pétreo que llegue a obra. Se realiza cubrimiento del material con plástico negro de alto calibre al terminar la jornada laboral con el fin de minimizar los riesgos por las emisiones de partículas al ambiente y polución.

3.10.3 HUMECTACIÓN DE SUPERFICIES

Durante el presente periodo, se realizaron las labores de humectación de superficies mediante riego controlado, aplicadas principalmente en actividades como el barrido de placas, con el fin de minimizar la emisión de polvo y mantener las condiciones adecuadas de limpieza. Estas acciones se ejecutan bajo criterios de uso eficiente del recurso hídrico, evitando el desperdicio de agua y en coherencia con las campañas internas de ahorro y consumo responsable.

3.10.4 CORTE DE LADRILLOS, TABLETAS Y ADOQUINES

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de corte de ladrillo bajo condiciones controladas, aplicando humectación previa del material con el propósito de minimizar la generación y dispersión de material particulado. Asimismo, se adecuó un área específica para el corte, cubierta con poli sombra, que actúa como barrera física para evitar la propagación de polvo hacia otras zonas de trabajo. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando la prevención de impactos al entorno y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

3.10.5 VÍAS DE ACCESO

En este periodo, las vías de acceso a la obra Hospital Departamental San Vicente de Paúl se mantienen en óptimas condiciones, libres de acumulación o dispersión de material particulado. Al finalizar cada jornada o actividad que implique movimiento de materiales o tránsito de vehículos, se realizan barridos y limpieza preventiva en las vías

de acceso, con el fin de remover el material particulado o residuos sueltos generados durante las labores. Estas acciones contribuyen al control ambiental del área de influencia, asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza

3.10.6 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para este periodo ingresa al frente de obra volquetas para realizar trasiego de material; toda maquinaria y vehículo en obra se les realiza revisión documental, esto con el fin de verificar que cuenta con SOAT, Tecno mecánica y Licencia vigente. Y así, autorizar su ingreso.

Tabla 31. Volquetas entrada y movimiento de material

PLACA	LINEA	MODELO
XMC-971	KODIAK-157	2009
WHA-003	SIN LINEA	1946
ABL-519	KODIAK 157	2006
SWK-353	KODIAK 7500	2007

Tabla 32. Relación maquinaria en obra

CLASE	LINEA	MODELO
BOMBA ESTACIONARIA	PUTZMEISTER	BSA 1004
TORRE GRUA MOVIL	-	ACRS13-L
PLANTA ELECTRICA	-	P-100
TORRE GRUA	-	CM4810

3.11 MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

3.11.1 SUMIDEROS

En la zona aledaña a la obra, no se encuentran sumideros. No existen cuerpos de agua que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.2 MANTENIMIENTOS SUMIDEROS

Se aclara que en la obra Hospital departamental San Vicente de Paul, no se evidencian sumideros cercanos a la ejecución de la obra, dicho lo anterior, no se realizó ningún inventario y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento de estos.

3.11.3 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

La obra cuenta con el servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Empresas Públicas de Garzón – EMPUGAR.

Tabla 33 Relación consumo de agua

Factura No.	Código interno	Consumo m3
3586711	00185097	51

En el presente periodo, la obra cuenta con cinco sanitarios para hombres y dos sanitarios para mujeres. De igual manera, cuenta con lavamanos y orinal múltiple.

Anexo 27. Control aseo de baños

3.11.4 SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE VOLQUETAS Y MAQUINARIA

Cuando se requiere, se implementan acciones de control para prevenir la dispersión de material particulado y el derrame de residuos en las vías de acceso. A las volquetas se les realiza el lavado de llantas mediante riego controlado, evitando el arrastre de material hacia el exterior de la obra. Asimismo, cuando hay ingreso de mixers se efectúa en un área acondicionada con dique de contención, lo que permite retener los residuos sólidos y evitar vertimientos directos sobre el suelo. Los residuos generados durante estas actividades son recolectados y trasladados a las áreas de acopio temporal, donde se almacenan de manera segura para su posterior disposición final.

3.11.5 ACOPIOS DE MATERIALES

Se mantiene en obra varios sitios destinados para el almacenamiento de material garantizando que no generen contaminación alguna ya sea al suelo o fuentes hídricas.

3.11.6 CUERPOS DE AGUA

No aplica, debido a que no se encuentran cuerpos de agua, cercanos al frente de obra a intervenir, que sean susceptibles de sufrir contaminación por las actividades propias de construcción.

3.11.7 CONTROL DE VECTORES

Se realiza limpieza de las áreas propensas a acumulación de agua y proliferación de vectores, principalmente en los fosos de los ascensores ubicados en el sótano del Lote A. Estas labores incluyen, la inspección visual de posibles criaderos, la remoción de residuos, el desagüe cada vez que es necesario o se intensifican las lluvias.

Anexo 28. Control de plagas y roedores

3.12 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

3.12.1 INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA

En las instalaciones de la obra se encuentra publicada la matriz de impactos ambientales y la matriz de compatibilidad química.

Ilustración 22. Publicaciones ambientales

3.13 CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el mes de enero, se llevó a cabo la siguientes charlas y capacitaciones:

Tabla 34. Relación de temas ambientales

No.	Tema	Fecha	Duración
1	Manejo seguro de RESPEL	06/02/2026	15 min
2	Recomendaciones de orden, aseo y señalización	07/02/2026	10 min
3	Clasificación y manejo de residuos	11/02/2026	10 min
4	Orden y aseo	18/02/2026	15 min

Anexo 29. Registro de charlas

3.14 ORDEN Y ASEO

3.14.1 JORNADAS DE ASEO

Durante el periodo del presente informe, Consorcio San Vicente ha reforzado las actividades de orden y aseo en todos los frentes de obra.

Ilustración 23. Orden y aseo

Anexo 30. Inspección de orden y aseo

3.14.2 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE OBRA

Los frentes de obra y los acopios temporales adecuados contaron con demarcación y señalización respectiva. De igual manera, constantemente se realiza mantenimiento de la demarcación de los árboles que no deben ser tocados ni manipulados en obra.

3.15 RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

3.15.1 VISITAS Y REQUERIMIENTOS

Durante el presente periodo no se recibió visita de ningún ente o autoridad ambiental.

3.15.2 RESPUESTA A OBSERVACIONES DE AUTORIDADES AMBIENTALES

No aplica para el periodo del presente informe, no se realizaron visitas o requerimientos ambientales por parte de la autoridad Ambiental.

3.16 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DEL PERIODO.

Con el fin de dejar registro de las actividades realizadas en el mes de febrero, se adjunta las evidencias en el siguiente anexo.

Anexo 31. Registro fotográfico Ambiental

4. CONCLUSIONES

- Se continuaron adelantando mesas técnicas de trabajo en conjunto con la Interventoría y el asesor hospitalario de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, verificando los diseños del proyecto.

- Se está a la espera por parte del Consorcio San Vicente la entrega de los diseños arquitectónicos y estructurales ajustados y aprobados para la implantación y ejecución de las áreas destinadas a PTAR y la Central de Gases medicinales. Así mismo la definición oficial del alcance constructivo y configuración estructural final de las edificaciones del Lote B.

- Es importante dejar constancia y resaltar de que las actividades para el sistema de gases medicinales no han sido iniciadas, debido exclusivamente a la falta de definiciones técnicas y contractuales formales, situación que no es imputable al contratista y que continúa afectando la planificación técnica, la programación del cronograma, la gestión de compras, la contratación de proveedores especializados y la coordinación con otras disciplinas del proyecto.

- Se reitero la necedad en la entrega por parte de la entidad contratante de la información técnica detallada requerida para la correcta selección, evaluación, y cotización del equipo "planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas tipo compacta" puesto que, a la fecha, no se ha recibido la documentación necesaria, lo cual imposibilita avanzar en los procesos de adquisición dentro de los plazos establecidos

- Para este frente de obra denominado lote B aún no se encuentra definida la infraestructura requerida para el paso de ductos que integrará y/o comunicará el et frente de obra con la torre asistencial de las diferentes especialidades. En la planimetría y diseños correspondientes a la Etapa 1 de construcción no se incluyen detalles estructurales ni constructivos que permitan materializar la conexión entre el Lote B y el edificio asistencial. Esta conexión resulta crítica, considerando que debe atravesar la Calle 6 e integrar, entre otros, los siguientes sistemas:

  - Red de gases medicinales.
  - Sistema de agua helada para ventilación mecánica

- La información anteriormente mencionada constituye un insumo técnico indispensable para evaluar la viabilidad constructiva, definir procedimientos de ejecución, establecer secuencias de obra y realizar la planificación de recursos, equipos y adquisiciones asociadas.

- En cumplimiento de las actividades del Plan Trabajo Anual SST en el periodo se ejecuta el 100% de las actividades programadas.

- En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, el ausentismo del periodo fue solo por incapacidad de origen común.

- En el presente periodo, se implementan medidas de prevención, control y mitigación de impactos. No se han presentado incidentes ambientales. Asimismo, se ha realizado una adecuada gestión de residuos, control de emisiones de polvo y manejo responsable de los recursos, evidenciando el compromiso del proyecto con la protección del medio ambiente y el mejoramiento continuo en sus procesos.

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO SAN VICENTE** identificado con NIT **901.785.549 -8**, es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el día 26 de enero de 2024 con la Cuenta Corriente No. 267877108, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO SAN VICENTE** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO SAN VICENTE**, hoy 26 de enero del 2024.

Cordial Saludo,

Yesenia Paola Ortiz Rodriguez
Gerente de Relación- Banca Empresas
Vicepresidencia de Empresas

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	159093953	178991903	30/03/2026

Número de Identificación
901785549

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN VICENTE

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Ciudad de Domicilio
neiva

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,317 0884254

Correo electrónico
consorciosanvicente2024@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
0

Número Contrato de Obra
090-2024

Nombre Obra
HTAL DTAL SAN VICENTE GARZON

Fecha Inicio Obra
20/03/2026

Fecha Terminación Obra
19/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
GARZON

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
608682700.00

Costo Total Mano de Obra
608682700.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1521707.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1521707.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCO DE OCCIDENTE**	**159093953**	**178991903**	**30/03/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901785549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.209.80**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,521,707.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,521,707.00	COP$ 1,521,707.00

ecollect
Seguro para ti

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 — **Actualización de oficio**

4. Número de formulario: **141043337614**

(415)7707212489364(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 5 5 4 9	8		1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: **CONSORCIO SAN VICENTE**

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: **CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO**

42. Correo electrónico: consorciosanvicente2024@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 8 8 7 1 6 8 2 6	3 1 7 0 8 8 4 2 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 2 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 16 52 55

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985 Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **141043337614**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 5 5 4 9	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 2 1 5	
81. Hasta	2 0 4 5 1 2 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **141043337614**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 7 8 5 5 4 9 | 8 — 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 13

14. Buzón electrónico

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN — 18

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2023 12 15

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní — 13

101. Número de identificación: 77116112

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: POLO

105. Segundo apellido: POLANIA

106. Primer nombre: WILLIAM

107. Otros nombres: ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL — 19

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2023 12 15

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan — 13

101. Número de identificación: 7990571 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: CASTILLO

105. Segundo apellido: FAJARDO

106. Primer nombre: TELMO

107. Otros nombres: ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141043337614

(415)7707212489984(8020) 000014104333761 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 5 5 4 9	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 3 7 3 2 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
289,663,782,473	3 3	2 0 2 3 1 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 2 0 0 2 9 8 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
CONSTRUSAR SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
289,663,782,473	3 3	2 0 2 3 1 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 7 2 6 6 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
289,663,782,473	3 3	2 0 2 3 1 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	158185794	135487449	12/03/2026

Número de Identificación
901785549

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN VICENTE

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
NEIVA (HUILA)

Dirección de Domicilio
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALER

Ciudad de Domicilio
neiva

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,317 0884254

Correo electrónico
consorciosanvicente2024@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
0

Número Contrato de Obra
090-2024

Nombre Obra
HTAL DTAL SAN VICENTE HUILA

Fecha Inicio Obra
20/03/2024

Fecha Terminación Obra
19/10/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
GARZON

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
1354599903.00

Costo Total Mano de Obra
1354599903.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
3386500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
3386500.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCO DE OCCIDENTE**	**158185794**	**135487449**	**12/03/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901785549**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **179.33.177.104**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 3,386,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 3,386,500.00	COP$ 3,386,500.00

ecollect
Seguro para ti

SAN VICENTE
CONSORCIO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yo, WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN VICENTE identificado con Nit 901.785.549-8, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Neiva el doce (12) del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social del consorcio en referencia.

Sin otro particular,

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva
Representante Legal

CRA 4 No 2-85 KM 3.2 VIA PALERMO
608-8716826
CONSORCIOSANVICENTE2024@GMAIL.COM

CONSTRUSAR S.A.
Ingeniería y Arquitectura

Nit: 892.002.985-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **GABRIEL SALOMON ALJURE SANTANA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.020.752.222 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal (S) de CONSTRUSAR S.A. identificada con Nit 892.002.985-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar

Nota 1: *Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y del ICBF y Seguridad Social en Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*

Dada en Bogotá, a los doces (12) días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

ARQ GABRIEL SALOMON ALJURE SANTANA
Representante Legal (S)
C.C. No. 1.020.752.222 de Bogotá
CONSTRUSAR S.A.
Nit. 892.002.985-5

PROTELCA
INGENIEROS · ARQUITECTOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANGELA ROJAS TAUTIVA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.158.483 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con **Nit 830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes en seguridad social de la empresa en referencia.

La presente certificación se expide a solicitud del INTERESADO en Cajicá el doce (12) del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), previa verificación por parte mía de los soportes de pago.

Sin otro particular,

LUZ ANGELA ROJAS TAUTIVA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 66489-T
C.C. 52.158.483 de Bogotá

PROTELCA
INGENIEROS · ARQUITECTOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.), en mi calidad de Contador de **PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS** con **Nit 830.037.322-8**, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad es Contribuyente de Impuesto de Renta y Complementarios, es sujeto pasivo del Impuesto de Renta para la equidad CREE, y a su vez se encuentra a PAZ Y SALVO en el periodo comprendido desde el primero (01) de marzo de 2024 a la fecha, con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016reforma estructural y el artículo 118 de la ley de financiamiento 1943 del 28 de Diciembre de 2018 en concordancia con el artículo 114-1 del E.T. que dice:

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide a solicitud del **INTERESADO** en Cajicá el doce (12) del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), previa verificación por parte mía de los soportes de pago en seguridad social de la empresa en referencia.

Sin otro particular,

INGRID MARYOLY MEDINA GARCIA
Contador
Tarjeta Profesional No. TP 211838-T
C.C. 1.069.741.313 de Fusagasugá (Cund.),

SEINGECOL
Servicio de ingeniería Colombiana S.A.S

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que **SEINGECOL SAS SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA** NIT. **900072667-5**, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar.

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal
TP-96943-T

seingecol@gmail.com
km carrera 4-28 3.2 via Palermo Neiva-Huila
Tel 8716826

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	6363063	servicioalcliente@construsar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	[illegible]	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
RIESGOS SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28202593	$1.005.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.900	0		0		0	0	0	0	268.900	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Realizado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	0	0	[illegible]			4.671	[illegible]	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	[illegible]	860007336-1	[illegible]	0	0	[illegible]	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor aprox de IGE, LMA, RTP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	268.900	268.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	[illegible]	[illegible]
CCF	1	[illegible]	268.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.005.700	[illegible]

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	6363083	[illegible] co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	2 – menos de 200 c	PRINCIPAL	PRAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VSP
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28202593	$1.005.700	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Principal	Suspensión temporal	Extranjero	Información Novedades	Pensión					Salud			Riesgos Laborales				CCF			Parafiscales				
									Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Sal+UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	ALEJO SANTIAGO ZADA LAMBE	X	X					0	0	0	0	0	0	EPS005	[illegible]	[illegible]	14-7	[illegible]	V	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785549	8	[illegible] SAN VICENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4 N° 2 85 INDUSTRIAL [illegible] 3	NEIVA-HUILA	2131545	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071202033	9497760338	E	2026/01/19	2026/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$54,494,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre			Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado ICBF e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (94 Afiliados)							[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$64,000	$100,000			$64,000	$2,000			$64,000		$0					$12,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$64,000	$100,000			$64,000	$2,000			$64,000		$0					$12,900
1	CC	[illegible]	[illegible]		23059	1	$64,000	$100,000	05001	1	$64,000	$2,000	CCF32	1	$0	0%	$0	1	$0	$0	SI	$12,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)							$1,960,348	$313,700			$1,960,348	$78,500			$1,960,348		$39,200		$0	$0		$556,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,960,348	$313,700			$1,960,348	$78,500			$1,960,348		$39,200		$0	$0		$556,000
2	CC	[illegible]	[illegible] DIEGO		23059	29	$1,960,348	$313,700	05001	29	$1,960,348	$78,500	CCF32	29	$1,960,348	2.00%	$39,200	29	$0	$0	SI	$556,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (93 Afiliados)							$183,373,52	$29,339,400			$183,373,52	$7,335,000			$171,373,52		$3,428,400		$0	$0		$55,835,900
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$4,123,848	$659,900			$4,123,848	$165,000			$4,123,848		$82,500		$0	$0		$1,277,000
3	CC	1030605072	[illegible]		23059	30	$4,123,848	$659,900	05001	30	$4,123,848	$165,000	CCF32	30	$4,123,848	2.00%	$82,500	30	$0	$0	SI	$1,277,000
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)							$4,970,561	$795,300			$4,970,561	$199,000			$4,970,561		$99,400		$0	$0		$1,539,400
4	CC	[illegible]	[illegible] ELVER		23059	30	$1,520,[illegible]	$243,[illegible]	05001	30	$1,520,[illegible]	$60,[illegible]	CCF32	30	$1,520,[illegible]	[illegible]	$30,[illegible]	30	$0	$0	SI	$471,[illegible]
5	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$1,431,[illegible]	$229,[illegible]	05001	30	$1,431,[illegible]	$57,[illegible]	CCF32	30	$1,431,[illegible]	[illegible]	$28,[illegible]	30	$0	$0	SI	$443,[illegible]
6	CC	12197113	[illegible]		23059	30	$2,019,[illegible]	$323,[illegible]	05001	30	$2,019,[illegible]	$80,[illegible]	CCF32	30	$2,019,[illegible]	[illegible]	$40,[illegible]	30	$0	$0	SI	$625,[illegible]
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (89 Afiliados)							$173,378,11	$27,740,500			$173,378,11	$6,935,000			$169,610,75		$3,392,400		$173,378,11	$11,484,800		$53,019,300
7	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$1,446,[illegible]	$231,[illegible]	05001	30	$1,446,[illegible]	$57,[illegible]	CCF32	30	$1,446,[illegible]	[illegible]	$28,[illegible]	30	$0	$0	SI	$448,[illegible]
8	CC	1075209502	[illegible]		23059	30	$1,909,[illegible]	$305,[illegible]	05001	30	$1,909,[illegible]	$76,[illegible]	CCF32	30	$1,909,[illegible]	[illegible]	$38,[illegible]	30	$0	$0	SI	$591,200
9	CC	[illegible]	[illegible]		23059	23	$1,514,[illegible]	$242,[illegible]	05001	23	$1,514,[illegible]	$60,[illegible]	CCF32	23	$1,514,[illegible]	[illegible]	$30,[illegible]	23	$1,514,[illegible]	$104,[illegible]	SI	$469,500
10	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$6,522,400	$1,043,[illegible]	05001	30	$6,522,400	$260,[illegible]	CCF32	30	$6,522,400	[illegible]	$130,[illegible]	30	$0	$0	SI	$3,084,800
11	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$2,297,[illegible]	$367,[illegible]	05001	30	$2,297,[illegible]	$91,[illegible]	CCF32	30	$2,297,[illegible]	[illegible]	$59,[illegible]	30	$0	$0	SI	$711,[illegible]
12	CC	[illegible]	[illegible]		23059	29	$1,868,[illegible]	$299,[illegible]	05001	29	$1,868,[illegible]	$74,[illegible]	CCF32	29	$1,868,[illegible]	[illegible]	$54,[illegible]	29	$1,868,[illegible]	$134,[illegible]	SI	$578,700
13	CC	[illegible]	[illegible]		23059	1	$60,667	$9,[illegible]	05001	1	$60,667	$2,[illegible]	CCF32	1	$0	0%	$0	1	$60,667	$0	SI	$9,800
14	CC	[illegible]	[illegible]		23059	23	$1,591,[illegible]	$254,[illegible]	05001	23	$1,591,[illegible]	$63,[illegible]	CCF32	23	$1,607,[illegible]	[illegible]	$32,[illegible]	23	$1,591,[illegible]	$114,[illegible]	SI	$496,700
15	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$1,918,91[illegible]	$307,[illegible]	05001	30	$1,918,91[illegible]	$76,[illegible]	CCF32	30	$1,918,91[illegible]	[illegible]	$38,[illegible]	30	$1,918,91[illegible]	$138,[illegible]	SI	$984,[illegible]
16	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$2,382,261	$381,[illegible]	05001	30	$2,382,261	$95,[illegible]	CCF32	30	$2,382,261	[illegible]	$95,[illegible]	30	$2,382,261	$171,[illegible]	SI	$737,700
17	CC	[illegible]	[illegible]		23059	27	$1,821,913	$291,[illegible]	05001	27	$1,821,913	$72,[illegible]	CCF32	27	$1,821,913	[illegible]	$36,[illegible]	27	$1,821,913	$131,[illegible]	SI	$564,300
18	CC	[illegible]	[illegible]		23059	3	$192,000	$30,[illegible]	05001	3	$192,000	$8,[illegible]	CCF32	3	$0	0%	$0	3	$192,000	$0	SI	$38,400
19	CC	[illegible]	[illegible]		23059	13	$775,[illegible]	$124,[illegible]	05001	13	$775,[illegible]	$31,[illegible]	CCF32	13	$402,[illegible]	[illegible]	$20,[illegible]	13	$775,[illegible]	$54,[illegible]	SI	$246,100
20	CC	[illegible]	[illegible]		23059	1	$60,[illegible]	$9,[illegible]	05001	1	$60,[illegible]	$2,[illegible]	CCF32	1	$0	0%	$0	1	$60,[illegible]	$0	SI	$11,000
21	CC	[illegible]	[illegible]		23059	30	$1,516,[illegible]	$242,[illegible]	05001	30	$1,516,[illegible]	$60,[illegible]	CCF32	30	$1,516,[illegible]	[illegible]	$30,[illegible]	30	$1,516,[illegible]	$106,[illegible]	SI	$469,[illegible]
22	CC	[illegible]	[illegible]		23059	26	$1,684,[illegible]	$269,[illegible]	05001	26	$1,684,[illegible]	$67,[illegible]	CCF32	26	$1,684,[illegible]	[illegible]	$67,[illegible]	26	$1,684,[illegible]	$117,[illegible]	SI	$521,700

| | | |

64	CC	1017077427	[illegible]						X								1	30	$1,986	$317		30	$1,[illegible]	[illegible]	CCF02	30	[illegible]	$79	14-7	30	[illegible]	[illegible]			SI	$615,200
65	CC	[illegible]	[illegible]		X				X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	CCF02	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	$2,028,17	6.9%	$141	30				SI	[illegible]
66	CC	1110178025	[illegible]		X				X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	CCF02	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$1,093,300
67	CC	1037067125	[illegible]						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	CCF02	30	[illegible]	$69	14-7	30	$1,7[illegible]	6.9%	[illegible]	30				SI	[illegible],300
68	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	CCF02	30	[illegible]	$81	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	[illegible]
69	CC	1075053620	[illegible]		X				X								[illegible]	28	$1,487,[illegible]	[illegible]		28	$1,487,[illegible]	[illegible]	CCF02	28	[illegible]	$99	14-7	28	$1,487,[illegible]	[illegible]	$[illegible]	28				SI	$460,600
70	CC	1075053620	[illegible]					X									[illegible]	1	$72,[illegible]	$1,[illegible]		1	$72,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				SI	$11,600
71	CC	[illegible]	[illegible]					X									[illegible]	1	$47,[illegible]	$7,[illegible]		1	$47,[illegible]	$1,[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				[illegible]	[illegible]
72	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	30	$2,207,[illegible]	[illegible]		30	$2,207,[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible],3[illegible]	14-7	30	$2,207,[illegible]	[illegible]	$[illegible]	30				SI	$683,500
73	CC	[illegible]34	[illegible]						X								[illegible]	30	$1,60[illegible]	[illegible]		30	$1,605,[illegible]	$64,[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	111,[illegible]	30				SI	$497,300
74	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	28	$1,932,[illegible]	[illegible]		28	$1,932,[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	$1,932,[illegible]	$77,[illegible]	14-7	28	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	28				[illegible]	[illegible]
75	CC	78246942	[illegible]							X							[illegible]	1	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				SI	$12,900
76	CC	[illegible]	[illegible]							X							[illegible]	1	$64,[illegible]	[illegible]		1	$64,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				SI	$10,300
77	CC	[illegible]	[illegible] JORGE						X								[illegible]	30	$1,423,[illegible]	[illegible]		30	$1,423,[illegible]	$57,[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				[illegible]	[illegible]
78	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	$8[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	[illegible]
79	CC	[illegible]	[illegible]		X				X								[illegible]	28	$1,906,78[illegible]	[illegible]		28	$1,906,[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	14-7	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28				SI	$600,100
80	CC	[illegible]	[illegible]							X							[illegible]	2	$12[illegible]	[illegible]		2	[illegible]	$5,[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	14-7	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2				SI	$25,700
81	CC	[illegible]	[illegible]		X				X								[illegible]	23	[illegible]	[illegible]		23	[illegible],489,[illegible]	$59,[illegible]	[illegible]	23	$1,580,[illegible]	[illegible]	14-7	23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23				SI	[illegible]
82	CC	[illegible]	[illegible] YEISON		X				X								[illegible]	23	$1,484,[illegible]	$237,[illegible]		23	$1,484,[illegible]	$59,[illegible]	[illegible]	23	[illegible]	[illegible]	14-7	23	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	23				SI	$463,400
83	CC	1078246078	[illegible] NEZ JORGE						X								[illegible]	30	$1,[illegible]	$245,[illegible]		30	$1,531,[illegible]	$61,[illegible]	[illegible]	30	$1,531,81	$6[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$474,400
84	CC	[illegible]	[illegible]		X				X								[illegible]	30	[illegible]	$3[illegible]	E[illegible]	30	$2,[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$2,037,41	$8[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	$141,[illegible]	30				[illegible]	[illegible]
85	CC	1081401131	[illegible]		X				X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	$8[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$626,800
86	CC	5571166	[illegible] DONEZ JESUS						X								[illegible]	30	$1,59[illegible]	$254,[illegible]	E[illegible]	30	$1,592,[illegible]	$63,[illegible]	[illegible]	30	$1,592,77	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$493,400
87	CC	2192849	[illegible]		X				X								[illegible]	30	$1,[illegible]	$239,[illegible]	E[illegible] 1	30	$1,[illegible]	$59,[illegible]	[illegible]	30	$1,496,[illegible]	$5[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				[illegible]	[illegible]
88	CC	1077847716	[illegible] KEVIN						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,512,46[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$468,300
89	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	30	$2,[illegible]	[illegible]		30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$620,500
90	CC	1019052387	[illegible]														[illegible]	30	$4,[illegible]	$720,[illegible]		30	$4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$4[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30				SI	$1,393,200
91	CC	[illegible]8	[illegible]						X								[illegible]	29	$1,457,2[illegible]	$233,[illegible]		29	$1,457,[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	$1,457,[illegible]	$[illegible]	14-7	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29				[illegible]	[illegible]
92	CC	[illegible]	[illegible]						X								[illegible]	1	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				SI	[illegible]
93	CC	1077850906	[illegible]						X								[illegible]	28	$1,[illegible]	$2[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]	$[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	$104,[illegible]	30				SI	$463,600
94	CC	1007569201	[illegible] DEIM						X								[illegible]	30	$1,644,1[illegible]	$263,[illegible]	[illegible]	30	$1,644,1[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	$114,[illegible]	30				SI	$509,200
95	CC	1077859088	[illegible]						X								[illegible]	30	$1,431,2[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,431,2[illegible]	$5[illegible]	[illegible]	30	$1,431,23[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,431,236	[illegible]	[illegible]	30				[illegible]	[illegible]
96	CC	12284218	[illegible]						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$2,[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$2,055,652	[illegible]	$143,[illegible]	30				SI	$636,700
97	CC	12200230	[illegible] PABLO		X				X								[illegible]	29	$1,399,2[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	$1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	$97,[illegible]	29				SI	$433,300
98	CC	12200230	[illegible] PABLO							X							[illegible]	1	$47,4[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$1,[illegible]	CCF02	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1				[illegible]	[illegible]
99	CC	12195690	[illegible] FRANCISCO						X								[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$2,01[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	$140,[illegible]	30				SI	$623,700
100	CC	2193229	[illegible]						X								[illegible]	30	$1,632,537	$261,[illegible]	[illegible]	30	$1,632,537	$65,4[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	$113,[illegible]	30				SI	$505,800
101	CC	[illegible]9	[illegible] ON FEDIO						X								[illegible]	30	$1,586,1[illegible]	$[illegible]	[illegible]	30	$1,[illegible]	$61,[illegible]	[illegible]	30	$1,586,1[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$1,586,11	[illegible]	$110,[illegible]	30				[illegible]	[illegible]

aportes en línea

Pla a Resumen

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	$29,574,400	$0	$0	$29,574,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$2,933,600	$0	$0	$2,933,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,501,400	$0	$0	$1,501,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	64	$19,431,700	$0	$0	$19,431,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$5,707,700	$0	$0	$5,707,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	$12,375,100	$0	$0	$12,375,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	94	$12,375,100	$0	$0	$12,375,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				94	$7,190,900	$0	$0	$7,190,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$165,000	$0	$0	$165,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	93	$7,025,900	$0	$0	$7,025,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				94	$7,264,400	$0	$0	$7,264,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$113,100	$0	$0	$113,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$254,900	$0	$0	$254,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,200	$0	$0	$80,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$81,900	$0	$0	$81,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	1	45	$3,335,000	$0	$0	$3,335,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$559,900	$0	$0	$559,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$312,100	$0	$0	$312,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$2,524,300	$0	$0	$2,524,300
TOTAL				94	$56,404,800	$0	$0	$56,404,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	16%	$1,033,200
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$6,457,329		$32,300
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$6,457,329		$32,300
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	6.96%	$449,500
9497357956	2053280655	E	2026-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9496026379	19818647	E	2025-12-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9496026379	19818647	E	2025-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,457,329	16%	$1,033,200
9496026379	19818647	E	2025-12-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$6,457,329		$32,300
9496026379	19818647	E	2025-12-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$6,457,329		$32,300
9496026379	19818647	E	2025-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496026379	19818647	E	2025-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496026379	19818647	E	2025-12-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,457,329	6.96%	$449,500
9496026379	19818647	E	2025-12-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,457,329	4%	$258,300

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 12:38.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO RC DEPORTIVO**, identificada con **NI** número **901889250**, aportó por **OTTO LOZANO TORRES** identificado(a) con **CC** número **79149080** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 11 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SALP	Cia de Seguros Bolivar S.A.	1														0		30	[illegible]	0.00000	5457,200	$0	$0	Noviembre - 2025	92314207	[illegible]	SI
CCF24	Comfamiliar Cali de Compensacion Filiar	1														0		30	[illegible]	0.04000	$290,000	$0	$0	Noviembre - 2025	92314207	12/12/2025	SI
EPS010	EPS Sura	1														0		30	[illegible]	0.04000	$290,000	$0	$0	Diciembre - 2025	92314207	[illegible]	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Enero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN DARIO GIRON CASTILLO identificado(a) con CC 74860596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30		X															$2,556,000	4%	$102,300
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															$2,556,000	16%	$409,000
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30		X															$2,556,000		$0
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30		X															$2,556,000		$0
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30		X															$0	0%	$0
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30		X															$0	0%	$0
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															$2,556,000	6.96%	$177,900
9497213471	2053290744	E	2026-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X														X	$4,721,550	4%	$188,900
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	$2,556,000	4%	$102,300
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$2,556,000	16%	$409,000
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																	$2,556,000		$0
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																	$2,556,000		$0
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	$0	0%	$0
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	$0	0%	$0
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$2,556,000	6.96%	$177,900
9495080584	1981873479	E	2025-12-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$2,556,000	4%	$102,300
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$2,556,000	4%	$102,300
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$2,556,000	16%	$409,000
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$2,556,000		$0
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$2,556,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	cet	irl	vip				
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																			$0	0%	$0
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																			$0	0%	$0
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$2,556,000	6.96%	$177,900
9493564759	1911554503	E	2025-11-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			$2,556,000	16%	$409,000
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																			$2,556,000		$0
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																			$2,556,000		$0
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																			$0	0%	$0
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																			$0	0%	$0
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			$2,556,000	6.96%	$177,900
9492112514	1821341864	E	2025-10-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																			$2,556,000	16%	$409,000
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																			$2,556,000		$0
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																			$2,556,000		$0
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																			$0	0%	$0
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																			$0	0%	$0
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																			$2,556,000	6.96%	$177,900
9490695544	1752882687	E	2025-09-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9489313821	1686634520	E	2025-08-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																			$2,556,000	4%	$102,300
9489313821	1686634520	E	2025-08-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			$2,556,000	16%	$409,000
9489313821	1686634520	E	2025-08-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																			$2,556,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9489313821	1686634526	E	2025-08-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$2,556,000		
9489313821	1686634526	E	2025-08-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489313821	1686634526	E	2025-08-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489313821	1686634526	E	2025-08-08	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9489313821	1686634526	E	2025-08-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																		$2,556,000		$0
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																		$2,556,000		$0
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																		$0	0%	$0
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																		$0	0%	$0
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9487989952	1602472581	E	2025-07-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$2,556,000		$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$2,556,000		$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9486369042	1535953725	E	2025-06-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	16%	$409,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$2,556,000		$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$2,556,000		$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9484932140	1464364368	E	2025-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9484932140	14643643[illegible]	E	2025-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9484932140	14643643[illegible]	E	2025-05-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$2,556,000		$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$2,556,000		$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9483696033	1393446793	E	2025-04-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	16%	$409,000
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	1316809365	E	2025-03-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$2,556,000		$0
9482075642	131680936[illegible]	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	131680936[illegible]	E	2025-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482075642	131680936[illegible]	E	2025-03-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	6.96%	$177,900
9482075642	131680936[illegible]	E	2025-03-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$2,556,000	4%	$102,300
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30								X										$2,556,000	4%	$102,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	16%	$409,000
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$2,556,000		$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$2,556,000		$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	6.96%	$177,900
9481390693	1250846557	E	2025-02-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$2,556,000	4%	$102,300
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-12	30																		$2,400,000		$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-12	30																		$2,400,000		$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-12	30																		$0	0%	$0
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,400,000	6.96%	$167,100
9479265041	1183715131	E	2025-01-09	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30																		$2,400,000		$0
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30																		$2,400,000		$0
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30																		$0	0%	$0
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30																		$0	0%	$0
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$2,400,000	6.96%	$167,100
9477645967	1102673040	E	2024-12-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$2,400,000	4%	$96,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9476087361	103584[illegible]547	E	2024-11-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9476087361	103584[illegible]547	E	2024-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9476087361	103584[illegible]547	E	2024-11-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																			$2,400,000		$0
9476087361	1035[illegible]547	E	2024-11-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																			$2,400,000		$0
9476087361	1035849547	E	2024-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																			$0	0%	$0
9476087361	1035849547	E	2024-11-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																			$0	0%	$0
9476087361	1035849547	E	2024-11-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9476087361	1035849547	E	2024-11-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9474057456	965070269	E	2024-10-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9474057456	965070269	E	2024-10-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9474057456	965070269	E	2024-10-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	30																			$2,400,000		$0
9474057456	965070269	E	2024-10-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	30																			$2,400,000		$0
9474057456	965070269	E	2024-10-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	30																			$0	0%	$0
9474057456	965070269	E	2024-10-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-09	30																			$0	0%	$0
9474057456	965070269	E	2024-10-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9474057456	965070269	E	2024-10-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9471651709	892972057	E	2024-09-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9471651709	892972057	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9471651709	892972057	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30																			$2,400,000		$0
9471651709	892972057	E	2024-09-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30																			$2,400,000		$0
9471651709	892972057	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30																			$0	0%	$0
9471651709	892972057	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30																			$0	0%	$0
9471651709	892972057	E	2024-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vdp			
9471651709	892972057	E	2024-09-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9470282750	827466757	E	2024-08-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9470282750	827466757	E	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9470282750	827466757	E	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$2,400,000		$0
9470282750	827466757	E	2024-08-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$2,400,000		$0
9470282750	827466757	E	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9470282750	827466757	E	2024-08-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9470282750	827466757	E	2024-08-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,400,000	6.96%	$167,100
9470282750	827466757	E	2024-08-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9468925889	761216931	E	2024-07-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9468925889	761216931	E	2024-07-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9468925889	761216931	E	2024-07-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-06	30																		$2,400,000		$0
9468925889	761216931	E	2024-07-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-06	30																		$2,400,000		$0
9468925889	761216931	E	2024-07-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-06	30																		$0	0%	$0
9468925889	761216931	E	2024-07-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-06	30																		$0	0%	$0
9468925889	761216931	E	2024-07-08	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$2,400,000	6.96%	$167,100
9468925889	761216931	E	2024-07-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9467510038	690278698	E	2024-06-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9467510038	690278698	E	2024-06-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9467510038	690278698	E	2024-06-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30																		$2,400,000		$0
9467510038	690278698	E	2024-06-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30																		$2,400,000		$0
9467510038	690278698	E	2024-06-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30																		$0	0%	$0
9467510038	690278698	E	2024-06-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30																		$0	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vst	irl	vip			
9467510038	690278698	E	2024-06-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9467510038	690278698	E	2024-06-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9465996734	624413059	E	2024-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9465996734	624413059	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9465996734	624413059	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30																			$2,400,000		$0
9465996734	624413059	E	2024-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30																			$2,400,000		$0
9465996734	624413059	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30																			$0	0%	$0
9465996734	624413059	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30																			$0	0%	$0
9465996734	624413059	E	2024-05-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9465996734	624413059	E	2024-05-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9464687034	562162531	E	2024-04-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9464687034	562162531	E	2024-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9464687034	562162531	E	2024-04-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																			$2,400,000		$0
9464687034	562162531	E	2024-04-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																			$2,400,000		$0
9464687034	562162531	E	2024-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																			$0	0%	$0
9464687034	562162531	E	2024-04-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																			$0	0%	$0
9464687034	562162531	E	2024-04-08	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9464687034	562162531	E	2024-04-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9464062750	500383739	E	2024-03-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9464062750	500383739	E	2024-03-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9464062750	500383739	E	2024-03-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-02	30																			$2,400,000		$0
9464062750	500383739	E	2024-03-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-02	30																			$2,400,000		$0
9464062750	500383739	E	2024-03-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-02	30																			$0	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9464062750	500383739	E	2024-03-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-02	30																			$0	0%	$0
9464062750	500383739	E	2024-03-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																			$2,400,000	6.96%	$167,100
9464062750	500383739	E	2024-03-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9462670308	440262537	E	2024-02-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	16	X																		$1,280,000	4%	$51,200
9462670308	440262537	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	16	X																		$1,280,000	16%	$204,800
9462670308	440262537	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	16	X																		$1,280,000		$0
9462670308	440262537	E	2024-02-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	16	X																		$1,280,000		$0
9462670308	440262537	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	16	X																		$0	0%	$0
9462670308	440262537	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	16	X																		$0	0%	$0
9462670308	440262537	E	2024-02-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	16	X																		$1,280,000	6.96%	$89,100
9462670308	440262537	E	2024-02-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	16	X																		$1,280,000	4%	$51,200

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 12:40.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	8363083	servicioalcliente@construsar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – Aportes de 200 o	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28202593	$1.005.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.900	0		0		0	0	0	0	268.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	[illegible]	[illegible]	467.900				467.900	0	0	467.900			4.579	467.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	[illegible]	[illegible]	268.900	0	0	268.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor aprox de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	268.900	268.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	467.900	467.900
CCF	1	268.900	268.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.005.700	1.005.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	6363063	servicioalcliente@construsar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	20/01/2026	28202593	$1.005.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	TAE	TDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Suspensión temporal	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario AFP/Fondo	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107037171	ALEJANDRO MAURICIO ZAPATA CARMONA	1	1																										EPS005	6.722.917	288.900	14-7	6.722.917	V	1.740	125.217	6.722.917	288.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785549	8	CONSORCIO SAN VICENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	[illegible]	CRA 4 N° 2 85 INDUSTRIAL Int 3	NEIVA-HUILA	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-02	59351401	[illegible]	I	2026/02/13	2026/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$33,120,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (82 Afiliados)							[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		$0	$0		[illegible]
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)							$2,175,900	$348,200			$2,175,900	$87,100		$2,175,900	$87,100			$2,175,900		$304,700		$0	$0		$617,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$2,175,900	$348,200			$2,175,900	$87,100		$2,175,900	$87,100			$2,175,900		$304,700		$0	$0		$617,100
1	CC	1075306851	[illegible]		30	30	$2,175,900	$348,200	30	30	$2,175,900	$87,100	30	$2,175,900	$87,100	14-7	30	$2,175,900	4.350%	$94,700	30	$0	$0	SI	$617,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (81 Afiliados)							$172,524,600	$27,604,000			$172,524,600	$6,900,900		$165,124,900	$6,609,900			$172,524,600		$11,474,200		$0	$0		$52,489,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$4,123,840	$659,900			$4,123,840	$165,000		$4,123,840	$165,000			$4,123,840		$287,100		$0	$0		$1,277,000
2	CC	030605072	[illegible]		30	30	$4,123,840	$659,900	30	30	$4,123,840	$165,000	30	$4,123,840	$165,000	14-7	30	$4,123,840	6.960%	$287,100	30	$0	$0	SI	$1,277,000
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (3 Afiliados)							$5,483,437	$877,300			$5,483,437	$207,800		$5,191,600	$207,800			$5,483,437		$361,500		$0	$0		$1,654,400
[illegible]							$1,[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		$0	$0		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]			30	25	$1,459,[illegible]	[illegible]	30	25	$1,459,[illegible]	[illegible]	30	$1,459,[illegible]	[illegible]	14-7	25	[illegible]	6.960%	[illegible]	25	$0	$0	SI	[illegible]
[illegible]						1	[illegible]	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	6.960%	[illegible]	1	$0	$0	SI	$46,700
6	CC	2197113	[illegible]		30	30	$1,981,[illegible]	[illegible]	30	30	$1,981,[illegible]	$79,[illegible]	30	$1,981,[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	6.960%	[illegible]	30	$0	$0	SI	$613,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (77 Afiliados)							$162,916,[illegible]	$26,073,200			$162,916,[illegible]	$6,368,000		$155,809,4[illegible]	$6,256,300			$162,916,[illegible]		$10,82[illegible]		$0	$0		$49,804,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]			30	30	$1,[illegible]	[illegible]	30	30	$1,[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	$1,[illegible]	[illegible]	$121,[illegible]	30	$0	$0	SI	[illegible]
8	CC	1075209502	[illegible]		30	30	$1,970,[illegible]	[illegible]	30	30	$1,970,[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	$610,400
9	CC	[illegible]	[illegible]		30	30	$6,522,[illegible]	[illegible]	30	30	$6,522,[illegible]	[illegible]	30	$6,522,[illegible]	[illegible]	14-7	30	$6,522,[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	[illegible],019,400
10	CC	192144	[illegible]		30	30	$2,190,[illegible]	[illegible]	30	30	$2,190,[illegible]	$87,600	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	[illegible]
11	CC	[illegible]	[illegible]		27	27	$1,771,814	[illegible]	27	27	$1,771,814	[illegible]	27	$1,771,814	[illegible]	14-7	27	$1,771,814	[illegible]	[illegible]	27	$0	$0	SI	[illegible]
12	CC	143959278	[illegible]		3	3	$193,[illegible]	[illegible]	3	3	$193,[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	14-7	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	$0	$0	SI	$31,[illegible]
13	CC	1080183434	[illegible]		30	30	$1,970,[illegible]	[illegible]	30	30	$1,970,[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	[illegible]
14	CC	077854755	[illegible]		30	30	$1,936,95[illegible]	[illegible]	30	30	$1,936,[illegible]	$77,[illegible]	30	$1,936,95[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	[illegible]
15	CC	[illegible]	[illegible]		25	25	$1,[illegible]	[illegible]	25	25	$1,[illegible]	[illegible]	25	[illegible]	[illegible]	14-7	25	$1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	25	$0	$0	SI	$563,400
16	CC	077858043	[illegible]		5	5	$337,39[illegible]	[illegible]	5	5	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	14-7	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	$0	$0	SI	$54,000
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30	30	$1,750,[illegible]	[illegible]	30	30	$1,750,[illegible]	[illegible]	30	$1,750,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	SI	$342,300
18	CC	12189889	[illegible]		29	29	$2,103,37[illegible]	[illegible]	29	29	$2,103,37[illegible]	$84,[illegible]	29	$2,103,37[illegible]	[illegible]	14-7	29	$2,[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	$0	$0	SI	[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]		[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-7	1	$64,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$0	$0	SI	$1[illegible]
20	CC	66694247	[illegible]		29	29	$1,692,[illegible]	[illegible]	29	29	$1,692,[illegible]	$67,[illegible]	29	$1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	SI	$524,400
21	CC	[illegible]	[illegible]		1	1	$58,[illegible]	$9,[illegible]	1	1	$58,[illegible]	$2,[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	14-7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$0	$0	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]		30	30	$1,981,[illegible]	[illegible]	30	30	$7,981,[illegible]	[illegible]	30	$1,981,[illegible]	$[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	$613,700
23	CC	[illegible]	DE AVILA [illegible]		30	30	$2,175,[illegible]	$348,[illegible]	30	30	$2,175,[illegible]	$87,[illegible]	30	$2,175,[illegible]	[illegible]	14-7	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	$0	$0	SI	$673,900

aportes en línea

Pla la Resumen

| | | |

aportes en línea

Pla la Resumen

| | | |

aportes en línea

Pla lla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	$27,957,800	$35,600	$0	$27,993,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,548,000	$3,300	$0	$2,551,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,716,500	$2,200	$0	$1,718,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$18,416,900	$23,400	$0	$18,440,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$5,276,400	$6,700	$0	$5,283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$11,570,900	$14,700	$0	$11,585,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	82	$11,570,900	$14,700	$0	$11,585,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				82	$6,696,100	$8,600	$0	$6,704,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$165,000	$300	$0	$165,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	81	$6,531,100	$8,300	$0	$6,539,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				82	$6,827,900	$9,200	$0	$6,837,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$128,900	$200	$0	$129,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$267,100	$400	$0	$267,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$87,100	$200	$0	$87,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$87,100	$200	$0	$87,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	$2,926,500	$3,800	$0	$2,930,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$510,200	$700	$0	$510,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$272,200	$400	$0	$272,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$2,548,800	$3,300	$0	$2,552,100
TOTAL				82	$53,052,700	$68,100	$0	$53,120,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499202211	35915828	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,457,329	16%	$1,033,200
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$6,457,329		$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$6,457,329		$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,457,329	6.96%	$449,500
9499202211	35915828	E	2026-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,457,329	4%	$258,300
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	16%	$1,033,200
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$6,457,329		$32,300
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$6,457,329		$32,300
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	6.96%	$449,500
9497357956	20532[illegible]	E	2026-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,457,329	4%	$258,300

Este certificado se expide el día 2026-02-16 a las 12:03.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO RC DEPORTIVO**, identificada con **NI** número **901889250**, aportó por **OTTO LOZANO TORRES** identificado(a) con **CC** número **79149080** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 02 - 2026 de la siguiente forma.

14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1														0		28						SI
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1														0		5	$1,166,667			$0	$0	Enero - 2026	50688899	13/02/2026	SI
CCF21	Compensar Caja de Compensacion Plus	1														0		25				$0	$0	Enero - 2026	50688899	13/02/2026	SI
CCF21	Compensar Caja de Compensacion Plus	1														X		0				$0	$0	Enero - 2026	50688899	13/02/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1														0		25				$0	$0	Febrero - 2026		13/02/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1														X		0				$0	$0	Febrero - 2026	50688899	13/02/2026	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Febrero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	calle 26 75-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8514545	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39024233	5499160476	E	2026/02/06	2026/02/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$758,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificacion	Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
			Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	fvl		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tipo	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	[illegible]	X																	[illegible]	27	$2,441,241	[illegible]	[illegible]	27	$2,441,241	[illegible]	CCF12	27	$2,441,241	$97,700	14-1	27	$2,441,241	$170,000	27	[illegible]	$0	SI	$758,200
Total	Afiliados(1)																					$2,441,241	[illegible]			$2,441,241				$2,441,241	$97,700			$2,441,241	$170,000			$0		$758,200

2026/02/10 05:53 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPALES	calle 26 25-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8551565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	1092435[illegible]	9499160476	E	2026/02/10	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$756,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,800	$0	$0	$390,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$390,800	$0	$0	$390,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$170,000	$0	$0	$170,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$97,700	$0	$0	$97,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$0	$0	$97,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$97,700	$0	$0	$97,700
TOTAL				1	$756,200	$0	$0	$756,200

2026/02/10 05:53 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 45 A No. 102 A 41	6363063	servicioalcliente@construsar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CONTENIDO VRU
		57706117	26/02/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$34,068,996	$7.521.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.200	0		0		0	7	400	0	70.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	662.100	0		0		0	7	3.000	0	665.100	4
EPS008	Compensar EPS	900006642-7	560.900	0		0		0	7	2.500	0	563.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229739-6	2.436.800	0	0	0	0	7	10.900	0	2.437.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.281.400	0	0	0	0	7	5.700	0	1.287.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	830031588-2	1.123.600				1.123.600	7	5.300	1.128.900			17.230	1.128.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.363.300	7	6.100	1.369.400	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.293.200	1.299.100
Pensión	2	3.708.200	3.724.700
Riesgos Laborales	1	1.123.600	1.128.800
CCF	1	1.363.300	1.369.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.488.300	7.521.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	892002985-5	CONSTRUSAR SA	Carrera 65 A No. 102 A 41	8363083	servicioalcliente@construsar.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (AAAA/MM/DD)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)	CANTIDAD EMPLEADOS	CONTRATO VIP
		57706117	26/02/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$34,069,996	$7.521.800	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Código novedad	Inicio SLN	Inicio IGE	Inicio LMA	Inicio VSP	Inicio VAC	Inicio SUS	Inicio IRL	Inicio IGE	Inicio LMA	Inicio VAC	Inicio SUS	Ing.	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Valor Adicional Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC [illegible]	[illegible]	1	A		0													230301	4.327.488	30	662.400	0	0	0	0	EPS005	4.327.488	30	173.100	14-7	4.327.488	[illegible]	5	[illegible]	CCF22	4.327.488	30	173.100	0	0	0	0	0
2	CC [illegible]	[illegible]	1	C		0													230301	3.076.588	30	482.300	0	0	0	0	EPS008	3.076.588	30	123.100	14-7	3.076.588	[illegible]	1	18.100	CCF22	3.076.588	30	123.100	0	0	0	0	0
3	CC 1033733666	SALAGUERA BARRETO ELVIA BANEZA	1	B		0													25-14	3.241.115	[illegible]	518.800	0	0	0	0	EPS008	3.241.115	30	129.700	14-7	3.241.115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF22	3.241.115	30	129.700	0	0	0	0	0
4	CC 1068928227	ORTEGON [illegible]	1	C		0													[illegible]	2.860.000	30	457.600	0	0	0	0	EPS008	[illegible]	30	[illegible]	14-7	2.860.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CCF22	[illegible]	30	114.400	0	0	0	0	0
5	[illegible]	[illegible]	1	C		0													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-7	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	1	C		0													0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	CC 51809911	[illegible] SABATIVA [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]													0	0	0	0	0	0	0						14-7	1.750.905	[illegible]	[illegible]	121.900	CCF22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0
8	CC 52551196	[illegible]	1	C		0													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EPS008	[illegible]	30	[illegible]	14-7	1.907.470	[illegible]	[illegible]	16.000	CCF22	[illegible]	[illegible]	76.300	0	0	0	0	0
9	CC 80158196	[illegible]	1	C		0													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EPS008	[illegible]	20	[illegible]	14-7	4.006.934	[illegible]	[illegible]	21.000	CCF22	[illegible]	[illegible]	150.300	0	0	0	0	0
10	CC 80158196	[illegible]	1	C		0													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	CCF22	[illegible]	[illegible]	80.200	0	0	0	0	0
11	CC 80742544	CHICO [illegible]	1	C		0													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-7	350.181	[illegible]	[illegible]	0	CCF22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785549	8	CONSORCIO SAN VICENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4 N° 2 85 INDUSTRIAL Int 3	NEIVA-HUILA	8551945	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	137374922	91001416497	E	2026/03/11	2026/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$52,360,[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (83 Afiliados)						$172,644,[illegible]	$27,624,[illegible]			$172,644,[illegible]	$6,788,[illegible]			$172,644,[illegible]		$11,196,[illegible]					$52,249,[illegible]
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$2,175,90[illegible]	$348,[illegible]			$2,175,90[illegible]	$87,[illegible]			$2,175,90[illegible]		$94,[illegible]					$617,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$2,175,90[illegible]	$348,[illegible]			$2,175,90[illegible]	$87,[illegible]			$2,175,90[illegible]		$94,[illegible]					$617,100
1	CC	1077868851 [illegible]		23010	30	$2,[illegible]	$348,[illegible]	09001	30	$2,[illegible]	$87,[illegible]	CCF02	30	$2,[illegible]		$94,[illegible]	30			SI	$617,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (82 Afiliados)						$169,868,61[illegible]	$27,[illegible]			$169,868,61[illegible]	$6,702,[illegible]			$169,868,61[illegible]		$11,06[illegible]					$[illegible]
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$8,033,840	$1,285,[illegible]			$8,033,840	$324,[illegible]			$11,775,18[illegible]		$471,[illegible]		$8,023,[illegible]			$2,634,600
2	CC	[illegible]		23010	30	$4,[illegible]	$659,[illegible]	09001	30	$4,[illegible]	$165,[illegible]	CCF02	30	$7,[illegible]		$310,[illegible]	30	$4,[illegible]			$1,[illegible]
3	CC	[illegible]		23010	30	$3,[illegible]	$624,[illegible]	09001	30	$3,[illegible]	$159,[illegible]	CCF02	30	$3,[illegible]		$161,[illegible]	30	$3,[illegible]		SI	$1,207,500
Ciudad: [illegible] Depto: HUILA (3 Afiliados)						$5,533,3[illegible]	$885,[illegible]			$5,533,3[illegible]	$216,[illegible]			$8,191,[illegible]		$289,[illegible]		$5,533,[illegible]			$1,677,200
4	CC	[illegible]		23010	30	$1,634,[illegible]	$261,[illegible]	09001	30	$1,634,[illegible]	$65,[illegible]	CCF02	30	$1,634,[illegible]		$65,[illegible]	28	$1,634,[illegible]		SI	$506,100
5	CC	[illegible]		23010	2	$116,72[illegible]	$18,[illegible]	09001	2	$116,72[illegible]	$4,[illegible]	CCF02	2	[illegible]		[illegible]	2	$116,72[illegible]			$13,400
6	PT	[illegible]		23014	27	$1,604,[illegible]	$256,[illegible]	09014	27	$1,604,[illegible]	$64,[illegible]	CCF02	27	$1,604,[illegible]		$64,[illegible]	27	$1,604,[illegible]			$494,800
7	PT	[illegible]		23014	1	$59,[illegible]	$9,[illegible]	09014	1	$59,[illegible]	$2,[illegible]	CCF02	1	[illegible]		[illegible]	1	$59,[illegible]		SI	$11,800
8	PT	[illegible]		23014	2	$116,72[illegible]	$18,[illegible]	09014	2	$116,72[illegible]	$4,[illegible]	CCF02	2	[illegible]		[illegible]	2	$116,72[illegible]		SI	$36,700
9	CC	12197113 [illegible]		23010	30	$2,[illegible]	$320,[illegible]	09001	30	$2,[illegible]	$80,[illegible]	CCF02	30	$2,003,[illegible]		$80,[illegible]	30	$2,[illegible]			$1,[illegible]
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (77 Afiliados)						$156,311,37[illegible]	$25,[illegible]			$156,311,37[illegible]	$6,184,[illegible]			$150,941,1[illegible]		$6,042,[illegible]		$156,31[illegible]			$47,363,200
10	CC	[illegible]		23010	24	$1,[illegible]	$[illegible]	09001	24	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	24	$1,[illegible]		$[illegible]	24	$1,[illegible]		SI	$433,900
11	CC	[illegible]		23010	3	$175,09[illegible]	$28,[illegible]	09001	3	$175,09[illegible]	[illegible]	CCF02	3	[illegible]		[illegible]	3	$175,09[illegible]		SI	$28,100
12	CC	[illegible]		23010	3	$175,09[illegible]	$28,[illegible]	09001	3	$175,09[illegible]	$7,[illegible]	CCF02	3	[illegible]		[illegible]	3	$175,09[illegible]			$[illegible]
13	CC	1075209502 [illegible]		23010	30	$1,[illegible]	$315,[illegible]	09001	30	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	30	$1,[illegible]		$[illegible]	30	$1,[illegible]		SI	$[illegible]
14	CC	[illegible]		23010	8	$1,[illegible]	$[illegible]	09001	8	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	8	$6,159,[illegible]		$[illegible]	8	$1,[illegible]		SI	$[illegible]
15	CC	1192144 [illegible]		23010	30	$2,[illegible]	$[illegible]	09001	30	$2,[illegible]	$[illegible]	CCF02	30	$2,[illegible]		$[illegible]	30	$2,[illegible]		SI	$678,100
16	CC	1142959278 [illegible]		23010	30	$1,[illegible]	$315,[illegible]	09001	30	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	30	$1,[illegible]		$[illegible]	30	$1,[illegible]		SI	$[illegible]
17	CC	[illegible]		23010	30	$1,[illegible]	$315,[illegible]	09001	30	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	30	$1,[illegible]		$[illegible]	30	$1,[illegible]		SI	$[illegible]
18	CC	[illegible]		23010	28	$1,[illegible]	$[illegible]	09001	28	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	28	$1,[illegible]		$122,[illegible]	28	$1,[illegible]		SI	$546,200
19	CC	[illegible]		23010	2	$[illegible]	$[illegible]	09001	2	$[illegible]	$4,[illegible]	CCF02	2	[illegible]		[illegible]	2	$[illegible]		SI	$24,000
20	CC	[illegible]		23010	26	$1,[illegible]	$[illegible]	09001	26	$1,[illegible]	$[illegible]	CCF02	26	$1,[illegible]		$[illegible]	26	$1,[illegible]		SI	$584,100
21	CC	[illegible]		23010	3	$[illegible]	$[illegible]	09001	3	$[illegible]	$[illegible]	CCF02	3	[illegible]		[illegible]	3	$[illegible]		SI	$35,000
22	CC	[illegible]		23010	1	$[illegible]	$11,[illegible]	09001	1	$[illegible]	$[illegible]	CCF02	1	$[illegible]		[illegible]	1	$[illegible]		SI	$17,700
23	CC	[illegible]		23010	30	$1,[illegible]	$280,[illegible]	09001	30	$1,[illegible]	$70,[illegible]	CCF02	30	$2,000,82[illegible]		[illegible]	30	$1,[illegible]			$[illegible]

aportes en línea

Plan[illegible]a Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				83	$27,534,400	$35,700	$0	$27,570,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,498,500	$3,300	$0	$2,501,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,731,600	$2,300	$0	$1,733,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$18,787,800	$24,200	$0	$18,812,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$4,516,500	$5,900	$0	$4,522,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$11,158,400	$14,400	$0	$11,172,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	$11,158,400	$14,400	$0	$11,172,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				83	$6,810,100	$8,900	$0	$6,819,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$471,100	$700	$0	$471,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	81	$6,339,000	$8,200	$0	$6,347,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				83	$6,789,200	$9,200	$0	$6,798,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$138,500	$200	$0	$138,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$423,100	$600	$0	$423,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$87,300	$200	$0	$87,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$87,100	$200	$0	$87,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	$2,819,200	$3,700	$0	$2,822,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$587,100	$800	$0	$587,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$272,400	$400	$0	$272,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$2,374,500	$3,100	$0	$2,377,600
TOTAL				83	$52,292,100	$68,200	$0	$52,360,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA identificado(a) con NI 830037322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO identificado(a) con CC 79905718

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501081627	115165289	E	2026-03-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																			$6,457,329	4%	$258,300
9501081627	115165289	E	2026-03-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																			$6,457,329	16%	$1,033,200
9501081627	115165289	E	2026-03-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																			$6,457,329		$0
9501081627	115165289	E	2026-03-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																			$6,457,329		$0
9501081627	115165289	E	2026-03-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																			$0	0%	$0
9501081627	115165289	E	2026-03-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-02	30																			$0	0%	$0
9501081627	115165289	E	2026-03-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																			$6,457,329	6.96%	$449,500
9501081627	115165289	E	2026-03-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																			$6,457,329	4%	$258,300
9499202211	35915828	E	2026-02-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																			$6,457,329	4%	$258,300
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																			$6,457,329	16%	$1,033,200
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																			$6,457,329		$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																			$6,457,329		$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																			$0	0%	$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2026-01	30																			$0	0%	$0
9499202211	35915828	E	2026-02-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																			$6,457,329	6.96%	$449,500
9499202211	35915828	E	2026-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																			$6,457,329	4%	$258,300

Este certificado se expide el día 2026-03-13 a las 03:09.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO RC DEPORTIVO**, identificada con **NI** número **901889250**, aportó por **OTTO LOZANO TORRES** identificado(a) con **CC** número **79149080** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2026 y 03 - 2026 de la siguiente forma.

[illegible]	Cía. de Seguros Bolívar S.A.	1															0		$0	$497.200	$0	$0	Febrero - 2026	[illegible]	[illegible]	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1															0		$0	$0	$0	$0	Febrero - 2026	67528719	13/03/2026	SI
EPS010	EPS Sura	1															0		$0	$0	$0	$0	Marzo - 2026	67528719	13/03/2026	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Marzo** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROTECCA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	calle 26 75-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2551545	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	115588447	95001	E	2026/03/08	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$840,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificacion		Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Fab	Sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC		IRON RUBEN																			230401	30	$2,713,000	$434,000	230201	30	$2,713,000	$108,000	CCF11	30	$2,713,000	$108,000	14	30	$2,713,000	$108,000	30	$0	$0	SI	$840,300
Total	Afiliados(1)																							$2,713,000	$434,000			$2,713,000	$108,000			$2,713,000	$108,000			$2,713,000	$108,000		$0	$0		$840,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830037322	8	PROYECTA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROFESIONALES	calle 26 75-49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8511545	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115083947	[illegible]06332	E	[illegible]	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	0	$840,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$434,200	$0	$0	$434,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$434,200	$0	$0	$434,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,900	$0	$0	$188,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$188,900	$0	$0	$188,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$108,600	$0	$0	$108,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$108,600	$0	$0	$108,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$108,600	$0	$0	$108,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$108,600	$0	$0	$108,600
TOTAL				1	$840,300	$0	$0	$840,300

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.4.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	LARGO			
PLACA SUPERIOR TANQUE RCI	6,60		9,00		1,00	59,40
ESCOTILLA	1,00		1,00		1,00	-1,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-39			
				Versión No: 00		Página 1 de 1	
				Fecha	D	M	AÑO

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	1.4.3.2	DESCRIPCION ITEM	Placa aérea Aligerada Concreto 4000 PSI			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

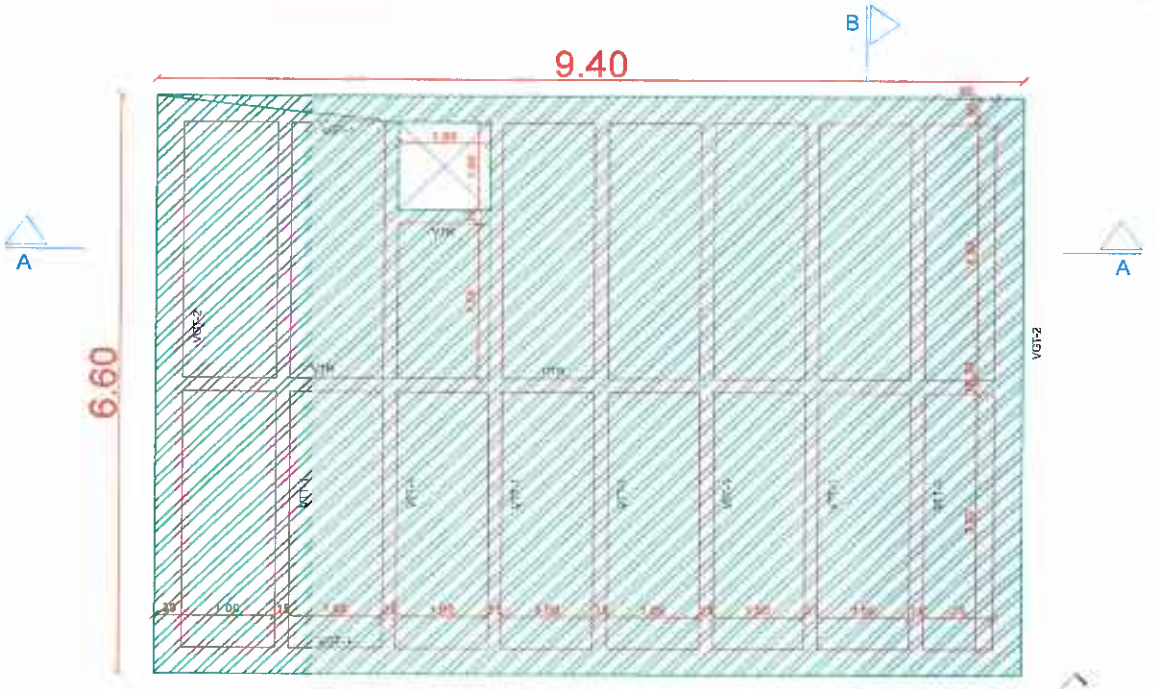

PLANTA CUBIERTA TANQUE CONTRAINCENDIOS NE+0.60

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	1.8.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	Descuento vinculos placa vanos puerta dintel	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
BLOQUE B							
M33		4,90	2,92		14,31	1,00	14,31
M34		1,26	2,80		3,53	1,00	3,53
M43	descuento vigas	1,53	3,20	0,15	4,90	1,00	4,72
M44		1,73	2,80		5,02	1,00	5,02
M35		5,74	2,90		16,65	1,00	16,65
M41	descuento puerta	2,50	2,40	2,02	5,98	1,00	3,78
	descuento puerta	1,88	2,90	3,00	5,45	1,00	2,43
M37	descuento ventana	1,88	2,90	1,00	5,45	1,00	2,78
M48		4,60	2,90		13,34	1,00	13,34
M25	descuento vigas y puerta	4,60	3,25	2,20	15,00	1,00	13,40
M1		4,60	2,90	2,31	14,01	1,00	11,10
M40		1,20	2,80		3,40	2,00	6,96
M43		1,10	2,90		3,19	2,00	6,38
						TOTAL	146,59

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			
Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha:	D	M	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	17	**FECHA :**	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.1.1	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Pañete interior liso muros			**(c) UND:**	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

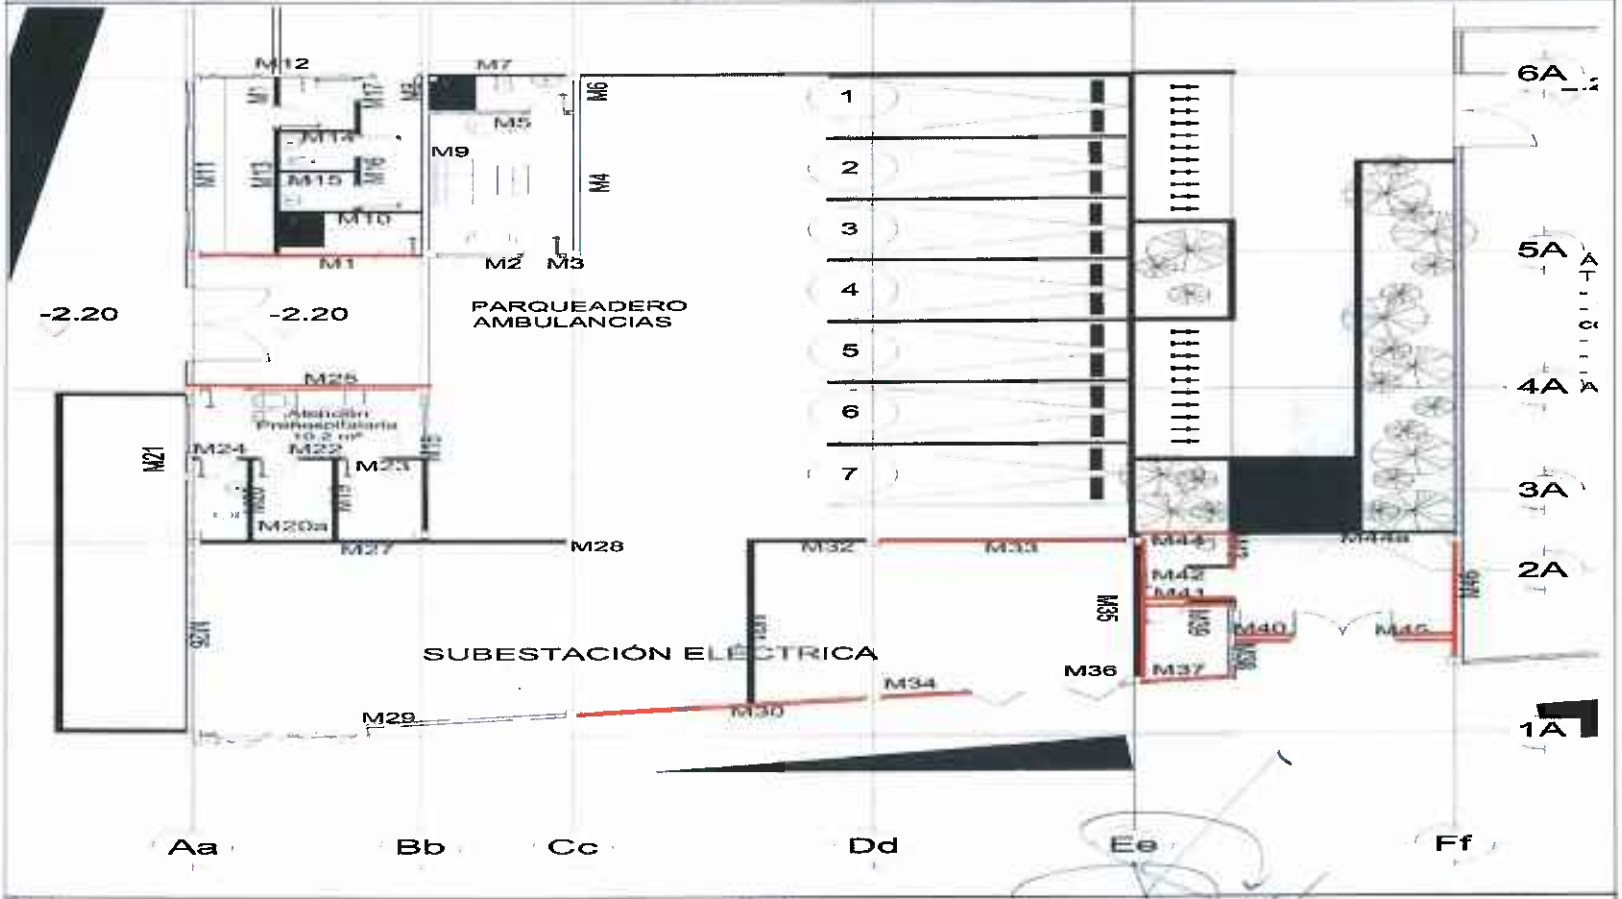

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 8	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA:	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
BLOQUE B							
M2-M3		3,02	3,90		11,78	1,00	11,78
	Descuento de puerta	0,80	2,20	1,76		-1,00	-1,76
M7		3,10	3,88		12,03	1,00	12,03
M12		4,78	3,25		15,54	1,00	15,54
	Descuento de puerta	0,80	2,20	1,76		-1,00	-1,76
	Descuento Ventana	1,50	1,00	1,50		-1,00	-1,50
M4 - M8		7,57	3,88		29,37	1,00	29,37
M11		7,57	3,95		29,90	1,00	29,90
	Descuento Ventana	1,50	1,00	1,50		-2,00	-3,00
M29-M30-M34-M36-M37		25,65	3,75	31,12	96,19	1,00	65,07
	Descuento de puerta M29	3,00	2,90	8,70		-1,00	-8,70
	Descuento de puerta M34	3,00	2,90	8,70		-1,00	-8,70
	Descuento Ventana	1,40	1,20	1,68		-1,00	-1,68
	Descuento vano	4,15	2,90	12,04		-1,00	-12,04
M48		5,24	3,70		19,39	1,00	19,39
M44a-M33-M32-M28		14,07	3,75		52,76	1,00	52,76
	Descuento vano	4,23	2,90	12,27		-1,00	-12,27
M26-M21		14,40	3,90		56,16	1,00	56,16
	Descuento Ventana	0,35	0,35	0,12		-1,00	-0,12
	Descuento Ventana	2,00	1,20	2,40		-1,00	-2,40
	TOTAL						338,87

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	PA-FO-30

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

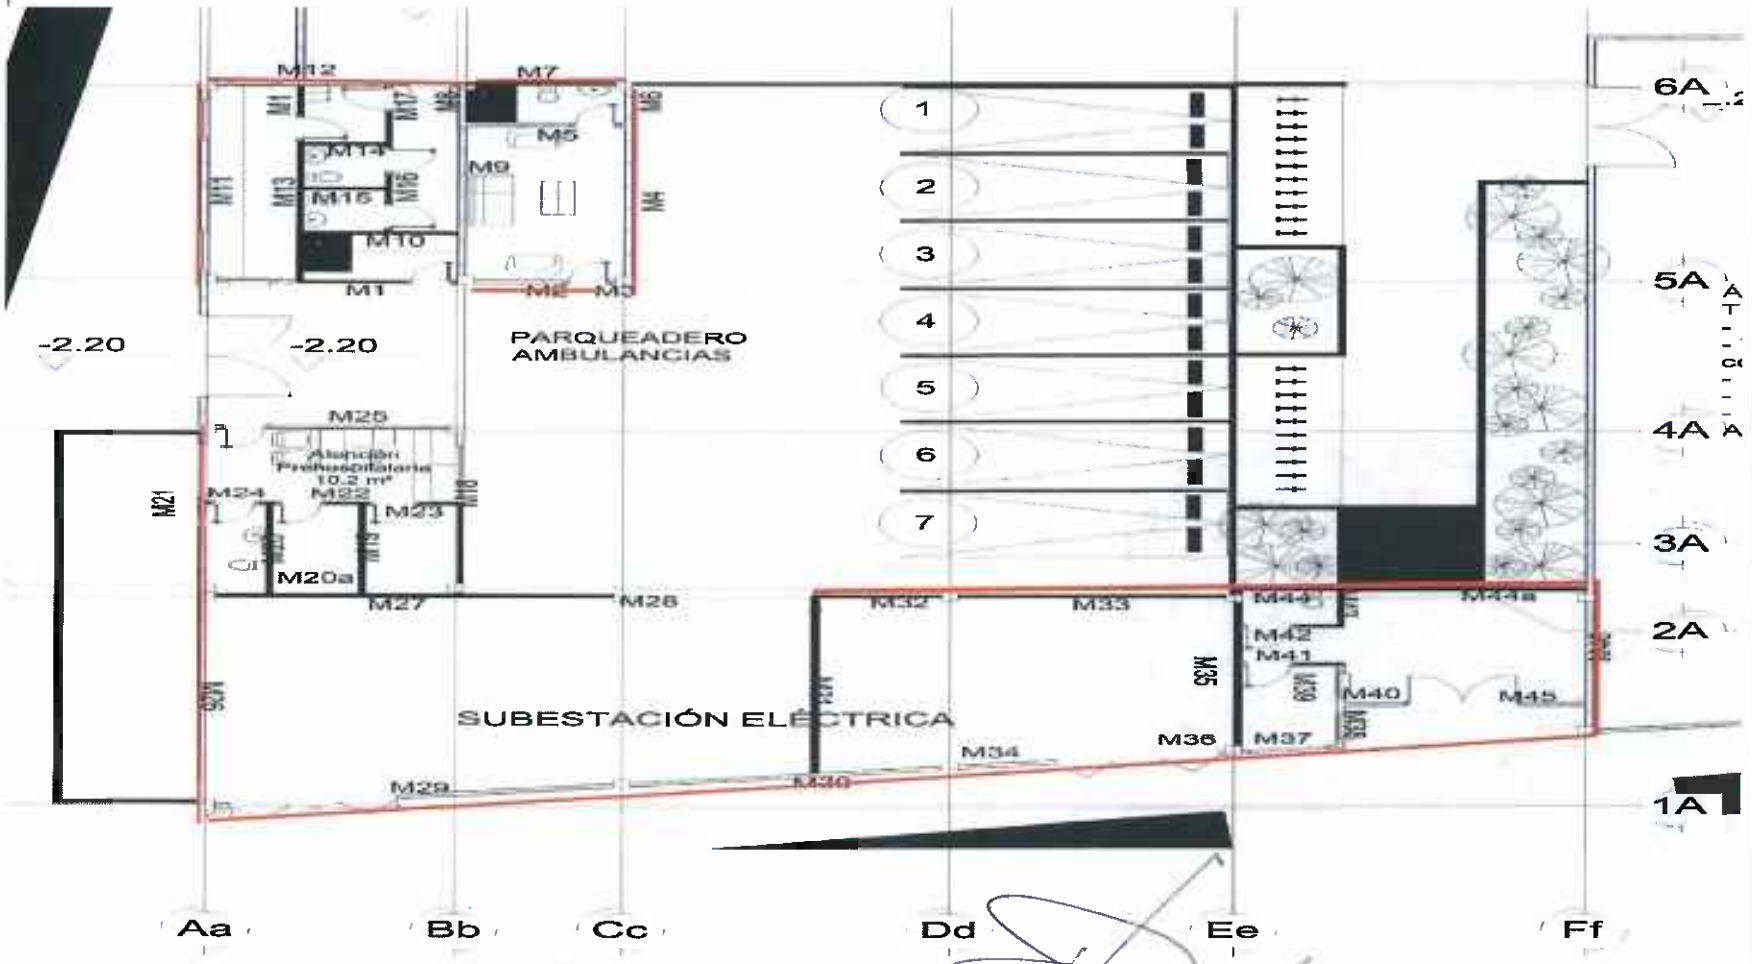

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	Long	Descuento vigueta y/o viga - cerco puerta ventana	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
BLOQUE B							
EDIFICIO 2	cabeza perimetral superior	0,13	65,57		65,57	1,00	65,57
	Pañete antepecho perimetral	0,44	65,57		65,57	1,00	65,57
						TOTAL	131,14

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE UNICONC	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código F-A-P-D-30			
		Versión 03		Página 1 de 1	
		Fecha	1	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

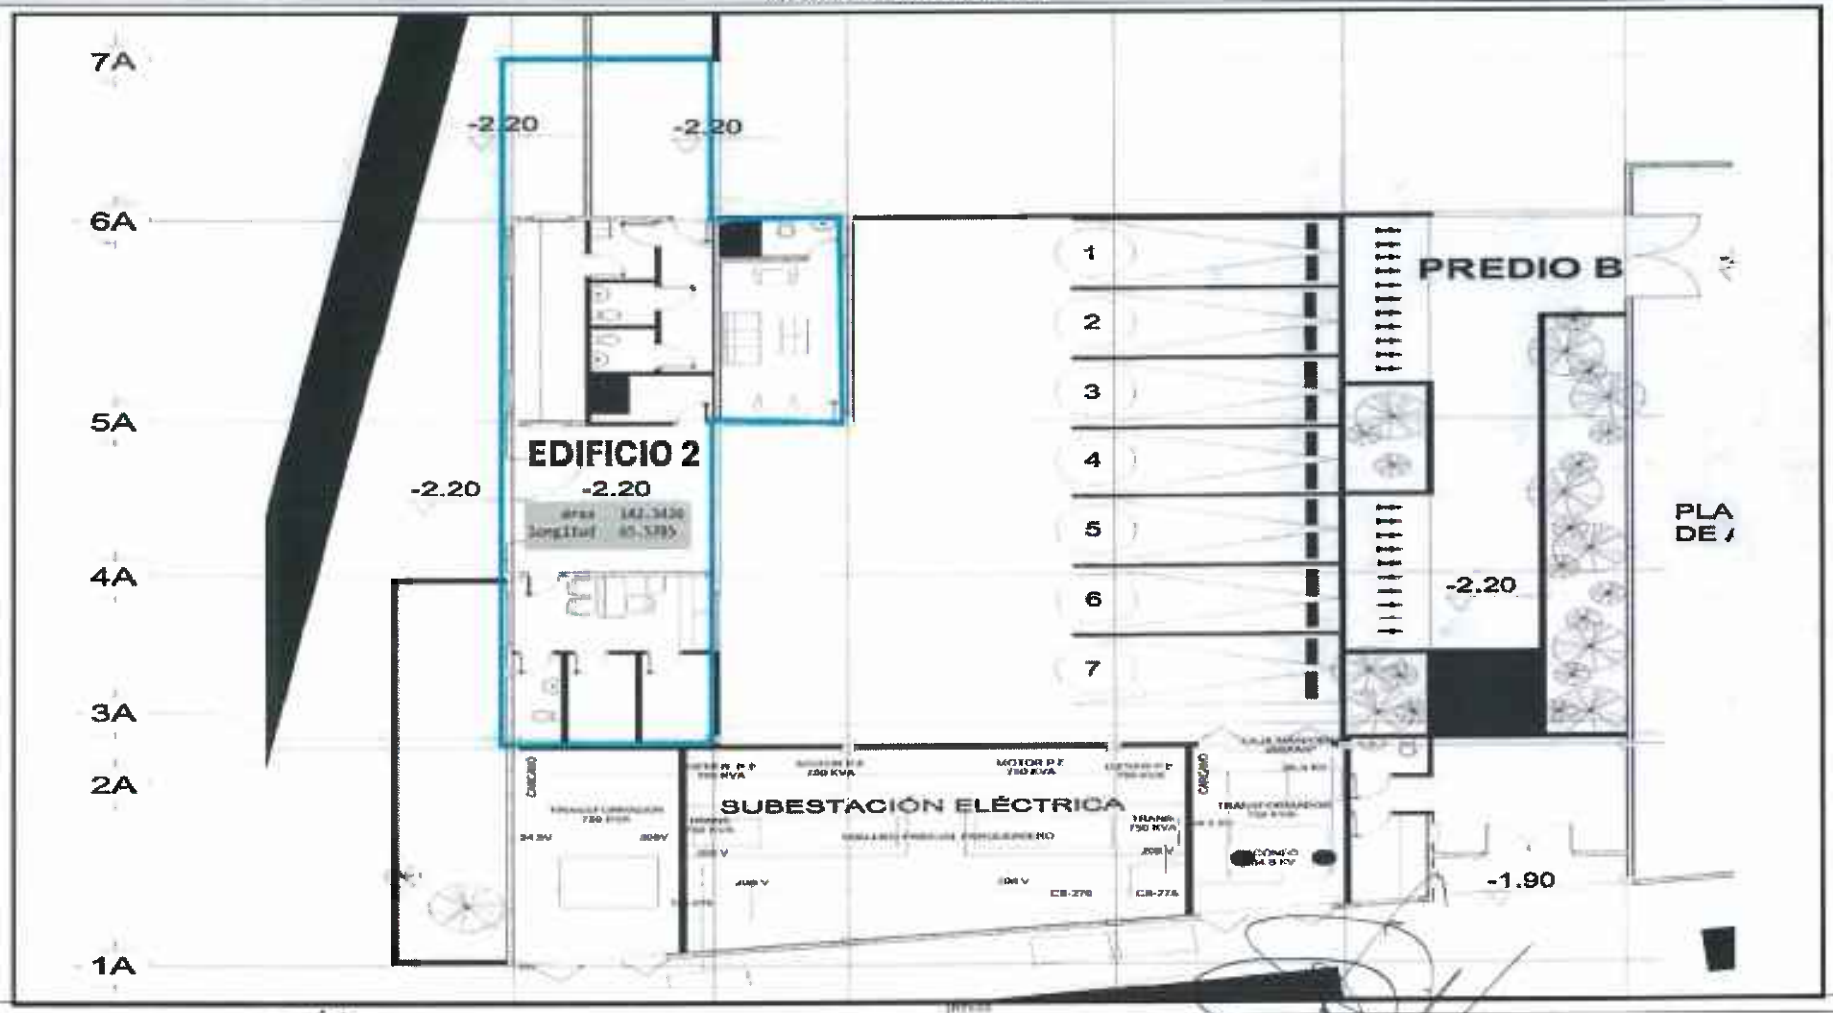

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Joe Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30 | Versión No. 03 | Página 1 de 4 | Fecha: 6 | 4 | 2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	Long	Descuento vigueta, placa - viguetas puerta divisi	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
BLOQUE B							
EDIFICIO 2	filo perimetral mismo	0,15	65,00		65,00	1,00	65,00
						TOTAL	65,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.3.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha:	0	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

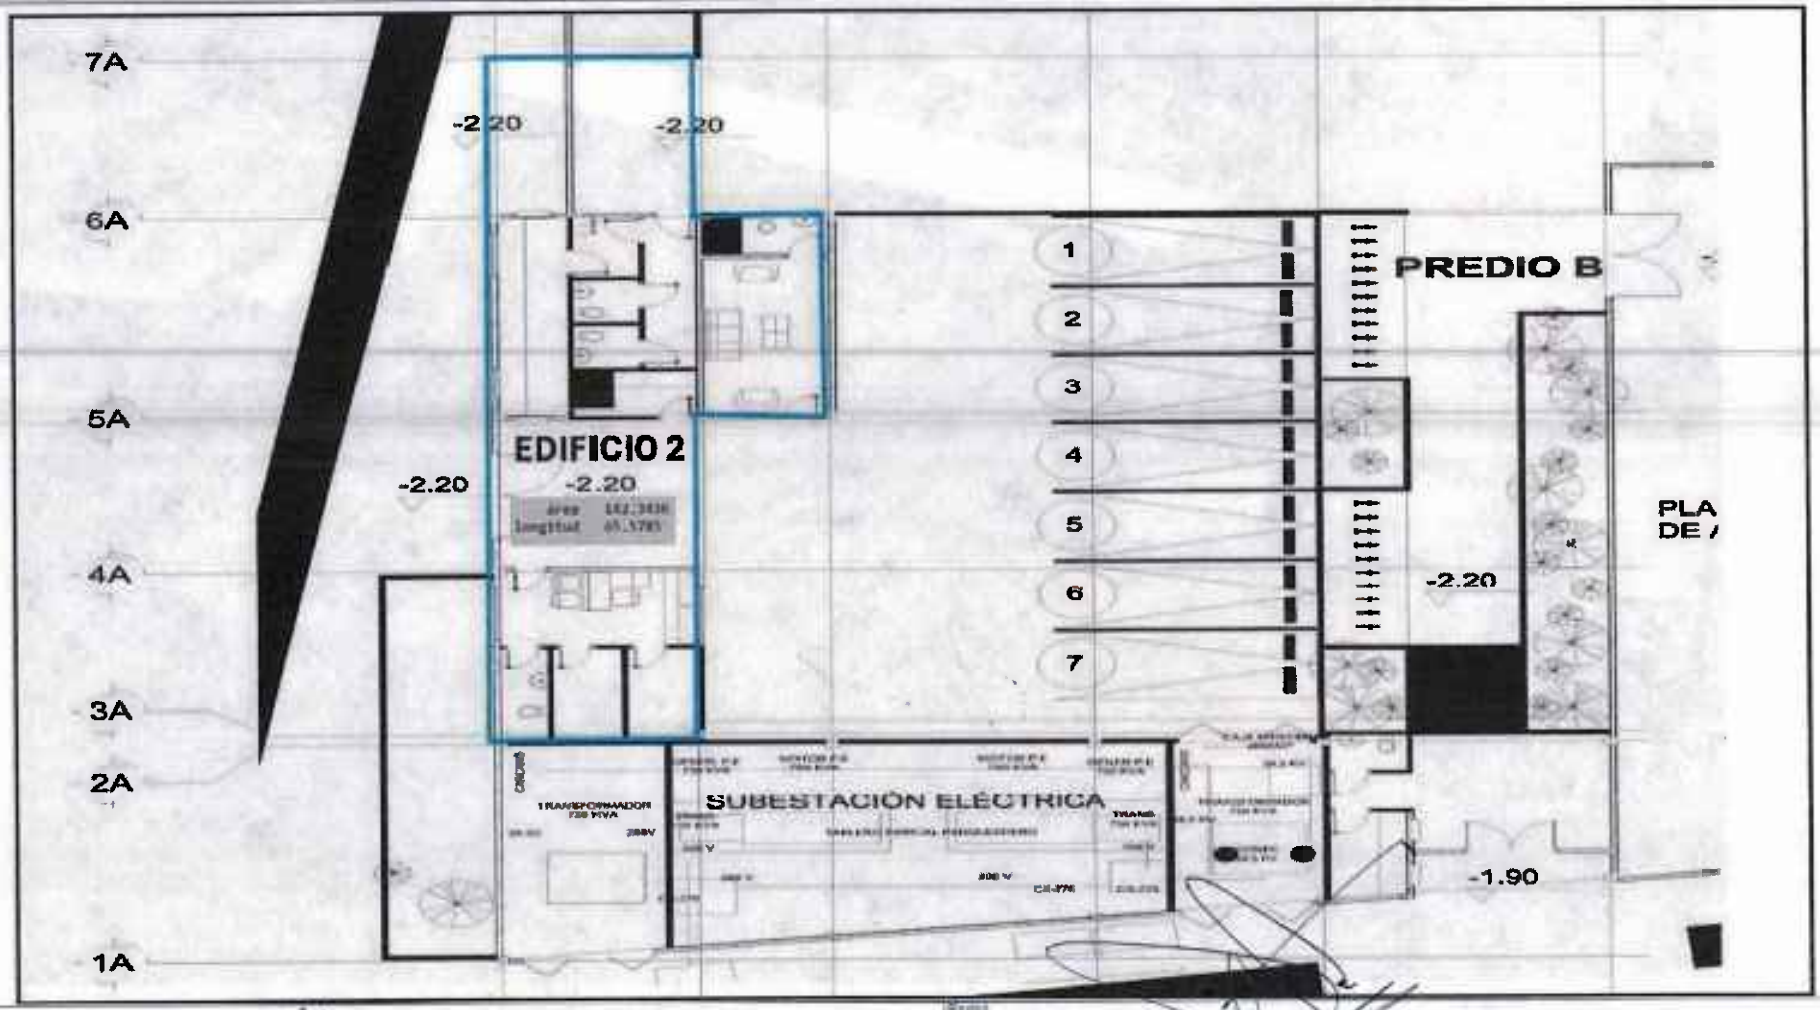

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 6

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	1.8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Altura	LARGO			
ESCALERA EJE 6-7 D-E DE PISO 5 A PISO CUBIERTA						
PLACA Y ESCALONES			0,90	2,01	3,00	5,43
DESCANSO 1/2HO ESCALERA	0,77	0,20	2,20		3,00	1,02
VIGE 2	0,20	0,40	2,20		3,00	0,53
ESCALERA EJE 2 C-D DE PISO 5 A PISO 6						
PLACA Y ESCALONES			1,20	2,00	1,00	3,12
DESCANSO 1/2HO ESCALERA	1,20	0,20	2,00		1,00	0,70
VIGE 1	0,25	0,40	2,00		1,00	0,26
				TOTAL		11,05

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FR-FO-20			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	6.4.1	DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLACA Y ESCALONES

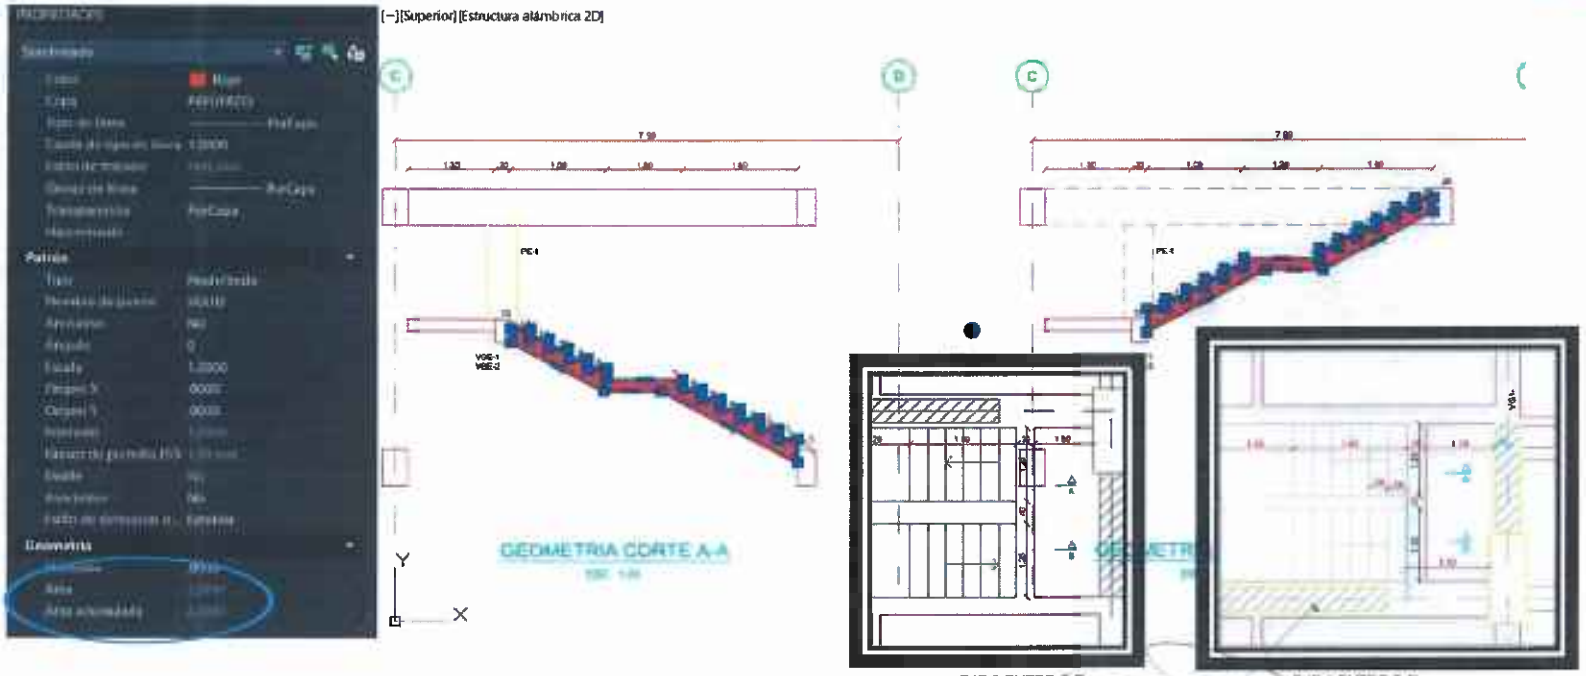

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Carrillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	D	M	AAAA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	6.4.1	DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			UND:	M3

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EJE 2 Y EJE 9 ENTRE C-D

VIGA VGE-1

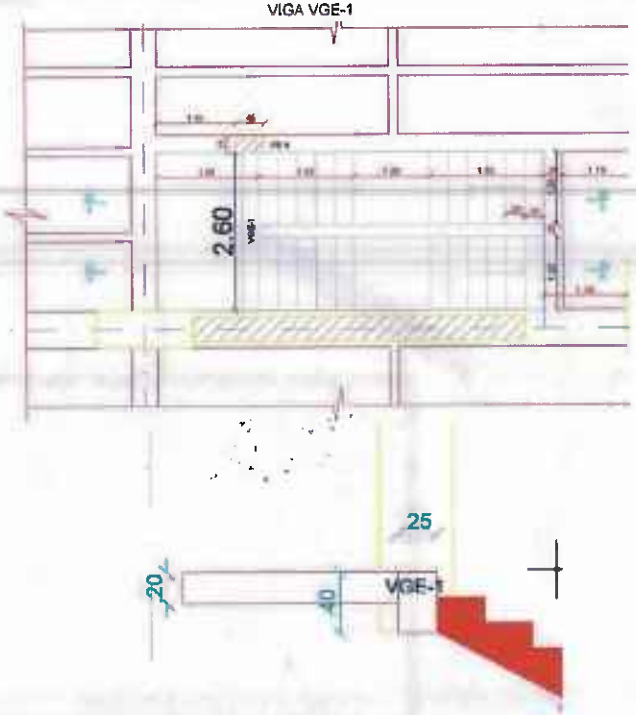

DESCASO GIRO ESCALERA

PLANTA TIPO ESCALERA EMERGENCIA

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha 2 4 2025	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	6.4.1	DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			UND:	M3

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EJE 6-7 ENTRE D-E

PLACA Y ESCALONES

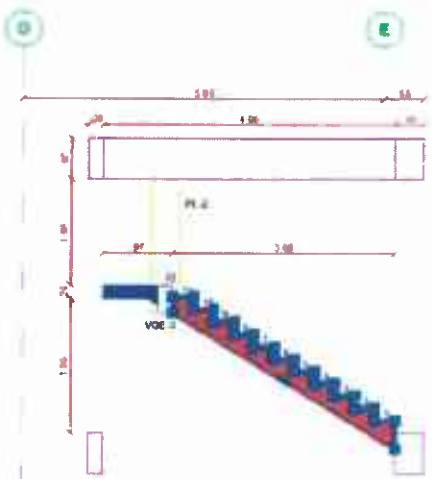

GEOMETRIA CORTE D-D

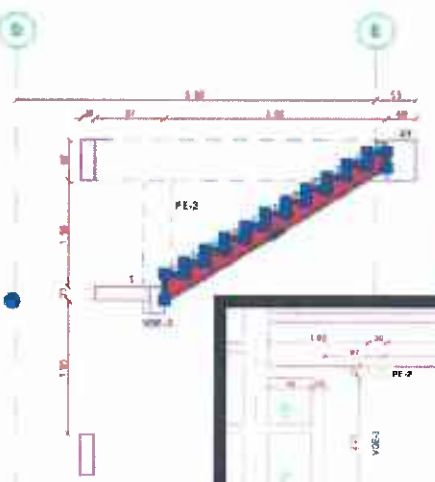

GEOMETRIA C

PLANTA ESCALERA SERVICIOS

CONTRATO	AVANCE
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	6.4.1	DESCRIPCION ITEM	Escaleras en concreto Concreto 4000 PSI			UND:	M3

(4) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EJE 6-7 ENTRE D-E

VIGA VGE-3

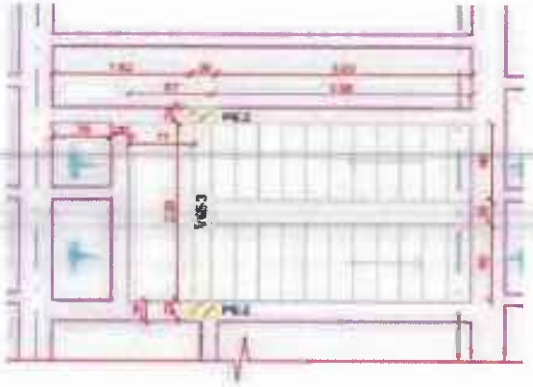

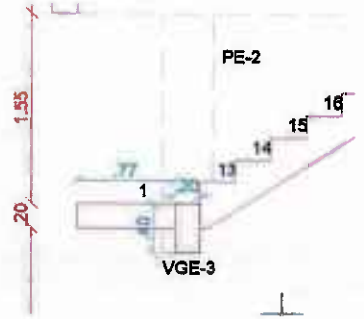

DESCASO GIRO ESCALERA

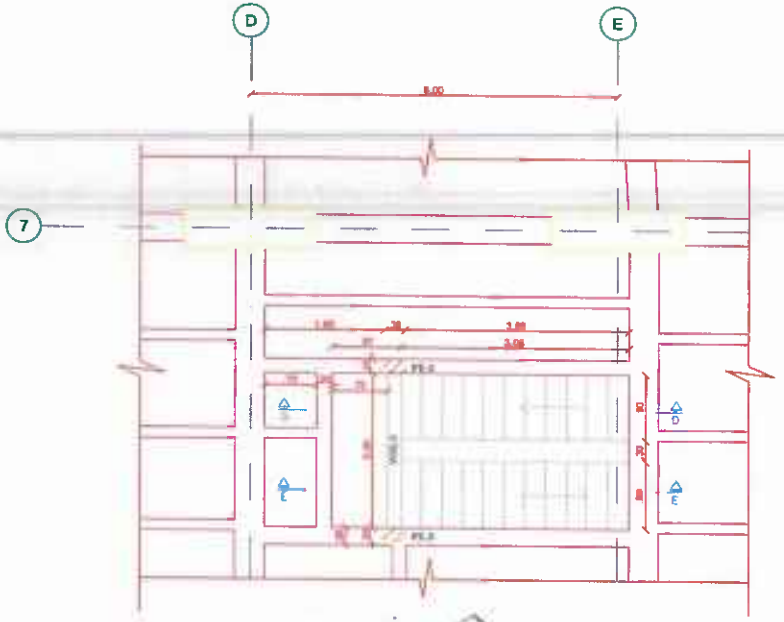

PLANTA ESCALERA SERVICIOS

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha	8	4	2026

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº.	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm perforación, anclajes y adhesivo epóxico <50CM			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO				
M3	0.40	0.68		0.68	1.00	0.68
M2	0.28	0.68		0.68	1.00	0.68
M73	0.49	0.68		0.68	1.00	0.68
M145	0.30	0.68		0.68	1.00	0.68
M154	0.30	0.68		0.68	1.00	0.68
M189	0.48	0.68		0.68	1.00	0.68
					TOTAL	4.08

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No.: 08		Página 1 de 4		
		Fecha:	D	M	AÑO	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de arcilla N° 4 incluye Grafil 4mm, perforación, anclajes y adhesivo epóxico <50CM			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

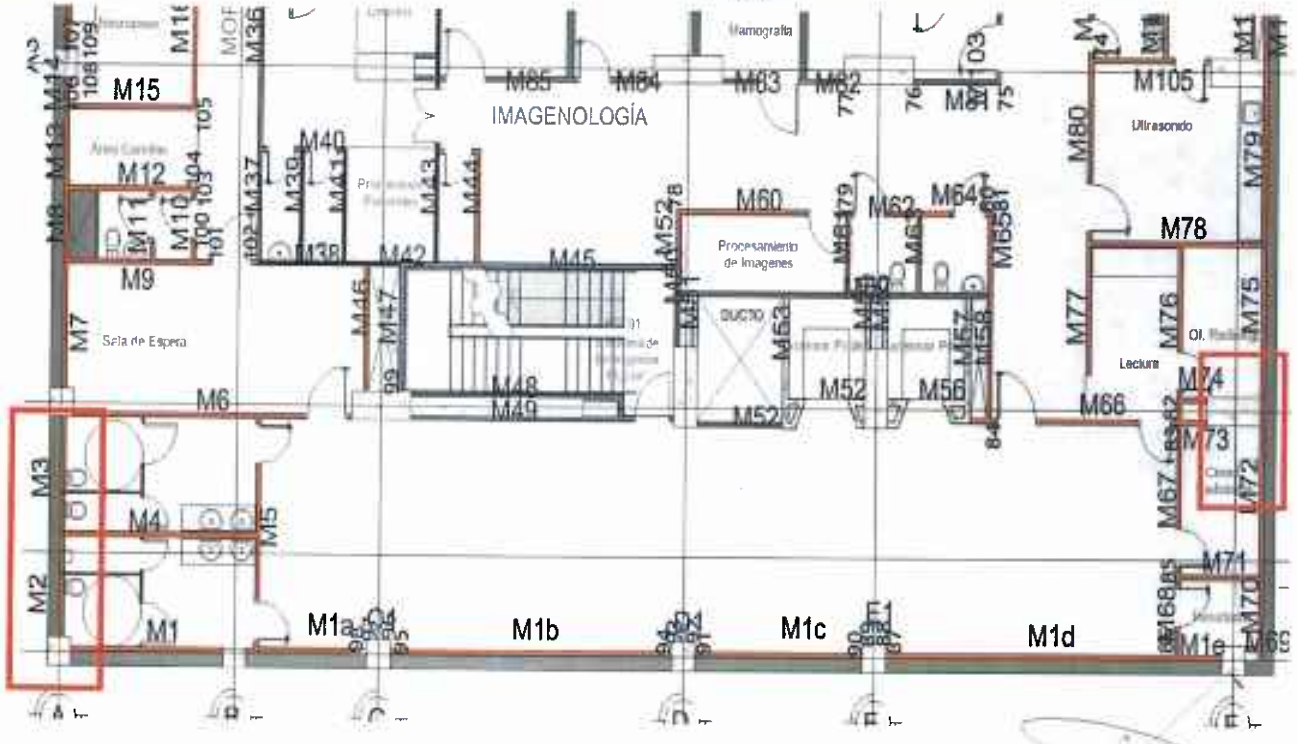

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N°. DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 3						
M84	4,40	3,70	2,06	16,28	1,00	16,28
M83	8,35	3,70	2,75	30,90	1,00	29,89
M83a	1,75	3,70		6,48	1,00	6,48
M89	2,90	3,70		10,73	1,00	10,73
M81	1,12	4,20	0,20	4,70	1,00	4,50
M82	2,80	4,20	0,79	11,76	1,00	11,03
M78	2,80	3,70		10,36	1,00	10,36
M79	2,90	3,70		10,73	1,00	10,73
M79a	2,46	3,70		9,10	1,00	9,10
M60	45,90	2,70		123,93	1,00	123,93
Descuento vanos ventanas M60			13,60		-1,00	-27,20
			10,20		-1,00	-20,40
M60a	3,54	3,7		13,10	1,00	13,10
			TOTAL			196,73

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 38		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.1.3	DESCRIPCION ITEM	Muro en bloque de concreto gris tolete 19x12x39 cm			UND:	M2

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

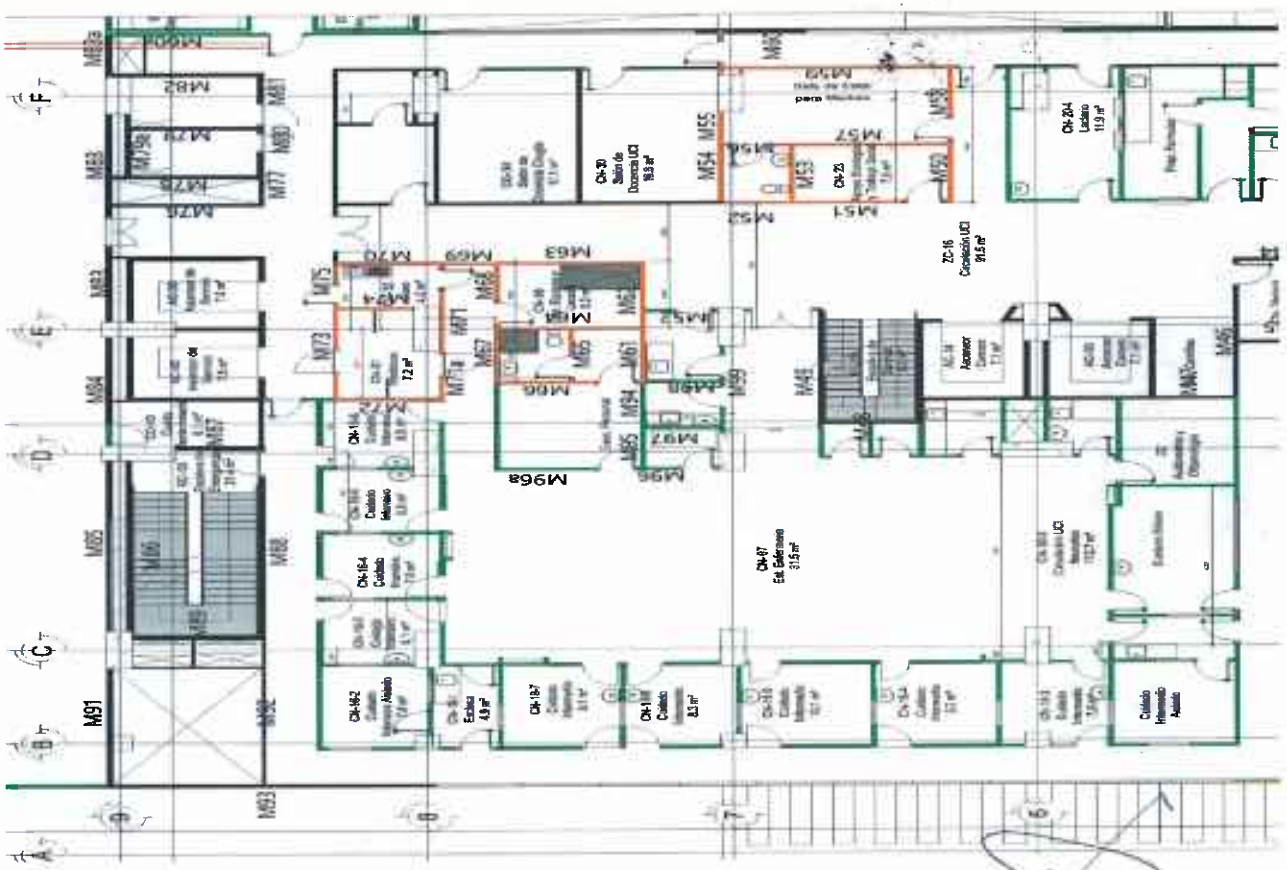

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.6.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HP	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M54a		0,97			1,00	0,97
M56		0,97			1,00	0,97
M51		1,01			1,00	1,01
M50		1,03			1,00	1,03
M48		0,98			1,00	0,98
M39		0,98			1,00	0,98
M33		0,96			1,00	0,96
M34		0,98			1,00	0,98
M29		0,98			1,00	0,98
M27		1,01			1,00	1,01
M24		0,96			1,00	0,96
M21		0,97			1,00	0,97
M20		1,03			1,00	1,03
		1,03			1,00	1,03
M61		0,95			1,00	0,95
M63		0,95			1,00	0,95
M66		1,46			1,00	1,46
M78		0,97			1,00	0,97
M79		0,95			1,00	0,95
M80		0,98			1,00	0,98
M68		0,94			1,00	0,94
						0,00
		TOTAL				21,06

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 7	
		Fecha:	6	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

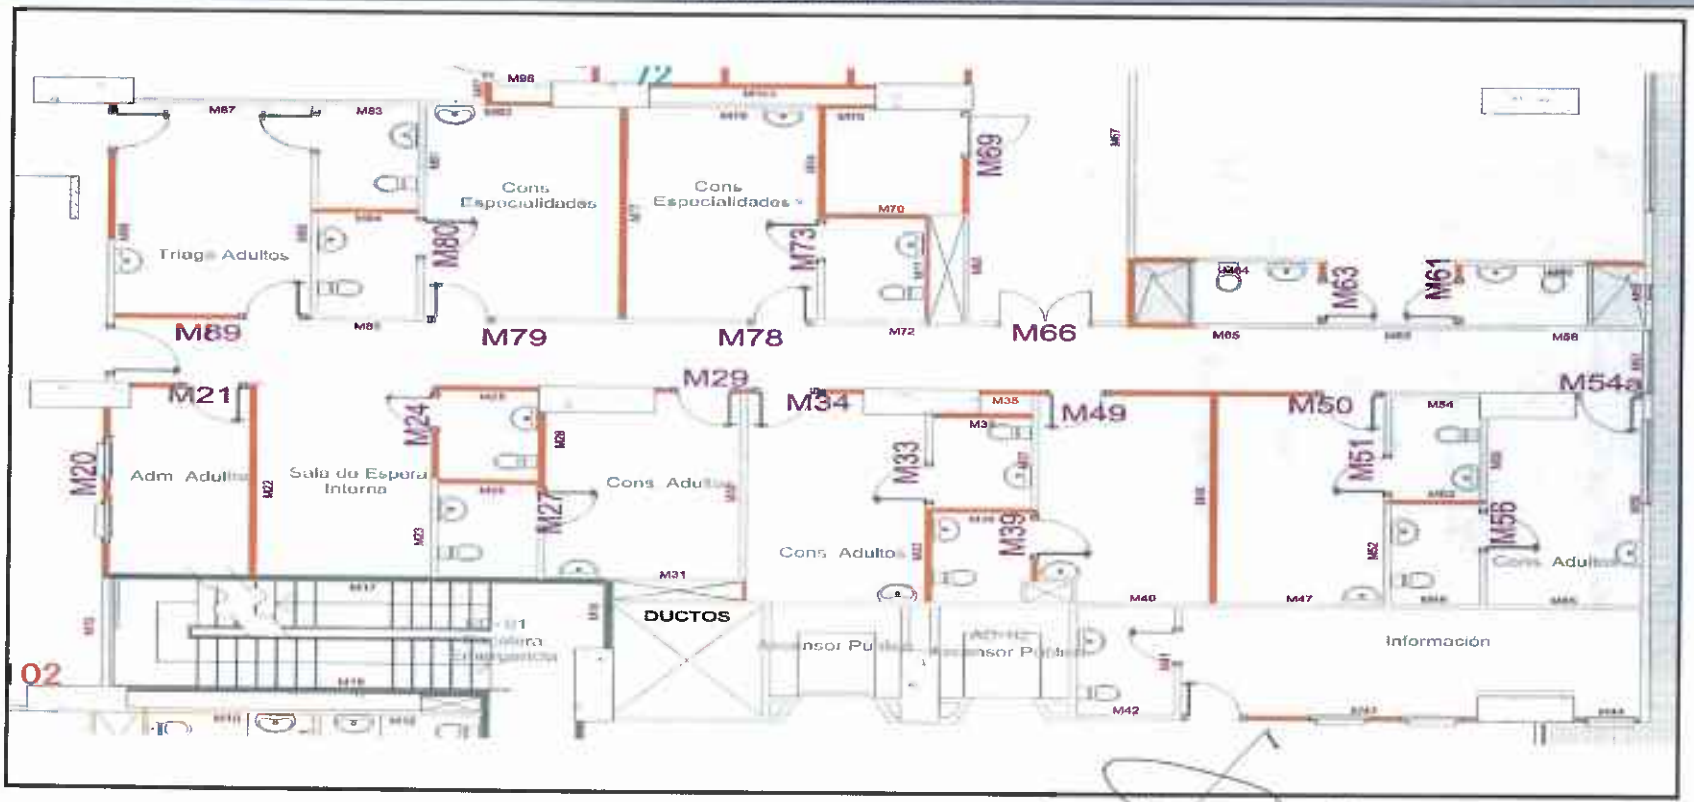

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(I) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M45	7,37	4,30		31,69	1,00	31,69
	0,80	0,60		0,48	-1,00	-0,48
				1,25	-1,00	-1,25
				6,00	-1,00	-6,00
M50	1,80	5,00		4,80	1,00	4,80
M74	0,69	2,83		1,95	1,00	1,95
M75	3,18	2,83		9,00	1,00	9,00
M76	3,18	2,83		9,00	1,00	9,00
M76	3,18	2,83		9,00	1,00	9,00
	1,00	2,20		2,20	-1,00	-2,20
M139-M137-M141	4,82	2,83		13,64	1,00	13,64
	1,00	2,20		2,20	-1,00	-2,20
M134	2,56	2,83		7,24	1,00	7,24
M135	2,06	2,83		5,83	1,00	5,83
M138	1,26	2,83		3,57	1,00	3,57
M139	2,56	2,83		7,24	1,00	7,24
M182	2,58	2,83		7,30	1,00	7,30
M181	4,85	4,30		20,86	1,00	20,86
	0,80	0,60		0,48	-1,00	-0,48
				0,99	-1,00	-0,99
				3,86	-1,00	-3,86
M174	2,29	4,30		9,59	1,00	9,59
	2,29	0,20		0,45	-1,00	-0,45
M175	4,17	2,45		10,26	1,00	10,26
M190	1,18	2,83		9,00	2,00	18,00
M195	1,54	2,83		4,36	3,00	13,07
M191	2,15	2,83		6,08	4,00	24,34
M192	3,20	2,83		9,06	5,00	45,28
M179	2,17	2,83		6,14	6,00	36,83
M223	7,82	4,30		33,63	1,00	33,63
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
	1,18	2,80		3,33	-1,00	-3,33
				1,27	-1,00	-1,27
M221	2,92	4,30		12,56	1,00	12,56
	2,92	3,00		8,76	1,00	8,76
	2,92	0,20		0,58	-1,00	-0,58
		PASAN				316,26

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

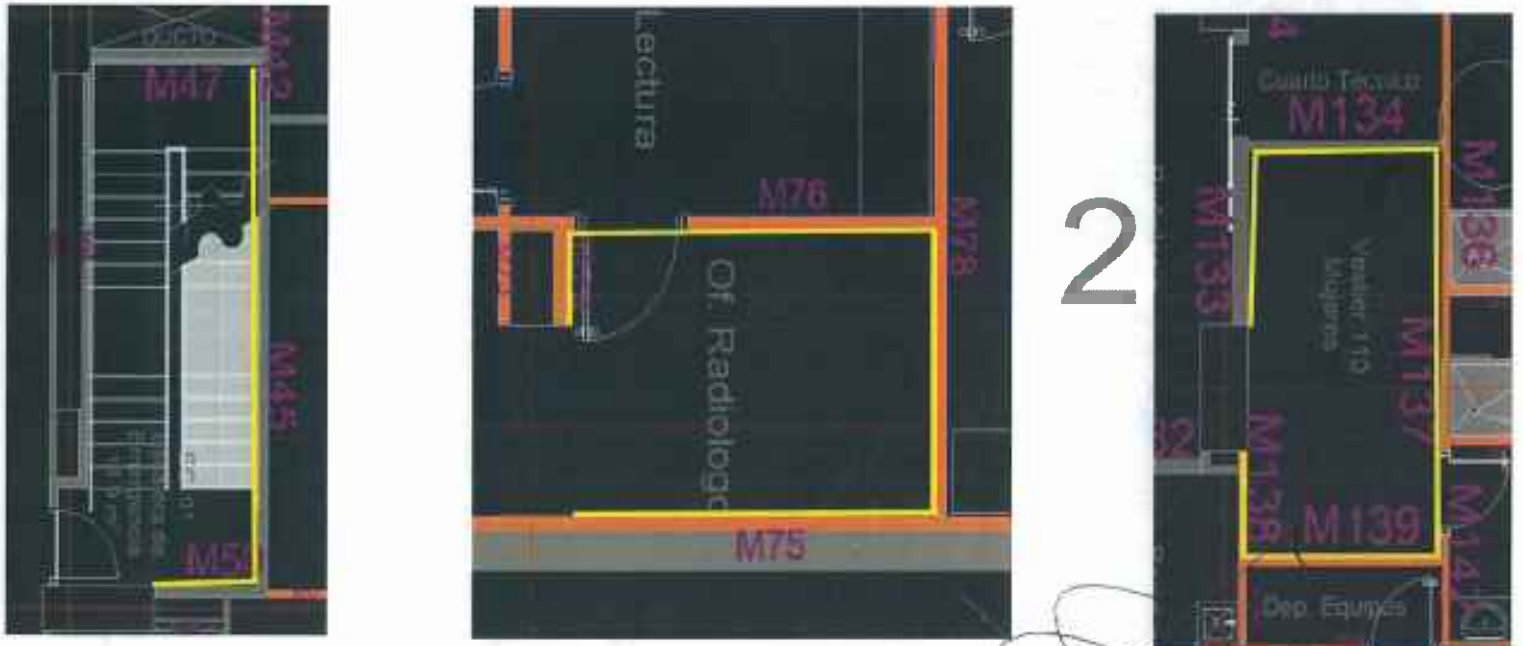

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

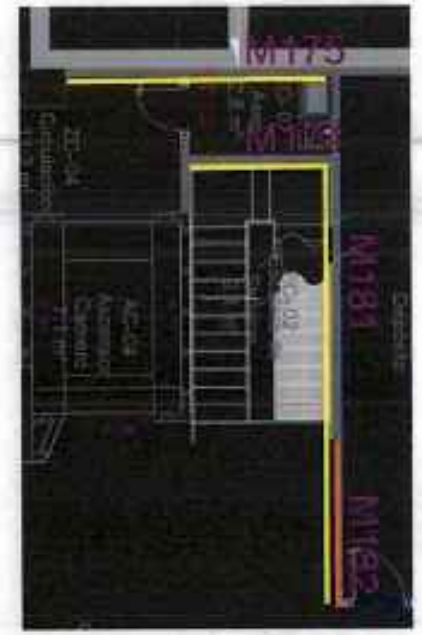

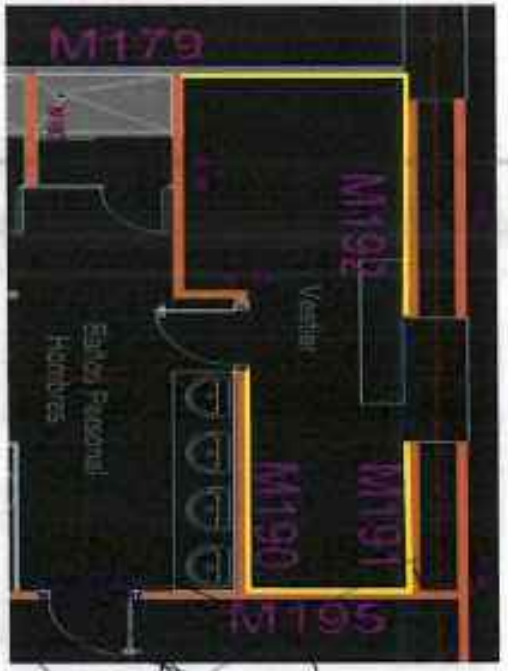

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-20 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 6 4 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EC 01 SOTANO

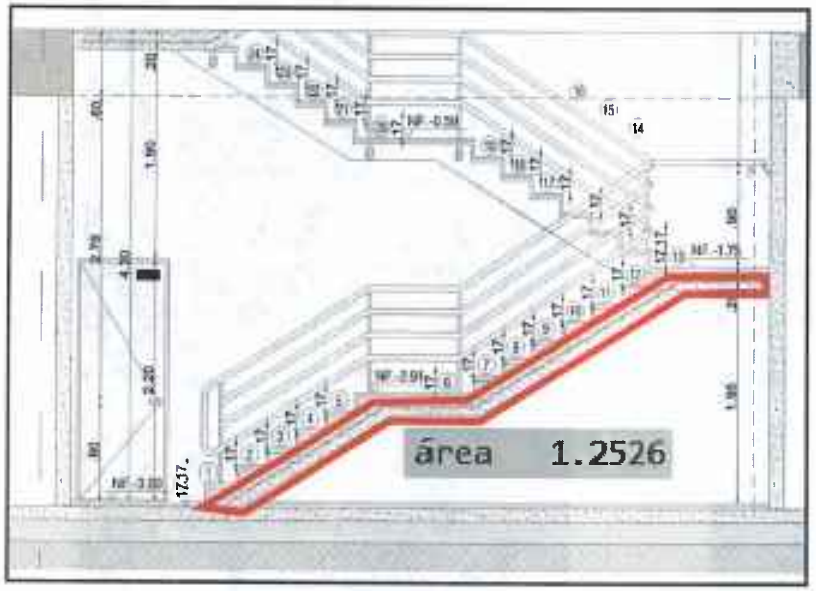

ESCALERA EC 02 SOTANO

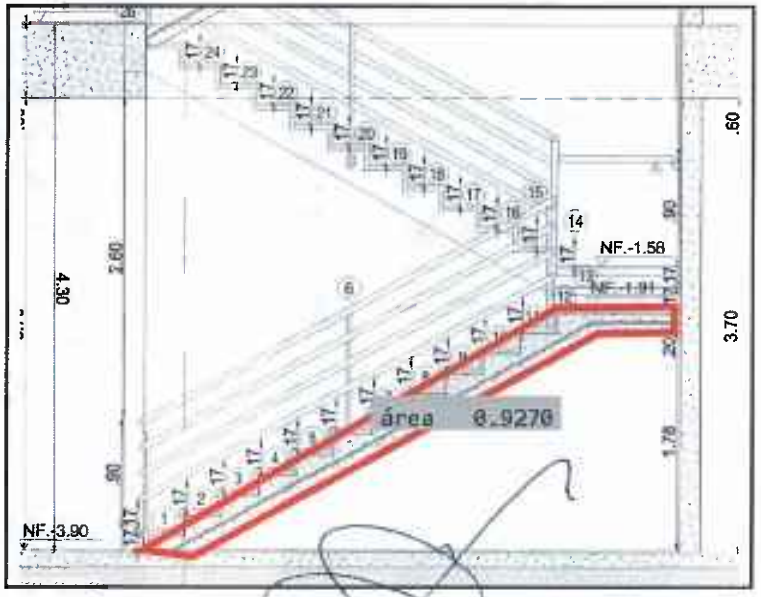

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EC-03 SOTANO

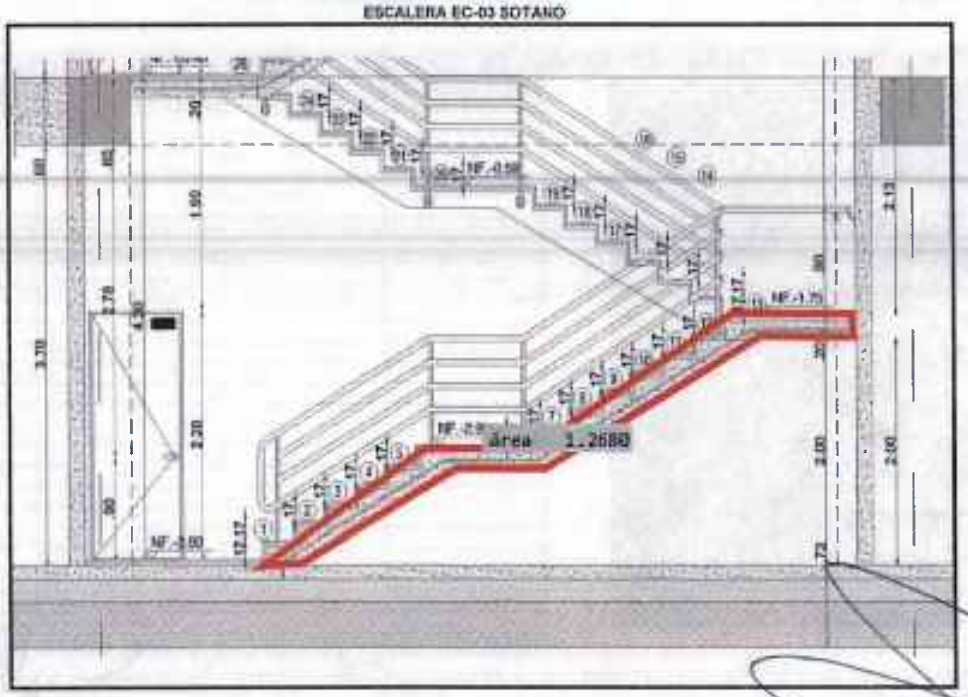

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Carrillo	Arq Jair Lazaro

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Peñete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			SOTANO			
M223	4,07	3,00		12,21	1,00	12,21
	2,02	2,78		4,61	-1,00	4,61
SUB TOTAL						7,60
VIENEN						316,26
PASAN						323,86

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Ivar Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06	Página 1 de 1		
		Fecha:			2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

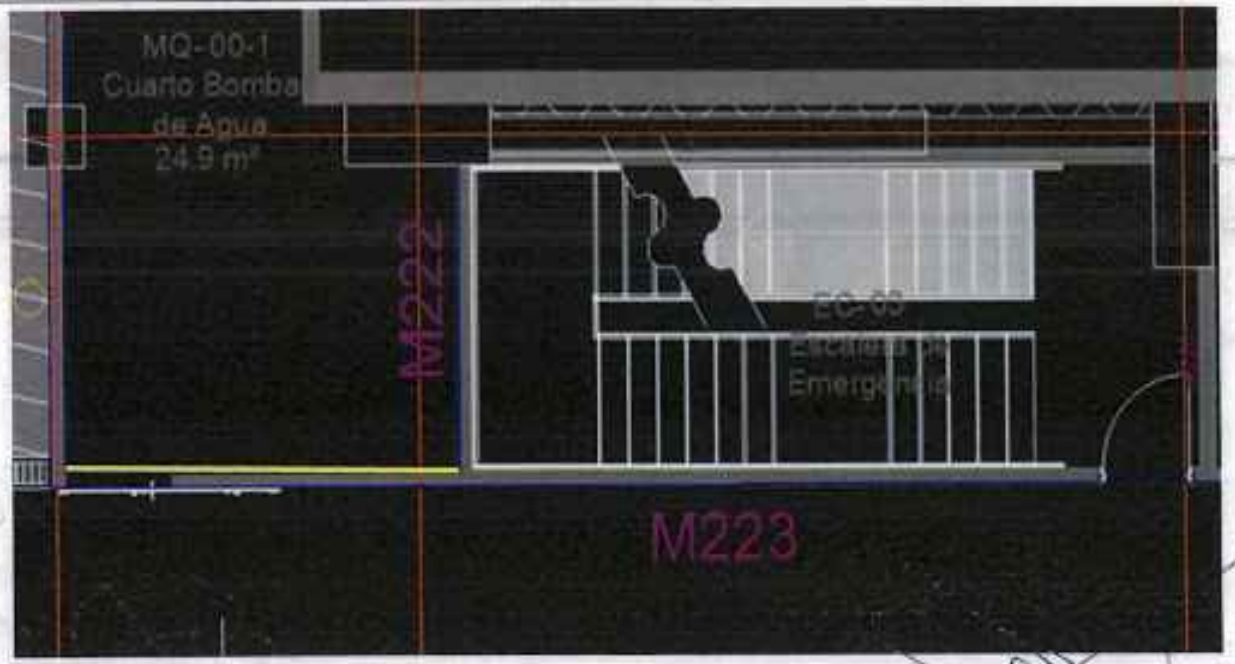

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(o) largo	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(ll) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M222	7,82	4,30		33,63	1,00	33,63
	1,17	2,28		2,67	-1,00	-2,67
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
				1,27	-1,00	
M219	2,93	4,30		12,60	1,00	12,60
M223	1,95	3,70		7,22	1,00	7,22
M222	6,50	2,83		18,40	1,00	18,40
M231a	4,23	2,83		11,91	1,00	11,91
	1,30	0,45		0,59	-1,00	-0,59
M231a	2,47	2,83		6,99	1,00	6,99
M17	6,82	4,30		29,33	1,00	29,33
	0,80	0,60		0,48	1,00	0,48
				1,25	-1,00	-1,25
M18	2,53	4,30		10,88	1,00	10,88
M34	3,80	3,70		21,46	1,00	21,46
			SUB TOTAL			248,37
			VIENEN			323,36
			PASAN			470,23

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-10 Versión No. 06 Página 1 de 1 Fecha 16 4 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ISIDRO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE	FECHA	DICIEMBRE DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros		UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

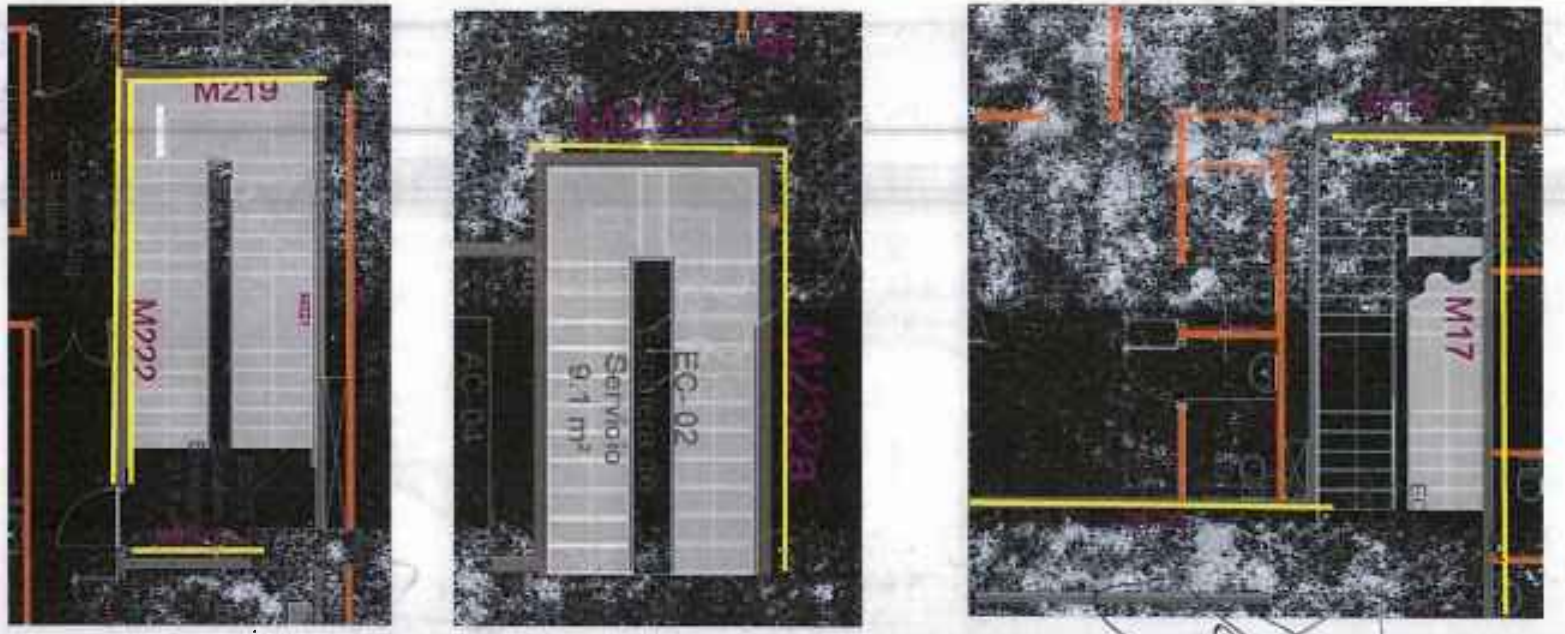

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EC 01

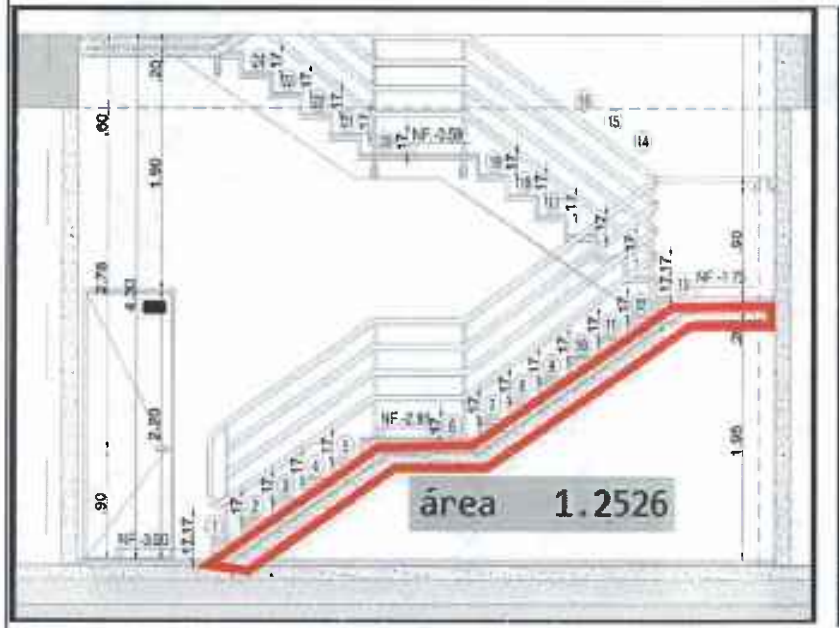

ESCALERA EC 03

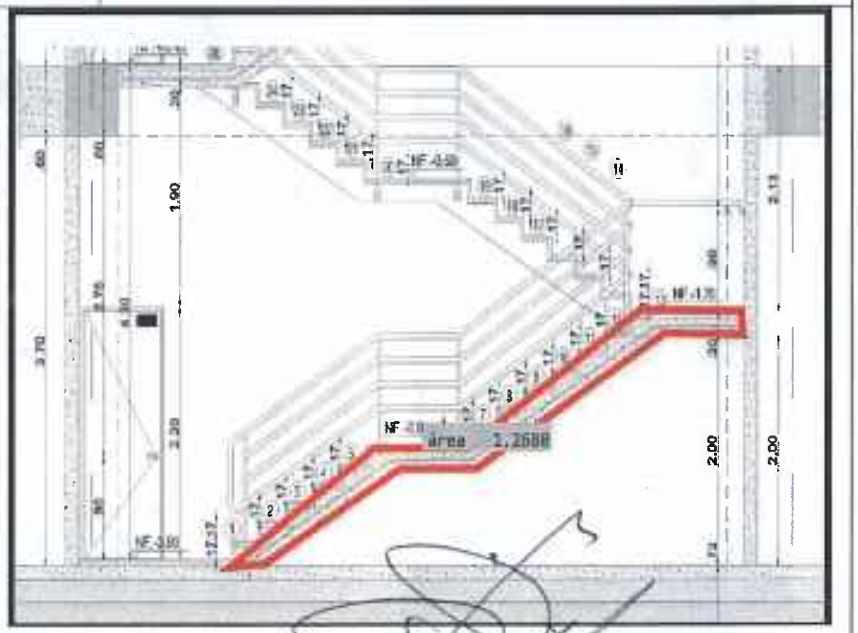

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 2			
M11	7,48	4,30		32,16	1,00	32,16
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
				1,27	-1,00	-1,27
M12	2,51	4,30		10,97	1,00	10,97
M172	4,25	2,83		12,03	1,00	12,03
	1,35	0,45		0,59	-1,00	-0,59
M167	2,56	2,83		7,24	1,00	7,24
M217	16,35	2,83		46,30	1,00	46,30
	15,00	0,80		12,00	1,00	12,00
	2,00	2,83		5,66	1,00	5,66
	0,90	2,83		2,55	1,00	2,55
M277	3,34	2,83		9,45	1,00	9,45
M277a	1,52	2,83		4,30	1,00	4,30
M253	7,81	4,30		33,58	1,00	33,58
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
				1,27	-1,00	-1,27
M260	2,93	4,30		12,60	1,00	12,60
M254	1,55	3,70		7,22	1,00	7,22
	2,08	2,83		5,89	1,00	5,89
M253	7,81	2,83		22,10	1,00	22,10
SUB TOTAL						218,84
VIENEN						670,23
PASAN						889,07

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-F0.03 Versión No. 02 | Página 1 de 1 Fecha: 3 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	ersión No. (	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

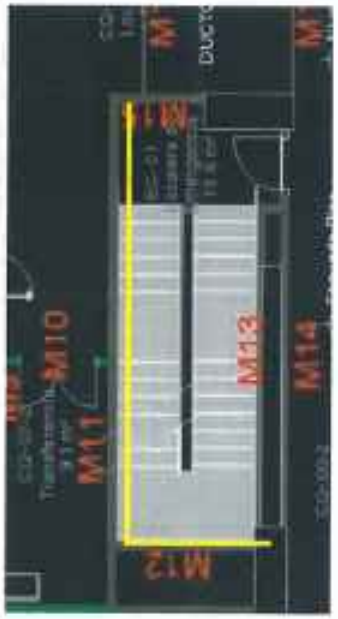

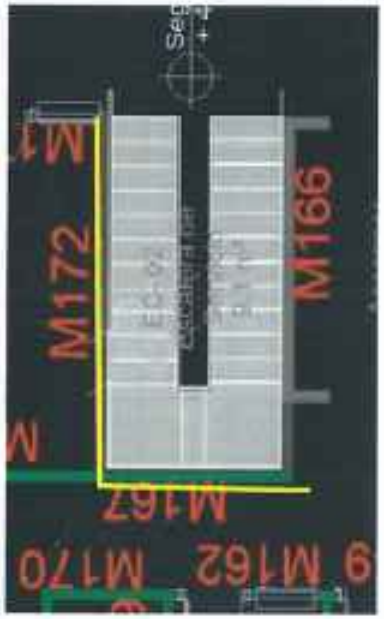

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 30	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EC 01

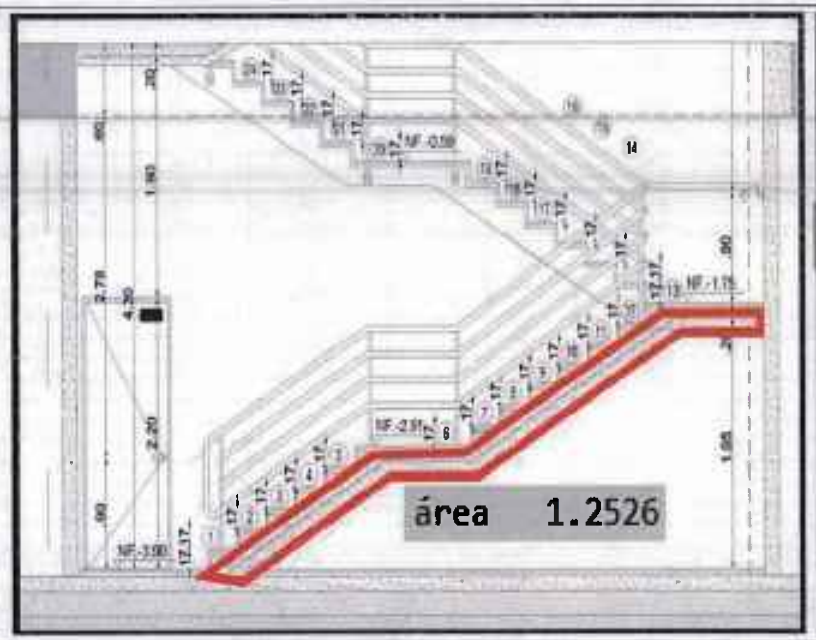

ESCALERA EC 03

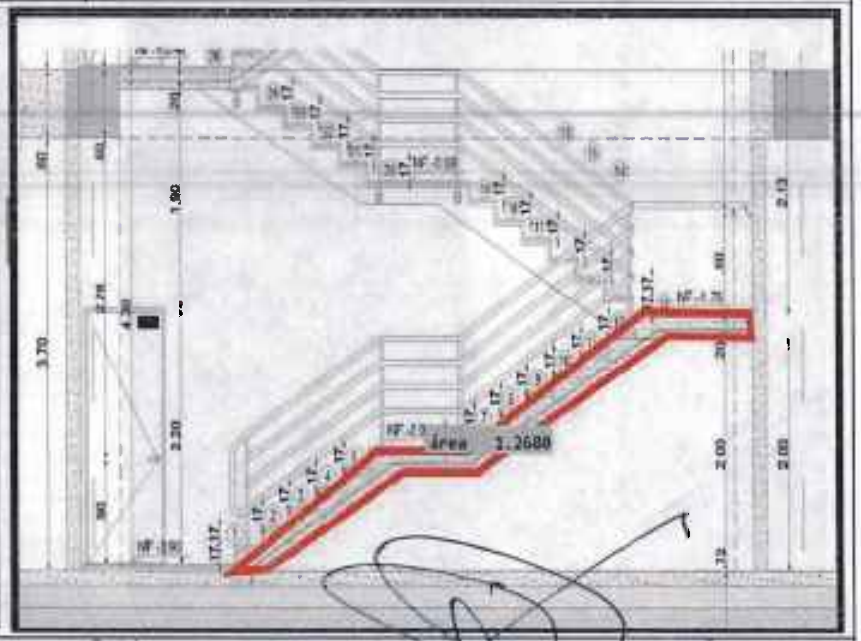

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) Largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 3			
M88	7,81	4,30		33,58	1,00	33,58
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
	1,10	2,29		2,51	-1,00	-2,51
				1,27	-1,00	-1,27
M88	2,93	4,30		12,60	1,00	12,60
M87	3,55	3,70		7,22	1,00	7,22
	1,45	2,93		5,52	1,00	5,52
M88	6,60	2,83		18,68	1,00	18,68
M93	4,06	2,83		11,49	1,00	11,49
M93	7,47	2,83		21,14	1,00	21,14
	18,90	0,80		15,12	1,00	15,12
	2,35	2,83		6,65	1,00	6,65
	0,68	2,83		1,91	1,00	1,91
M88	2,57	2,83		7,27	1,00	7,27
M49	4,32	2,83		12,23	1,00	12,23
	1,36	0,45		0,61	-1,00	-0,61
			SUBTOTAL			147,09
			VIENEN			689,07
			PASAN			837,06

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

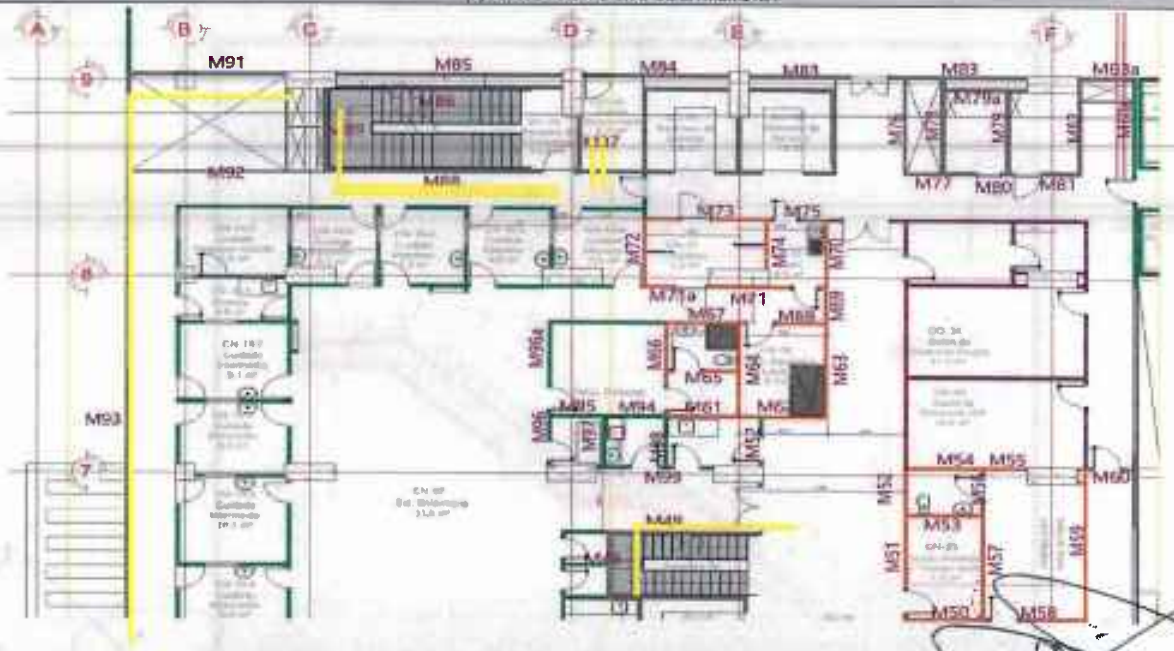

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	6	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ESCALERA EC 03

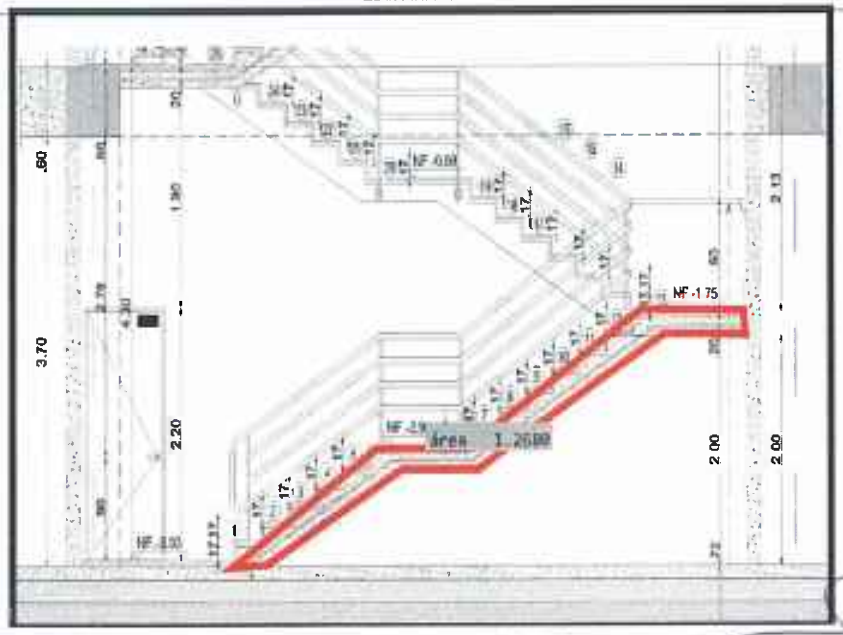

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) Largo	(I) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 5			
M50	7,83	4,30		33,58	1,00	33,58
	1,75	0,60		1,05	-1,00	-1,05
	1,00	2,28		2,28	-1,00	-2,28
				1,27	-1,00	-1,27
M51	2,91	4,30		12,60	1,00	12,60
M50	7,58	3,00		22,74	1,00	22,74
M52	1,85	3,70		7,22	1,00	7,22
	1,55	3,00		5,85	1,00	5,85
M54	4,67	2,83		13,22	1,00	13,22
	1,30	0,45		0,59	-1,00	-0,59
M55	2,46	2,83		6,96	1,00	6,96
			SUB TOTAL			96,98
			MENOS			837,06
			TOTAL			934,04

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

[d] PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

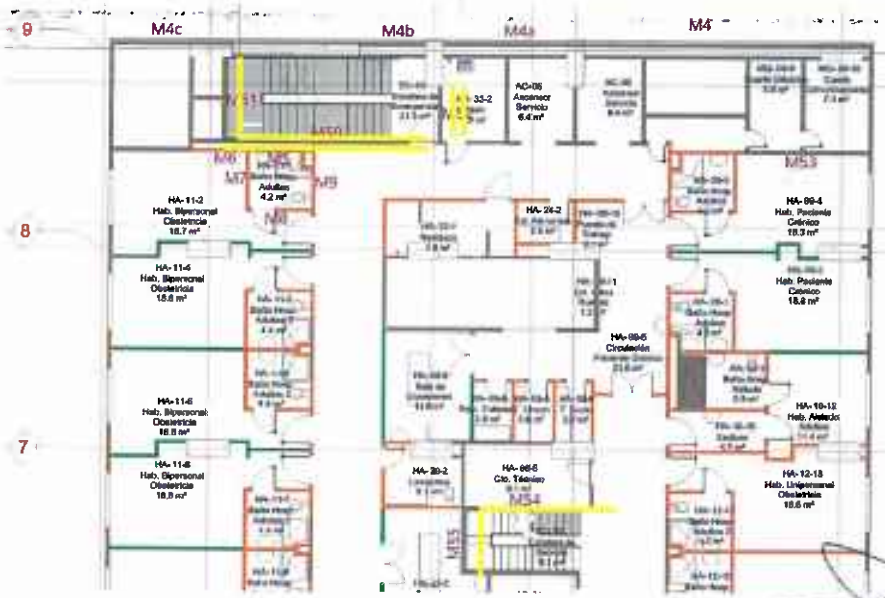

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

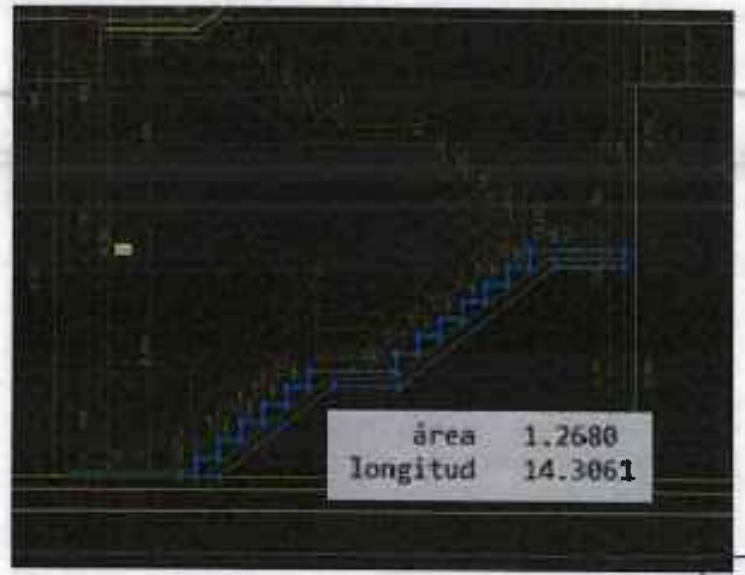

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	ENERO 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(d) ITEM Nº:	9.1.1	(h) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(i) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN

	(a) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) Longitud, diámetro, altura o cantidad	(j) MEDIDA PARCIAL (m)	(i) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1					
1	M101-M105-M103a-M107a	Circulación Urgencias	1.20	3.00	2.56	19.82	1.00	19.82
2	M101-M214-M209-M213	Sala Espera	8.41	3.00	3.15	22.38	1.00	22.38
3	M101-M103-M107-M105-M214-M213	Circulación Urgencias	10.80	3.00	11.95	20.75	1.00	20.75
4	M101-M217	Sala de espera pediatría	5.50	3.00		16.50	1.00	16.50
10	M103a-M106	Sala de espera pediatría	4.84	2.93	4.75	9.93	1.00	9.93
11	M177-M178-M179-M180-M181	Tinaja pediatría	14.02	2.93	4.70	36.12	1.00	36.12
12	M174-M175-M177-M197-M198a-M180	Circulación pediatría	17.59	2.93	5.90	42.95	1.00	42.95
13	M183-M175-M172-M197-M174-M173-M184	Circulación pediatría	12.60	2.93	9.72	27.07	1.00	27.07
14	M184-M185-M183-M202	Cuarto Urgencias	14.80	2.93	6.11	30.95	1.00	30.95
15	M184-M185-M183a-M186	Aseo, control enfermería	13.04	2.93	4.59	26.83	1.00	26.83
31	M186	Pasillo	3.60	2.93	2.85	8.11	1.00	8.11
30	M186a	Pasillo	1.17	2.93	2.85	1.26	1.00	1.26
32	M187-M219-M182-183	Aseos, control enfermería	12.80	2.93		36.43	1.00	36.43
33	190	Pasillo	3.40	2.93		9.96	1.00	9.96
34	M184-M187-M186	Circulación Urgencias	9.80	2.93	6.84	21.56	1.00	21.56
35	M187-M186	Circulación Urgencias	8.33	2.93	2.85	24.12	1.00	24.12
36	M184-M186-Cuarto 3/8	Cuarto Urgencias/Aislados	7.80	2.93	2.29	19.34	1.00	19.34
37	M175-M194-M183-M190		18.86	4.00	2.28	60.03	1.00	60.03
38	M189-M190-M140-M141	Pasillo	10.69	2.93	1.63	19.47	1.00	19.47
39	M103a	Escalera de servicio - PISO	4.21	2.93	1.27	10.64	1.00	10.64
40	M107a	Escalera de servicio - PISO	2.40	2.93		6.96	1.00	6.96
41	M140-M186	UCI - Aseo	8.21	2.93		20.23	1.00	20.23
42	M140-M144	Circulación Emergencias	6.24	2.93	1.42	16.80	1.00	16.80
43	M144-M213-M212	Est. Camillas-sillas	5.06	2.93		14.69	1.00	14.69
44	M140-M213-M212	Cuarto de pacientes	8.00	2.93		23.72	1.00	23.72
45	M101-M103-M107-M105-M214-M213	Emergencias Pediatría	14.23	2.93	3.42	37.13	1.00	37.13
46	M140-M187	Pre-Pediatría	5.10	2.93		17.43	1.00	17.43
47	M103	Enfermería	2.79	2.93	4.03	3.79	1.00	4.04
48	M103	Enfermería	1.77	2.93		4.04	1.00	4.04
49	Cubierta ESE M103		1.77	2.93		19.12	1.00	19.12
27	M101-M103-M105-M104	T. Izquierda	2.19	2.93	2.05	18.84	1.00	18.84
28	M103-M105-M104-M107	T. Largos	2.19	2.93	2.05		1.00	

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL								

CONTRATO Nº:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	ENERO 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM Nº:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros					(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

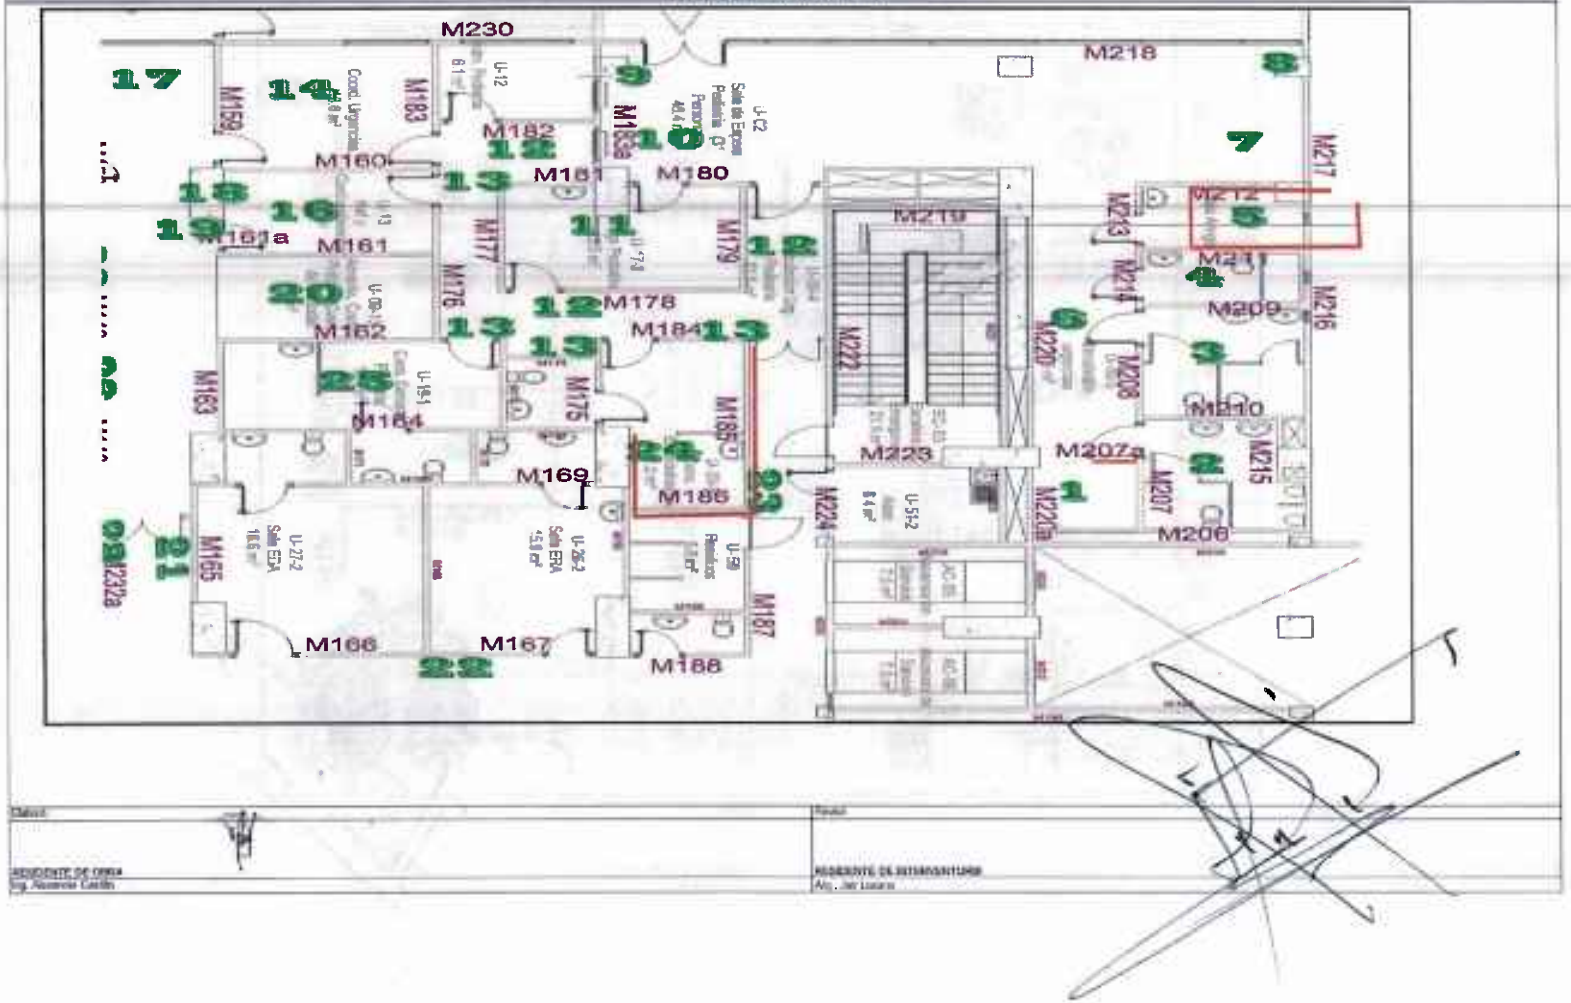

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Rosmine Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
					FA-FO-30		
					Versión: 05	Página 1 de 1	
					Fecha: 5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

CONTRATO Nº:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	ENERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTIVO 2023						
(a) ITEM Nº:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(e) PLANO DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD

	(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			(f) Ancho	(g) Altura	Descuento vigas/columnas - vanos - nueva losa			
	PISO 1							
38	M1/24-M1/25-M1/C	Circulación zona general	13.53	2.83	5.86	30.09	1.00	30.09
39	M1/25-M1/25-M1/24-M1/24-M1/C-M1/C-M1/B-M1/B	Rectificación Ascensor	15.60	2.83	5.46	49.69	1.00	49.69
41	M1/22-M1/19-Colum D5-M1/20	Fachada Oriental	11.41	2.83	2.47	79.92	1.00	28.03
42	M1/7-M1/5-M1/7-M1/4-M1/5	Circulación	13.53	2.83	7.30	70.09	1.00	30.09
43	M1/5-M1/4-M1/5-Colum D5	3.77 - 2.83 T. Lenga	3.77	2.83	2.30	14.26	1.00	14.26
44	M1/4-M1/3-M1/3-M1/2	0.90 - 2.83 Lenga	0.90	2.83	0.29	24.09	1.00	24.09
45	M1/3-M1/1-M1/3-M1/2	0.90-2 Consult. Especial	15.53	2.83	4.29	39.98	1.00	39.98
46	M1/3-M1/1-M1/3-M1/2	0.90-2 Consult. Especial	14.00	2.83	4.56	37.55	1.00	37.55
48	M1/C-M1/B-M1/C	Triage Adultos	13.89	2.83	6.39	39.68	1.00	39.68
47	M1/C-M1/C-M1/B-M1/B-M1/C-M1/C-M1/B-M1/B	Pasillo consultorios - especialidades	23.64	2.83	10.25	66.94	1.00	66.94
49	M1/21-M1/24-M1/1	Sala de espera Adultos	12.67	2.83	1.34	34.52	1.00	34.52
50	M1/1-M1/5	Pasillo	6.31	2.83	4.56	12.45	1.00	12.45
51	M1/1	Sala de espera Adultos	5.73	2.83	2.28	11.96	1.00	11.96
52	Colum C1-M1/7, M1/4-M1/2	Pasillo	6.59	2.83		18.66	1.00	18.66
53	M1/4-M1/3-Colum C2	Sala de espera Adultos	8.71	2.83	3.47	32.19	1.00	32.19
54	Colum C3- M1/21	Pasillo	2.29	2.83		6.48	1.00	6.48
55	M1/21-M1/21-M1/17	Aseo Adultos	13.47	2.83	4.52	33.60	1.00	33.60
56	M1/20-M1/1-M1/3-M1/4	Sala de espera Infancia	11.67	2.83	2.91	30.03	1.00	30.03
58	M1/C-M1/A-M1/4-M1/5-M1/5-M1/C-M1/4-M1/4b	Pasillo consultorios - especialidades	13.83	2.83	11.17	27.46	1.00	27.46

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	PA-FO-30			
			0	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO 2025
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCOASTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

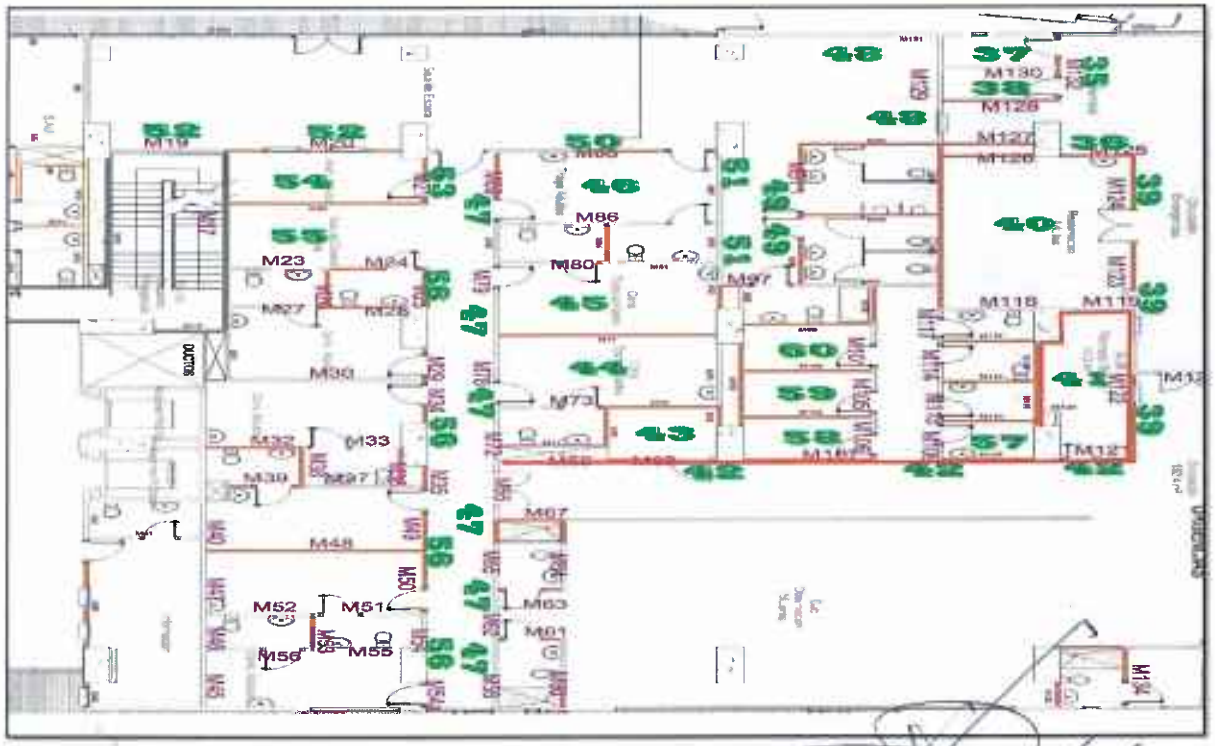

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 4	
		Fecha:			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO O DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	Descuento espacios (Area - cmas) puerta (total)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			RSO 1					
37	M230	U-12 Adm. Pediatrica	2,77	2,83	2,65	5,24	1,00	5,24
38	M191	Pasillo	3,00	2,83		8,49	1,00	8,49
39	M142	U-48 Obs. Pediatrica	8,05	2,83		22,78	1,00	22,78
40	M191-M198-M192	R. Sucio - Obs Pediatrica	5,33	2,83		15,08	1,00	15,08
41	M192-M196-M193-M197b	R. Limpio - Obs Pediatrica	6,59	2,83	2,45	16,20	1,00	16,20
42	M192-M196-M194-M197c	T.Limpio - Obs Pediatrica	6,59	2,83	2,45	16,20	1,00	16,20
43	M194-M196-M195-M197a	T.Sucio - Obs Pediatrica	6,59	2,83	2,05	16,62	1,00	16,62
44	M199	U-46 Obs. Pediatrica	4,06	2,83		11,49	1,00	11,49
45	M228	U-46 Obs. Pediatrica	1,52	2,83		4,30	1,00	4,30
47	M141-M141a-M142-M139	U-43 Obs. Hombres	8,07	2,83	4,26	18,58	1,00	18,58
48	M137	U-43 Obs. Hombres	1,06	2,83		2,97	1,00	2,97
70	M136	U-43 Obs. Hombres	6,55	2,83	2,33	16,00	1,00	16,00
71	M137- M136- M59	Esclusa	5,25	2,83	0,21	14,65	1,00	14,65
72	M136-M59-M134	U-48-2 Obs. Aislados	8,56	2,83	6,44	17,78	1,00	17,78
74	M121	U-38 Farmacia Satelite	1,27	2,83	2,26	0,77	1,00	0,77
75	M143-M144-M151-M154-M147-M148	U-24-Procedimientos	19,40	2,83	3,27	51,63	1,00	51,63
76	M128-M129-M127	U-13-1 Enfermeria	6,51	2,83		18,42	1,00	18,42
80	M60-M61	U-40 Obs Mujeres	4,45	2,83	2,22	10,38	1,00	10,38
81	M62	U-40 Obs Mujeres	2,04	2,83		5,77	1,00	5,77
82	M63-M64	U-40 Obs Mujeres	2,28	2,83	2,38	4,10	1,00	4,10
83	M45-M56-M55-M54a	U-18-10 Consul Adultos	12,73	2,83	7,75	28,32	1,00	28,32
84	M51-M52-M47-M46-M50	U-18-7 Consul Adultos	14,86	2,83	4,52	37,67	1,00	37,67
85	M40-M49-M48-M37-M39	U-18-6 Consul Adultos	13,40	2,83	4,22	33,79	1,00	33,79
87	M32-M33-M36-M30	U-18-3 Consul Adultos	10,74	2,83	4,40	25,96	1,00	25,96
89	M30-M29-M28-M27	U-18-1 Consul Adultos	9,55	2,83	4,60	22,43	1,00	22,43
93	M4	U-01 Sala de espera Adultos	2,70	2,83		7,64	1,00	7,64
95	M14	Escalera de emergencia	5,69	3,70		21,05	1,00	21,05
96	M223	U-51-2 Aseo	1,94	3,00		5,82	1,00	5,82
						SUBTOTAL FEBRERO		466,11
						VIENE SUBTOTAL DICIEMBRE		534,04
						VIENE SUBTOTAL ENERO		1239,43
						TOTAL ACTA		2833,58

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

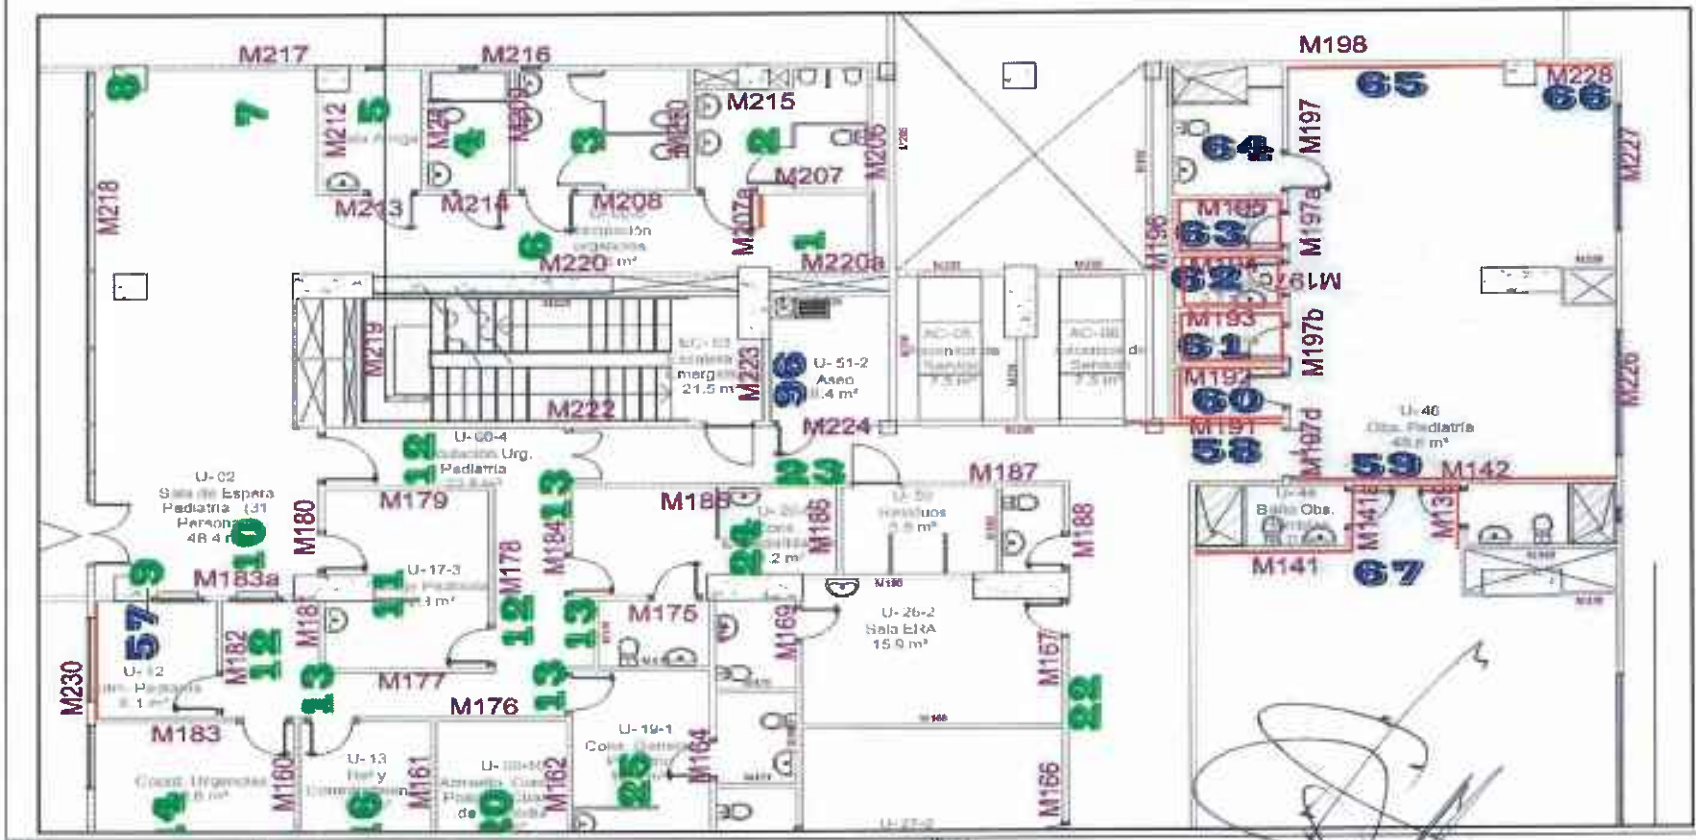

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

PA-FO-30

Versión No. 08		Página 1 de 1	
Fecha:	8	4	2025

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM Nº:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior lisa muros				(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

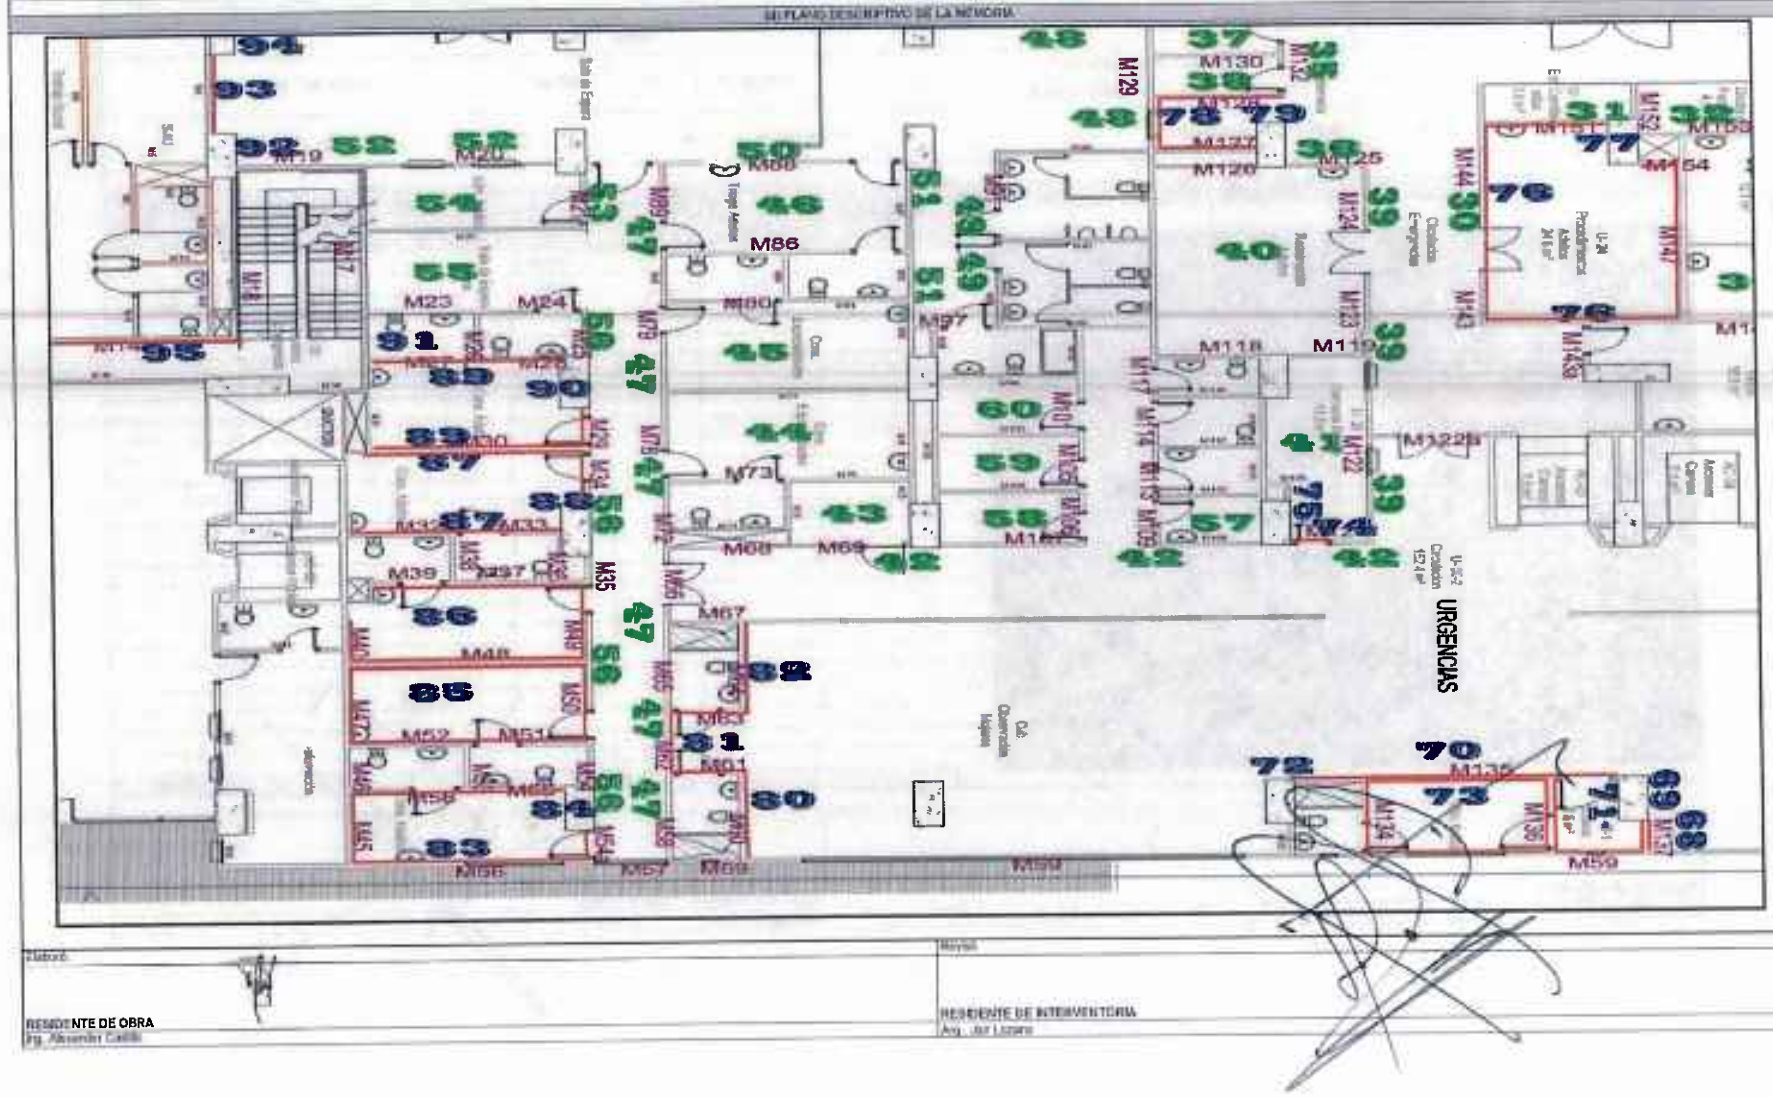

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lizarazo

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página: 1 de 4		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 2			
M217	0,15		15,00		1,00	15,00
	0,92		15,00		1,00	15,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No: 00	Página 1 de 1
		Fecha: 8	4 2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ALA DE HOSPITALIZACION DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
ITEM N°:	9.1.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

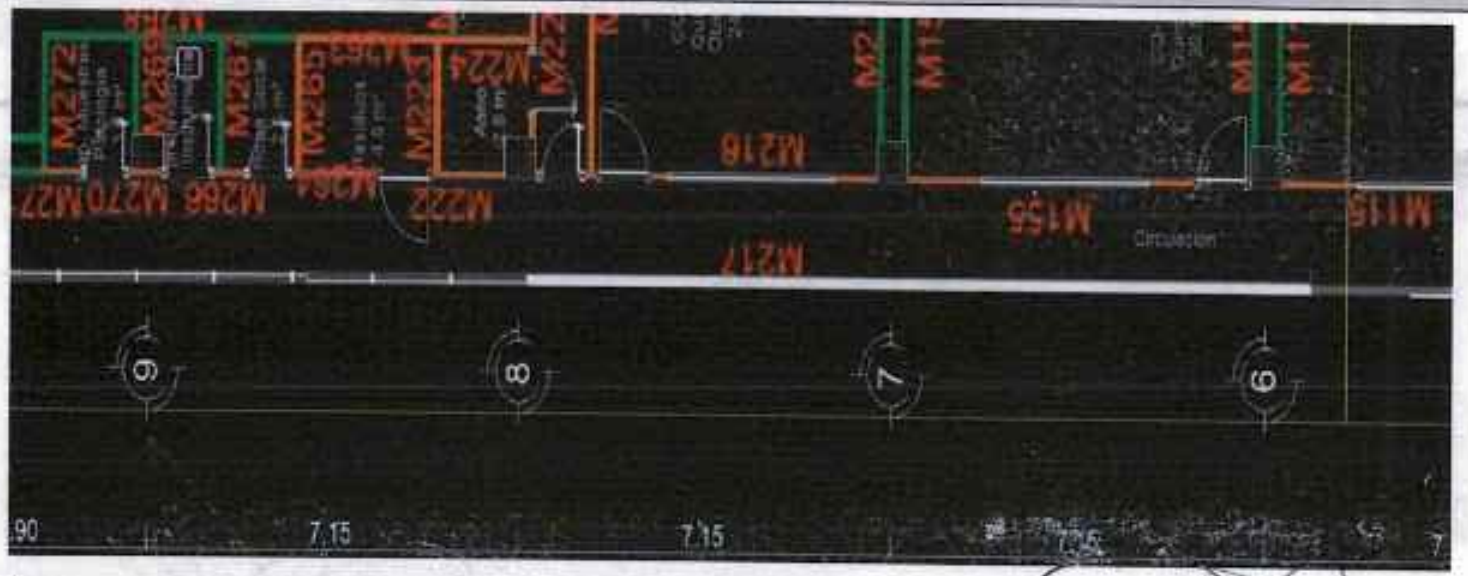

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
	PISO 3						
	M93	0,15		18,90		1,00	18,90
		0,32		18,90		1,00	18,90
	SUB TOTAL						37,80
	VIENEN						30,00
	TOTAL						67,80

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE IIARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.1.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

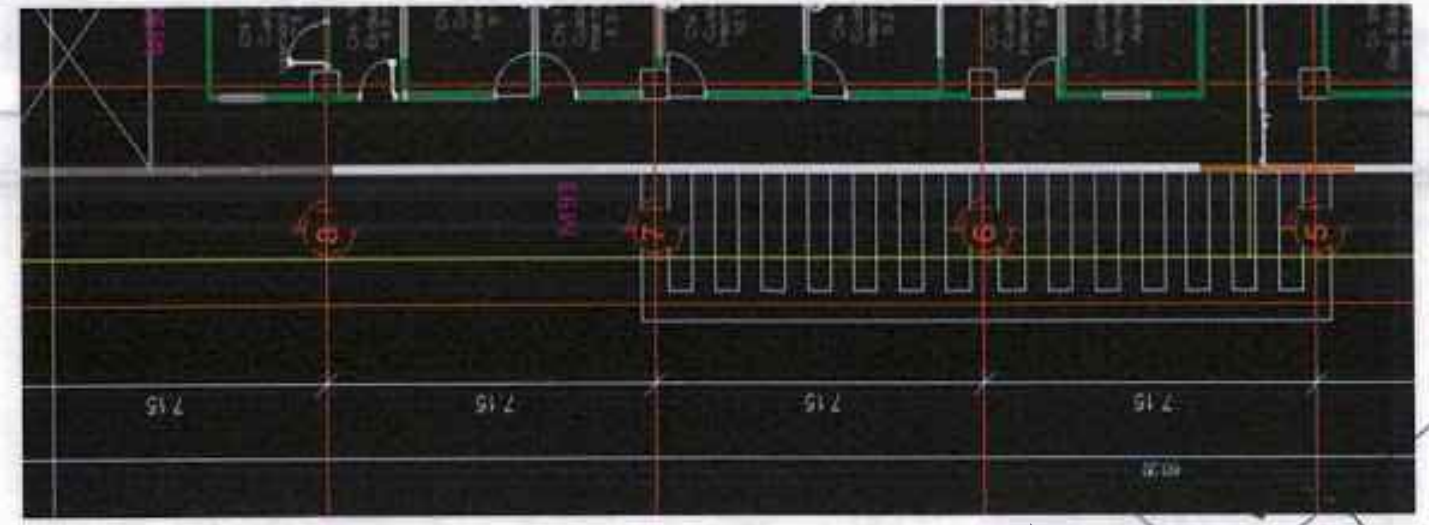

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	PISO 1						
2	M215	0,48		2,83		1,00	3,00
3	M214	0,26		2,83		1,00	2,83
7	M218	0,49		10,19		1,00	10,19
9	M180	0,08		2,28		2,00	4,56
10	M178	0,18		2,28		1,00	2,28
11	M162	0,18		2,28		1,00	2,28
		0,08		2,28		2,00	4,56
12	M184	0,18		2,28		1,00	2,28
16	M161a	0,18		2,28		2,00	4,56
		0,08		2,28		2,00	4,56
19	M159	0,08		2,28		2,00	4,56
20	M160	0,08		2,28		2,00	4,56
		0,26		2,83		1,00	2,83
21	M231a	0,08		2,28		2,00	4,56
22	M143a	0,08		2,28		2,00	4,56
24	M132	0,08		2,28		2,00	4,56
		0,34		2,28		1,00	2,28
25	M132	0,34		2,28		1,00	2,28
		0,19		2,28		1,00	2,28
		0,08		2,28		1,00	2,28
31	M86	0,15		2,28		2,00	4,56
32	M82	0,15		2,28		1,00	2,28
33	M85	0,15		2,28		2,00	4,56
34	M85	0,08		2,28		1,00	2,28
34	M79	0,08		2,28		1,00	2,28
				PASAN			89,63

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

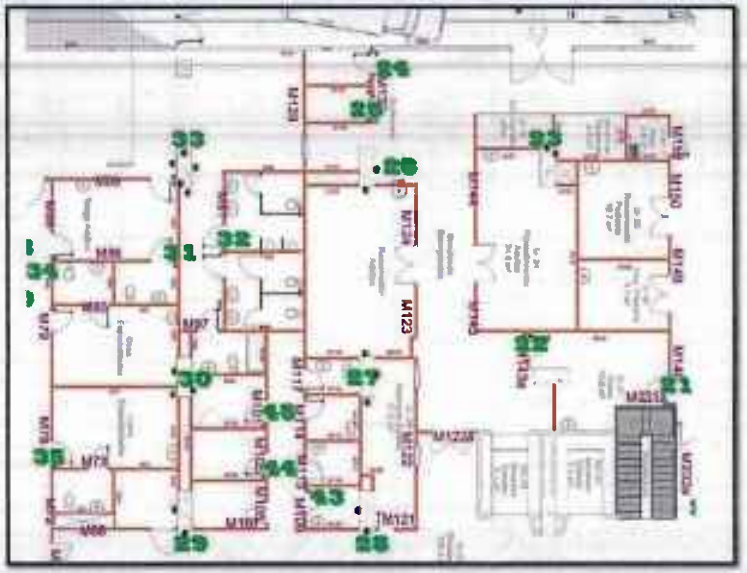

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1					
35	M7I	0,08		2,28		1,00	2,28
37	M19-M20	0,10		2,83		1,00	2,83
38	M121	0,15		2,28		1,00	2,28
		0,08		2,28		1,00	2,28
39	M24	0,15		2,28		1,00	2,28
40	M29	0,20		2,28		2,00	4,56
43	M110	0,08		2,28		1,00	2,28
44	M105	0,08		2,28		1,00	2,28
45	M101	0,08		2,28		1,00	2,28
					SUB TOTAL		23,35
					VIENEN		89,63
					TOTAL		112,98

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 4	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

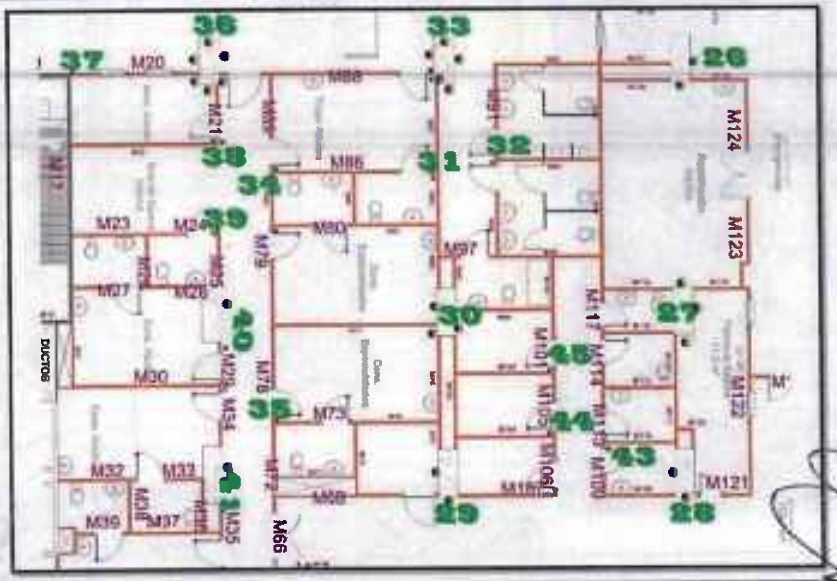

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Carrillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30 | Versión No. 00 | Página 1 de 4 | Fecha: 5 4 2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

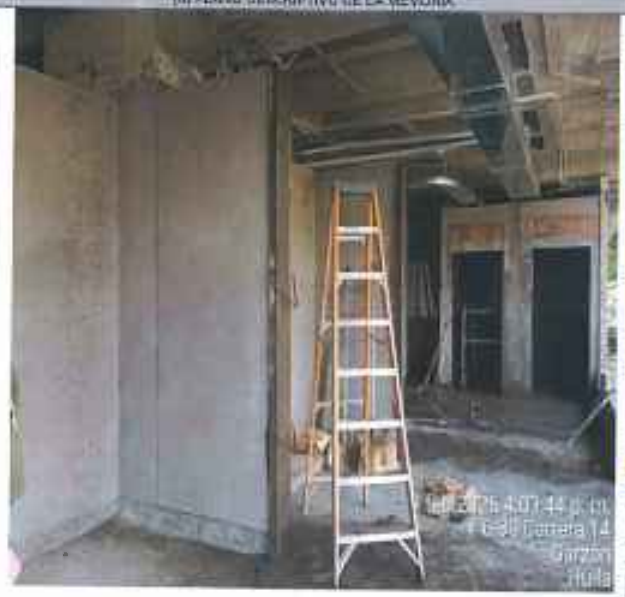

	(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Long	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1					
45	M121	Columna EE	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
46	M139	Obs. Aislado	0,10	2,28	2,28	2,00	4,56
47	M134	Obs. Aislado	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
48	M141a	U-43 Obs. Hombres	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
49	M139	U-43 Obs. Hombres	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
50	M197a	U-46 Obs. Pediatria	0,42	2,28	2,28	1,00	2,28
51	M197b	U-46 Obs. Pediatria	0,25	2,28	2,28	1,00	2,28
			0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
52	M197b	U-46 Obs. Pediatria	0,25	2,28	2,28	2,00	4,56
53	M197a	U-46 Obs. Pediatria	0,28	2,28	2,28	1,00	2,28
			0,10	2,28	2,28	2,00	4,56
54	M197a	U-46 Obs. Pediatria	0,28	2,28	2,28	2,00	4,56
			0,44	2,28	2,28	2,00	4,56
55	M01	U-40 Obs Mujeres	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
56	M03	U-40 Obs Mujeres	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
59	M54a	U-18-10 Consul Adultos	0,10	2,28	2,28	2,00	4,56
60	M50	U-18-7 Consul Adultos	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
63	M29	U-18-1 Consul Adultos	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
		U-18-1 Consul Adultos	0,26	2,28	2,28	1,00	2,28
	M34	U-18-7 Consul Adultos	0,10	2,28	2,28	1,00	2,28
64	M4	U-01 Sala de espera Adultos	0,56	2,83	2,83	1,00	2,83
65	M234	U-01 Sala de espera Adultos	0,47	4,82	4,82	1,00	4,82
		SUBTOTAL FEBRERO					56,72
		VIENE SUBTOTAL MES ANT					67,66
		VIENE SUBTOTAL ENERO					110,88
		TOTAL ACTA					247,41

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Joel [illegible]

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

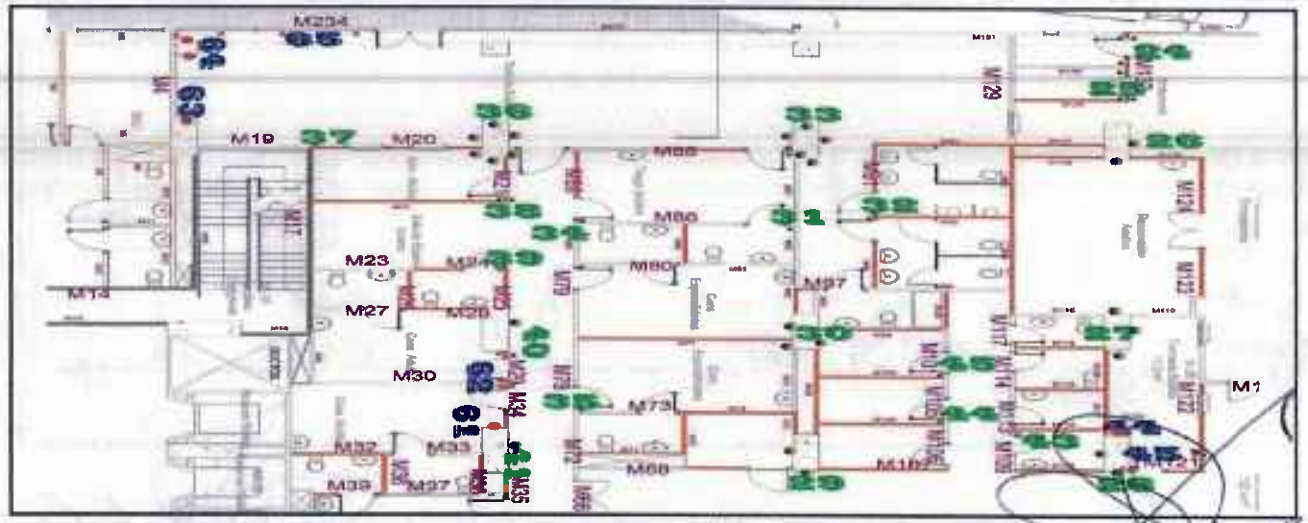

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA:	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete interior liso muros			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

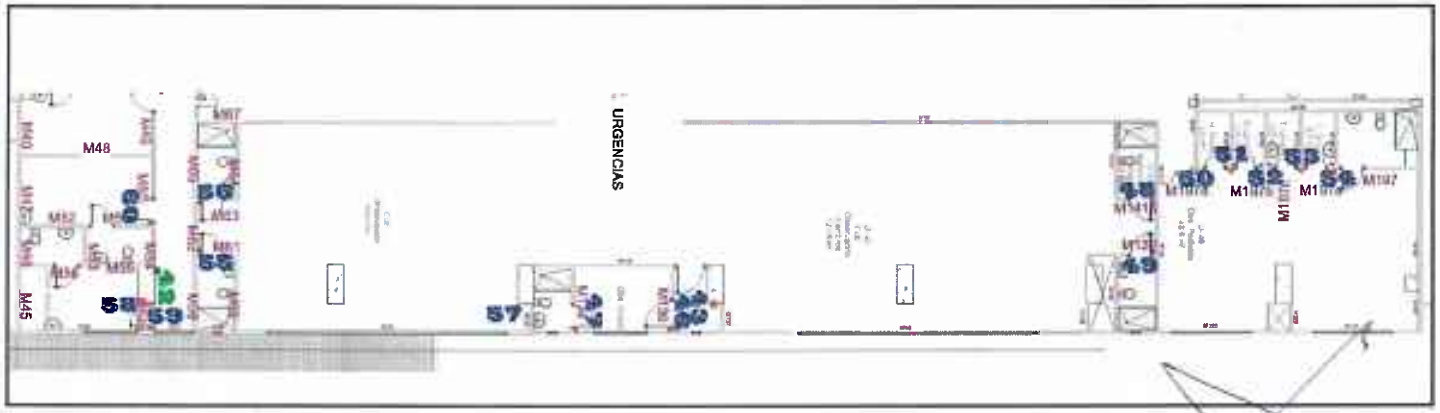

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 4		
		Fecha	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO				
COLUMNA D7	1,70	3,00		5,10	1,00	5,10
COLUMNA F2	1,40	2,83		3,96	1,00	5,96
COLUMNA E8	1,80	2,83		5,09	1,00	5,09
M105	1,84	3,00		5,52	1,00	5,52
M108	1,44	3,00		4,32	1,00	4,32
M109	1,84	3,00		5,52	1,00	5,52
M104	1,44	3,00		4,32	1,00	4,32
	0,90	2,20		1,98	1,00	1,98
COLUMNA A4	0,58	2,83		1,64	1,00	1,64
			PASAN			23,30

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00	Página 1 de 1			
		Fecha	5	4	2025	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

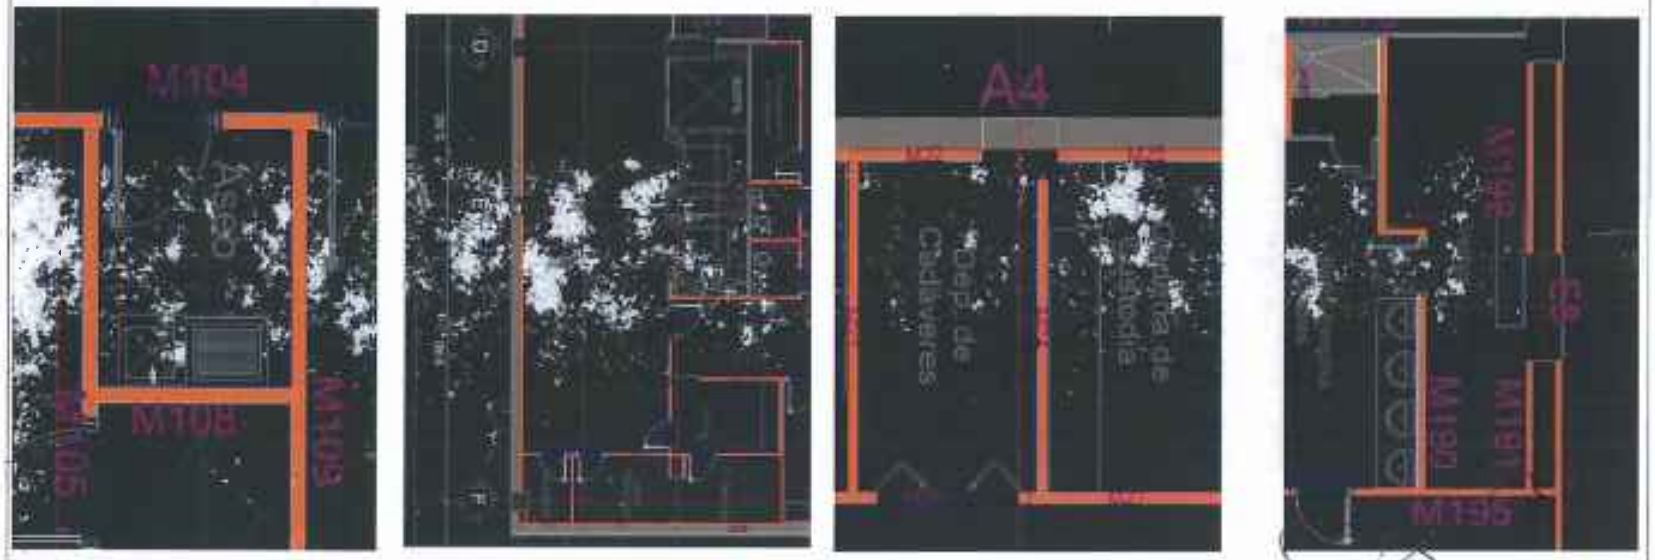

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	17	**FECHA :**	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	**DESCRIPCION ITEM**	Pañete impermeabilizado (duchas)			**UND:**	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		FISO 1				
M217-M216	16,00	5,40		78,84	1,00	78,84
	2,33	0,45		0,16	-3,00	-0,47

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

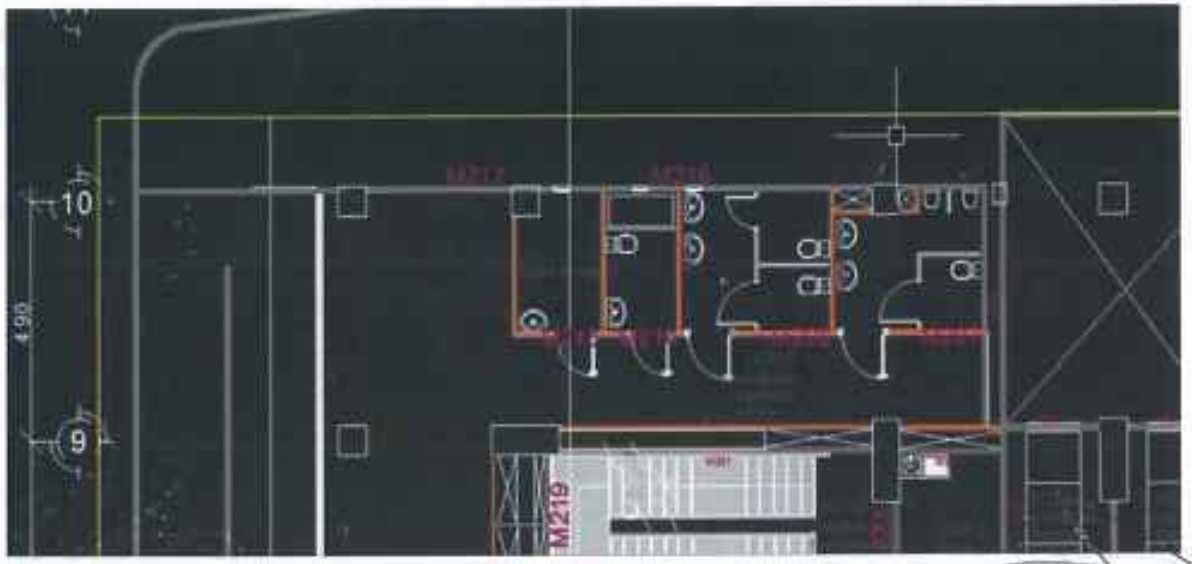

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
MDS4 - COL 09	1,70	2,83		4,81	1,00	4,81
			SUB TOTAL			4,81
			VIENEN			111,86
			PASAN			116,68

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castaño	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

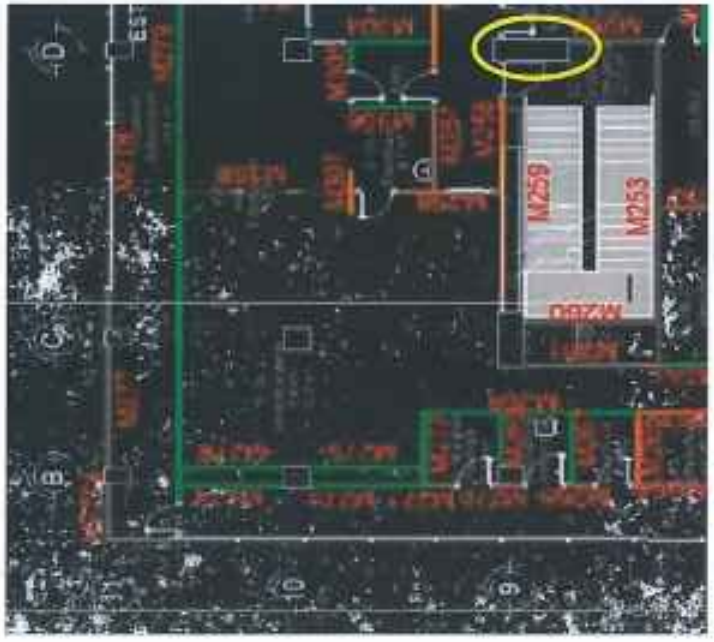

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	3	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 3			
M187-COLUM D9	1,70	2,83		4,81	1,00	4,81
M91 - COLUMN C8	6,30	4,30		27,09	1,00	27,09
M85	6,83	4,30		29,46	1,00	29,46
COLUMNA D9	0,60	4,30		2,58	1,00	2,58
M84	4,40	4,30		18,92	1,00	18,92
	0,90	2,20		1,98	-1,00	-1,98
COLUMNA E9	0,60	4,30		2,58	1,00	2,58
M83	8,35	4,30		35,91	1,00	35,91
	1,20	2,20		2,64	-1,00	-2,64
COLUMNA F9	1,50	4,30		6,45	1,00	6,45
M83a	1,75	4,30		7,53	1,00	7,53
			SUB TOTAL			130,70
			VIENEN			116,68
			PASAN			247,37

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Javier Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:			2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

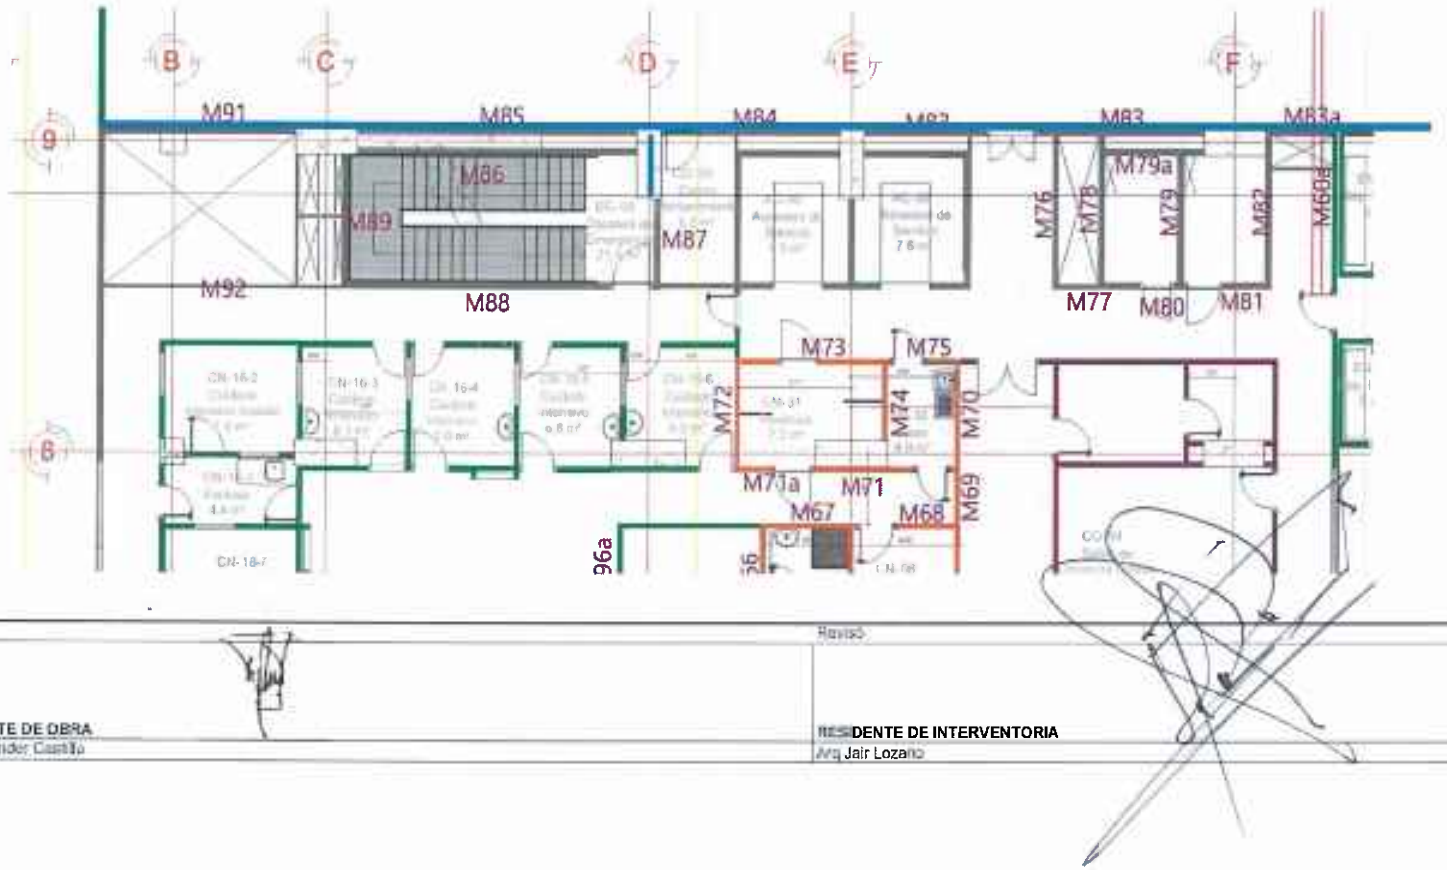

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 4						
M4	55,85	0,90		50,27		50,27
M80	55,85	0,90		50,27		50,27
SUB TOTAL						100,53
VIENEN						247,37
PASAN						347,90

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE DESARROLLO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2022

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

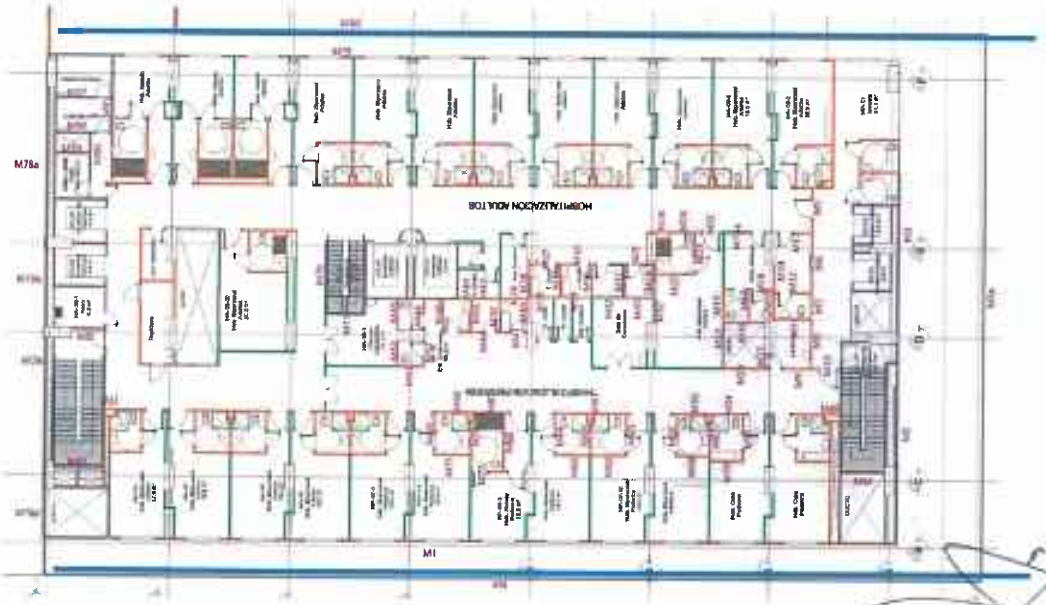

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

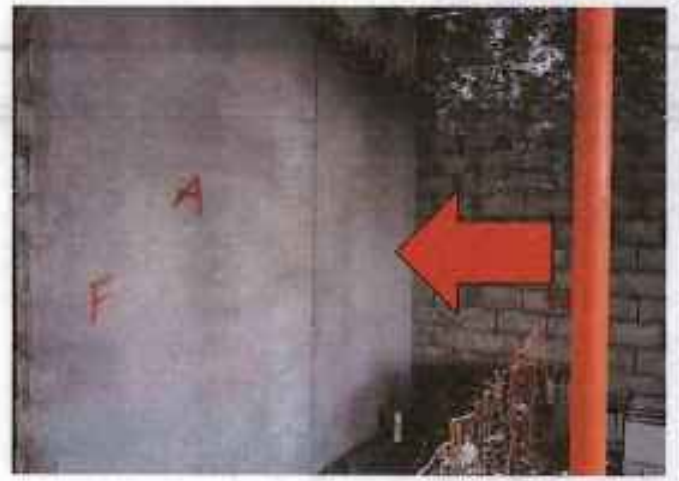

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 5				
COLUMNA D9	1,55	3,00		4,65	1,00	4,65
					SUB TOTAL	4,65
					VIENEN	347,90
					TOTAL	352,55

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ars Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 02		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.1	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

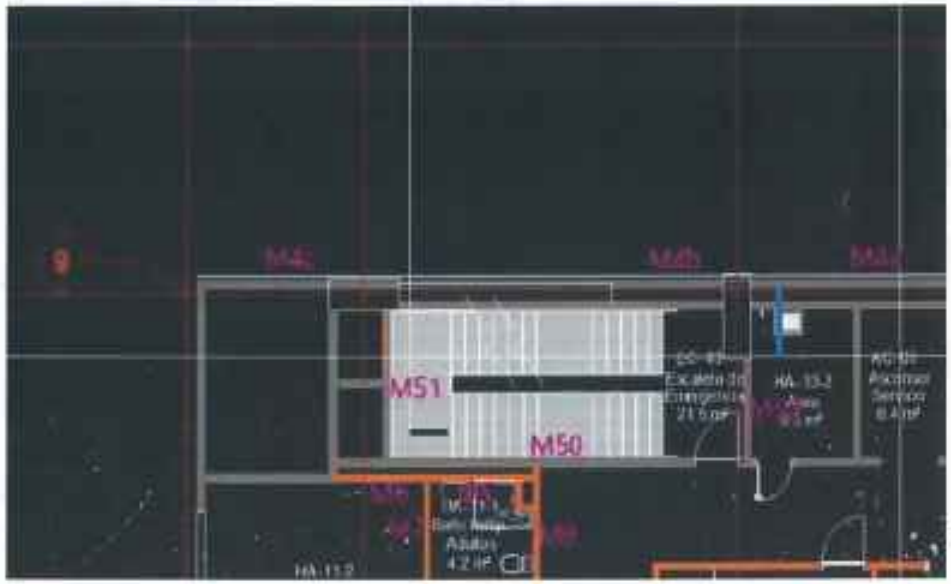

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE Nº:**	**17**	**FECHA :**	**ENERO DE 2026**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
(a) ITEM Nº:	**9.2.1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**Pañete impermeabilizado (duchas)**			**(c) UND:**	**M2**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	Descuentos	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1					
2	M210-M211-M214-M206-M207	Baño Urg. Hombres	11,66	3,00	2,81	22,47	1,00	22,47
3	M209-M216-M210-M208	Baño Urg. Mujeres	12,18	3,00	3,75	33,33	1,00	33,33
4	M211-M216-M209-M214	Baño Familiar	8,78	3,00	3,15	23,13	1,00	23,13
5	COLUMNA C6		1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
6	COLUMNA D10		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
7	COLUMNA B6		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
8	COLUMNA C8		2,44	2,83		6,91	1,00	6,91
13	COLUMNA D6		1,80	2,83		5,09	1,00	5,09
14	COLUMNA E8		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
15	COLUMNA D7		1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
17	COLUMNA E7		1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
18	COLUMNA C7		1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
			1,38	2,83		3,93	1,00	3,93
26	COLUMNA C5		1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
			0,60	2,83		1,70	0,00	0,00
27	COLUMNA D5		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
			1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
28	COLUMNA E5		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
			1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
29	COLUMNA E4		0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
30	COLUMNA D4		1,06	2,83		3,00	1,00	3,00
			0,77	2,83		2,18	1,00	2,18
33	COLUMNA C4		1,13	2,83		3,20	1,00	3,20
			0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
			1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
34	COLUMNA C3		1,10	2,83		3,11	1,00	3,11
				2,83		0,00	0,00	0,00
			1,13	2,83		3,20	1,00	3,20
40	COLUMNA D3		1,80	2,83		5,09	1,00	5,09
41	COLUMNA E3		1,80	2,83		5,09	1,00	5,09
42	COLUMNA F3		1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
43	M89-M90-M74-M75- Cuarto Eléctrico	U37-Residuos	9,18	3,00	2,29	25,26	1,00	25,26
					PASAN			176,83

NOTA ACLARATORIA: DE ACUERDO A LO PACTADO ENTRE EL RESIDENTE DE OBRA Y EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, DE ACUERDO EL COBRO DEL PAÑETE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) POR ESTE ITEM, DEBIDO A QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ES NECESARIO UTILIZAR UN ADITIVO (EUCOLATEX) PARA GENERAR LA ADHERENCIA DEL PAÑETE AL ELEMENTO (ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO).

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	202

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTÁL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

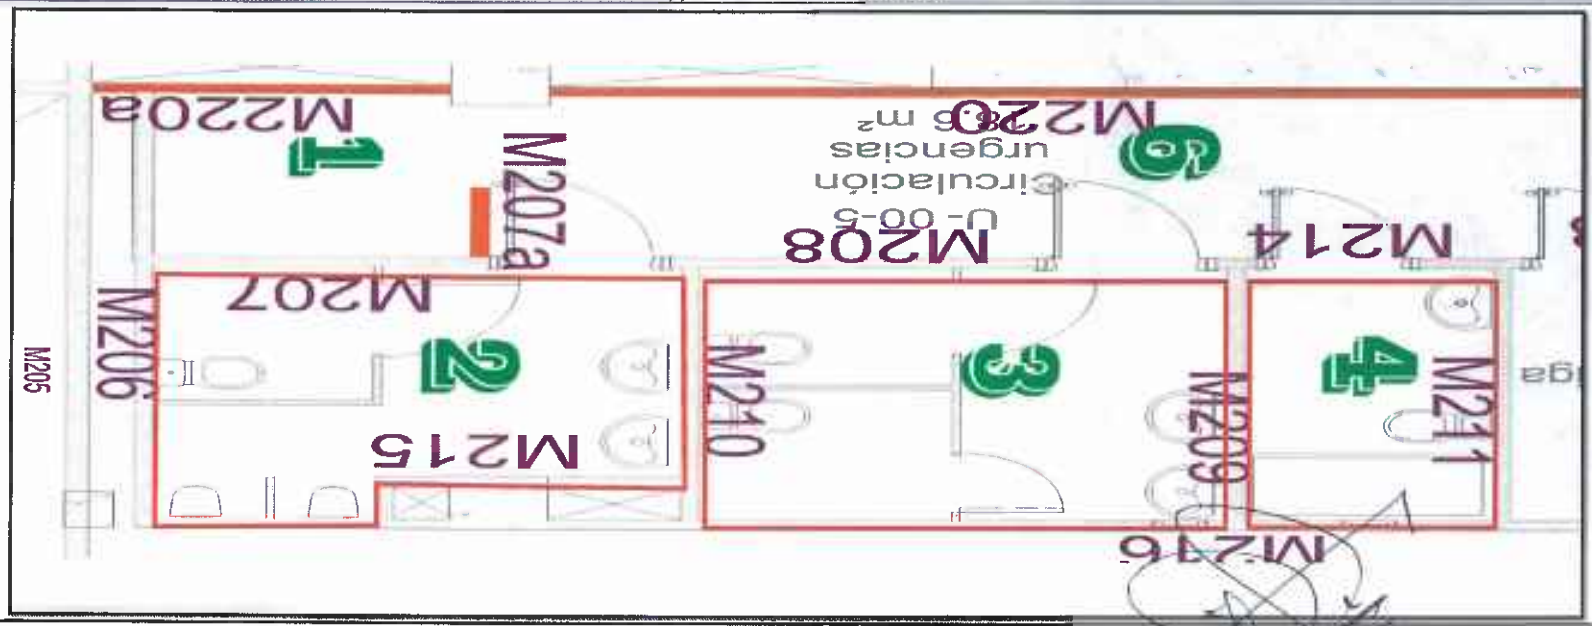

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

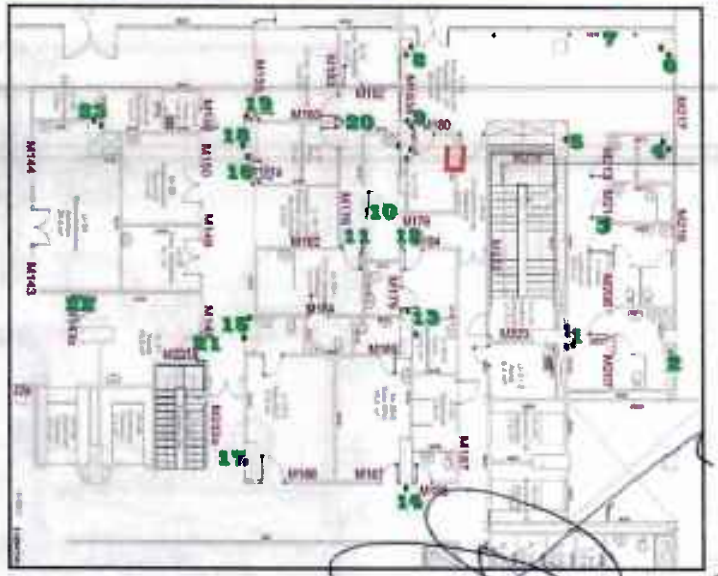

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 06		Página 1 de 4		
		Fecha	3	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

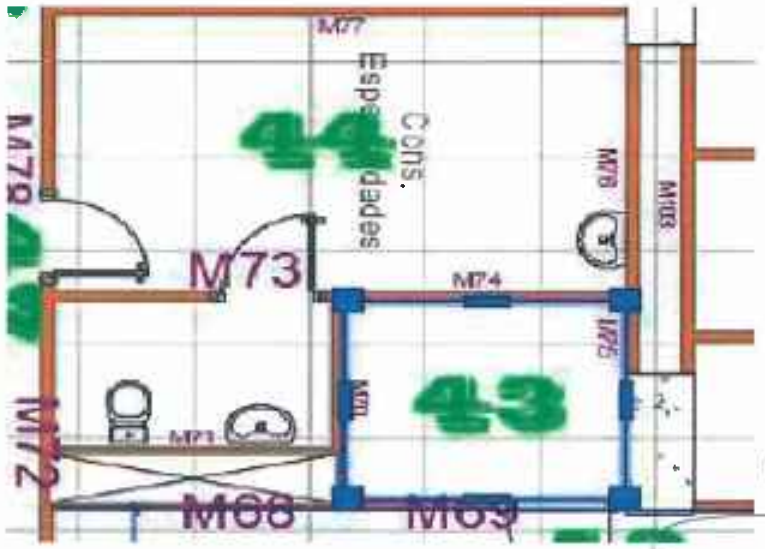

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Linares

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
FACHADA CALLE 6							
PISO 6							
M16		1,48	0,85		1,24	1,00	1,24
COLUMNA F9		1,50	4,30		6,45	1,00	6,45
M16		8,35	4,30		35,91	1,00	35,91
COLUMNA E9		0,60	4,30		2,58	1,00	2,58
PISO 5							
M4 - COLUMNA F9- COLUMNA E9		10,79	4,30		46,38	1,00	46,38
PISO 4							
M1 - COLUMNA F9- COLUMNA E9		10,79	4,30		46,38	1,00	46,38
PISO 3							
M1 - COLUMNA F9- COLUMNA E9		10,79	4,30		46,38	1,00	46,38
CUBIERTA							
M3		10,79	1,07		11,54	1,00	11,54
						SUB TOTAL	195,84
						VIENEN	175,83
						TOTAL	370,68

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cerón

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No.: 00		Página 1 de 1		
		Fecha:	6	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



PISO 4



PISO 3



PISO 2



PISO 1

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 07		Página 1 de 2	
		Fecha:	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)				(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

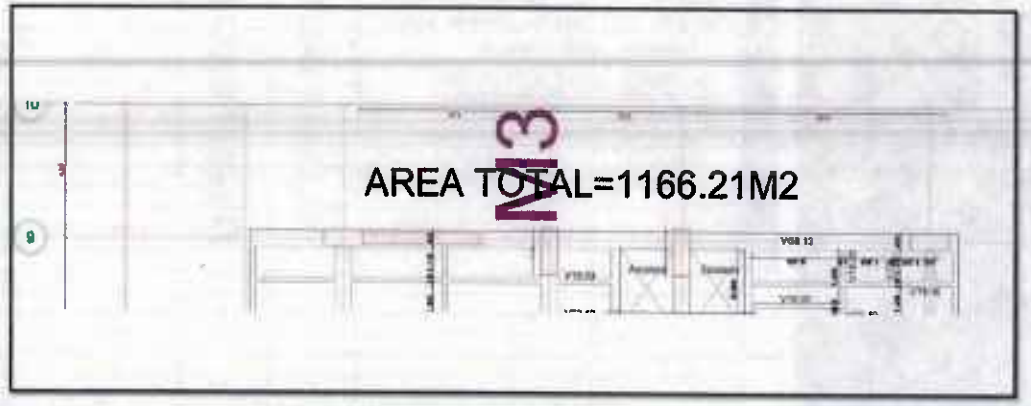

CUENTA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	D	M	AAAA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	Descuento vigas/losa/ placa - vanos puerta ventana	(i) MEDIDA PARCIAL HE	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1					
1	M197-M198	U-47 Baño pediatria	4,09	3,00		12,27	1,00	12,27
2	Columna F6	U-43 Obs. Hombres - Esclusa	2,16	2,83		5,94	1,00	5,94
3	Columna F6	U-43 Obs. Hombres - Esclusa	1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
4	Columna F5	Obs. Urgencias	2,60	2,83		1,70	1,00	1,70
5			1,50	2,83		4,25	1,00	4,25
6	Columna E5	U-38 Farmacia Satelite	1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
7	Columna C6	U-54-Procedimientos	1,98	2,83		5,60	1,00	5,60
8	Columna B5	U-13-1 Enfermeria	1,40	2,83		4,13	1,00	4,13
9	Columna F2	U-18-10 Consul Adultos	1,38	2,83		3,91	1,00	3,91
10	Columna E3	U-18-3 Consul Adultos	0,97	2,83		2,75	1,00	2,75
11	Columna D3	U-18-1 Consul Adultos	1,69	2,83				
12	M217	U-18-2 Baño Consul Utg	1,52	3,00		4,56	1,00	4,56
13	Columna C2	U-01 Sala de espera Adultos	1,10	2,83		3,11	1,00	3,11
14	Columna B2	U-01 Sala de espera Adultos	0,60	2,83		1,70	1,00	1,70
					PASAN			57,72

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

REVISO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	3	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

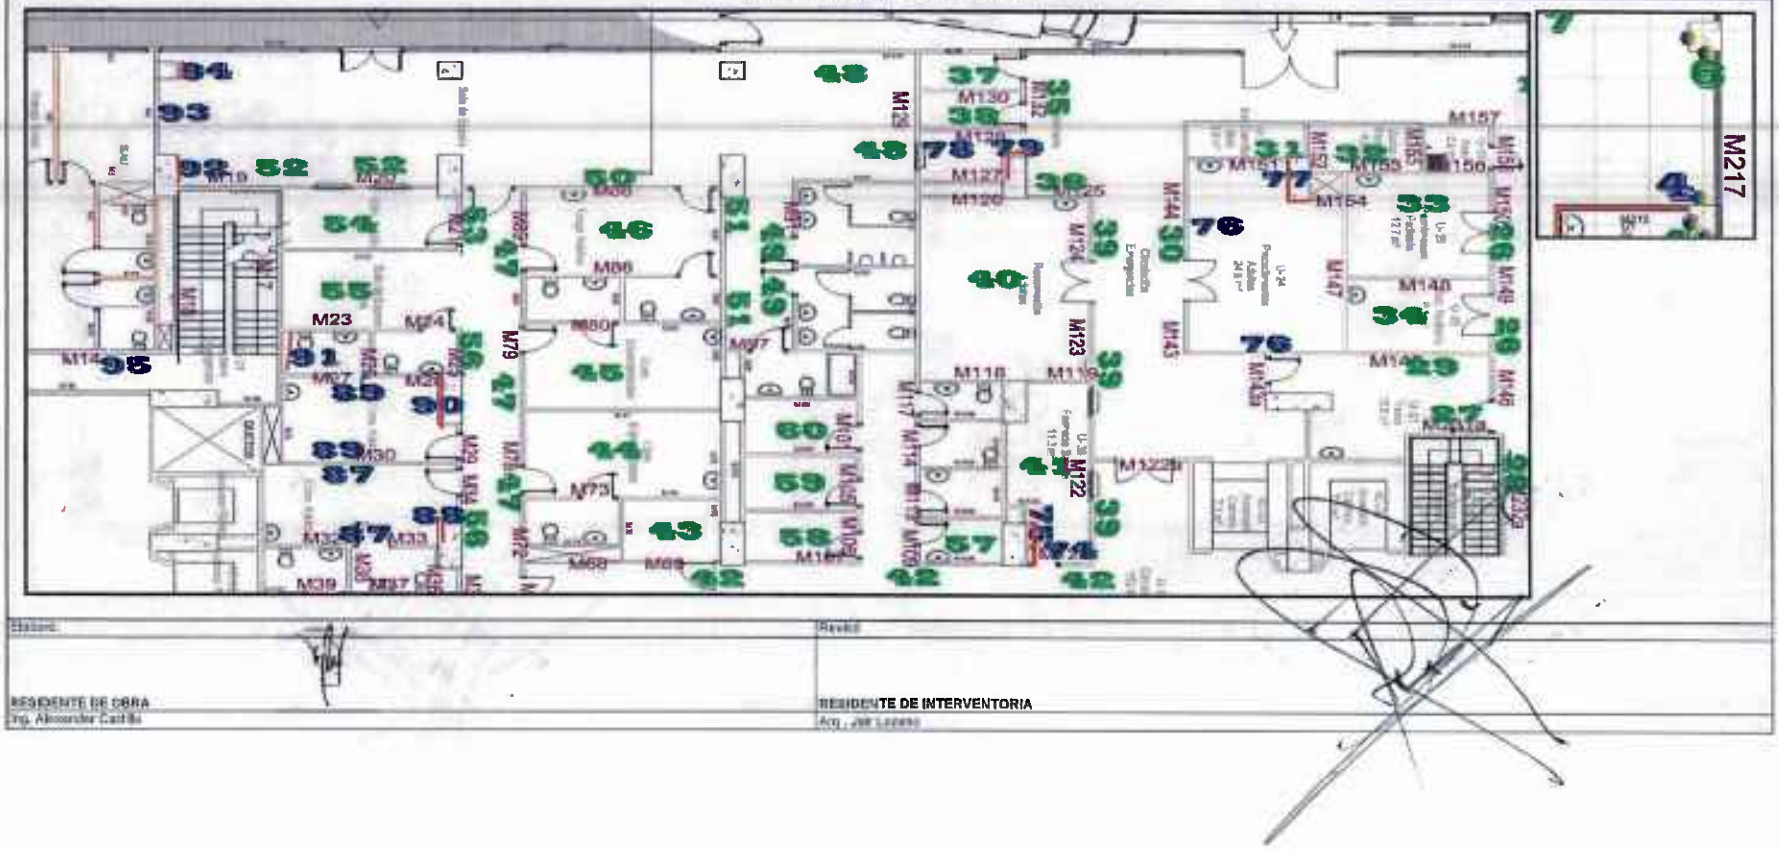

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

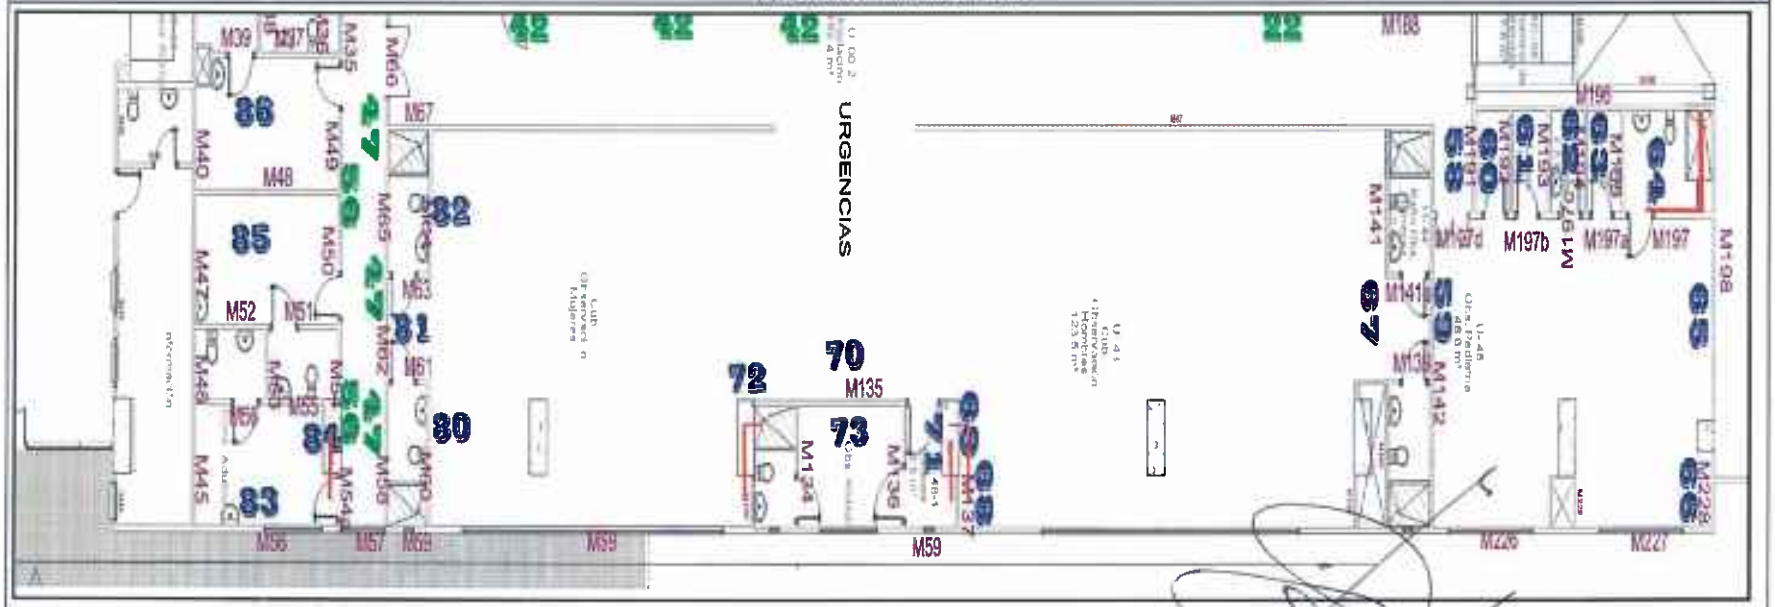

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: FR-FO-30 | Versión No. 06 | Página 1 de 4 | Fecha: 2 | 4 | 2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE N°:** 17	**FECHA :** FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	9.2.1	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Peñete Impermeabilizado (duchas) — **(c) UND:** M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	(h) Descuento alturas viaza - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4 (FACHADA CALLE 6)						
M76b-M76c-M76d	16,15	4,3		69,45	1,00	69,45
PISO 5 (FACHADA CALLE 6)						
M4-M4a-M4b-M4c	16,15	4,3		69,45	1,00	69,45
PISO 6 (FACHADA CALLE 6)						
M2-M3-M4	16,15	4,3		69,45	1,00	69,45
PISO 7 (FACHADA CALLE 6)						
M2-M3-M4	16,15	4,3		69,45	1,00	69,45
PISO 8 (FACHADA CALLE 6)						
M3	16,15	1,07		17,28	1,00	17,28
SUB TOTAL						345,08
VIENEN						57,72
PASAN						402,80

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	2	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

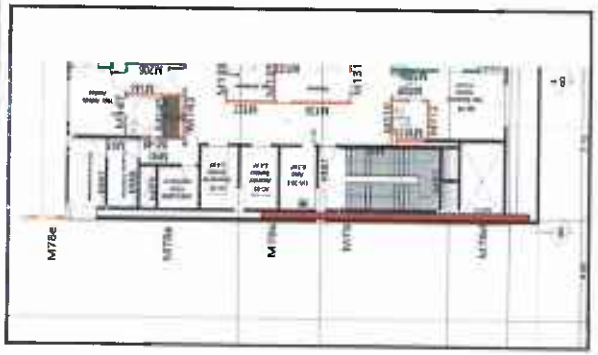

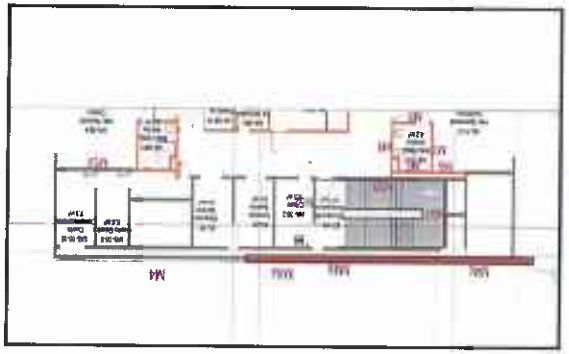

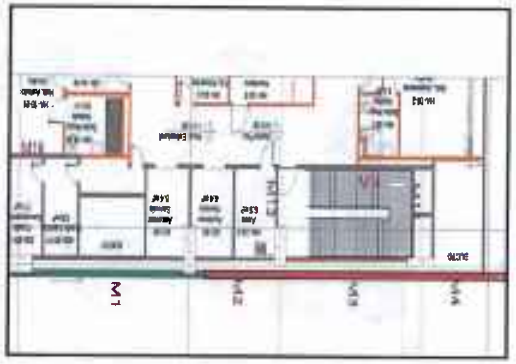

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq , Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

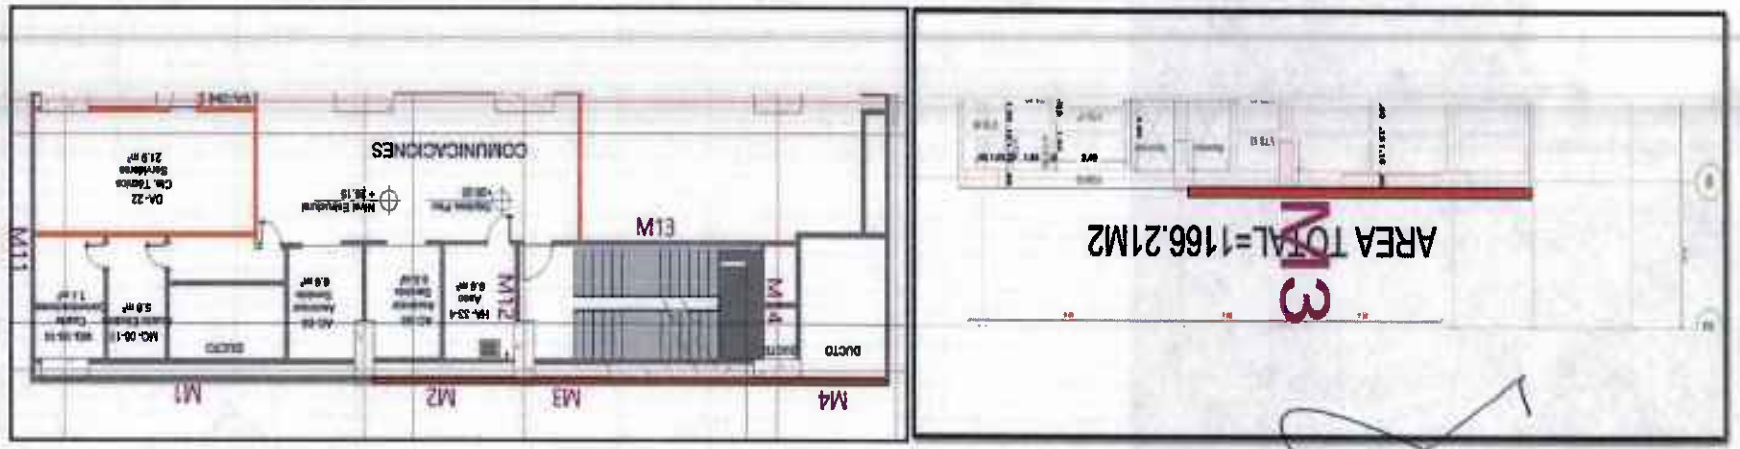

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	Descuento vigas/columnas/muros/vanos puerta ventana (Interi	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4 (FACHADA CRA 13)							
M7a	FACHADA	46,80	3,53	46,30	117,38	1,00	117,38
PISO 4 (FACHADA CALLE 7)							
M7-M9	FACHADA CALLE 7	22,54	3,53	3,26	77,29	1,00	77,29
M3a	ANTEPECHO (CALLE 7)	33,14	0,65		23,62	1,00	23,62
						SUB TOTAL	220,29
						VIENEN	352,78
						SUBTOTAL FEBRERO	573,07
						VIENE SUBTOTAL DICIEMBRE	352,55
						VIENE SUBTOTAL ENERO	375,68
						TOTAL ACTA	1301,30

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Linares

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

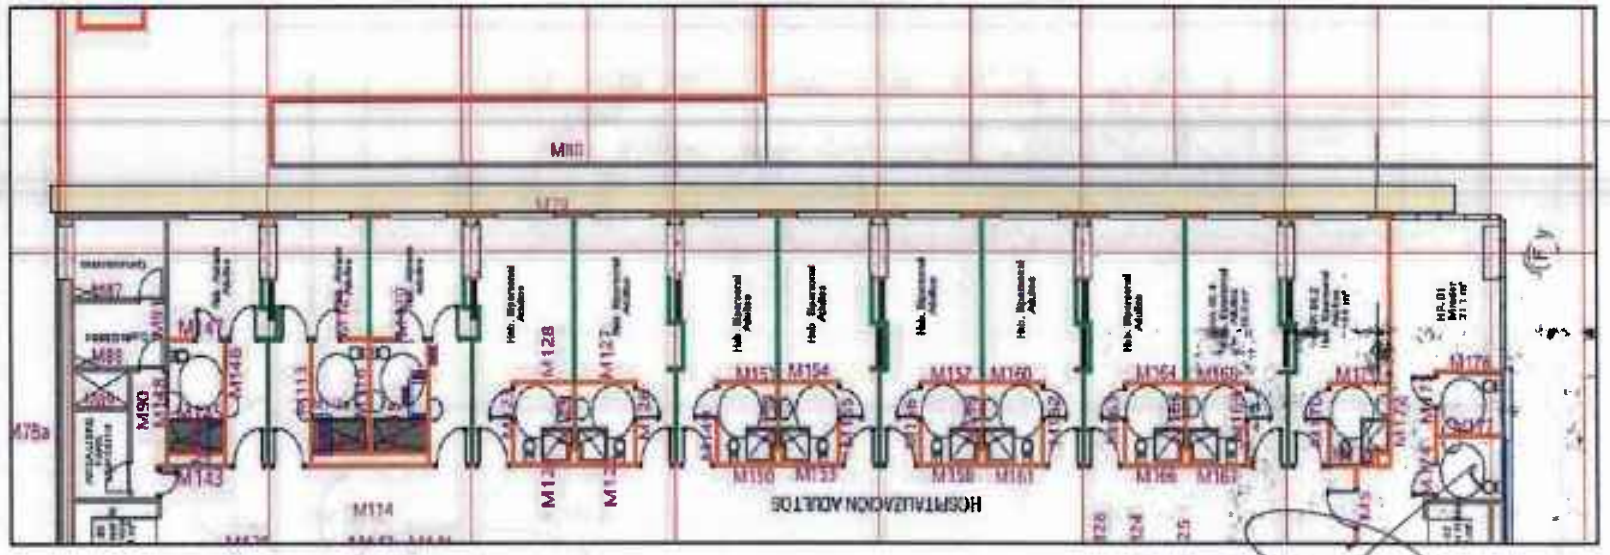

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-06			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

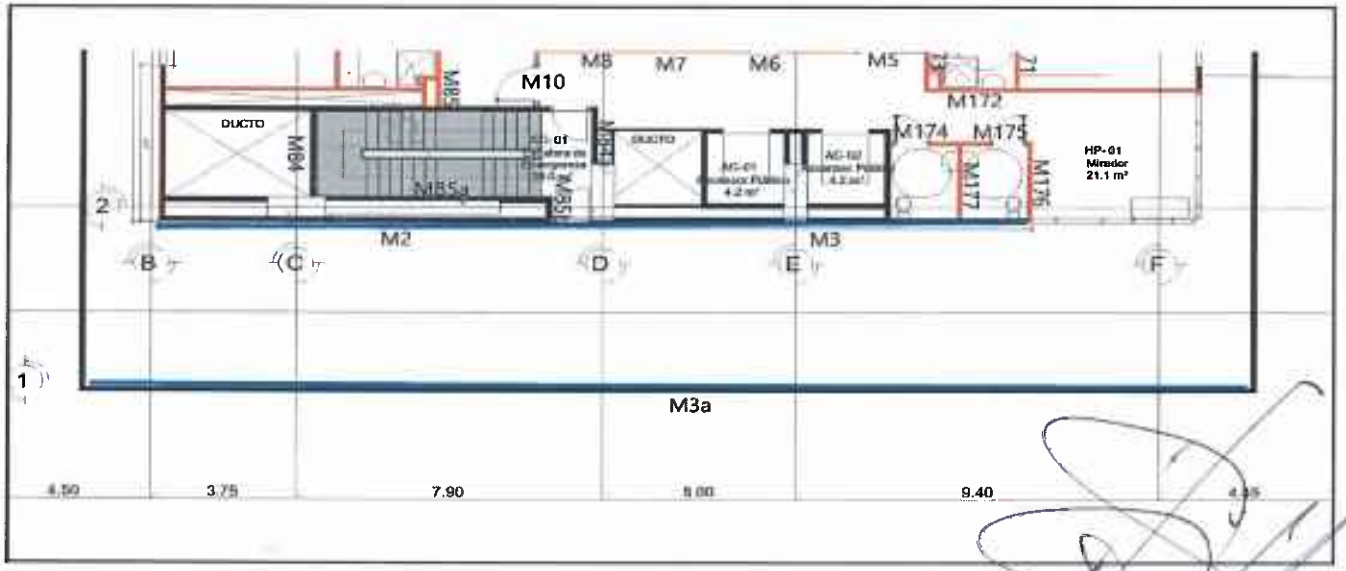

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-IFO-30				
		Versión No. 02		Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Joel Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete Impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			SOTANO			
COLUMNA C8	0,38			2,83	1,00	2,83
COLUMNA A3	0,18			2,83	2,00	5,66
COLUMNA A4	0,18			2,83	1,00	2,83
COLUMNA A4	0,10			3,00	1,00	3,00
	0,18			3,00	1,00	3,00
					PASAN	17,32

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jhir Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	ML

(ii) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

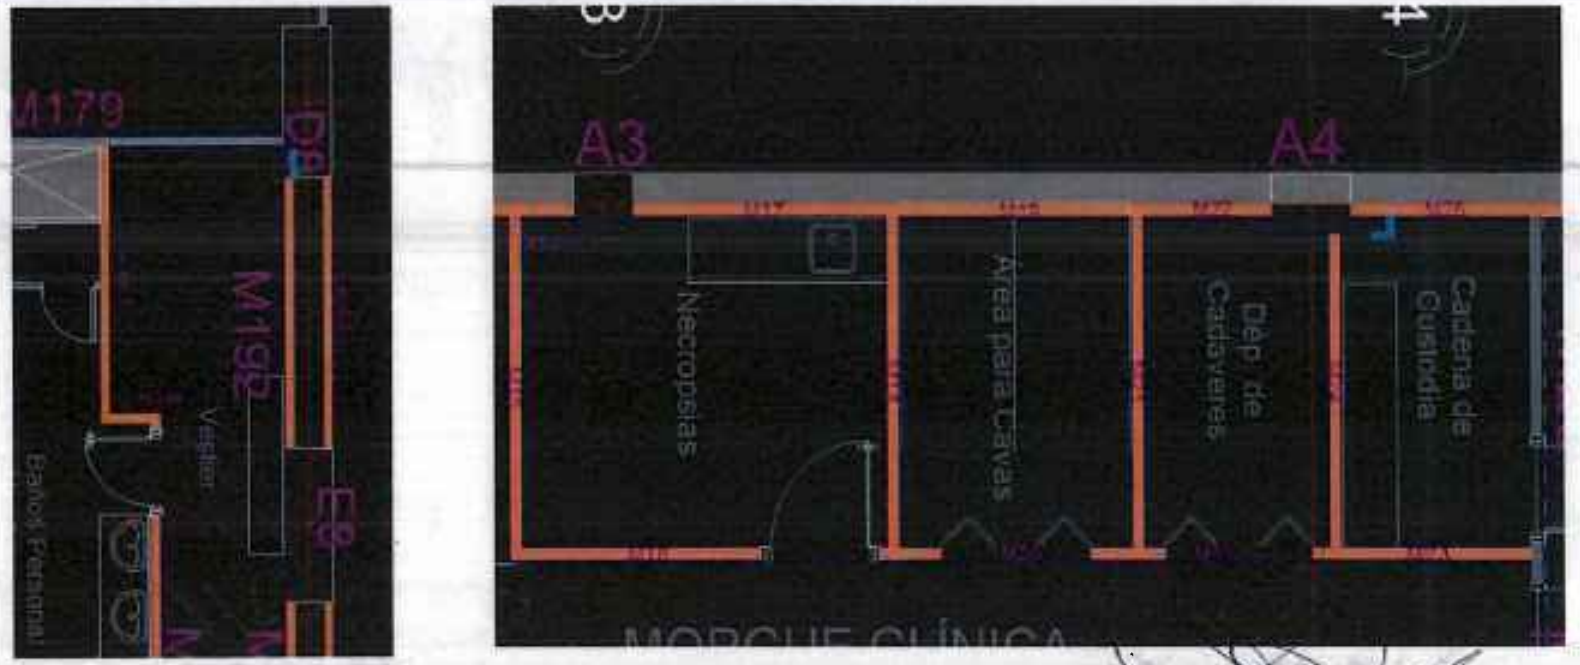

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	ML

(e) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) Largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 3			
COLUMNA C9	0,11		3,70		1,00	3,70
Viga M85	0,11		6,85		1,00	6,85
COLUMNA D9	0,11		3,70		1,00	3,70
				SUB TOTAL		14,25
				VIENEN		17,32
				PASAN		31,57

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Joel Lozano



SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 03	Página 1 de 1
		Fecha	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	17	**FECHA:**	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.2	**DESCRIPCION ITEM**	Pañete impermeabilizado (duchas)			**UND:**	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

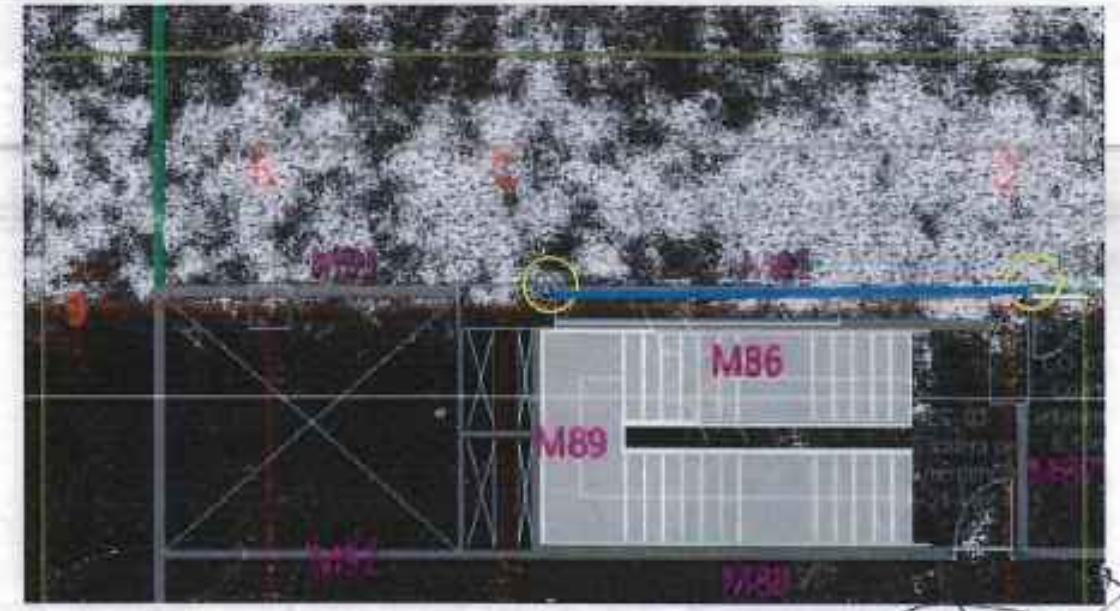

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M4	0,75		55,85		1,00	55,85

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 00	Página 1 de 1		
				Fecha:			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.2.2	DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

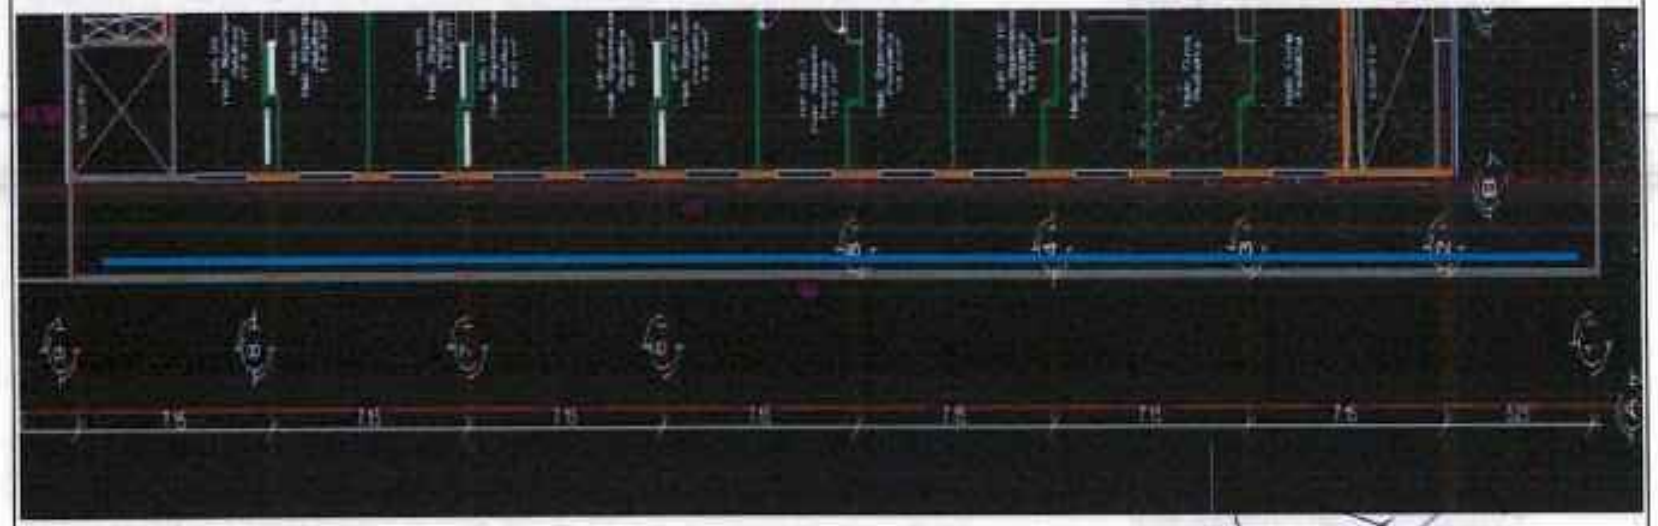

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	PISO 1						
1	COLUMNA D9	0,12		2,83		2,00	5,66
		0,06		2,83		1,00	2,83
4	COLUMNA C10	0,48		3,00		2,00	6,00
6	COLUMNA B10	0,48		2,83		1,00	2,83
8	COLUMNA B8	0,48		2,83		1,00	2,83
9	COLUMNA C8	0,48		2,83		2,00	5,66
12	COLUMNA D8	0,48		2,83		1,00	2,83
15	COLUMNA E7	0,48		2,83		1,00	2,83
16	COLUMNA C7	0,44		2,83		1,00	2,83
		0,48		2,83		1,00	2,83
20	COLUMNA C6	0,47		2,83		2,00	5,66
27	COLUMNA C5	0,48		2,83		1,00	2,83
30	COLUMNA D4	0,32		2,83		1,00	2,83
33	COLUMNA C4	0,47		2,83		1,00	2,83
		0,25		2,83		1,00	2,83
36	COLUMNA C3	0,25		2,83		1,00	2,83
		0,25		2,83		1,00	2,83
		0,48		2,83		1,00	2,83
	TOTAL						62,09

NOTA ACLARATORIA: DE ACUERDO A LO PACTADO ENTRE EL RESIDENTE DE OBRA Y EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, SE ACORDÓ EL COBRO DEL PAÑETE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS) POR ESTE ITEM, DEBIDO A QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ES NECESARIO UTILIZAR UN ADITIVO (ELCOLATEX) PARA GENERAR LA ADHERENCIA DEL PAÑETE AL ELEMENTO (ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO).

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

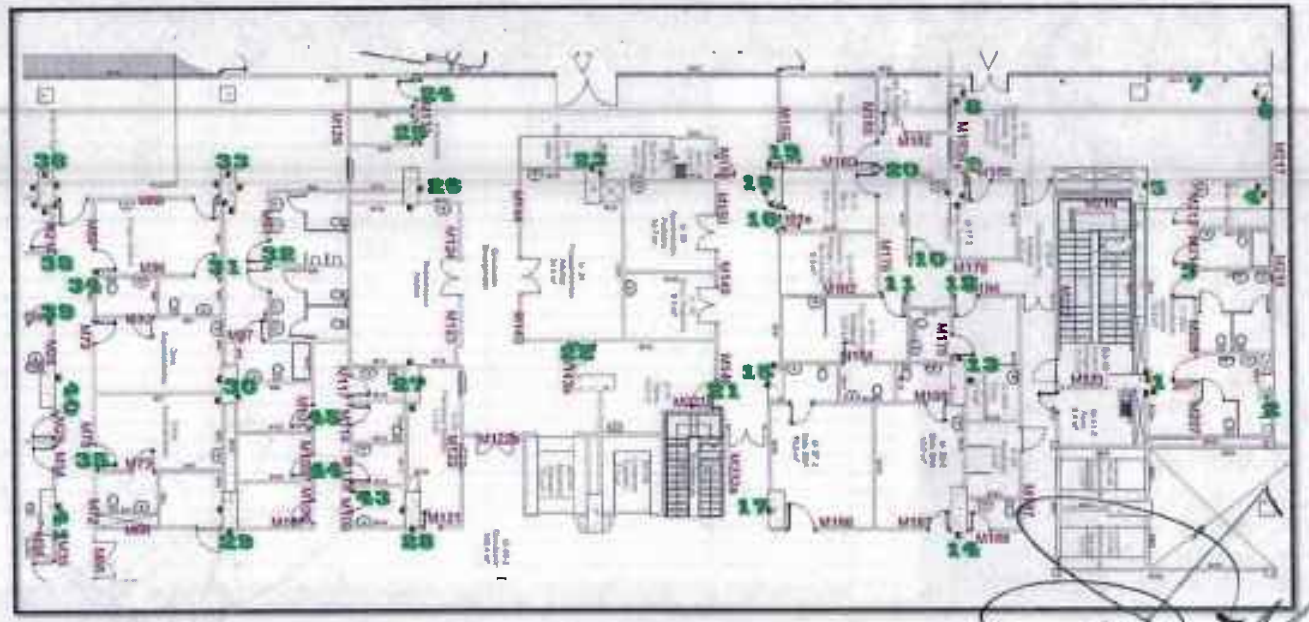

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE	
INTERVENTORIA:			
(a) ITEM N°:	9.2.2		

CORTE N°: FECHA: FEBRERO DE 2026

(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DEL ITEM A OBRA

	(e) CÓDIGO	(f) DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			(g) RENDIMIENTO MANUAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
					Descuento Pared o viga - Vano puerta dintel			
		PISO 1						
	Columna F7	U-40 Obs. Hombres - Baños	0,40	2,80		2,80	1,00	2,80
	Columna E6	U-06 Farmacia Satelite	0,40	2,80		2,80	1,00	2,80
	Columna F6	Obs. Urgencias	0,40	2,80		2,80	1,00	2,80
	Columna F5	U-18-19 Consul Adultos	0,40	2,80		2,80	1,00	2,80
	Columna E5	U-18-19 Consul Adultos	0,40	2,80		2,80	1,00	2,80
	Columna C2	U-01 Sala de espera Adultos	0,40	2,80		1,36	1,00	1,36
	Columna B2	U-01 Sala de espera Adultos	0,40	2,80		1,34	2,00	2,72
		PISO 1 (AREA HUMEDA)						
94	M222	U-51-2 Aseo	1,94	3,00		5,82	1,00	5,82
		PASAN						24,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañeta Impermeabilizado (duchas)				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

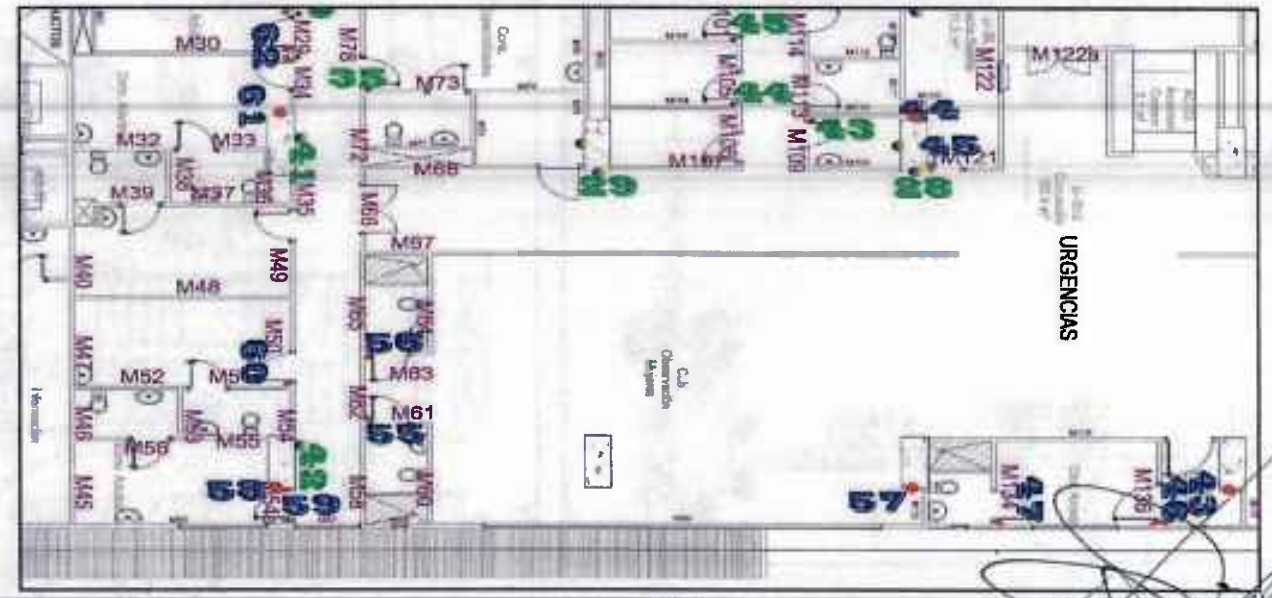

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Carrillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha	2	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

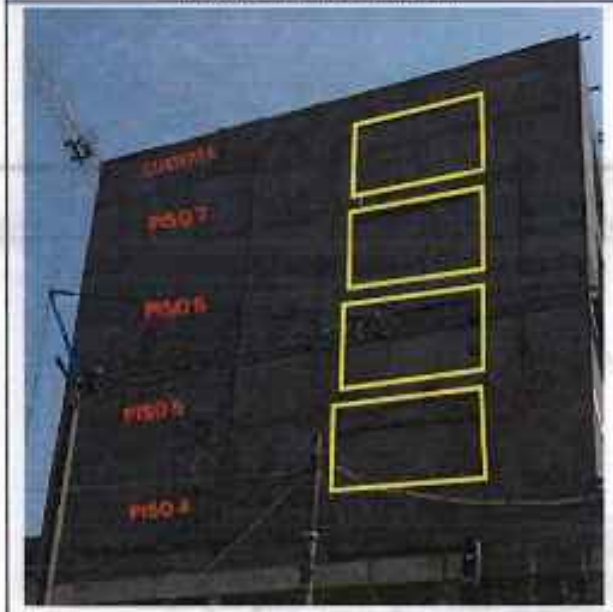

(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES (f) Ancho	Longitud	Descuento tuberías placa – vanos puerta ventana	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4						
	M72c		0,11	6,65		6,65	2,00	13,70
			0,11	3,70		3,70	2,00	7,40
		PISO 5						
	M4h		0,11	6,65		6,65	2,00	13,70
			0,11	3,70		3,70	2,00	7,40
		PISO 6						
	M3		0,11	6,65		6,65	2,00	13,70
			0,11	3,70		3,70	2,00	7,40
		PISO 7						
	M3		0,11	6,65		6,65	2,00	13,70
			0,11	3,70		3,70	2,00	7,40
		SUB TOTAL						84,40
		VIENEN						24,05
		SUBTOTAL FEBRERO						108,45
		VIENE SUBTOTAL DICIEMBRE						87,42
		VIENE SUBTOTAL ENERO						83,60
		TOTAL ACTA						279,47

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete impermeabilizado (duchas)			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

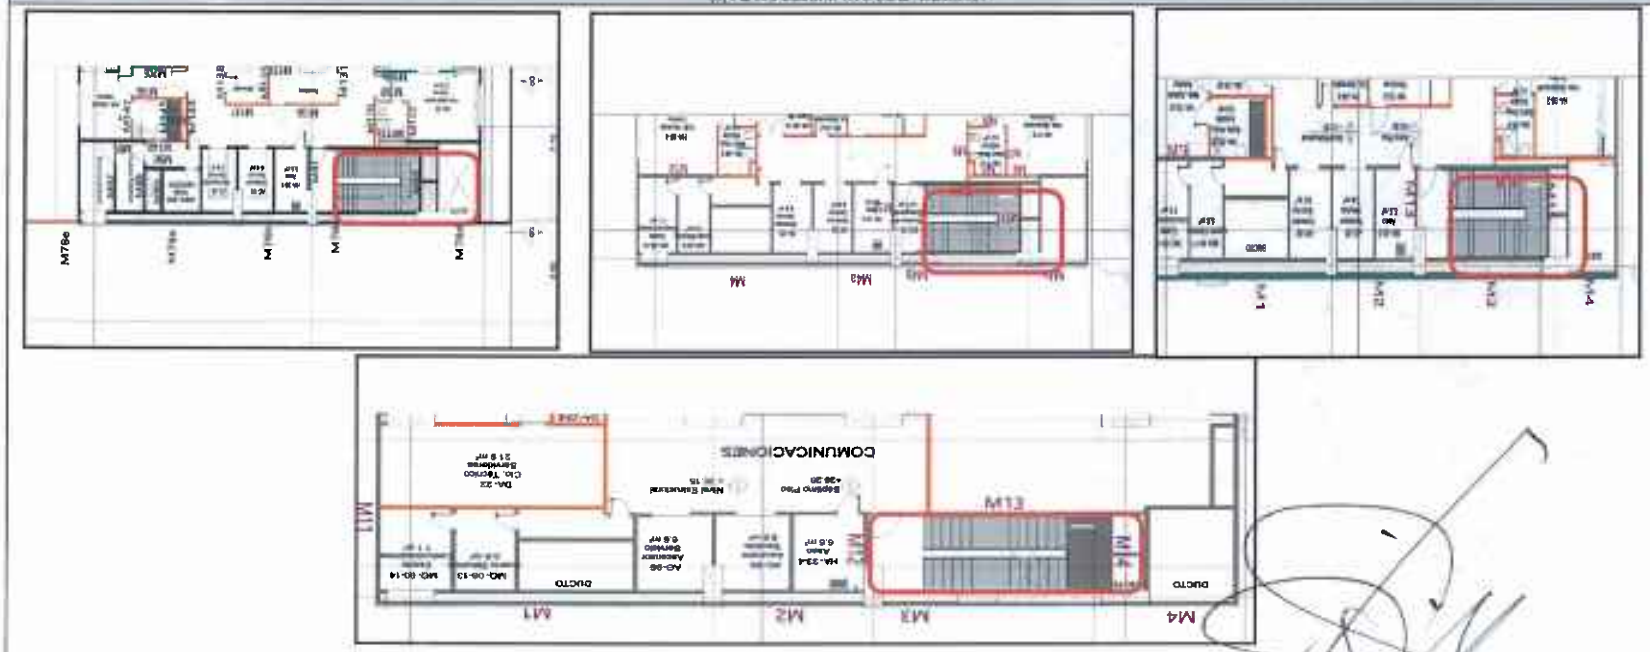

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes		(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		LONGITUD	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		DESCRIPCION	% POR CORTE SUPERIOR			
SOTANO- FILO CORTE PAÑETE						
CADENA DE CUSTODIA	1	SUPERIOR	50%	9,03	1,00	4,52
		INFERIOR	100%	9,03	1,00	9,03
		SUPERIOR PUERTA	50%	1,00	1,00	0,50
DEPOSITO DE CADAVERES	2	SUPERIOR	50%	8,52	1,00	4,26
		INFERIOR	100%	8,52	1,00	8,52
		SUPERIOR PUERTA	50%	1,50	1,00	0,75
NECROPSIAS	3	SUPERIOR	50%	12,86	1,00	6,43
		INFERIOR	100%	12,86	1,00	12,86
		SUPERIOR PUERTA	50%	1,20	1,00	0,60
AREA CAVAS	4	SUPERIOR	50%	9,46	1,00	4,73
		INFERIOR	100%	9,46	1,00	9,46
		SUPERIOR PUERTA	50%	1,50	1,00	0,75
AREA CAMILLAS	5	SUPERIOR	50%	8,12	1,00	4,06
		INFERIOR	100%	8,12	1,00	8,12
		SUPERIOR PUERTA	50%	1,50	1,00	0,75
PASILLO MORGUE CLINICA	6	SUPERIOR	50%	30,05	1,00	15,03
		INFERIOR	100%	20,87	1,00	20,87
SALA DE ESPERA	7	SUPERIOR	50%	20,15	1,00	10,08
		INFERIOR	100%	17,75	1,00	17,75
MS-M1a-M1b-M1c-M1d-M68-M67-M66	8	SUPERIOR	50%	33,38	1,00	16,69
		INFERIOR	100%	33,48	1,00	33,48
RESULTADOS	9	SUPERIOR	50%	5,52	1,00	2,76
		INFERIOR	100%	5,52	1,00	5,52
COOR. RADIOLOGIAS	10	SUPERIOR	50%	10,46	1,00	5,23
		INFERIOR	100%	3,46	1,00	3,46
OF. RADIOLOGO	11	SUPERIOR	50%	10,54	1,00	5,27
		INFERIOR	100%	3,54	1,00	3,54
LECTURA	12	SUPERIOR	50%	10,97	1,00	5,49
		INFERIOR	100%	3,97	1,00	3,97
ULTRASONIDO 1	13	SUPERIOR	50%	14,56	1,00	7,28
		INFERIOR	100%	12,36	1,00	12,36
ASEO	14	SUPERIOR	50%	6,58	1,00	3,29
ULTRASONIDO 3	15	SUPERIOR	50%	14,60	1,00	7,30
		INFERIOR	100%	13,40	1,00	13,40
ESTAR PERSONAL	16	SUPERIOR	50%	13,13	1,00	6,57
		INFERIOR	100%	10,13	1,00	10,13
PASILLO IMAGENOLOGIA 2	17	SUPERIOR	50%	41,02	1,00	20,51
		INFERIOR	100%	28,42	1,00	28,42
PASILLO IMAGENOLOGIA 1	18	SUPERIOR	50%	30,31	1,00	15,15
		INFERIOR	100%	25,21	1,00	25,21
VESTIER PUBL	19	SUPERIOR	50%	6,76	1,00	3,38
		INFERIOR	100%	5,25	1,00	5,25
BAÑOS	20	SUPERIOR	50%	8,29	1,00	4,15
DEP. EQUIPOS	21	SUPERIOR	50%	6,96	1,00	3,48
		INFERIOR	100%	5,56	1,00	5,56
		PASAN				417,79

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión no.: 16		Página 1 de 4	
		Fecha:	D	A	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		LONGITUD	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		DESCRIPCIÓN	% POR CORTE SUPERIOR			
SOTANO- FILO CORTE PAÑETE						
M158-M157-M144-M122	22	SUPERIOR	50%	18,72	1,00	7,80
		INFERIOR	100%	13,00	1,00	13,00
M182-M196-M195-M194-M204-M202-M197	27	SUPERIOR	50%	24,71	1,00	12,36
		INFERIOR	100%	19,81	1,00	19,81
VESTIER	28	SUPERIOR	50%	14,42	1,00	7,21
		INFERIOR	100%	14,42	1,00	14,42
DESCANSO PERSONAL	29	SUPERIOR	50%	13,24	1,00	5,62
		INFERIOR	100%	10,24	1,00	10,24
RESIDUOS	30	SUPERIOR	50%	8,66	1,00	4,33
CUARTO DE COMUNICACIONES	31	SUPERIOR	50%	8,82	1,00	4,41
DEPOSITO EJE E7	32	SUPERIOR	50%	17,54	1,00	8,97
		INFERIOR	100%	16,59	1,00	16,59
CUARTO ELECTRICO	34	SUPERIOR	50%	14,42	1,00	7,21
M203-M194	44	SUPERIOR	50%	8,47	1,00	4,24
M191	45	SUPERIOR	50%	5,20	1,00	2,60
M127-M128	46	SUPERIOR	50%	12,85	1,00	6,42
M129	47	SUPERIOR	50%	6,55	1,00	3,28
M219-M221-M224	48	SUPERIOR	50%	21,60	1,00	10,80
M222-M223-M224 (CUARTO BOMBAS	39	SUPERIOR	50%	14,26	1,00	7,13
M161-M162-M163 (CUARTO MAQUINAS - EXTERNO)	40	SUPERIOR	50%	22,86	1,00	11,43
CUARTO DE MAQUINAS (INTERNO)	41	SUPERIOR	50%	31,12	1,00	15,56
PASILLO - CARRO FUNEBRE	26	SUPERIOR	50%	15,44	1,00	7,72
M88-M56-M91 (AGUA)	25	SUPERIOR	50%	5,85	1,00	2,92
M87-M88-M89-M31 (RESIDUOS)	24	SUPERIOR	50%	11,17	1,00	5,59
CUARTO TECNICO	23	SUPERIOR	50%	11,56	1,00	5,78
				SUB TOTAL		225,82
				'ITEM		417,78
				PAÑAN		633,60

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Linares

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 4	
		Fecha	E	A	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

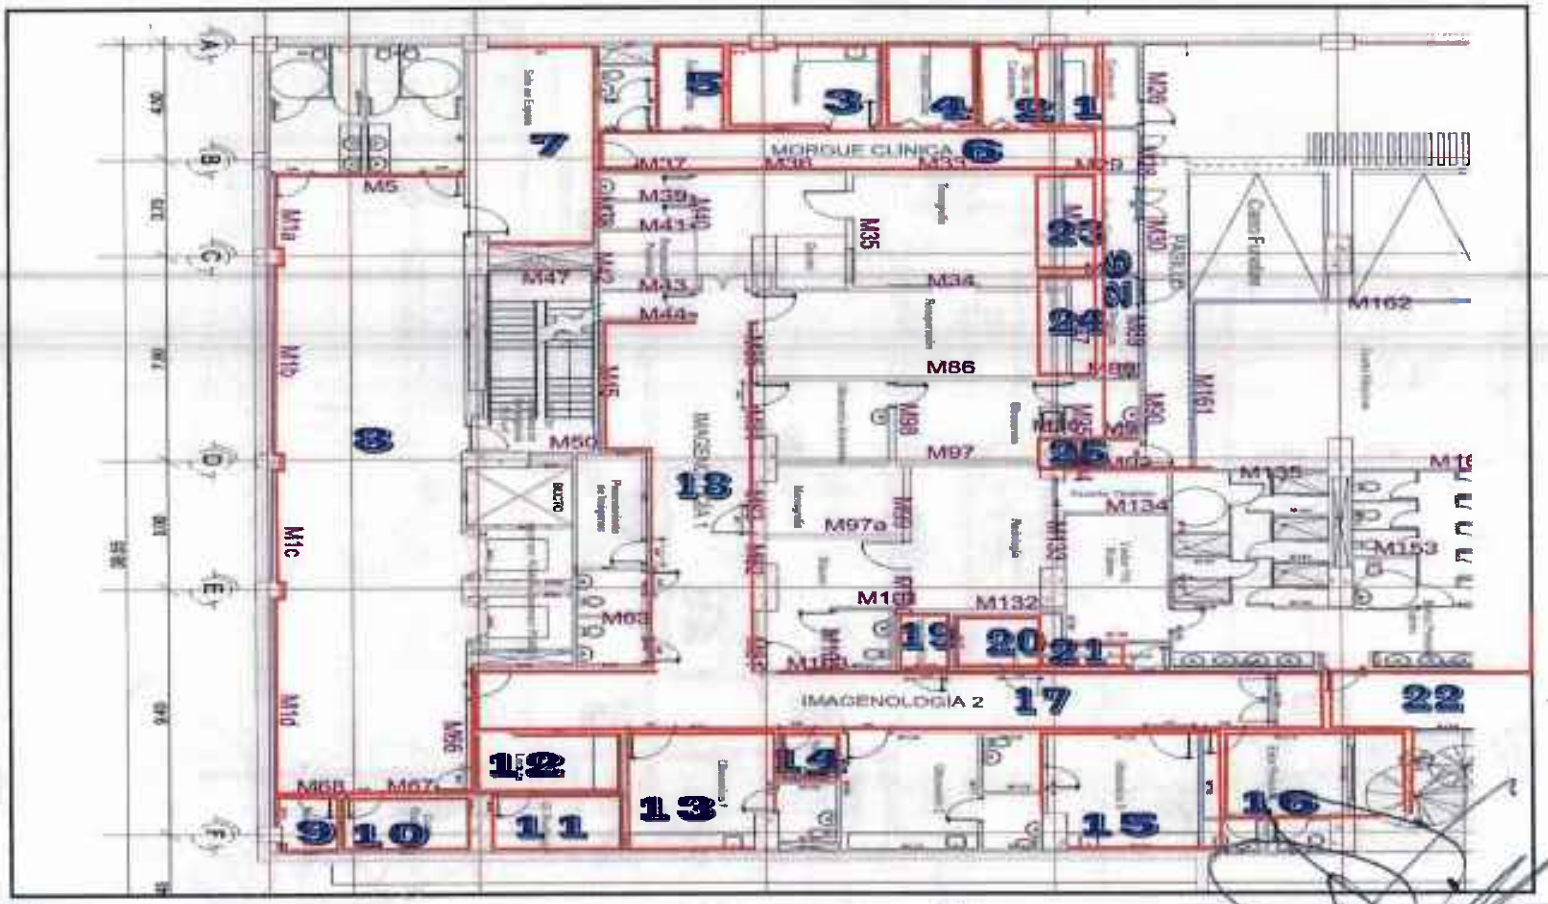

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lizcano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FD-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 4	
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

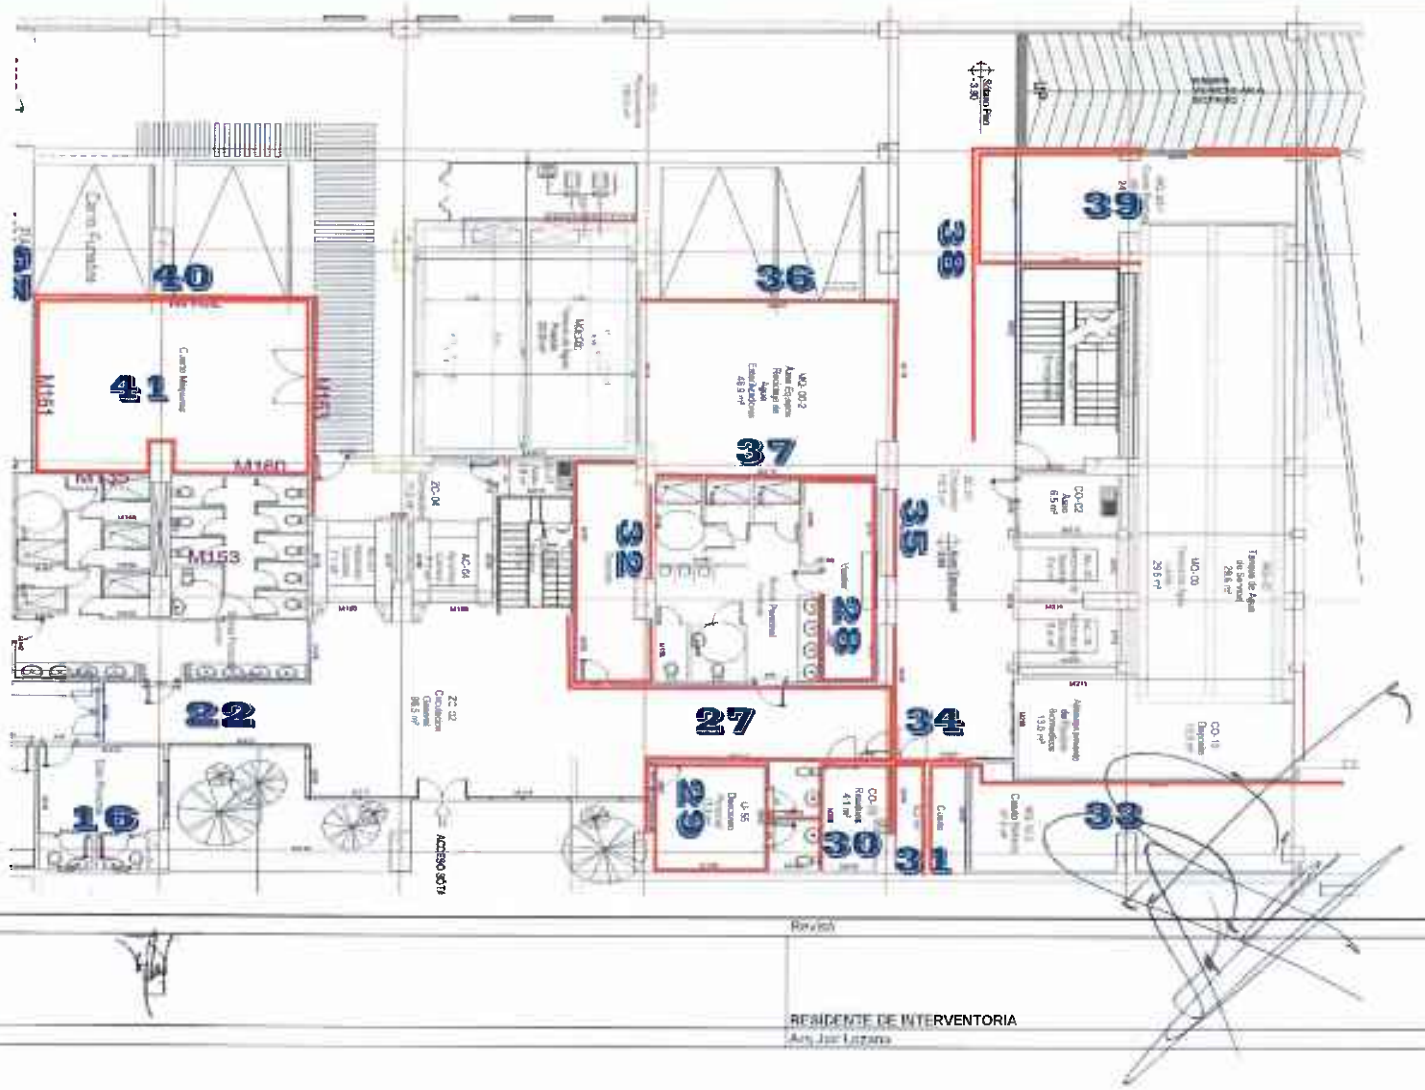

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ars Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES DESCRIPCIÓN	LONGITUD	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO			
M177-M178		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
M223-M219		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
M209-M210		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
M207-M208		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
M282-M287		FILO VERTICAL	2,83	1,00	2,83
M282-M282		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
M255-M257		FILO VERTICAL	2,83	1,00	2,83
M122-M123		FILO VERTICAL	2,83	1,00	2,83
COLUMNA C4		VESTIER MUJERES	3,83	1,00	3,83
M74-M78		PUERTA	2,20	1,00	2,20
M80-M803		FILO VERTICAL	3,83	1,00	3,83
M84-M83		FILO VERTICAL	2,83	1,00	2,83
M83-M80		FILO VERTICAL	3,83	1,00	3,83
COLUMNA E1		FILO VERTICAL	2,83	2,00	5,66
COLUMNA D1		FILO VERTICAL	2,83	2,00	5,66
COLUMNA C1		FILO VERTICAL	2,83	2,00	5,66
COLUMNA A1		FILO VERTICAL	2,83	2,00	5,66
COLUMNA A4		DER. CADAVERES	2,83	1,00	2,83
		CADENA CUSTODIA	3,00	1,00	3,00
M363-M363		FILO VERTICAL	3,00	1,00	3,00
COLUMNA D5		FILO VERTICAL	3,00	2,00	6,00
		SUB TOTAL			74,01
		VIENEN			633,60
		PASAN			707,61

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

18 PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

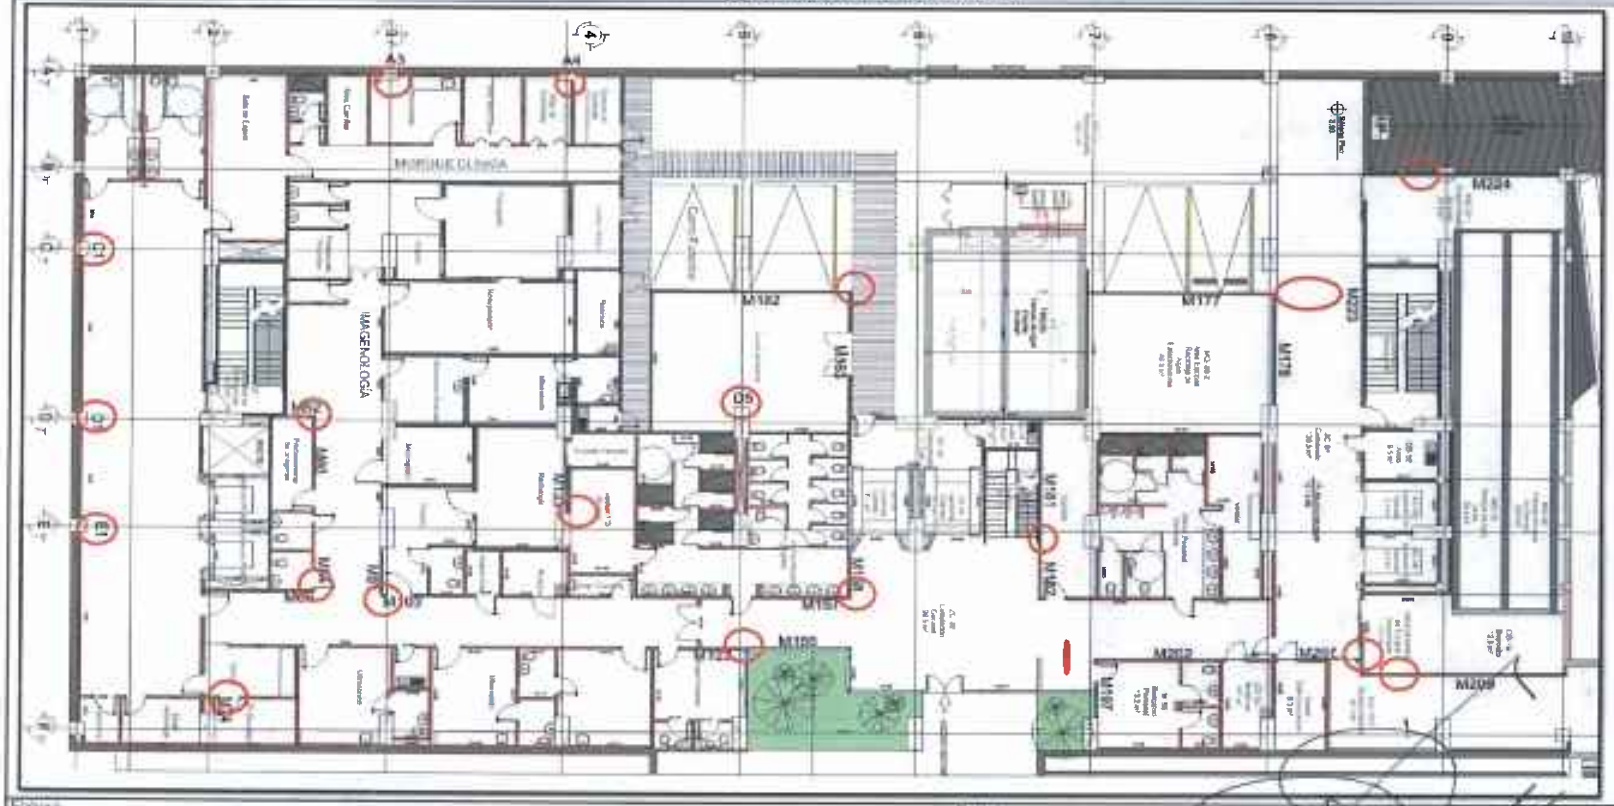

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lazaro

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES DESCRIPCIÓN	LONGITUD	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1			
M203e-M231e		[illegible]	2,83	1,00	2,83
M223		INFERIOR (corte pañete)	6,50	1,00	6,50
M232		INFERIOR (corte pañete)	4,21	1,00	4,21
M231		INFERIOR (corte pañete)	2,47	1,00	2,47
M217-M218		INFERIOR (corte pañete)	14,60	1,00	14,60
		SUB TOTAL			30,61
		VIENEN			707,03
		PASAN			738,24

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión: 03		Página: 1 de 4	
		Fecha:	0	4	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

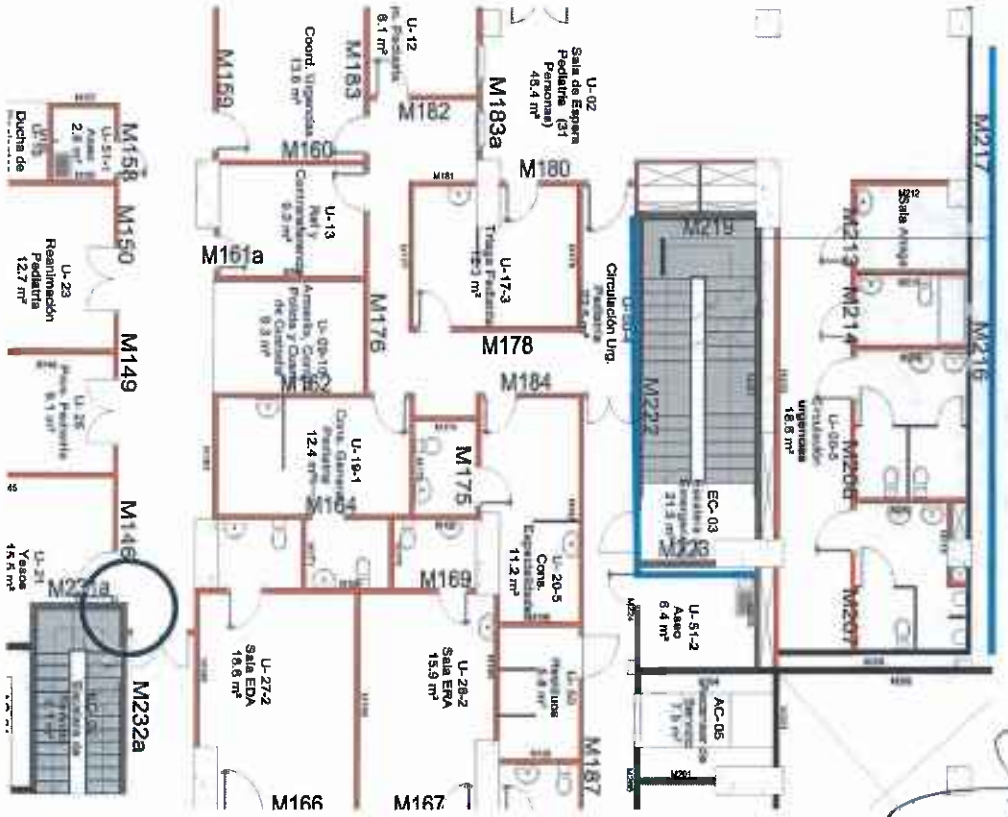

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 03		Página 1 de 4	
				Fecha	5	6	2022

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
(a) ITEM N°:	**9.4.1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**Filos sencillos pañetes**			**(c) UND:**	**ML**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES DESCRIPCIÓN	LONGITUD	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 2			
M177		INFERIOR (corte pañete)	4,21	1,00	4,21
M167		INFERIOR (corte pañete)	2,56	1,00	2,56
		INFERIOR (CORTE)	33,00	1,00	33,00
		FILO INFERIOR VENTANA	15,00	1,00	15,00
M277		INFERIOR (corte pañete)	3,34	1,00	3,34
M277a		INFERIOR (corte pañete)	6,52	1,00	6,52
M254 - COLUMN D8		INFERIOR (corte pañete)	3,78	1,00	7,56
M253		INFERIOR (corte pañete)	7,83	1,00	13,83
		SUB TOTAL			82,85
		VIENEN			738,24
		PASAN			821,09

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

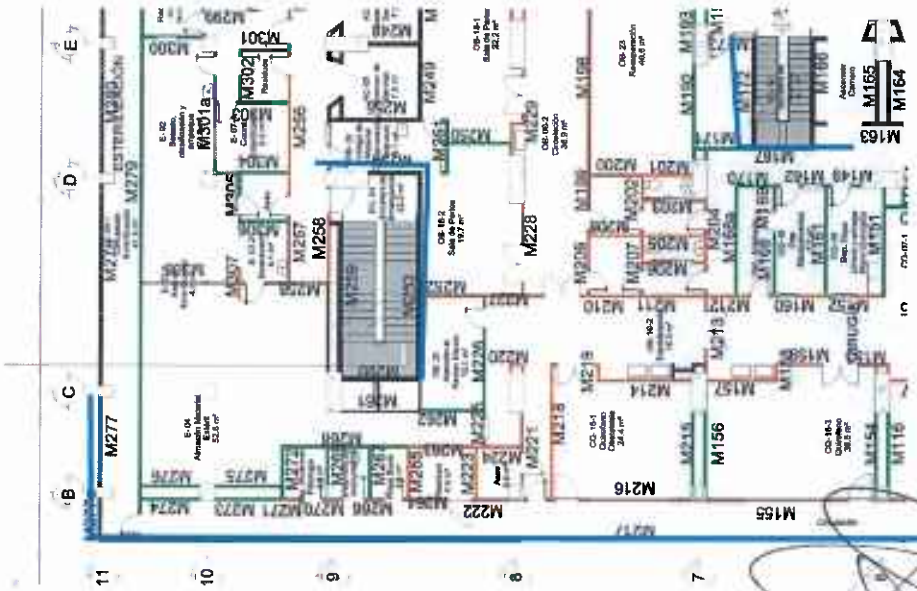

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FD-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DESCRIPCION	LONGITUD	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 3			
M87		INFERIOR (corte pañete)	3,65	1,00	3,65
M88		INFERIOR (corte pañete)	6,60	1,00	6,60
M91 - COLUMNA D9		FACHADA (FILO VERTICAL)	3,70	1,00	3,70
Viga - M93		FACHADA (FILO HORIZONTAL)	6,85	1,00	6,85
COLUMNA D9		FACHADA	3,70	1,00	3,70
		PUERTA	2,10	1,00	2,10
M91		INTERIO	4,00	1,00	4,00
M93		INFERIOR VENTANA	18,90	1,00	18,90
		INFERIOR	28,72	1,00	28,72
M49		INFERIOR VENTANA (HORIZONTAL)	2,57	2,00	5,14
M48		INFERIOR VENTANA (HORIZONTAL)	4,52	2,00	9,04
M49-M48		FILO (VERTICAL)	2,83	1,00	2,83
		SUB TOTAL			94,99
		VIENEN			821,69
		PASAN			916,68

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha	5	8	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

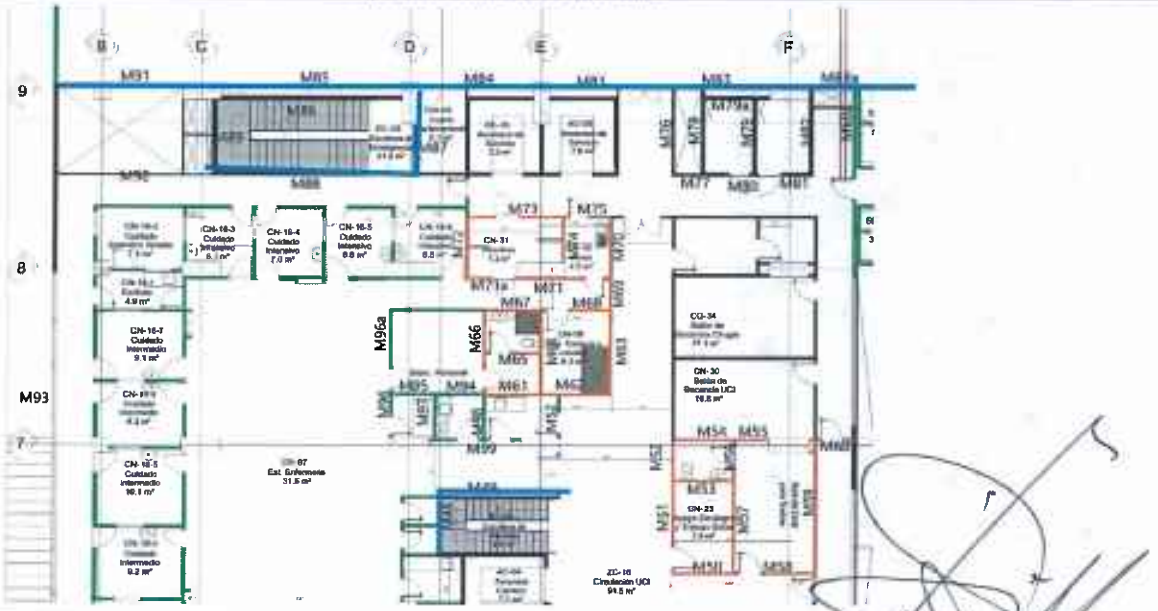

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 001	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	6	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES		LONGITUD	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Anota	DESCRIPCIÓN			
			PISO 4			
	M4		FILO CARTERA	55,85	1,00	55,85
	M4		FILO INFERIOR	55,85	1,00	55,85
	M8		FILO INFERIOR	55,85	1,00	55,85
			SUB TOTAL			167,55
			VIENEN			916,68
			PASAN			1083,53

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

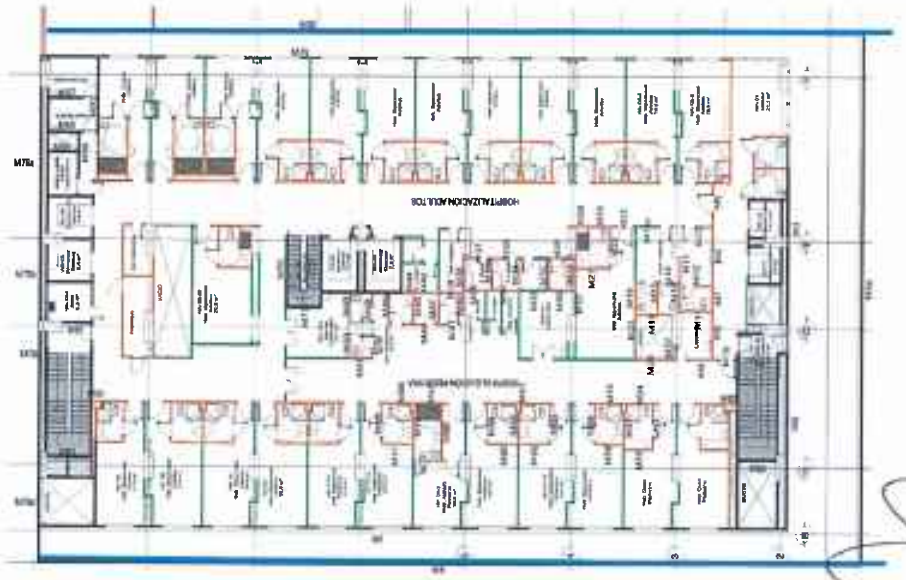

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES DESCRIPCIÓN	LONGITUD	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 5			
M54		MEDIDA (CORTE)	4,67	1,00	4,67
M55		MEDIDA (CORTE)	2,46	1,00	2,46
				SUB TOTAL	7,13
				VIENEN	1083,63
				TOTAL	1090,76

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

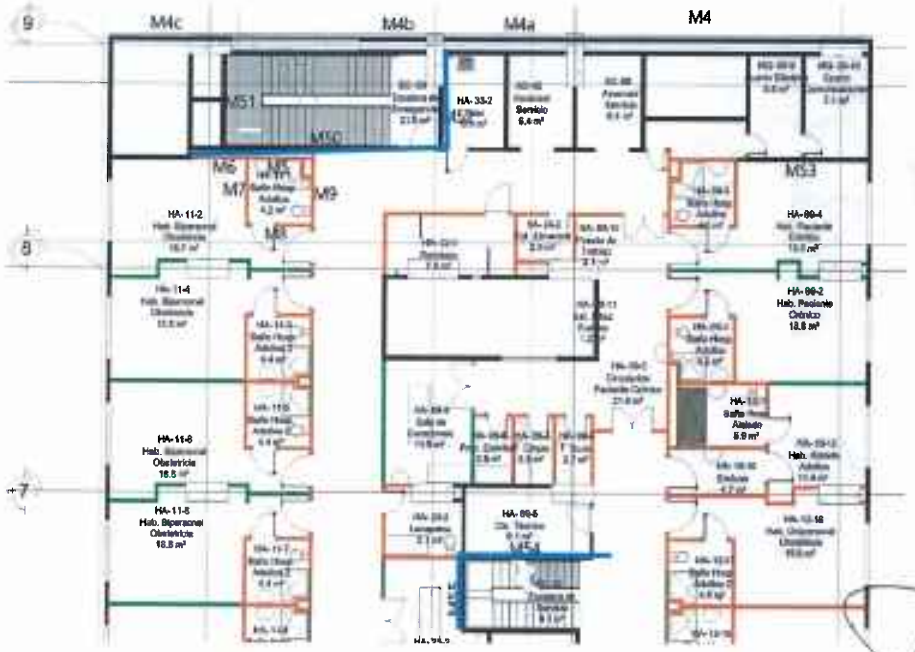

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36	

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA: / INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE / CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO 2026
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM:	Filos sencillos peñales			(c) UND:	ML

(d) PLANO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

	(e) UBICACION		DIMENSIONES			(f) PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) PARCIAL TOTAL
			(i) Ancho	(j) Alto	(k) Largo			
6	M019-M021-M022-M024-M013-M012	Circulación Urgencias	Interior			13.62	2.00	27.24
7	M012-M011-COLUMNA-P-10	Sala de espera pediatría	Interior			7.07	2.00	14.14
8	M018	Sala de espera pediatría	Interior			7.15	1.00	7.15
12	M1B3b-M1B5	Sala de espera pediatría	Interior			4.01	2.00	8.02
11	M171-M173-M172-M181-M191	Triage pediatría	Interior			15.46	1.00	15.46
13	M174-M175-M177-M181-M183a-M183	Circulación pediatría	Interior			18.19	1.00	18.19
14	M183-M184-M177-M181-M174-M175-M184	Circulación pediatría	Interior			8.98	1.00	8.98
15	M183-M184-M185-M186	Circul. Urgencias	Interior			11.96	1.00	11.96
16	M176-M181-M187-M188	Aseo cardiorespiratorio	Interior			10.40	1	10.40
17	M185	Pasillo	Interior			2.88	1	2.88
18	Columna G-P	Pasillo	Interior			3.96	1.00	4.00
19	M1B3	Pasillo	Interior			3.77	1.00	3.77
20	M187-M178-M183	Aseos, control pulsos	Interior			10.07	2.00	20.14
21	M183-M183-Columna- G-P-10	Pasillo	Interior			8.87	1.00	8.87
22	M183-M183-M184	Circulación Urgencias	Interior			8.96	1.00	8.96
23	M183-M183	Circulación Urg Pediatría	Interior			8.29	1.00	8.29
24	M183-M183-Colum-7B	Cons. Preconsultadas	Interior			6.44	2.00	12.88
25	M183-M183-M183-M183	Cons. General Pediatría	Interior			12.88	1.00	12.88
26	M183-M183-M183-M183	Pasillo	Interior			3.84	1.00	3.84
28	M183a	Escalera de servicio 1.60	Interior			4.21	2.00	8.42
27	M183a	Escalera de servicio 1.60	Interior			3.48	2.00	6.96
29	M183-M185	UCI - Hosp.	Interior			8.27	2.00	16.54
30	M183-M184	Circulación Urgencias	Interior			8.74	1.00	8.74
31	M184-M183-M183	Cir. Cardiovascular	Interior			5.54	2.00	11.08
32	M183-M183-M183-M183	Duchas de pacientes	Interior			8.03	2.00	16.06
33	M183-M183-M183-M183-M183-M183	Supervisión Pediatría	Interior			12.93	1.00	12.93

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión: No. 00	Página 1 de 4		
				Fecha:			

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE	ACTA Nº:	17	FECHA :	ENERO 2026	
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

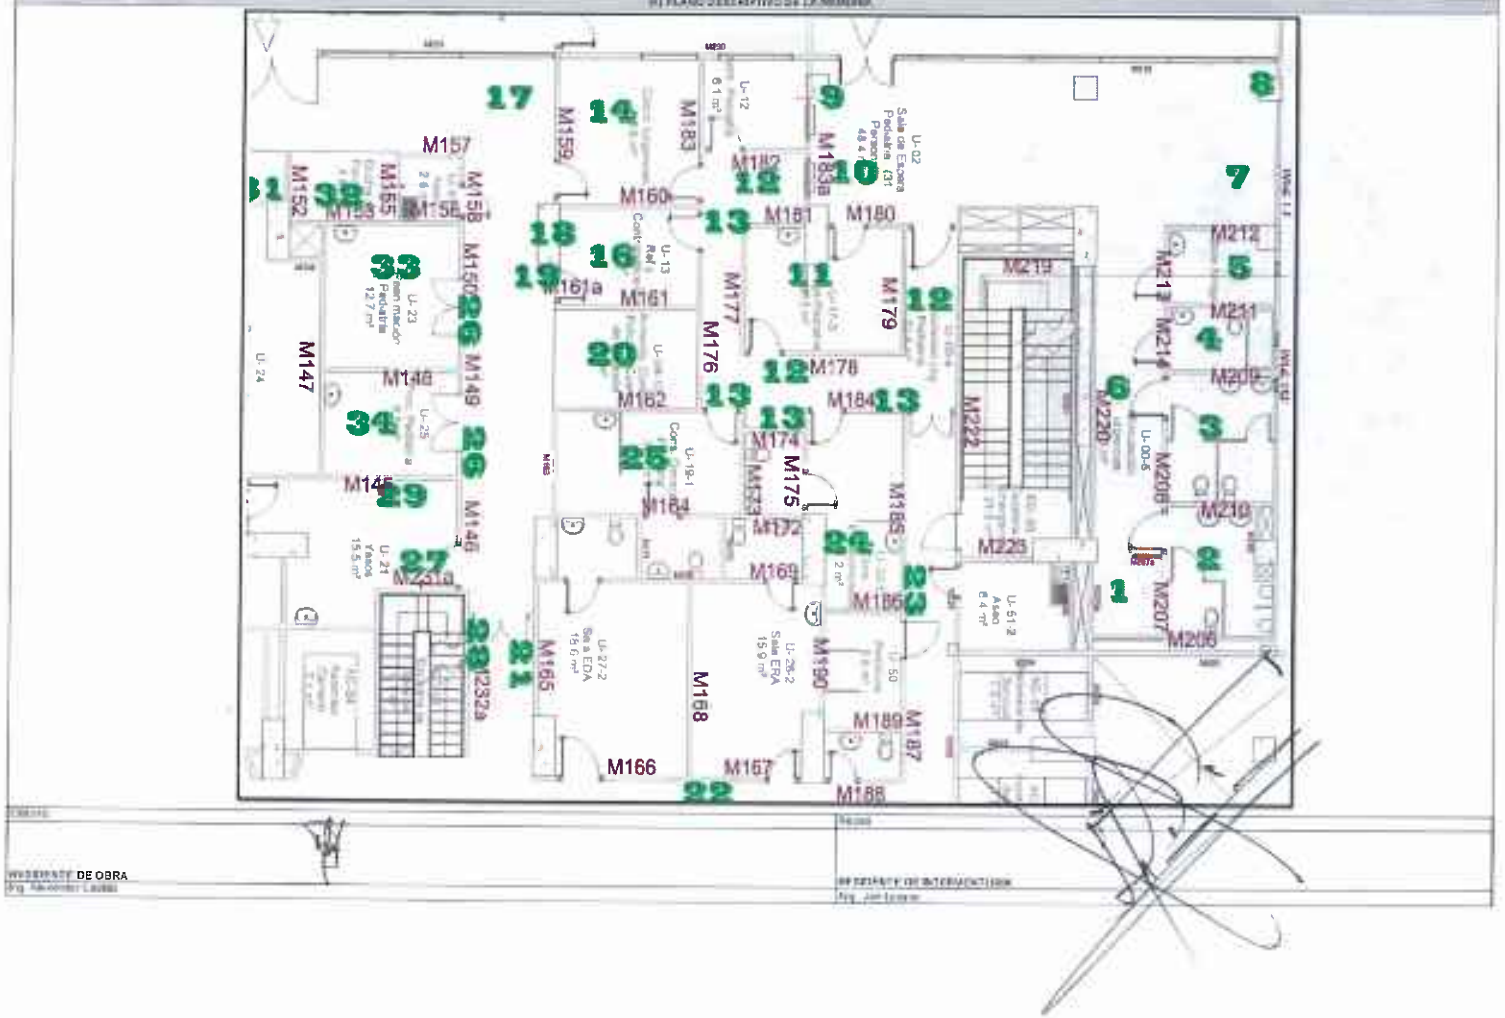

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTOR DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Folio: PA-FO-30

Versión: 03		Página 1 de 1	
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos peñetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA PARTIDA

	(e) LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Descuentos puertas	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
37	M2-3-M118	CUARTO Cto. Pediatria	FILO INFERIOR	5.04		5.04	1.00	5.04
38	M167-M153-M166-M165	T. SUCIO	FILO INFERIOR	6.00	0.80	5.20	1.00	5.20
39	M167-M153-M166-M164	T. limpio	FILO INFERIOR	6.00	0.80	5.20	1.00	5.20
40	M167-M153-M166-M163	Almacen	FILO INFERIOR	6.00	0.80	5.20	1.00	5.20
41	M167-M153-M166-M162	Ropería	FILO INFERIOR	5.20		5.20	1.00	5.20
42	M162	U.M. Cto. Pediatria	FILO INFERIOR	6.06		6.06	1.00	6.06
43	M3-M4-M5-M6-M7-M8	U.M. Cto. Hombres	FILO INFERIOR	8.00	2.00	6.00	1.00	6.00
44	M137-M138-M139	U.M. Cto. Mujeres	FILO INFERIOR	7.70		7.70	1.00	7.70
45	M136-M134-M135-M133	Cto. Aislam	FILO INFERIOR	13.16	2.05	11.11	1.00	11.11
46	M131-M130-M132	Urgencias	FILO INFERIOR	15.21	3.03	12.18	1.00	12.18
47	M143-M144-M151-M154-M157-143a	U.C.I. Psicoadiatria	FILO INFERIOR	23.97	1.00	22.97	1.00	22.97
48	M127-M128-M129	Enfermeria	FILO INFERIOR	7.93		7.93	1.00	7.93
49	M83-M81-M82-M80-M84	Cto. Cto. Mujeres	FILO INFERIOR	10.07	1.93	8.17	1.00	8.17
50	M94a-M95-M96-M97-M93	Cons. Adultos	FILO INFERIOR	14.55	1.83	12.72	1.00	12.72
51	M90-M91-M92-M87-M88	Cons. Adultos	FILO INFERIOR	14.00	1.90	13.10	1.00	13.10
52	M85-M86-M89-M94-M97	Cons. Adultos	FILO INFERIOR	13.60	1.80	11.80	1.00	11.80
53	M34-M33-M70-M69	Cons. Adultos	FILO INFERIOR	12.06	1.80	10.26	1.00	10.26
54	M64-M65-M67-M68	Cons. Adultos	FILO INFERIOR	11.67	1.80	9.87	1.00	9.87
55	M1	Sala de espera	FILO INFERIOR	13.41		13.41	1.00	13.41
56	M131	Formula Salatta	FILO INFERIOR	3.48	0.00	3.48	1.00	3.48

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
						PA-FO-30	
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA VIVENCIA

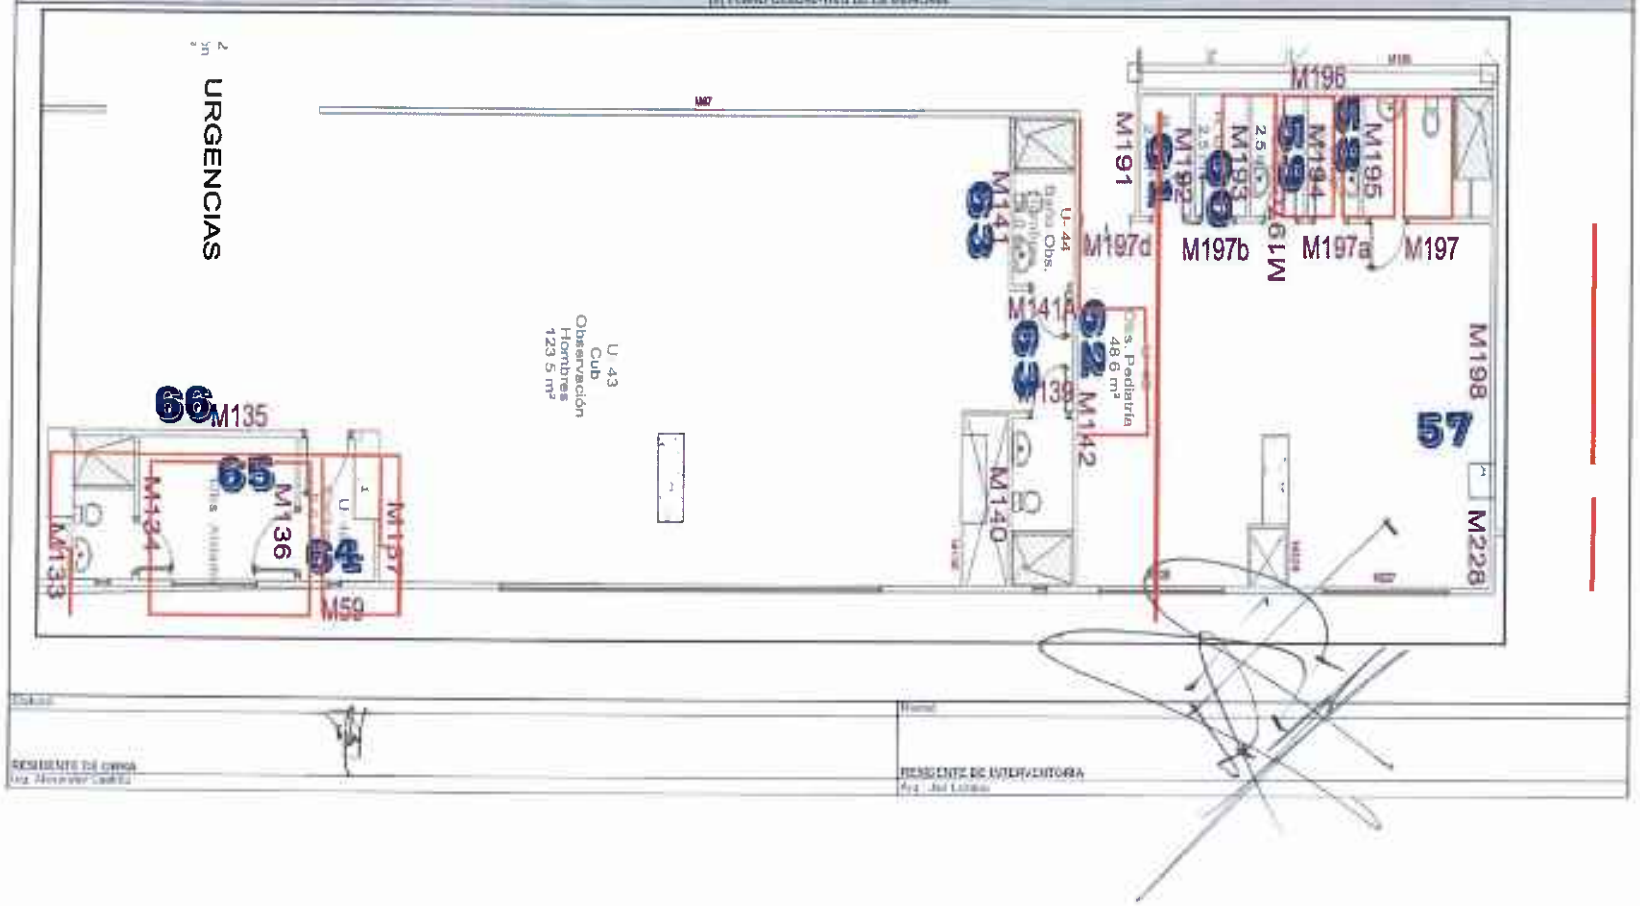

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30				
				Versión No. 08		Página 1 de 4		
				Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

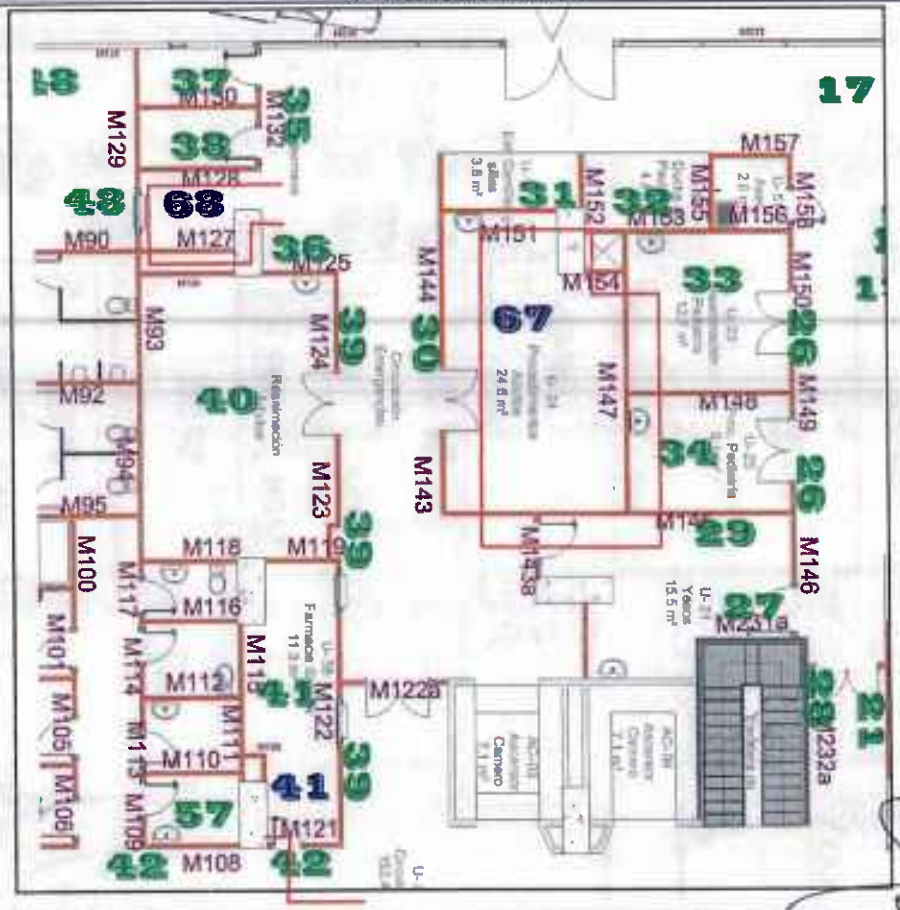

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

EL PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

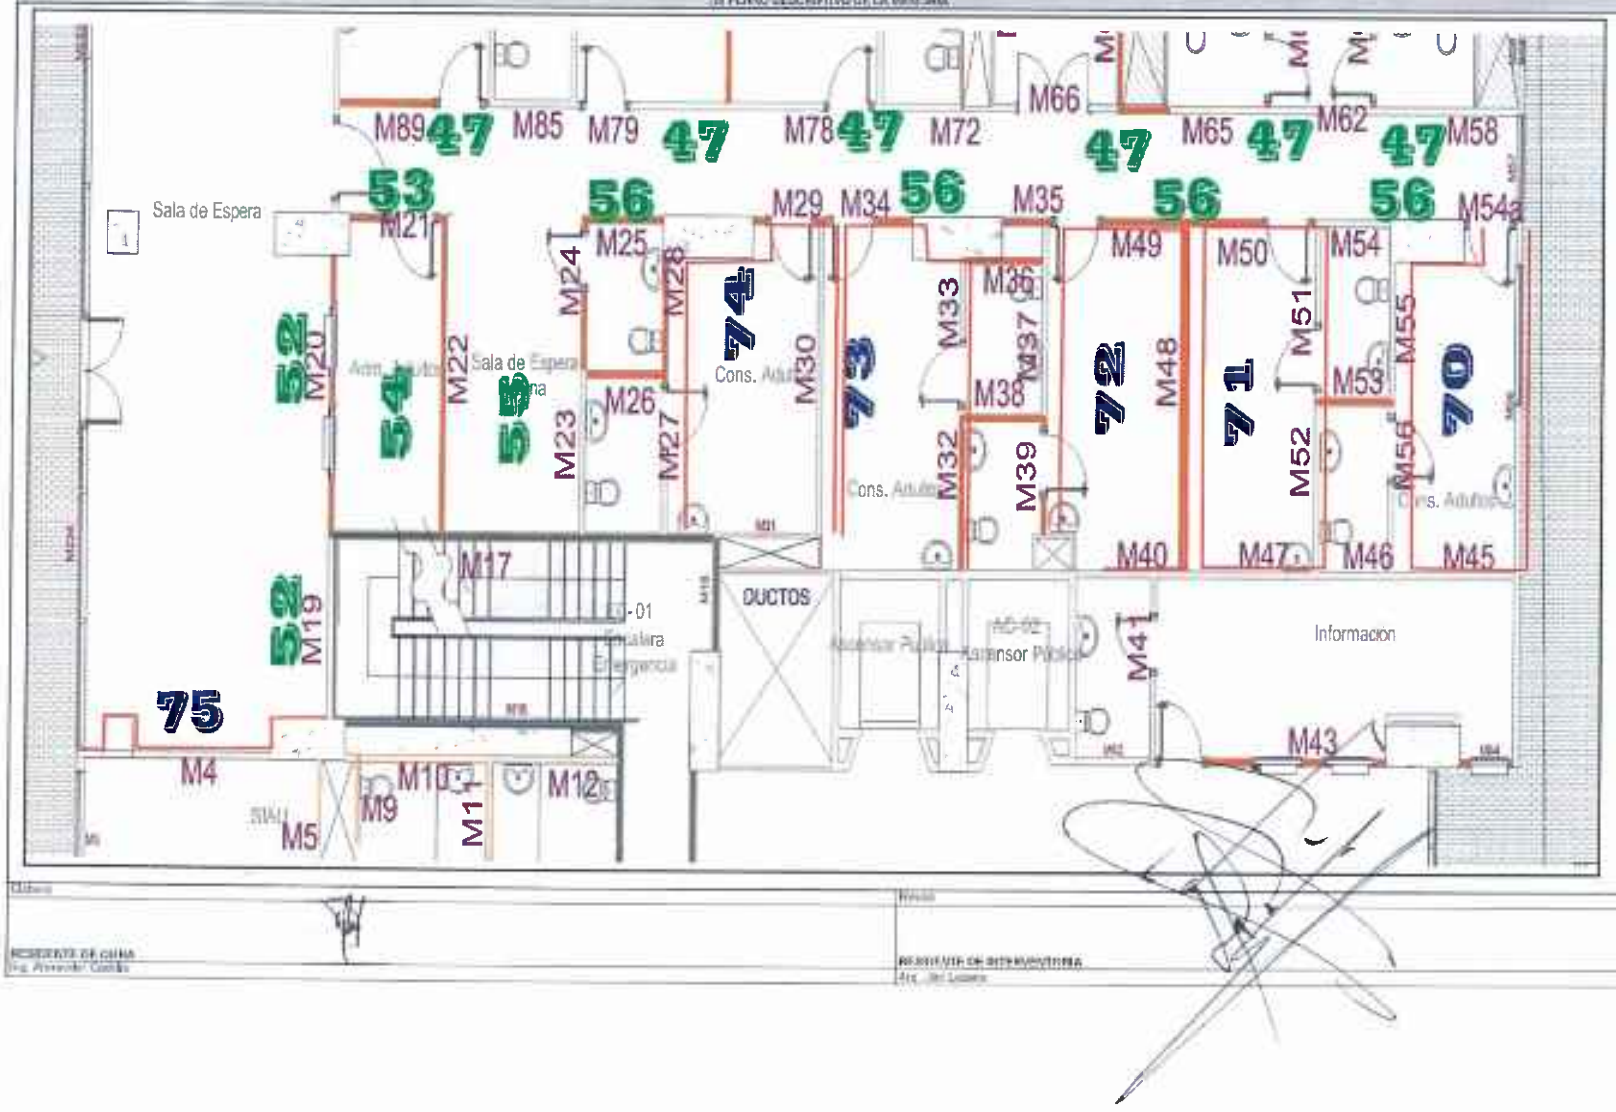

Dibujó:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-39				
				Versión No. 05		Página 1 de 4		
				Fecha:	9	4	2025	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLASO DESCRIPTIVO DE LA MANO DE OBRA

	(e) LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	UBIACIÓN	DEDUCCIONES		(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
				Longitud	Pequeños huecos			
1	Columna B10	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
3				2.83		2.83	1.00	2.83
4	M210-M213	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
13	M215	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
15	Columna B8	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
17	M163a	Sin vertical		1.20		1.20	4.00	4.80
		Sin horizontal	Ventanas	1.00		1.00	4.00	4.00
18		Sin vertical		1.00		1.00	4.00	4.00
		Sin horizontal		1.20		1.20	4.00	4.80
19	Columna C8	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
20				2.83		2.83	1.00	2.83
21				2.80		2.80	1.00	2.80
22	M176	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
23	M177	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
24		Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
25	Columna C7	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
27		Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
28	M179	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
29	M178	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
30	Columna D8	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
31	M158	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
33	M157	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
34	M152	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
35		Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
36	M144	Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
38		Sin vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
39	231.00	Sin horizontal		6.24		6.24	1.00	6.24
		Sin vertical		0.57		0.57	1.00	0.57
40	M232	Sin horizontal		5.39		5.39	1.00	5.39
		Sin vertical		0.57		0.57	1.00	0.57
			SUB TOTAL					83.83
			VARIOS					30.48
			PARAS					214.35

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Firma:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
				Código: PA-FO-30			
				Versión No. 06		Página 1 de 1	
				Fecha:	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
ITEM Nº:	9.4.1	DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes				(c) UND:	ML

M) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

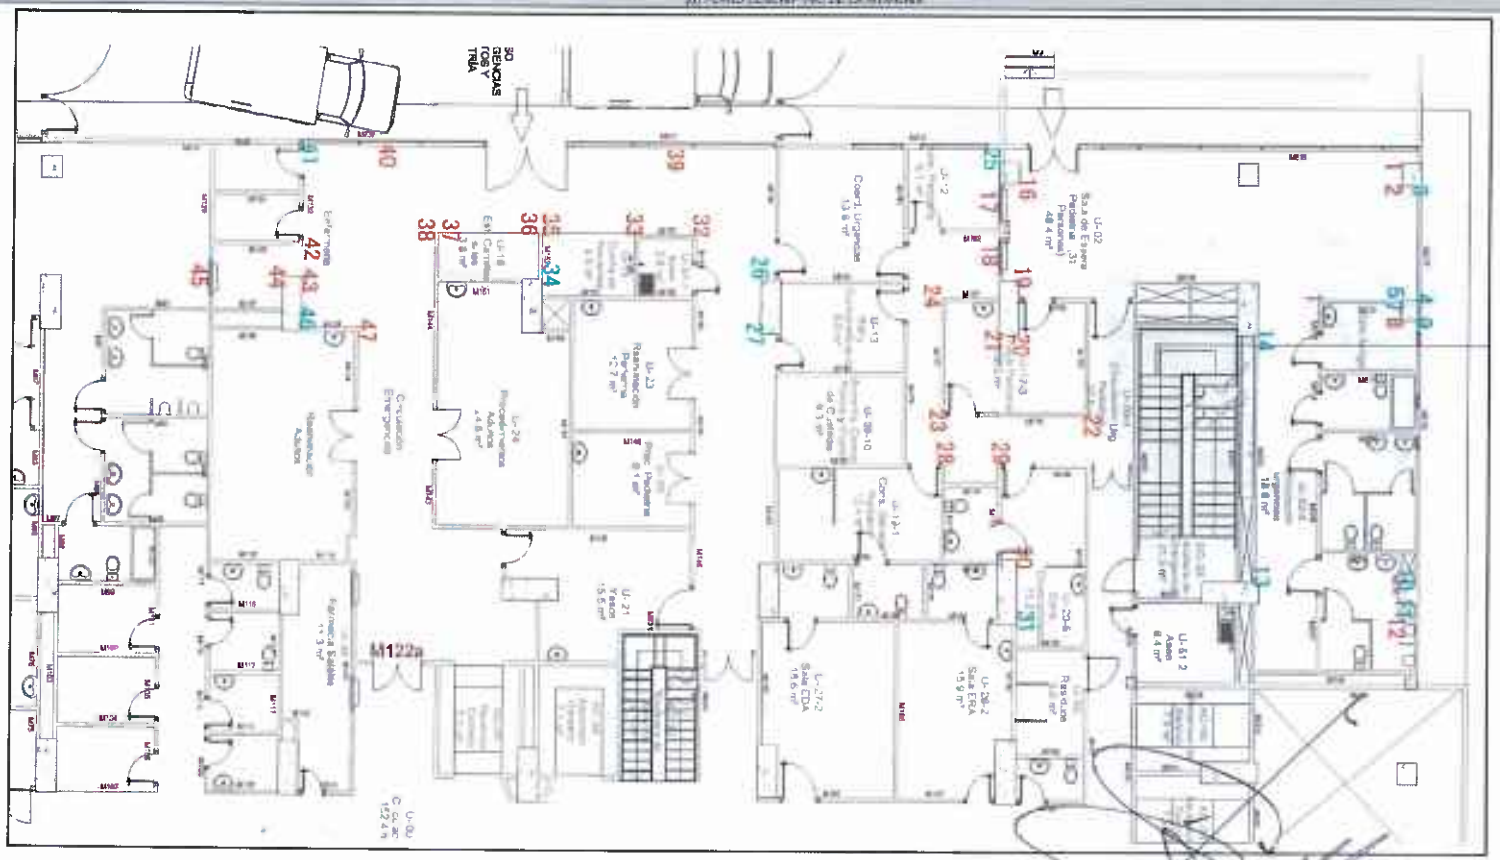

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-59	
		Versión No. 02	Página 1 de 4
		Fecha: 9	4 2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRITIVO DE LA MEMORIA

	(e) LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Repeticiones iguales	(f) MEDIDA PARCIAL ML	(g) No DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
42	M126	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
46	Columna C6	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
47	M126	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
48	Columna C6	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
50	M143	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
53	M122	Ría vertical	Ventana	1.10		1.10	4.00	4.00
		Ría horizontal		1.00		1.00	4.00	4.00
54		Ría vertical		1.10		1.10	4.00	4.00
		Ría horizontal		1.00		1.00	4.00	4.00
55	M131	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
57	M136	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
58	Columna E1	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
62	Columna D1	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
61	M102	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
64	M103	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
63	M101	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
65	Columna D5	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
67	Columna C6	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
70	M126	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
77	Columna F6	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
78		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
81		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
79	M135	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
86	Columna F5	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
87		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
83	M02	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
84	M01	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
93	Columna F3	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
90	Columna F4	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
91	M02	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
94	M03	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
96	Columna C3	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
97		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
98		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
99	M17	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
100		Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
101	M19	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
102	Columna C2	Ría vertical		2.83		2.83	1.00	2.83
		SUBTOTAL						121.81
		VENTA						274.72
		SUBTOTAL MUROS						396.53
		VALOR COSTO DE VIVIENDA						1340.76
		VALOR SUBTOTAL CUBO						396.76
		TOTAL ACTA						1183.76

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Firma:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Losada

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				
			Código: PA-FO-30		
			Versión: 03	Página 1 de 4	
			Fecha: 9	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.4.1	DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA PARTIDA

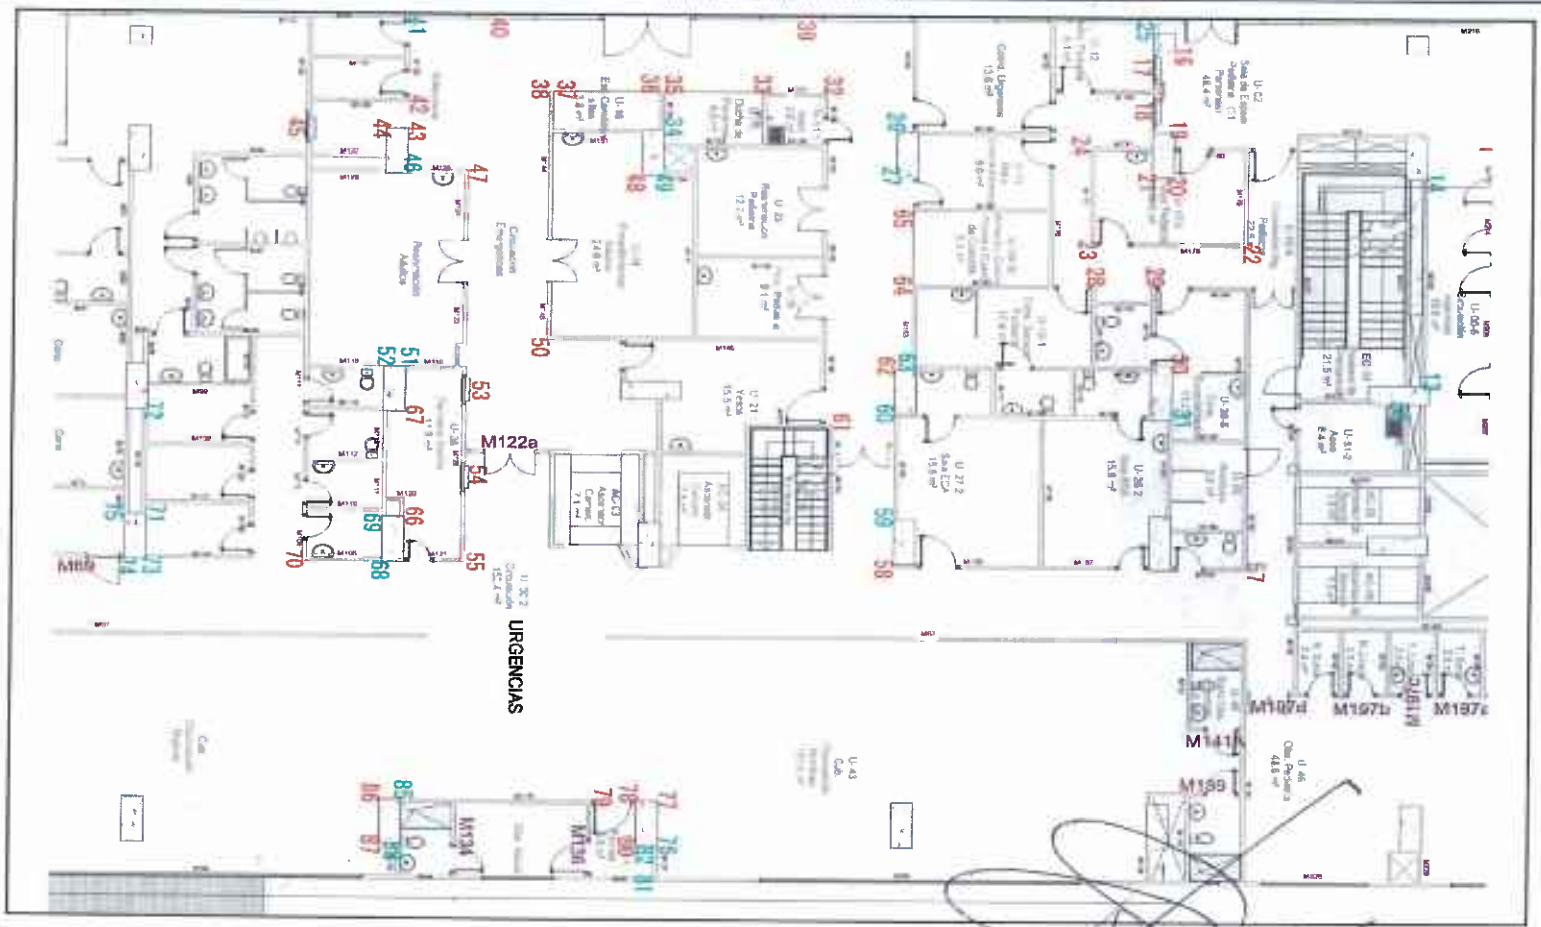

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos paÑetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

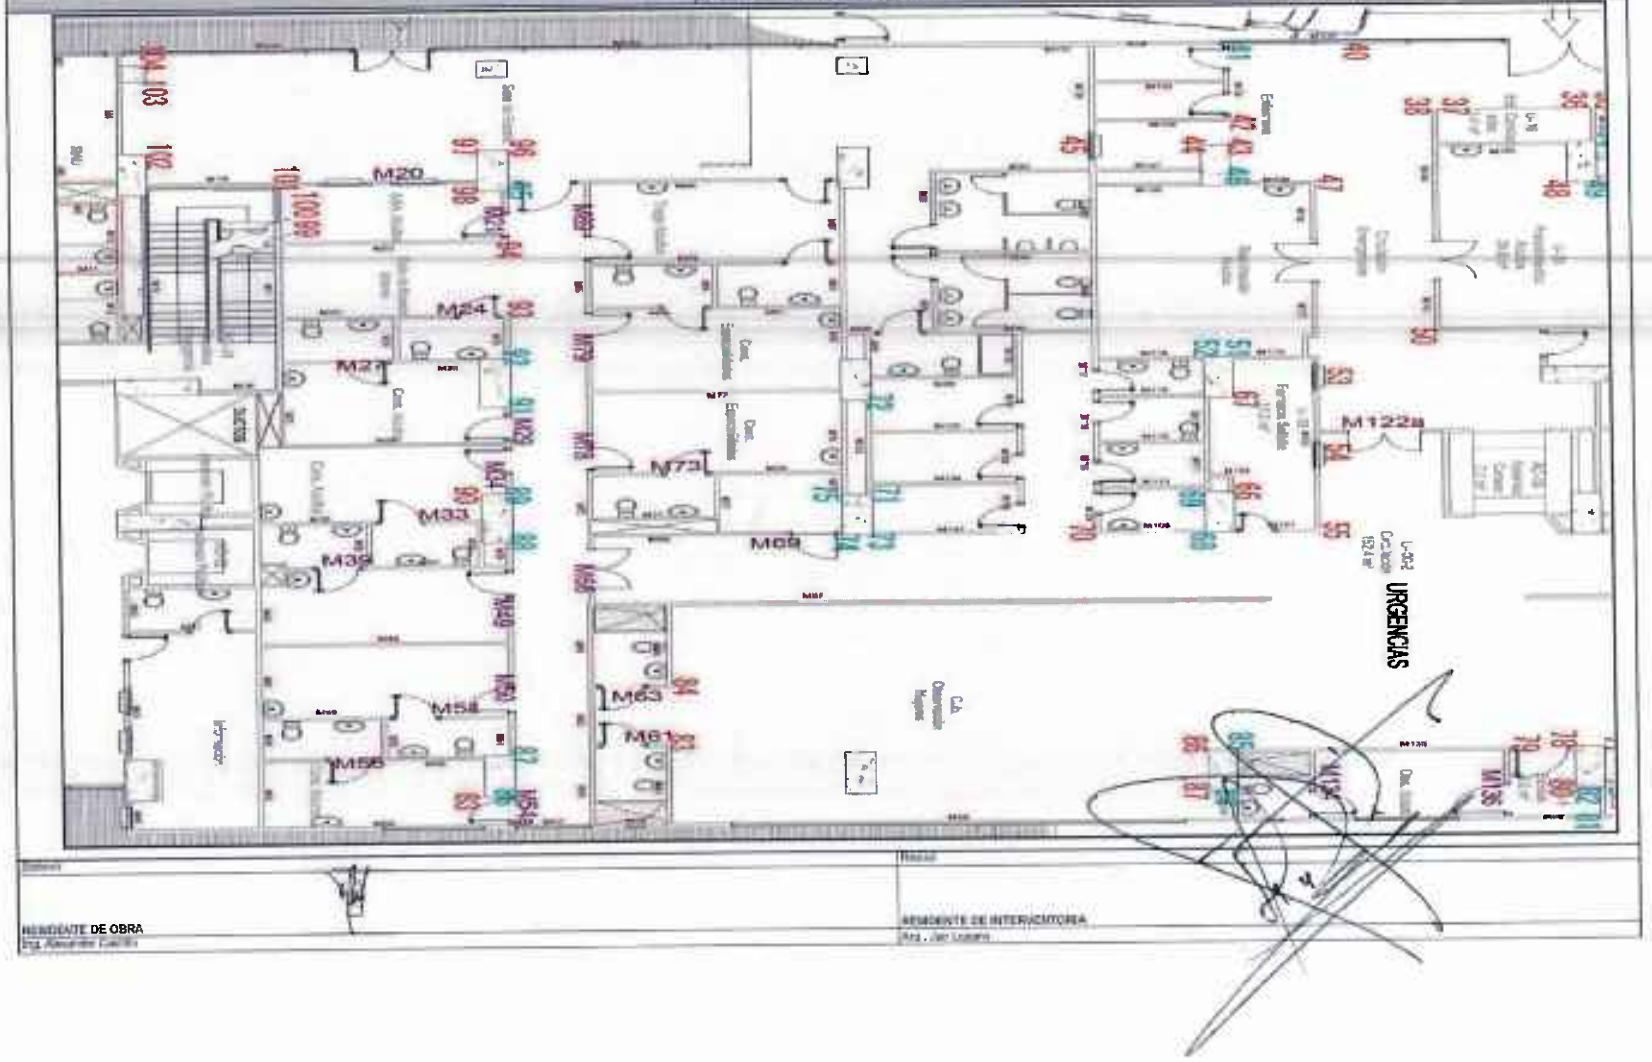

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 2						
M300a	4,52				1,00	4,52
M245	2,94				1,00	2,94
M284	3,46				1,00	3,46
M297	1,42				1,00	1,42
M298	1,48				1,00	1,48
M299	3,24		1,86		1,00	1,38
M300	2,28				1,00	2,28
M301	1,89				1,00	1,89
M301a	3,45				1,00	3,45
M302	0,84				1,00	0,84
M303	1,89				1,00	1,89
M240	1,73				1,00	1,73
M240a	1,73				1,00	1,73
M240b	0,79				1,00	0,79
M232	3,64				1,00	3,64
M234	2,54				1,00	2,54
M250	2,41				1,00	2,41
M251	2,04				1,00	2,04
M187	1,55				1,00	1,55
			PASAN			41,98

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	1	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pañetes			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

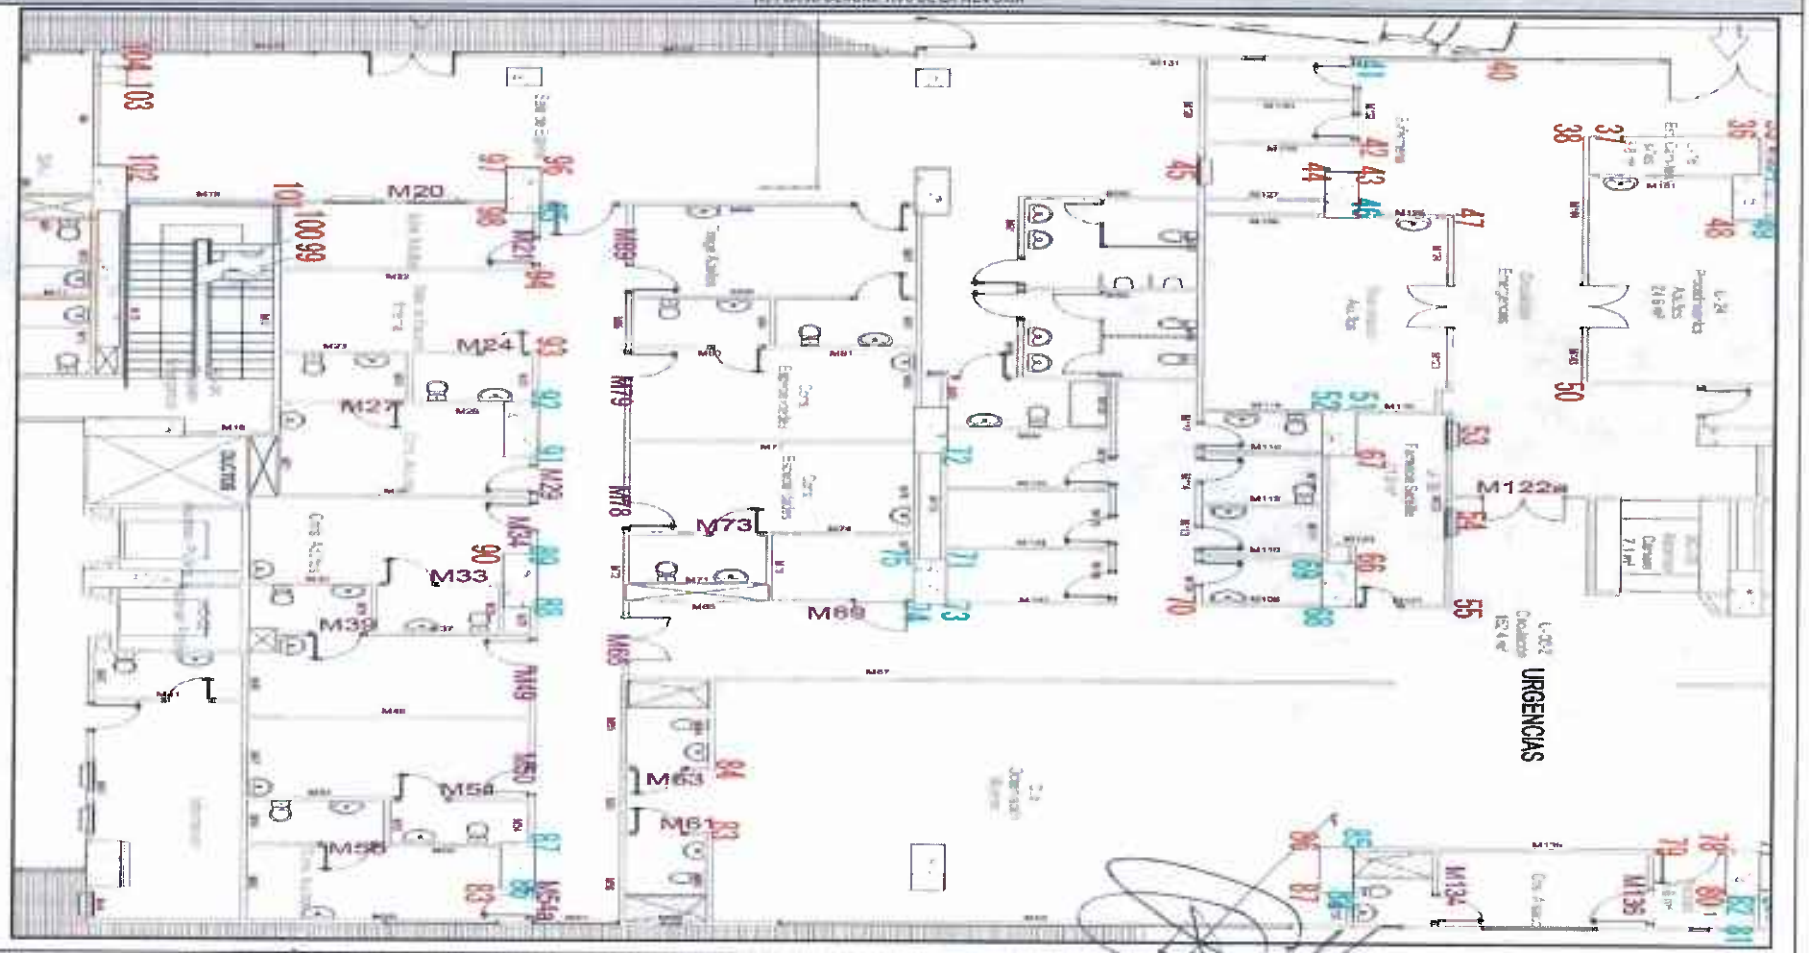

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lizano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Dscuento viguetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 2						
M188	0,96				1,00	0,96
M188	2,53				1,00	2,53
M195	5,02				1,00	5,02
M194	1,83				1,00	1,83
M189	2,04				1,00	2,04
M193	0,76				1,00	0,76
M191	0,85				1,00	0,85
M193a	0,39				1,00	0,39
M215	2,70				1,00	2,70
M156	2,70				1,00	2,70
M173	3,74				1,00	3,74
M168a	4,08				1,00	4,08
M170	1,57				1,00	1,57
M168	2,28				1,00	2,28
M169	0,80				1,00	0,80
M161	3,96				1,00	3,96
M162	1,04				1,00	1,04
			SUB TOTAL			37,25
			VIENEN			41,98
			PASAN			79,23

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 06		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°.	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 2						
M150	1,32				1,00	1,32
M151	3,96				1,00	3,96
M151a	0,66				1,00	0,66
M154	2,70				1,00	2,70
M116	2,70				1,00	2,70
M114	2,70				1,00	2,70
M113	2,70				1,00	2,70
M138	2,35				1,00	2,35
M139	2,32				1,00	2,32
M141	3,56				1,00	3,56
M107	2,70				1,00	2,70
M108	2,70				1,00	2,70
M1-M5	3,72				1,00	3,72
M2-M4	2,64				1,00	2,64
M3	5,42				1,00	5,42
				SUB TOTAL		42,15
				VIENEN		79,23
				PASAN		121,38

Elaboro:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

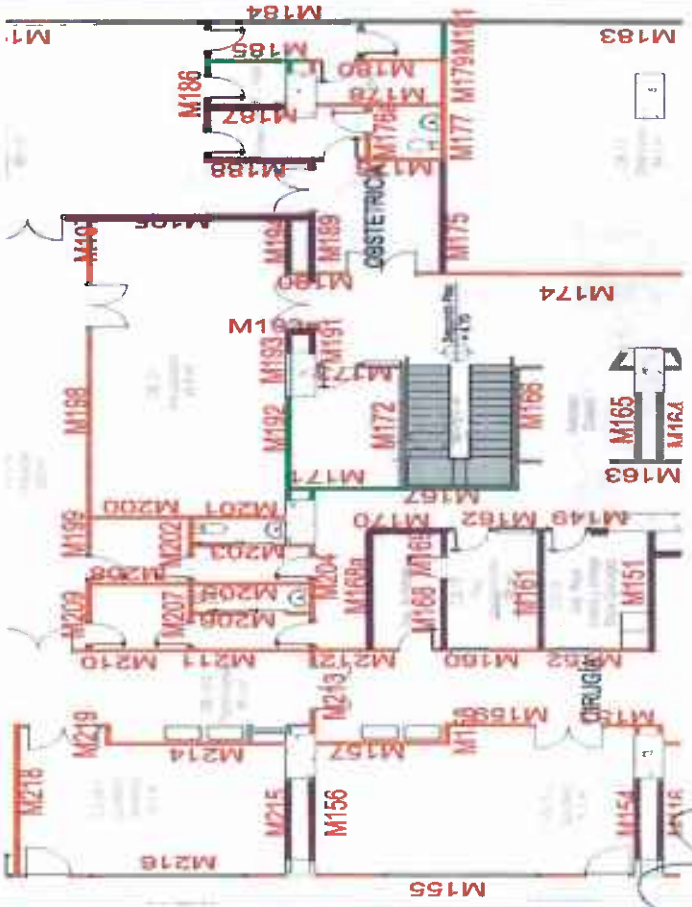

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO2						
M7	2,22				1,00	2,22
M8	1,75				1,00	1,75
M9	1,07				1,00	1,07
M70	2,87				1,00	2,87
M71	2,85				1,00	2,85
M71a	0,37				1,00	0,37
M68-69	9,43				1,00	9,43
M24	0,40				1,00	0,40
M36	5,43				1,00	5,43
M37	1,76				1,00	1,76
M38	1,74				1,00	1,74
M39	2,25				1,00	2,25
			SUB TOTAL			32,14
			VIENEN			121,38
			TOTAL			153,52

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 2						
M85	1,22				1,00	1,22
M79	3,38				1,00	3,38
M72	3,20				1,00	3,20
M73	3,20				1,00	3,20
M90	3,53				1,00	3,53
M91	3,50				1,00	3,50
M104	4,43				1,00	4,43
M103	6,18				1,00	6,18
M49	3,36				1,00	3,36
M48	5,84				1,00	5,84
M50	0,64				1,00	0,64
M59	3,61				1,00	3,61
M134	1,93				1,00	1,93
M136	0,99				1,00	0,99
M135	0,97				1,00	0,97
M143	0,99				1,00	0,99
M171	2,53				1,00	2,53
M192	3,50				1,00	3,50
M225	1,22				1,00	1,22
M226	3,38				1,00	3,38
M262	2,46				1,00	2,46
M304	1,90				1,00	1,90
M305	0,73				1,00	0,73
M306	1,90				1,00	1,90
				SUBTOTAL FEBRERO		54,59
				VIENE SUBTOTAL DICIEMBRE		163,52
				TOTAL ACTA		218,11

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE INSORE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

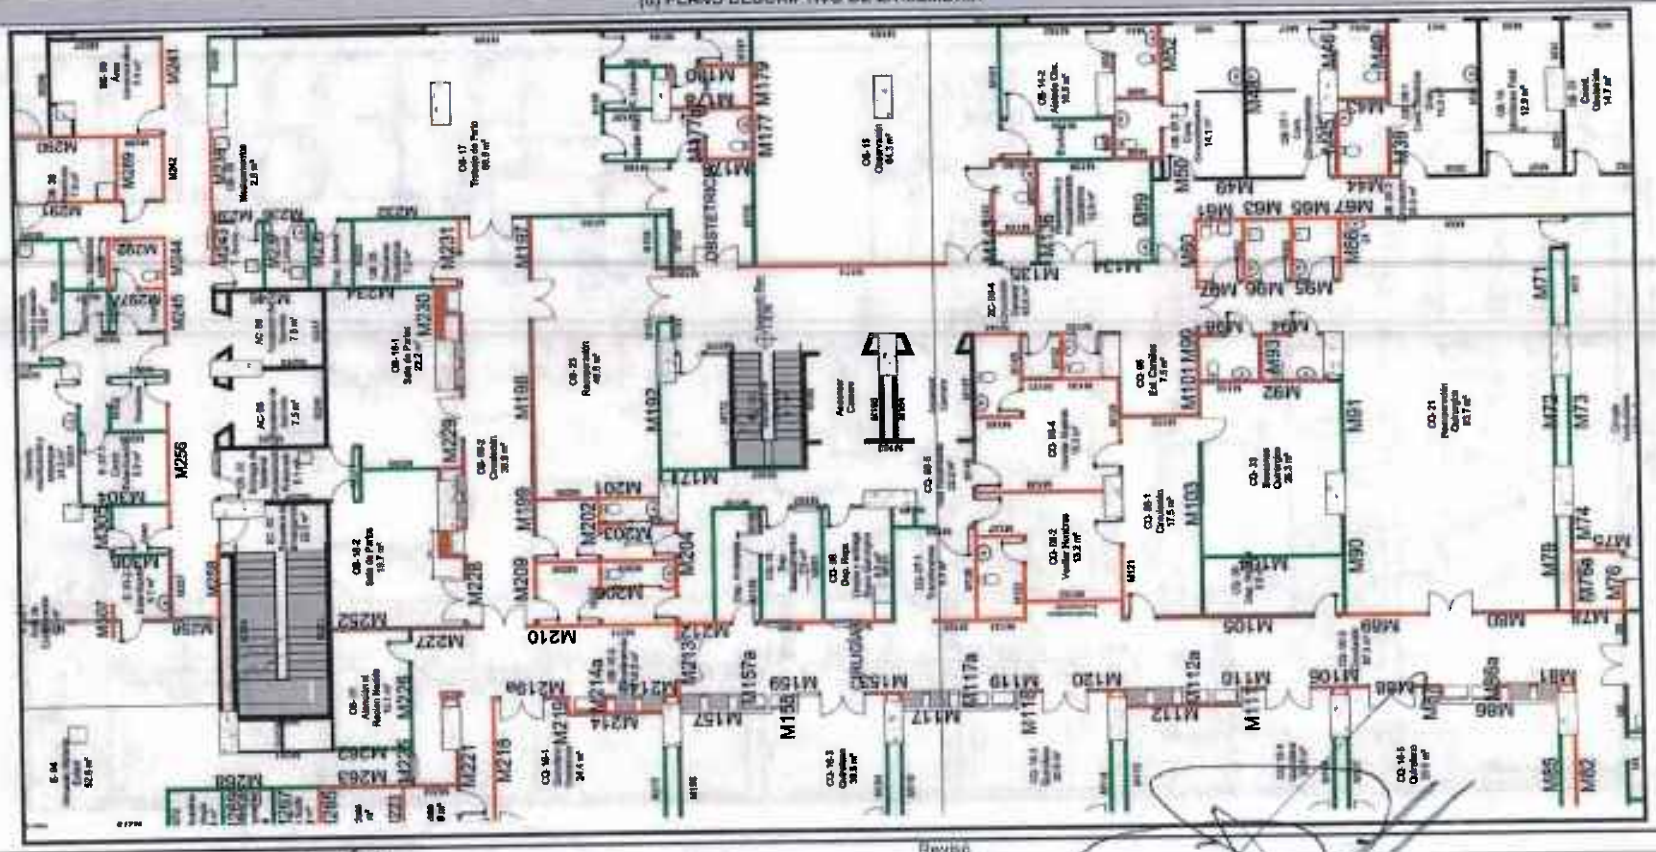

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 10		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	ENERO DE 2026
(a) ITEM N°:	11.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Bordillo en concreto gris 3000 psi 10x15 cm. (base muro de contención de arcilla) o cubierta+			(c) UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

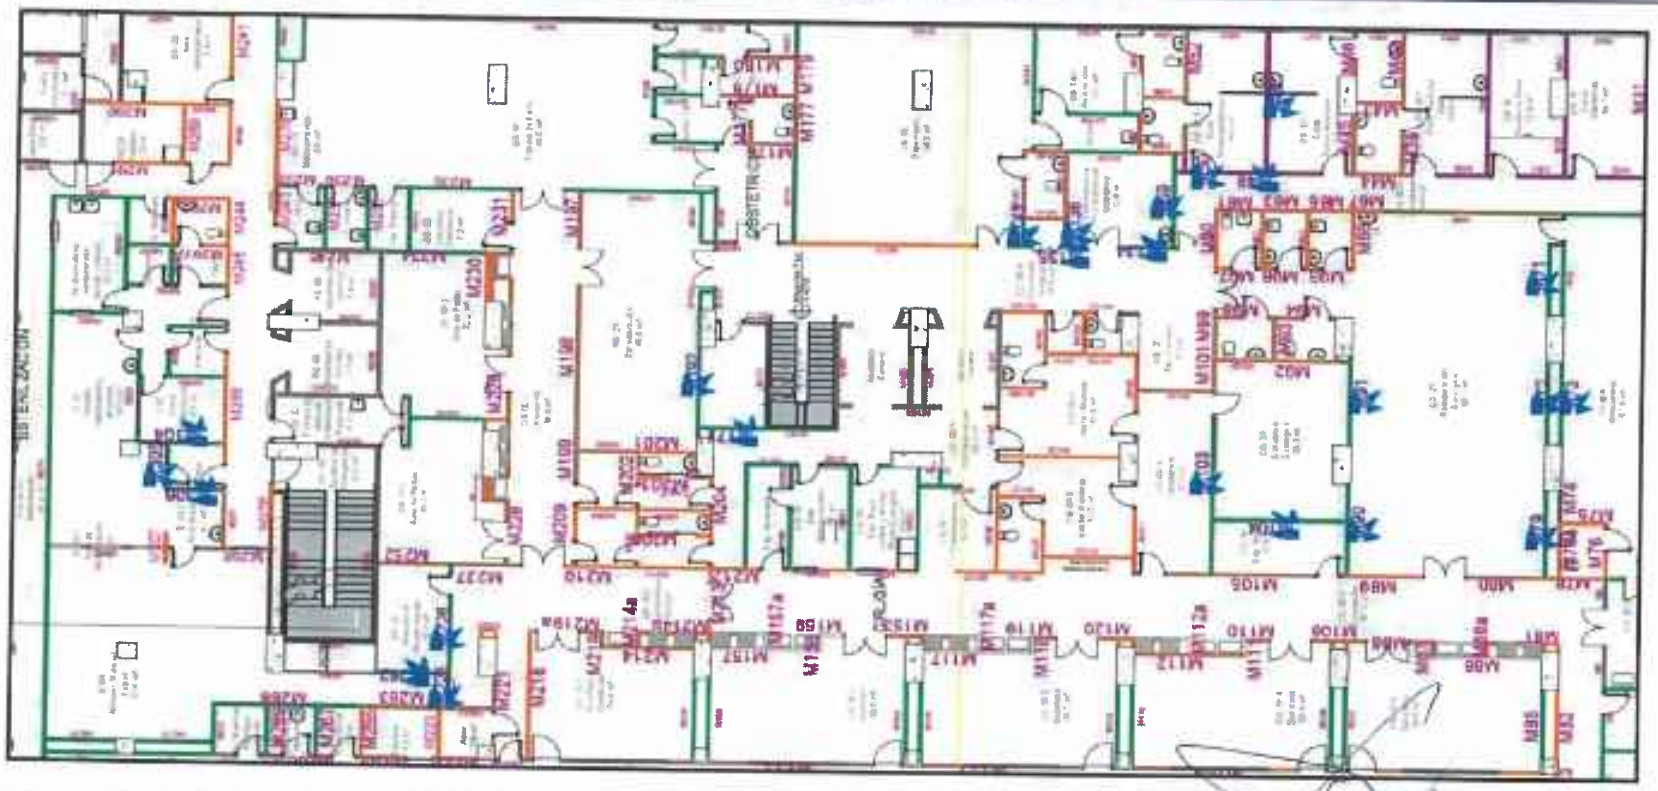

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 3-5 Y EJE E						
ENTRE EL EJE 6 Y ELE EJE B-E		15.00				13.00
ENTRE EL EJE 6 -7 EJE E		13.00				10.00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	6	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA AGUA CALIENTE

ENTRE ELEJE 8 Y ELE EJE B-E

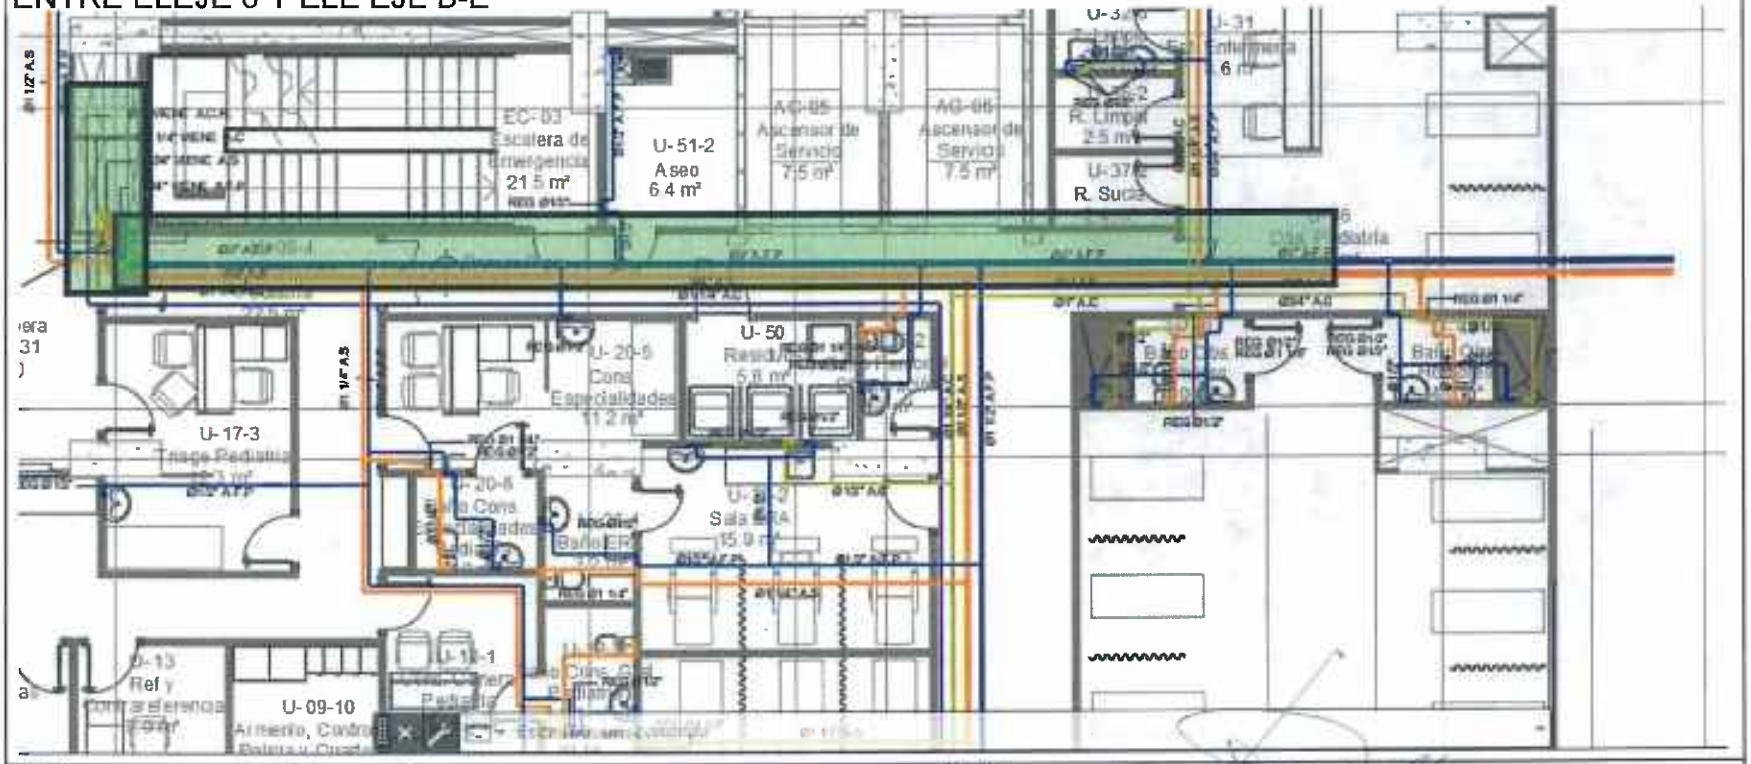

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castilla	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.7	DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 4-6 Y EJE E						
PASILLO URGENCIA		15,00				15,00
BAÑO OBSERVACION		4,30				4,30
			TOTAL			19,30

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 2 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/4"			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA AGUA CALIENTE

ENTRE ELEJE 8 -7 EJE E

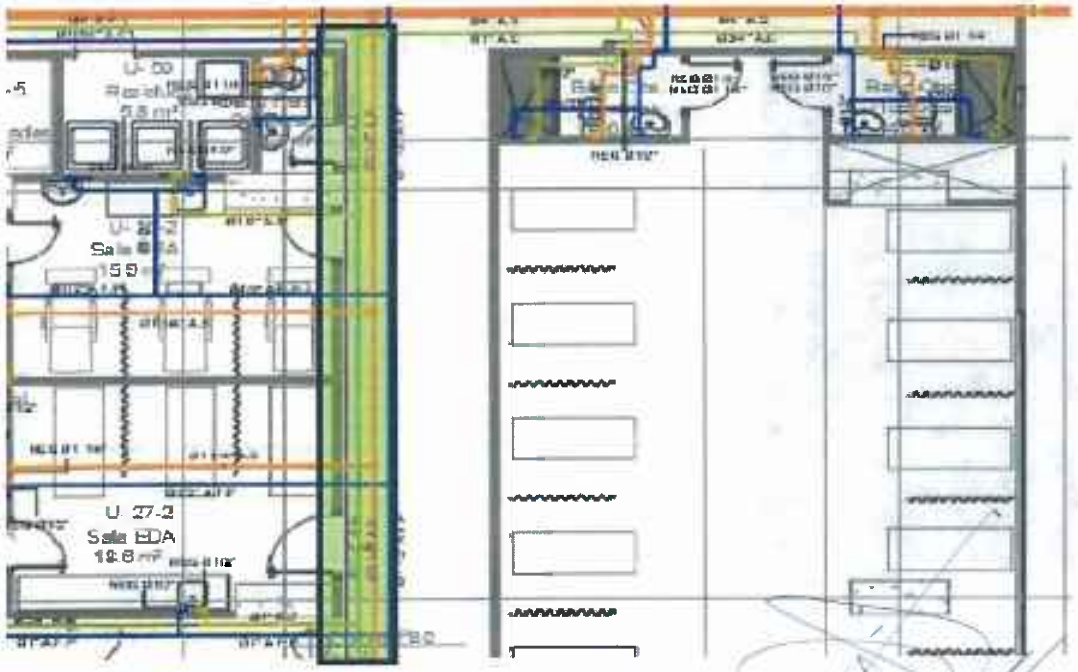

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA AGUA CALIENTE

PASILLO URGENCIA

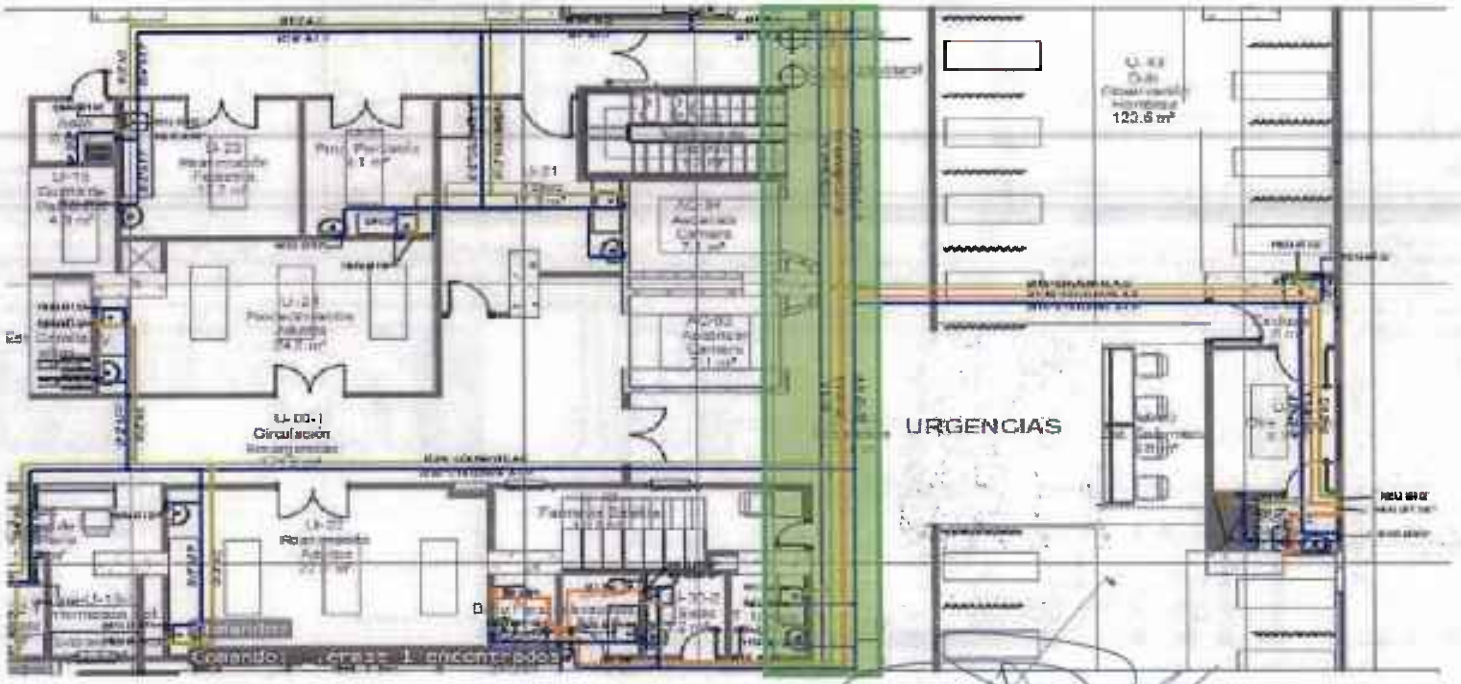

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	1	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.7	DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1"			UND:	ML

(2) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA AGUA CALIENTE

BAÑO OBSERVACION

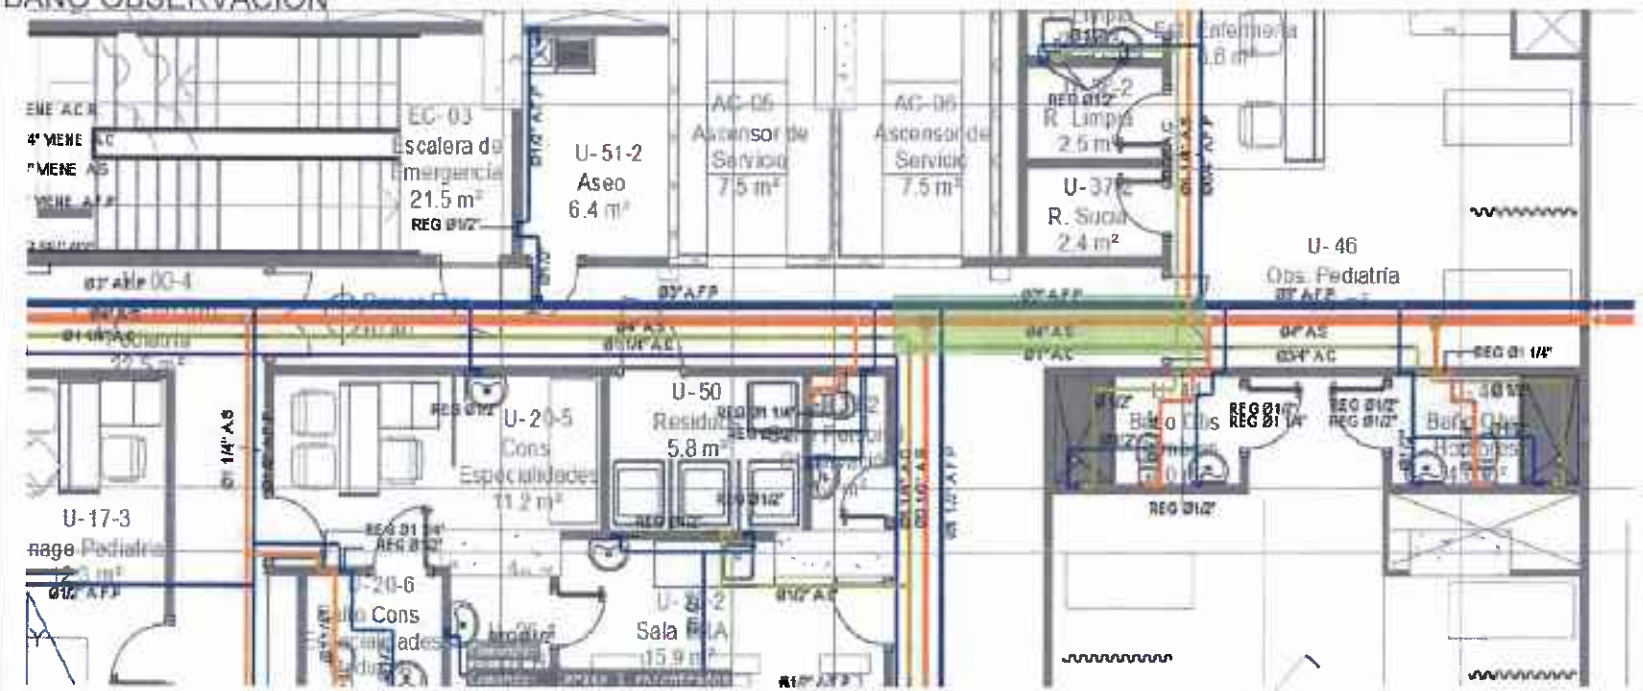

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09	Página 1 de 2		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE N°:**	17	**FECHA :**	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.8	**DESCRIPCION ITEM**	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø3/4"			**UND:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 3-7 Y EJE A-F						
CIRCULCION EMERGENCIA		25.00				25.00
PASILLO URGENCIA		15.00				15.00
ENTRE EJE 3 EJE E-F		6.00				6.00
		4.00				4.00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.8	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø3/4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.9	DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO						
ENTRE EJE 2-10 EJE A-F		1,10				1,10
		2,00				2,00
		1,50				1,50
		5,00				5,00
		1,30				1,30
		1,00				1,00
		1,00				1,00
		1,00				1,00
		1,50				1,50
		6,80				6,80
		1,70				1,70
		2,00				2,00
		3,20				3,20
		3,00				3,00
		1,00				1,00
		7,00				7,00
		4,00				4,00
		1,53				1,53
		2,00				2,00
		1,00				1,00
		2,00				2,00
		1,00				1,00
		1,00				1,00
		3,00				3,00
		3,90				3,90
		2,00				2,00
		2,00				2,00
		0,57				0,57
		1,00				1,00
		3,00				3,00
		1,30				1,30
		TOTAL				88,10

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.8.8	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø3/4"		UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

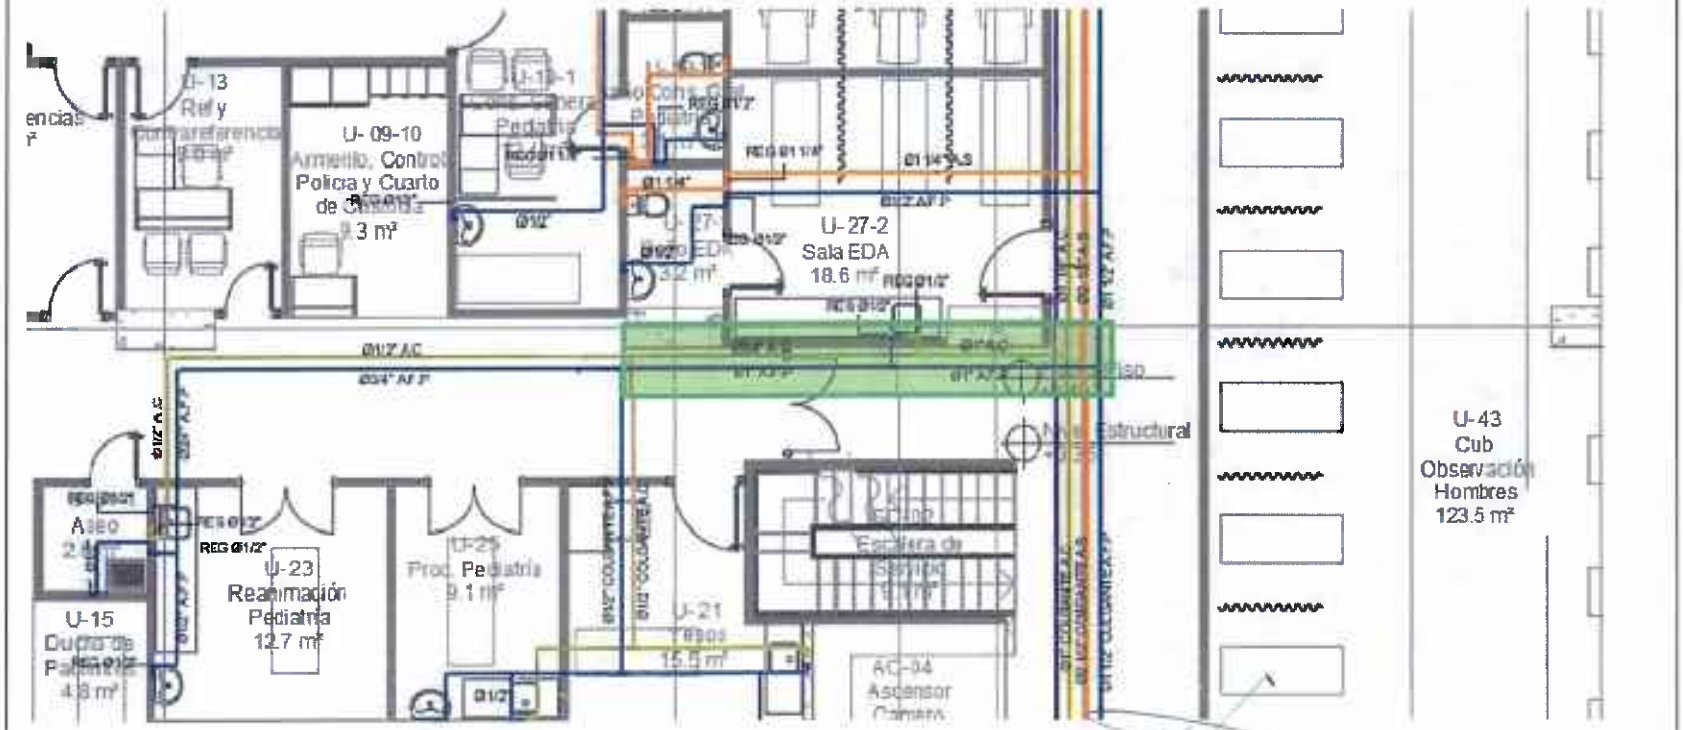

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	4	2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.8.9	DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(4) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

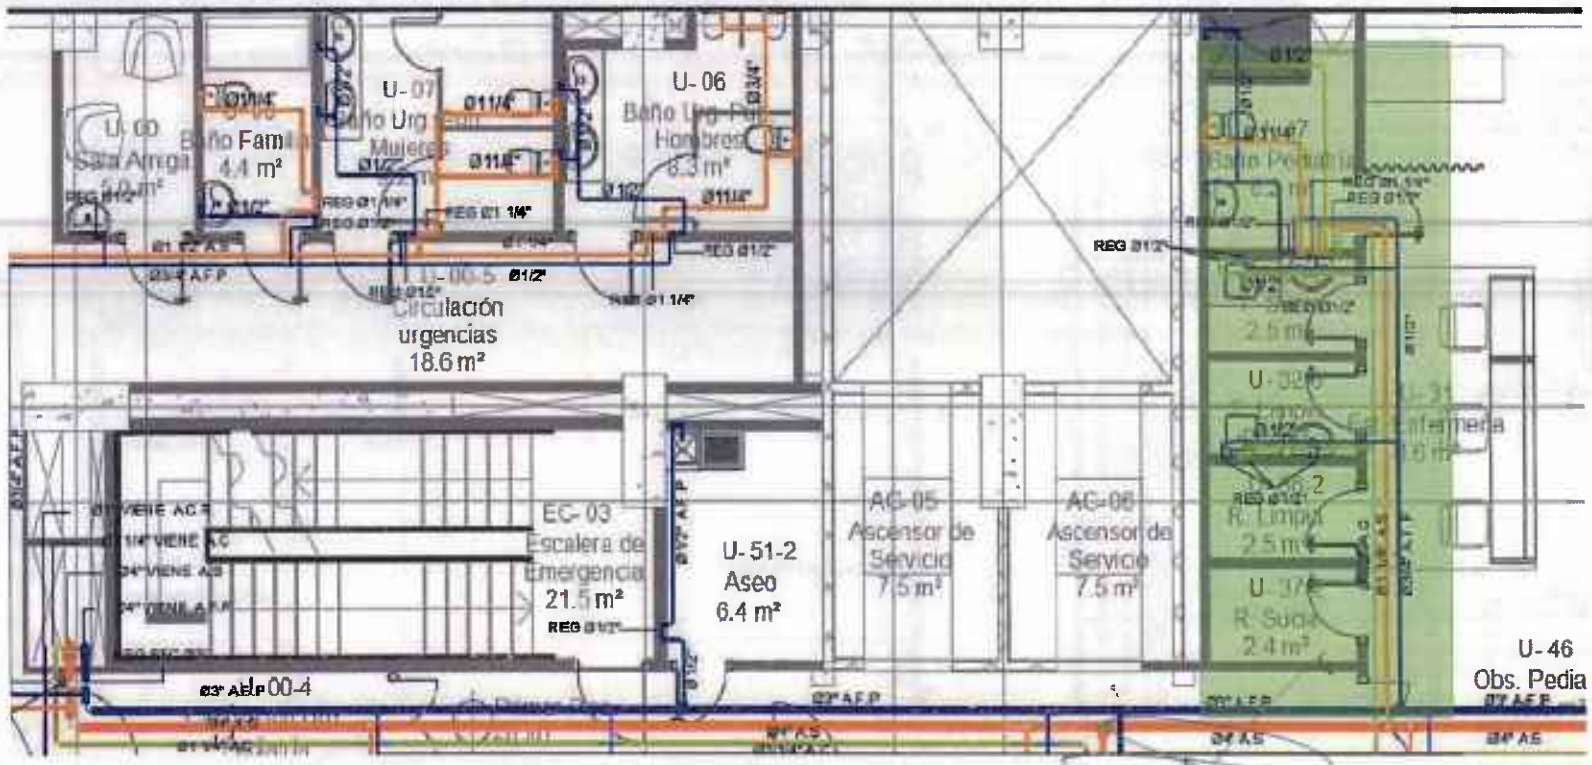

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 2 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.9	(b) DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

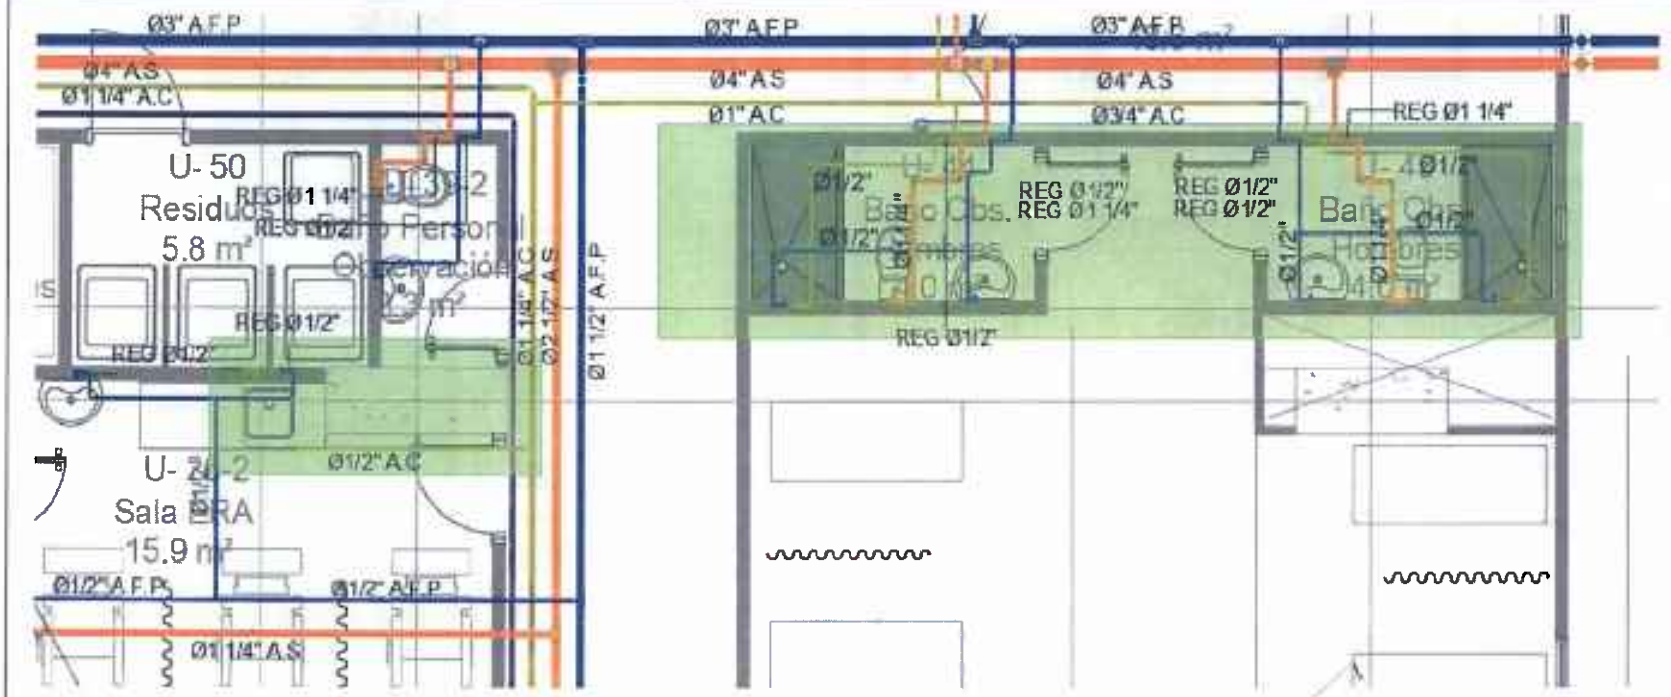

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Osorio

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No: 00		Página 2 de 4	
		Fecha	5	4	2033

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	26.8.9	(b) DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

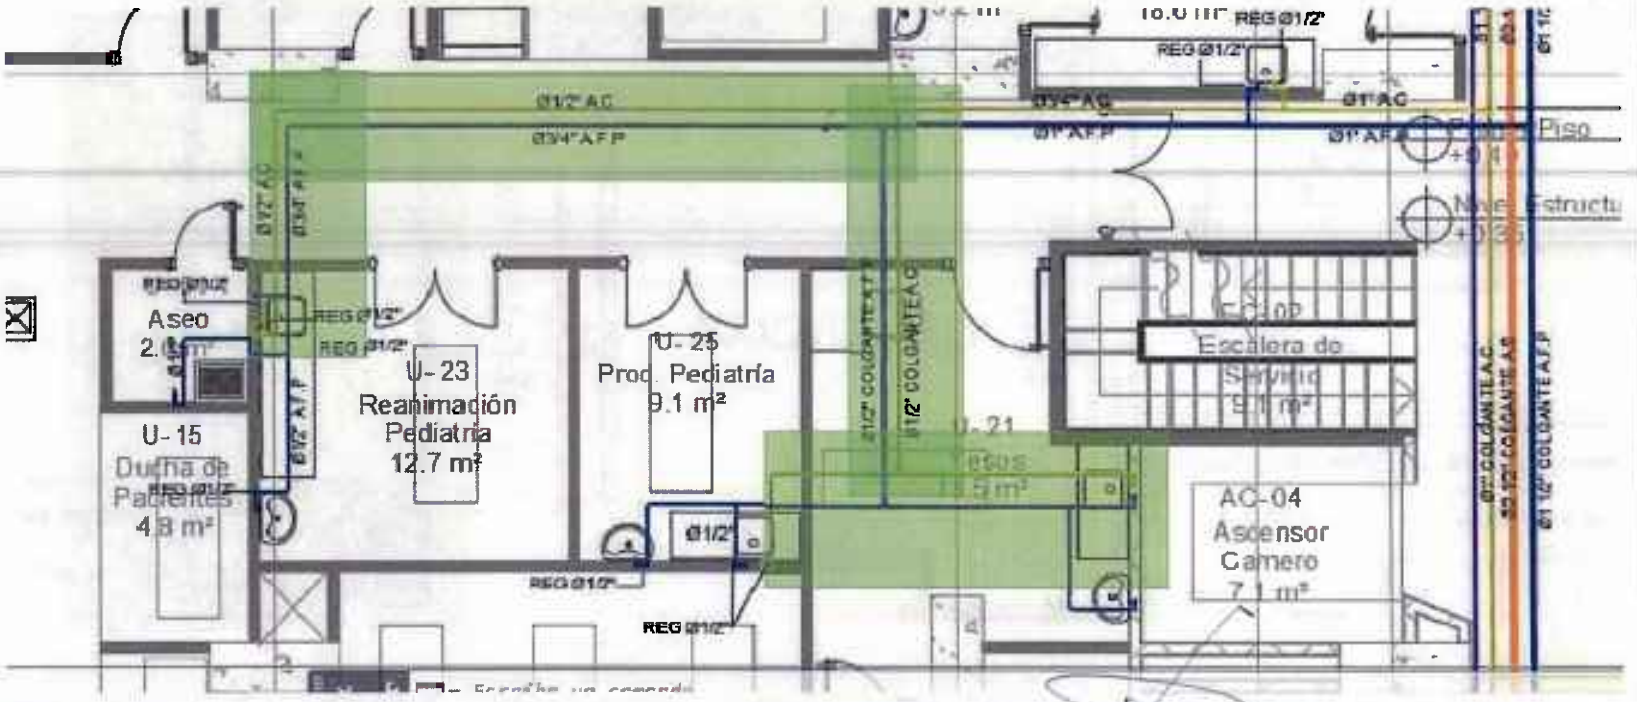

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03		Página 2 de 4	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.9	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 4	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.9	(b) DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

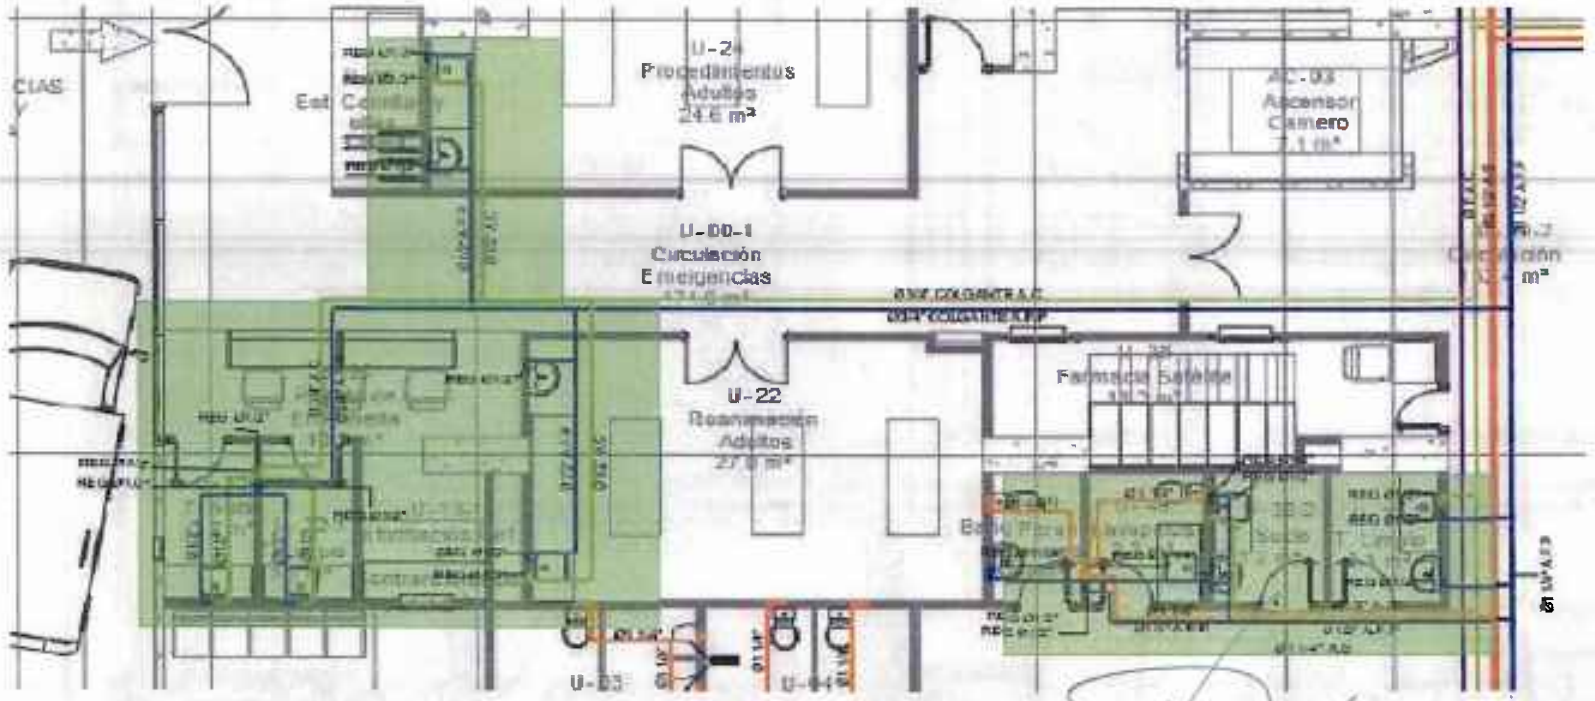

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 03	Página 2 de 4			
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.9	(b) DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

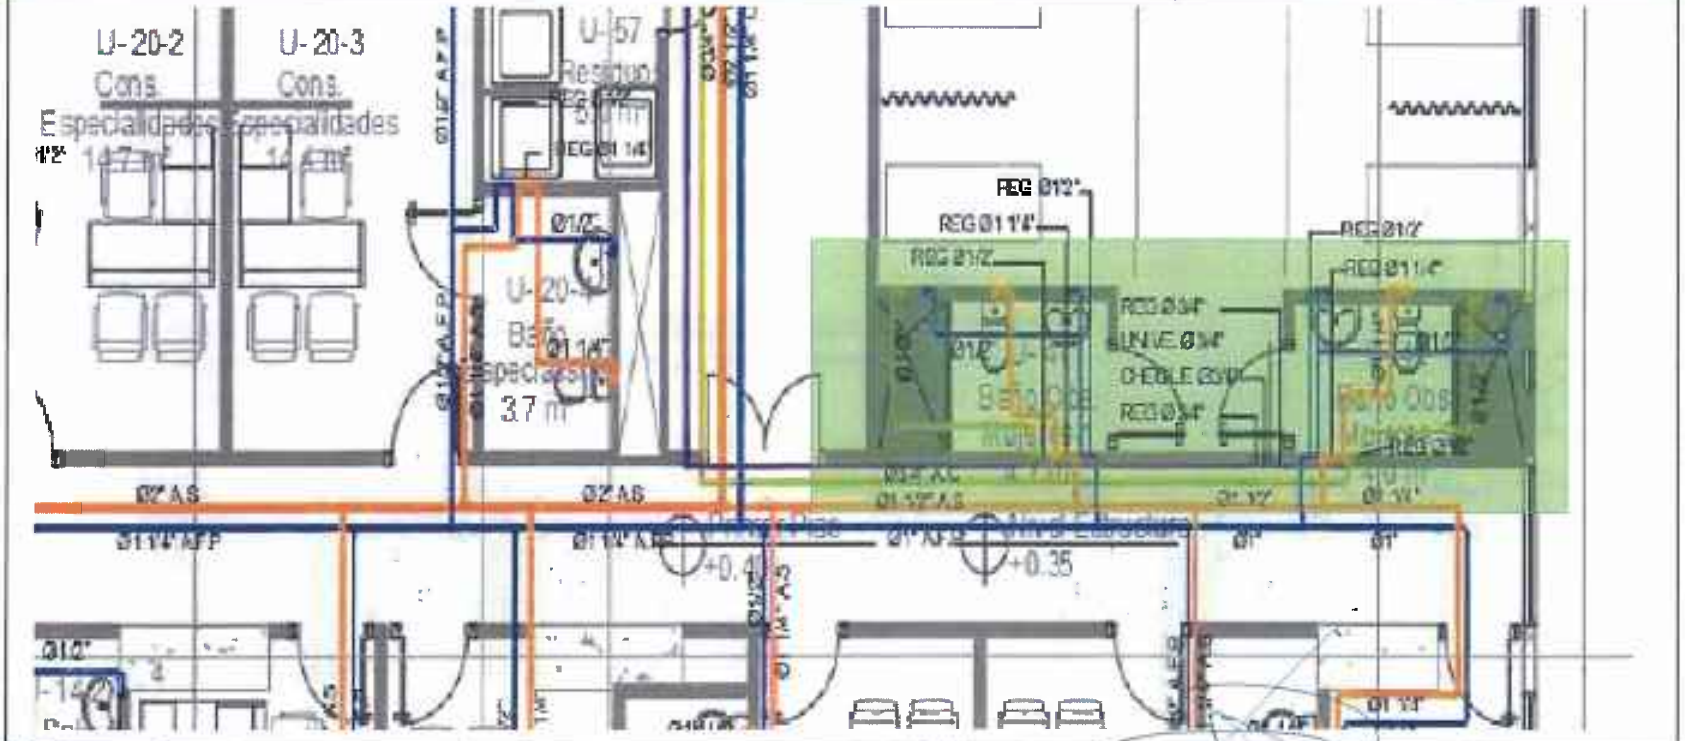

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	0	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					10,00	10,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-39			
				Versión No: 08		Página 1 de 1	
				Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/4"			UND:	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

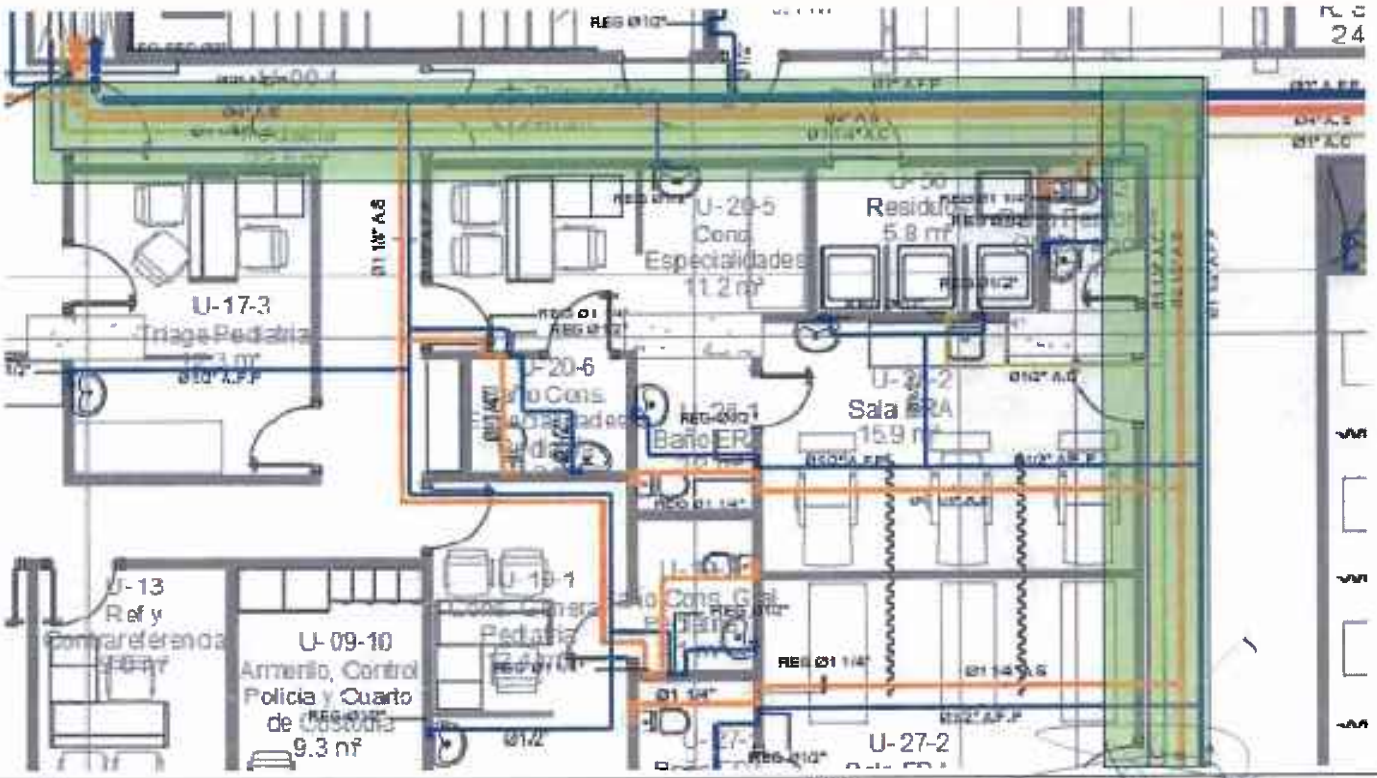

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.8.14	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					13,00	13,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.14	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	050 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.8.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø3/4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					40,00	40,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø3/4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

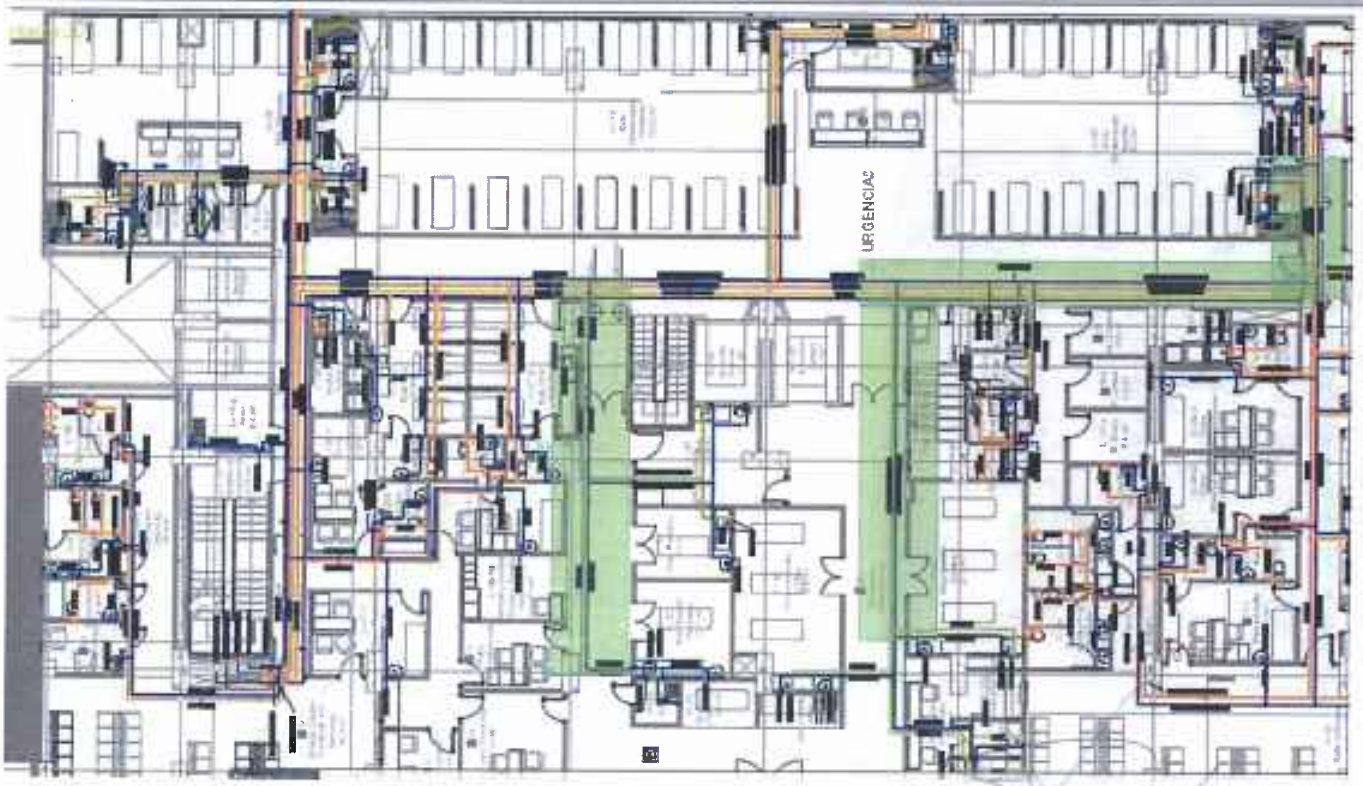

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 2	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.8.16	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					200,00	200,00
TOTAL						200,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.16	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

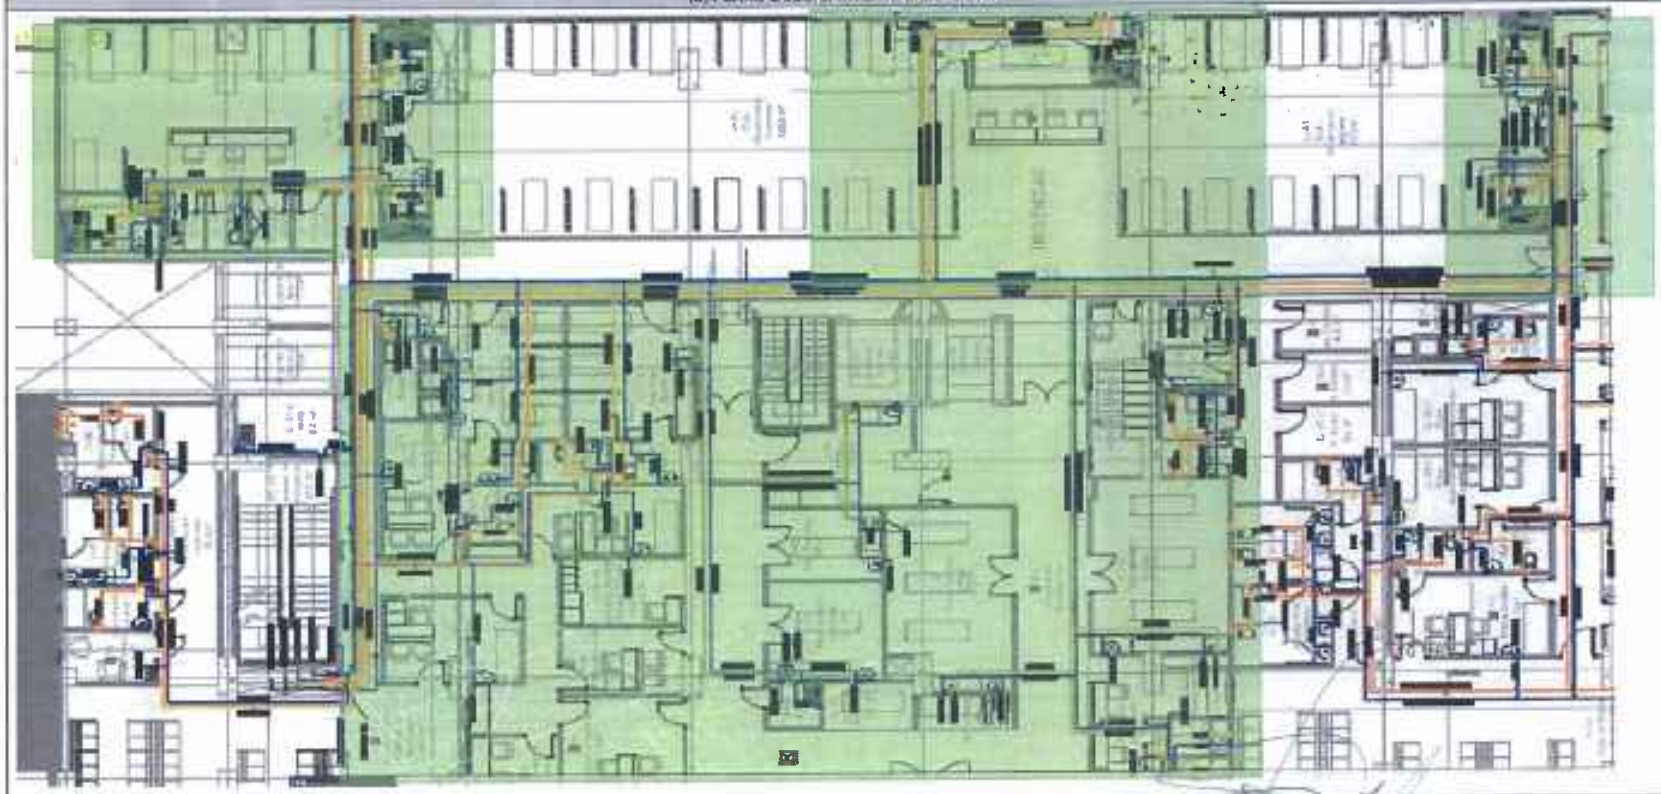

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.21	DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA :

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					13,00	13,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-10			
		versión No: 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	D	M	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.21	DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

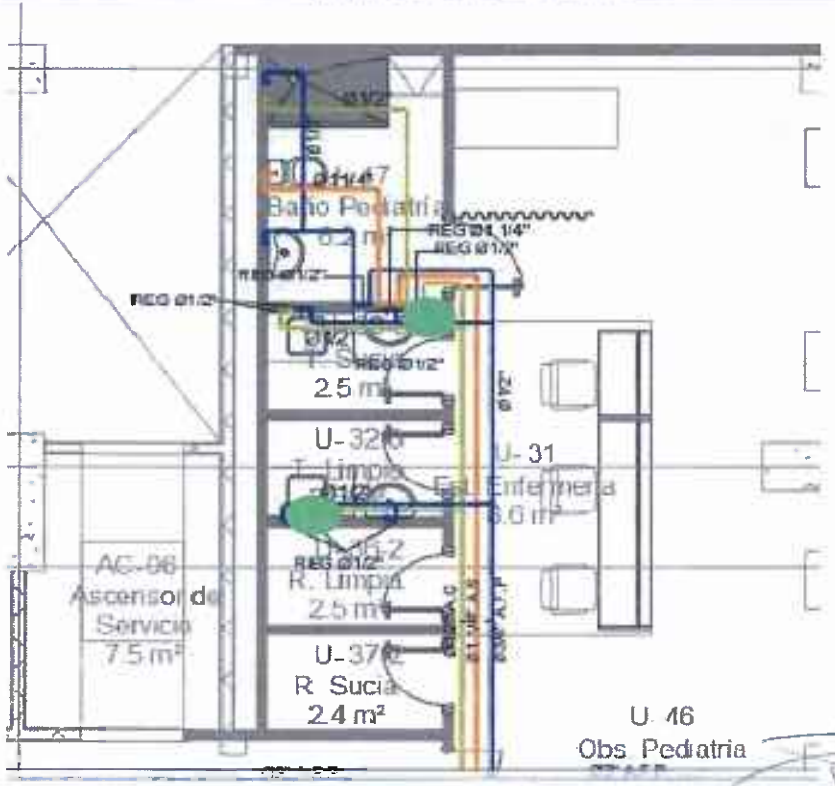

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 2 de 2		
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.21	DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

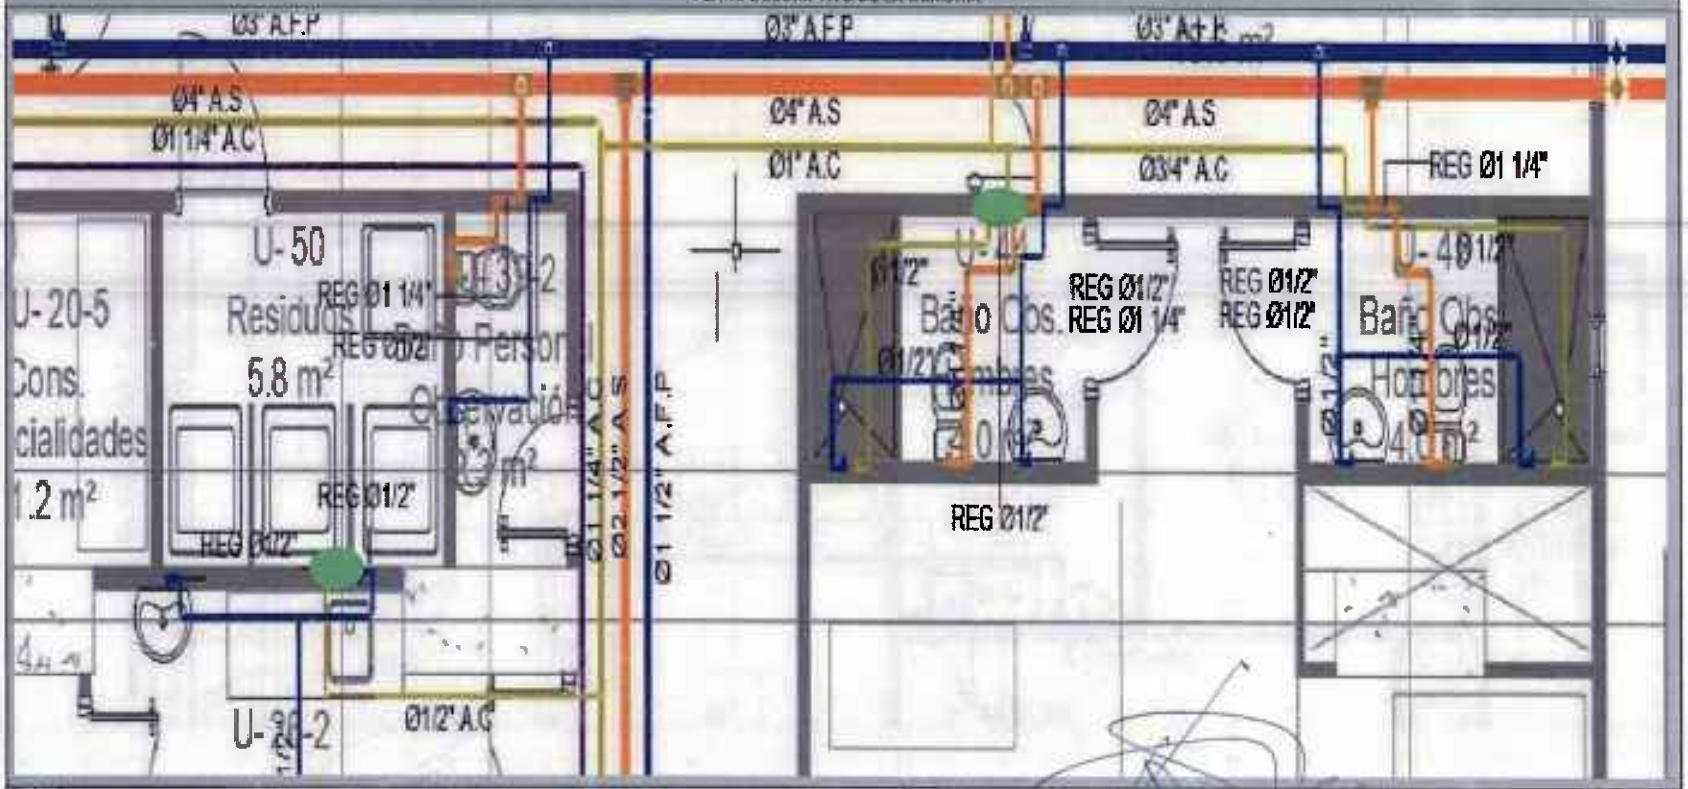

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página 1 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.8.21	(b) DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

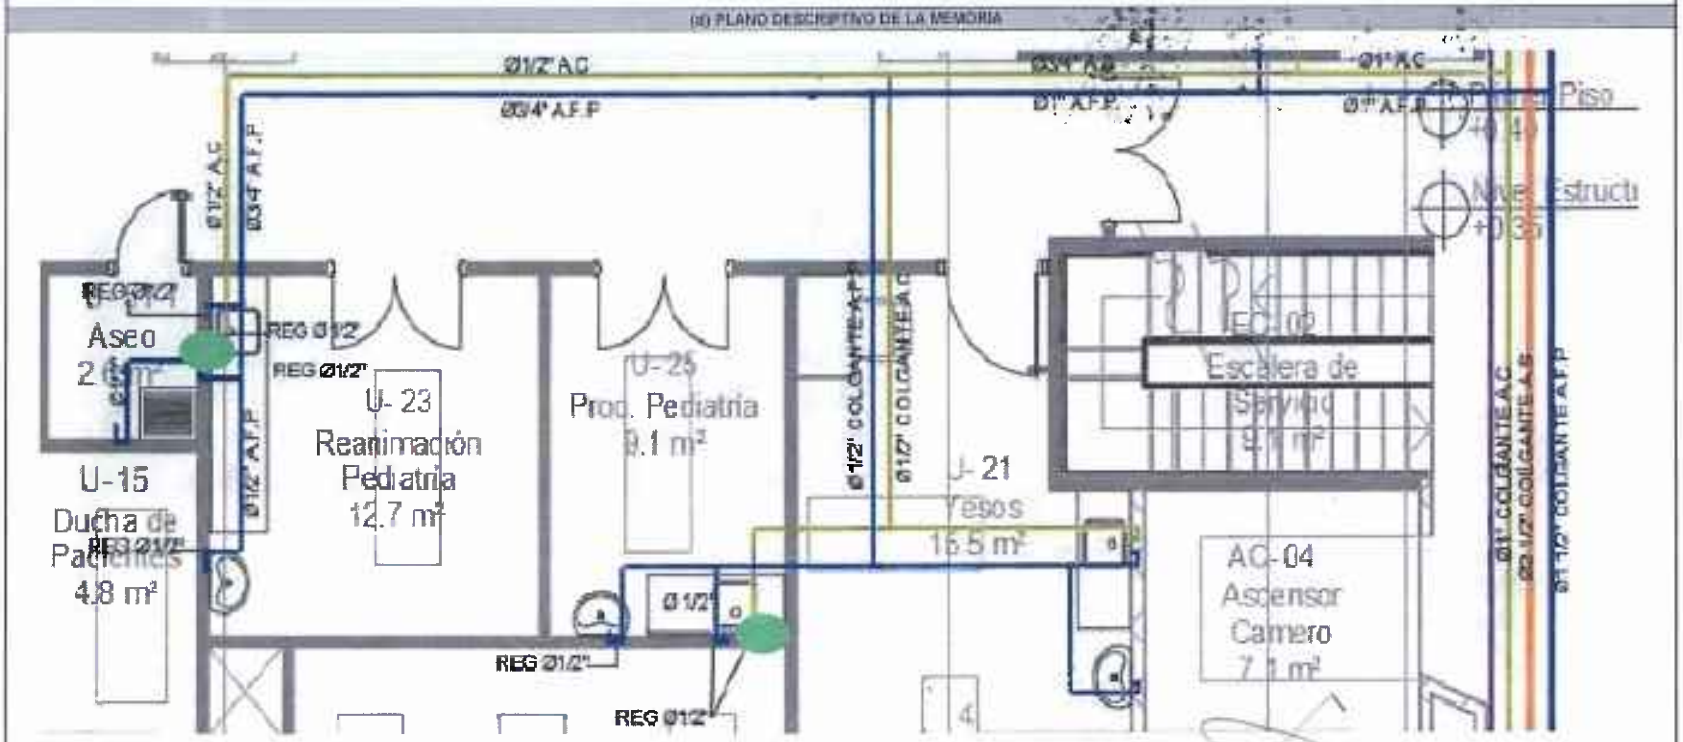

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	26.8.21	(b) DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

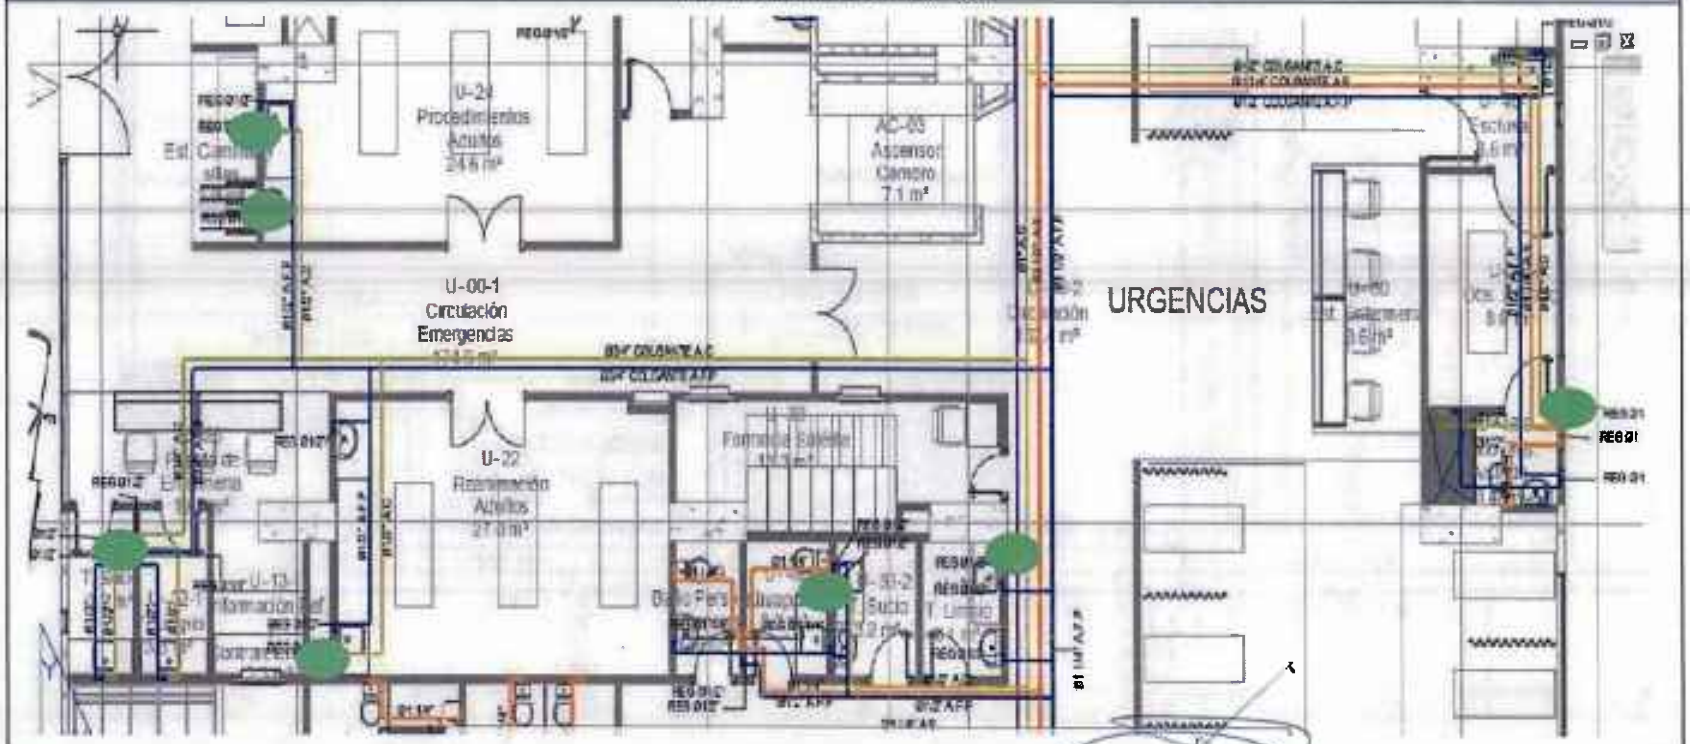

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 2	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	26.6.21	(b) DESCRIPCION ITEM	Registro bola Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

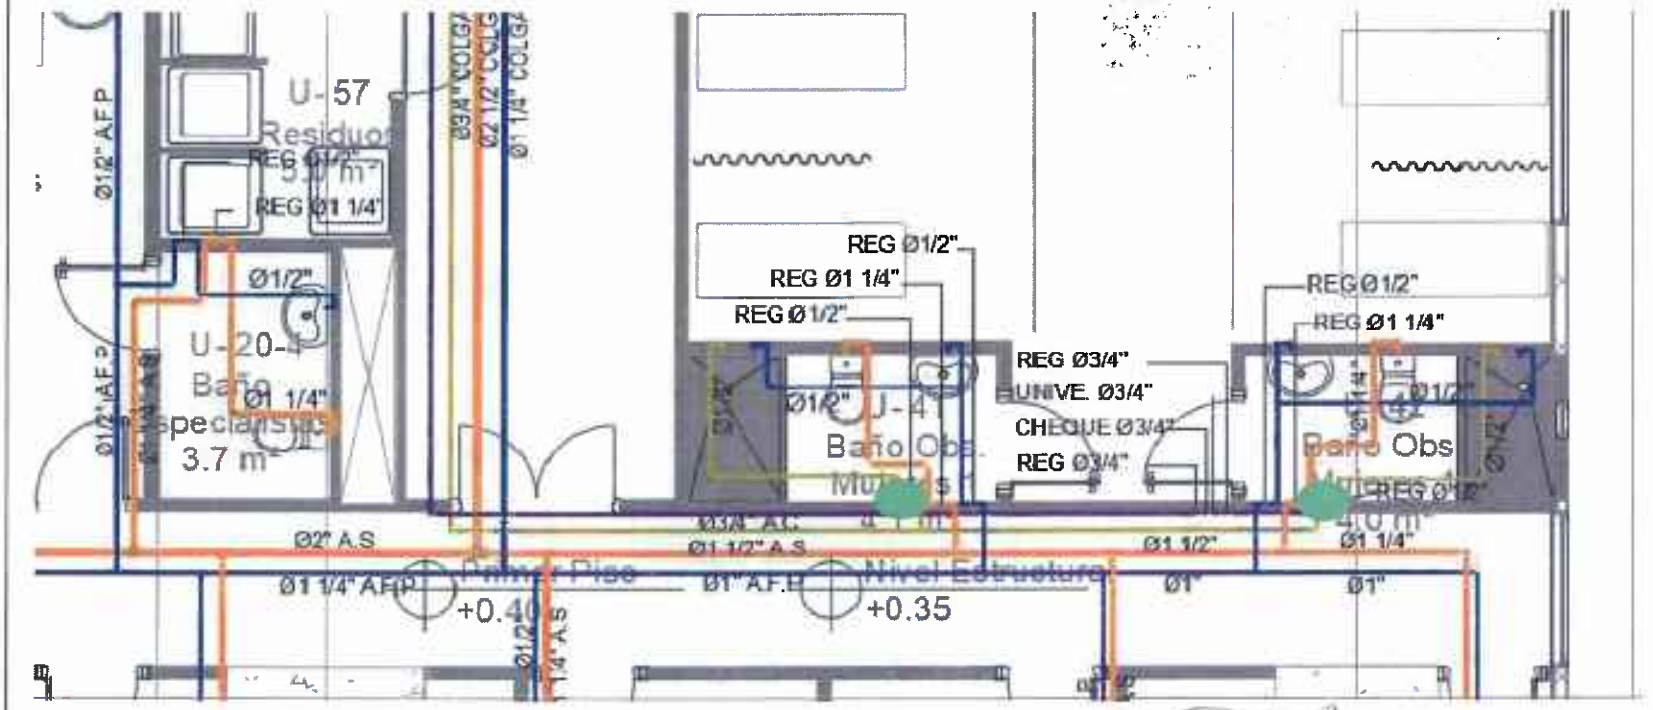

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE Nº:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	**26.8.28**	**DESCRIPCION ITEM**	Abrazadera pera/trapecio Ø11/4"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					20,00	20,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.28	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø11/4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

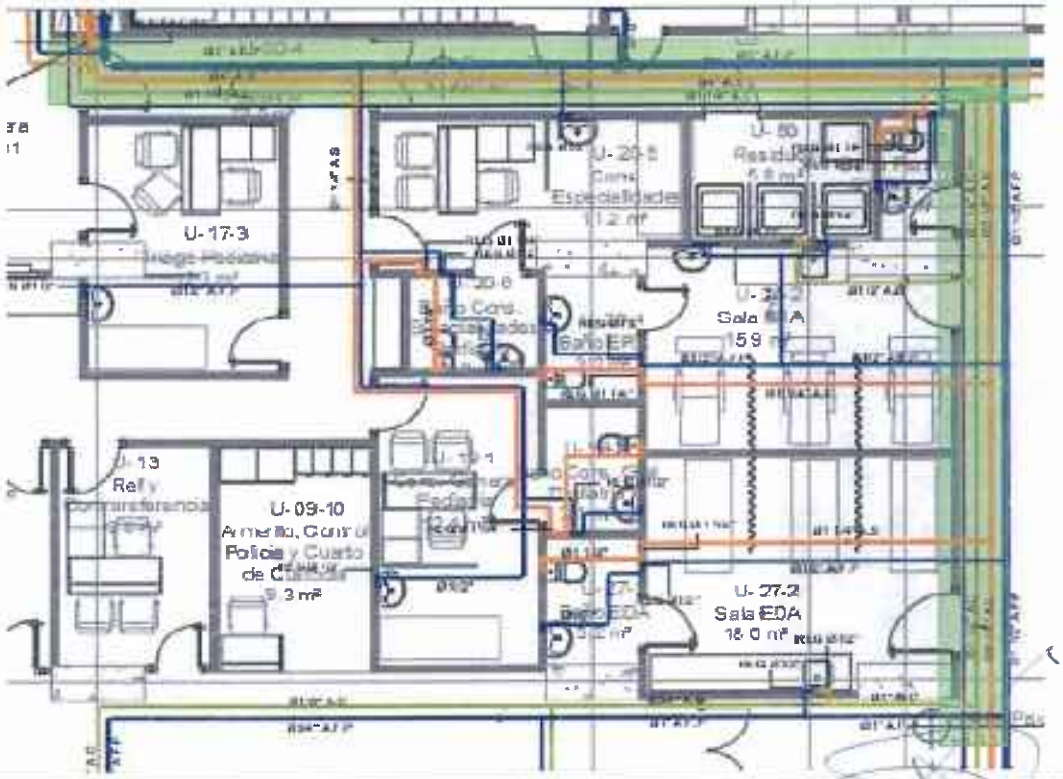

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	5	6	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.29	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTREEJE 3-10 EJE A-F					5,00	5,00

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.29	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

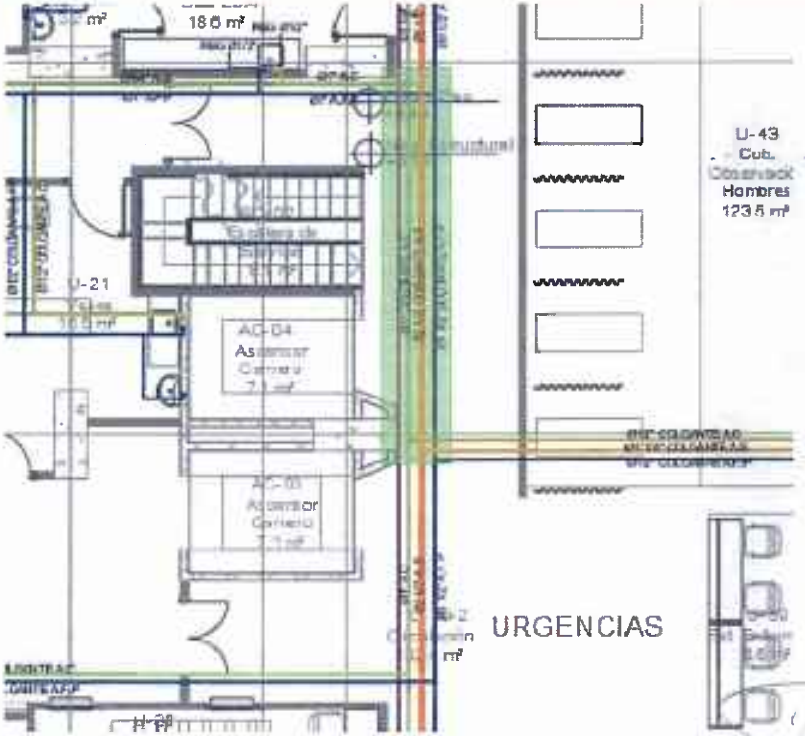

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Arq. Javi Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera para/trapecio Ø3/4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m2)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 2-10 Y EJE A-F					50,00	50,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-20			
		Version No: 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3/4"			UND:	UND

(#) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

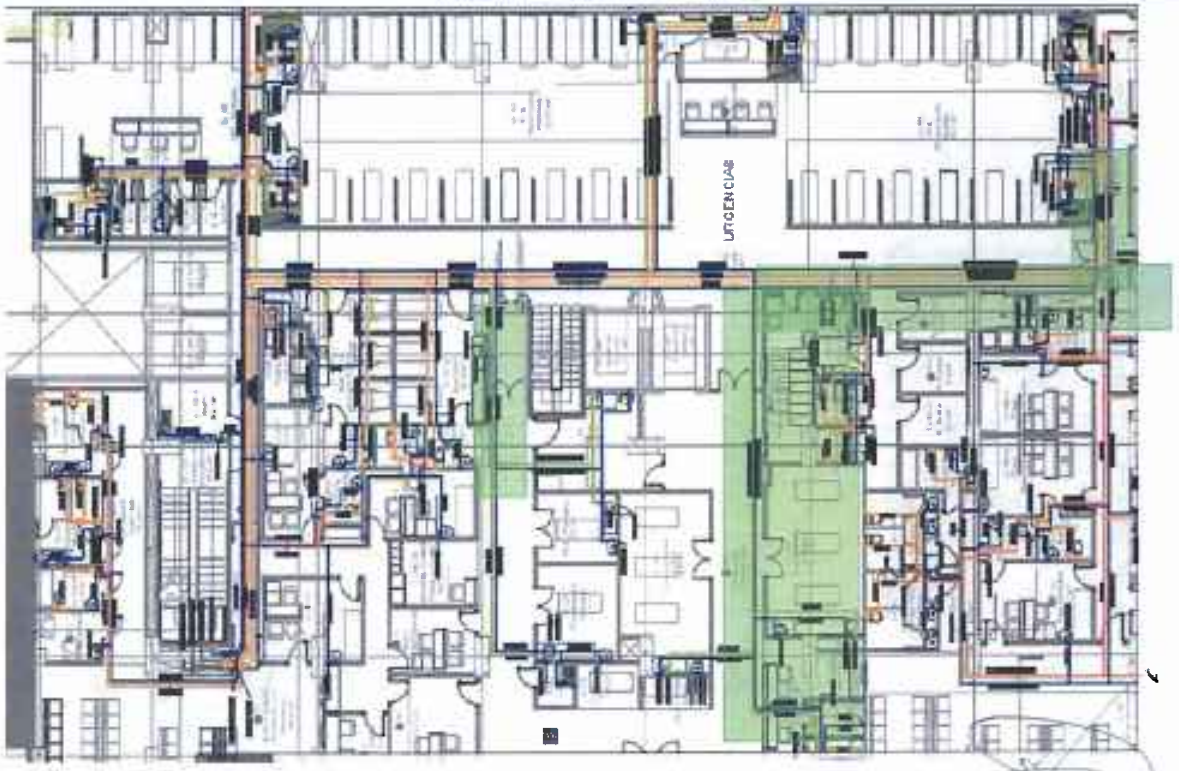

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.8.31	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 2-10 Y EJE A-F					200.00	200.00
TOTAL						200.00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.31	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1/2"			UND:	UND

[d] PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

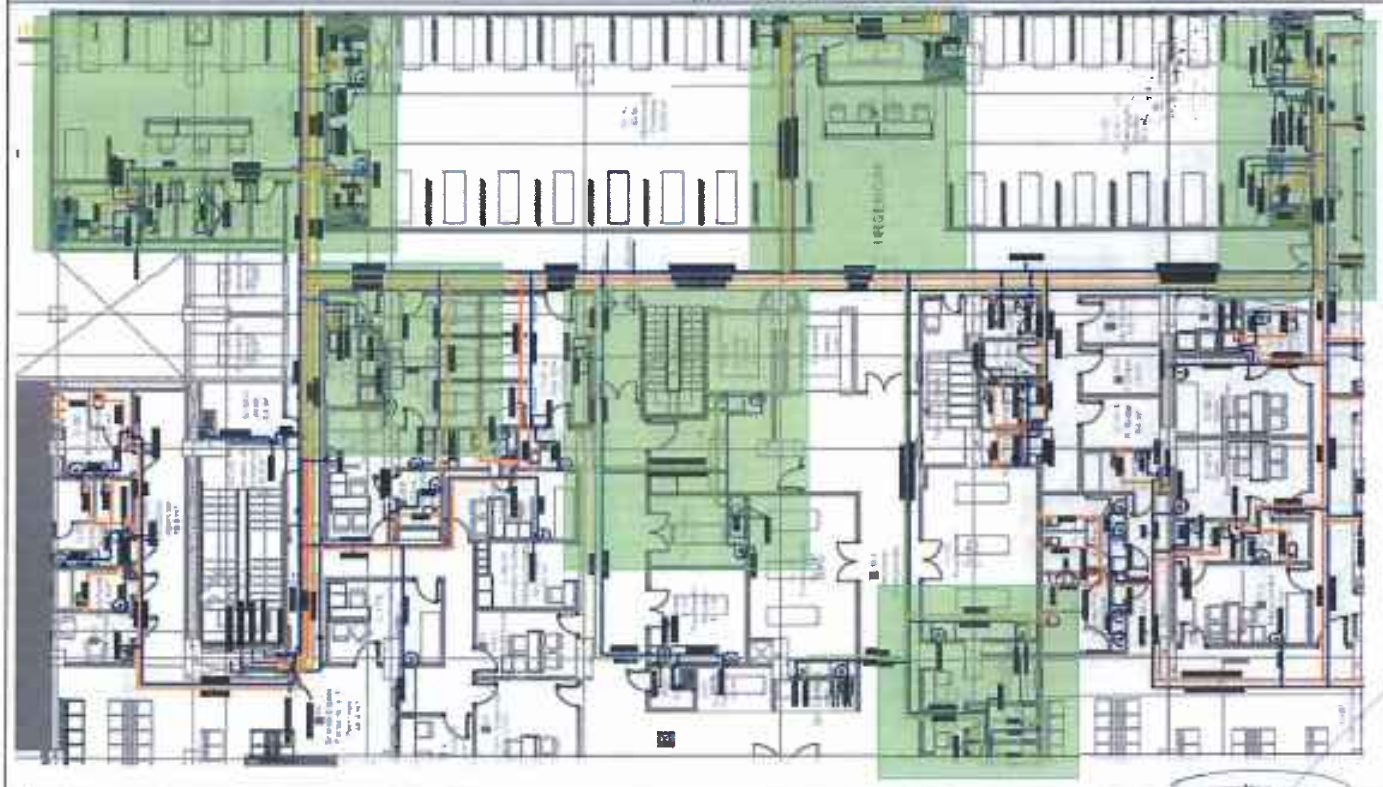

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jan Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00 | Página 1 de 2
Fecha: 3 | 4 | 2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.9.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO						
ENTRE EJE 2-10 EJE A-F					48,00	48,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.9.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

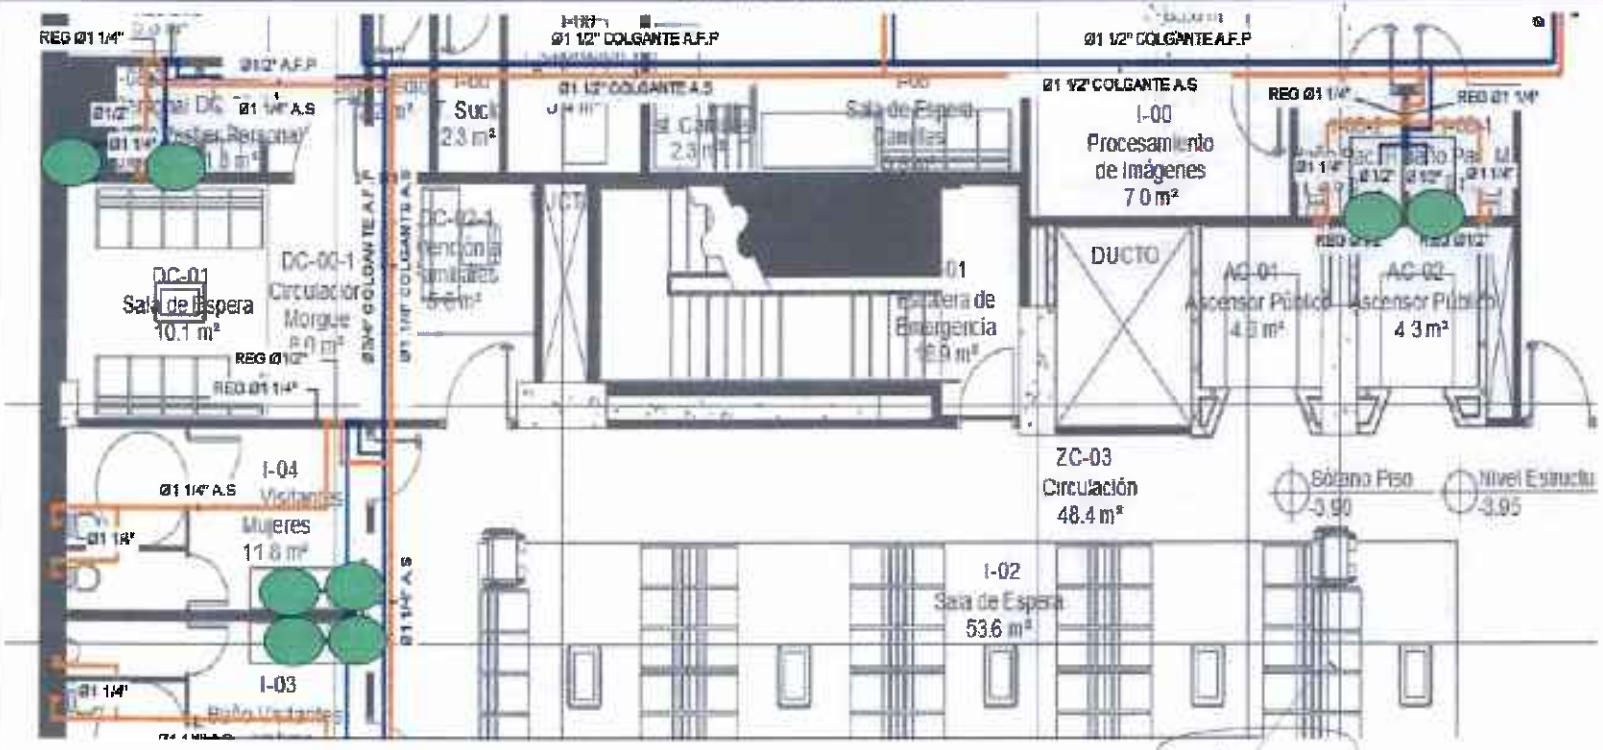

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 4	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

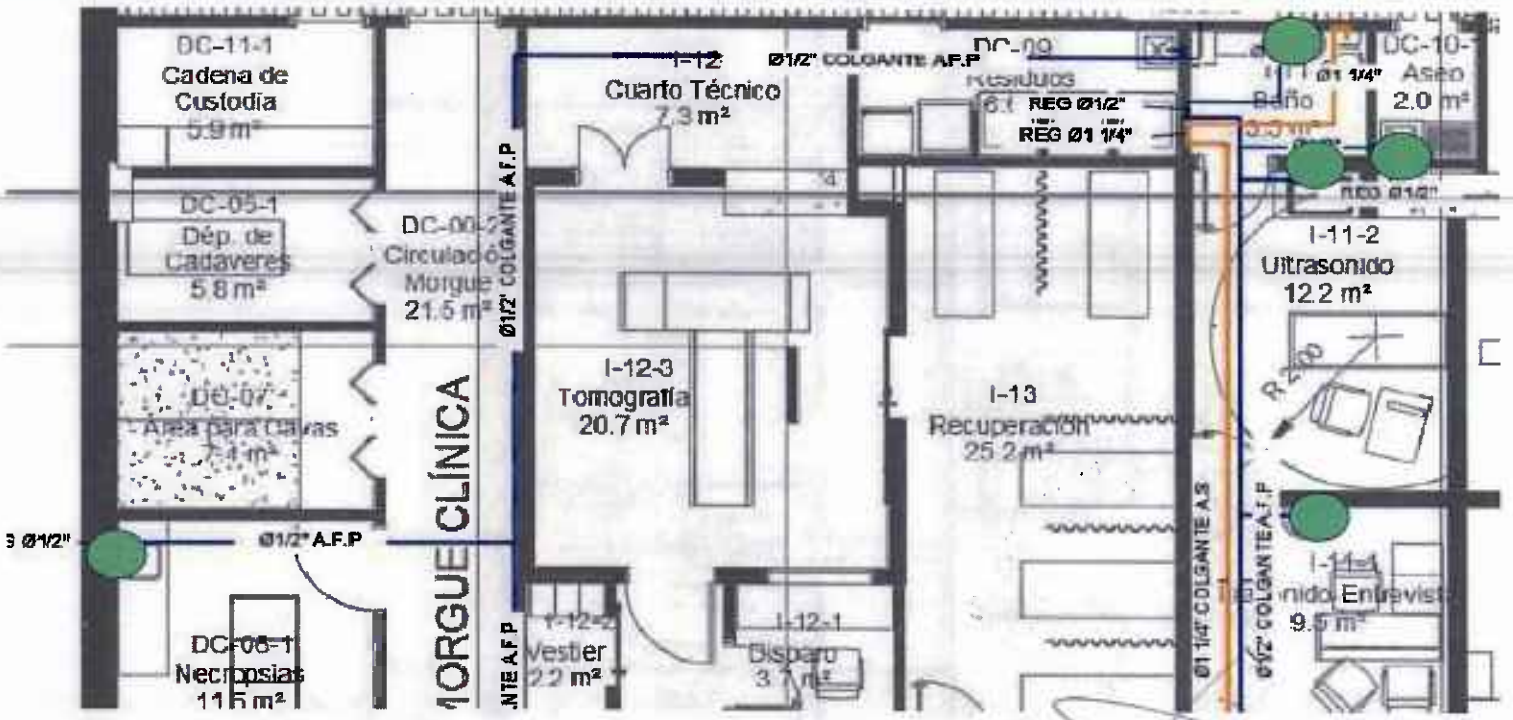

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02	Página 2 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

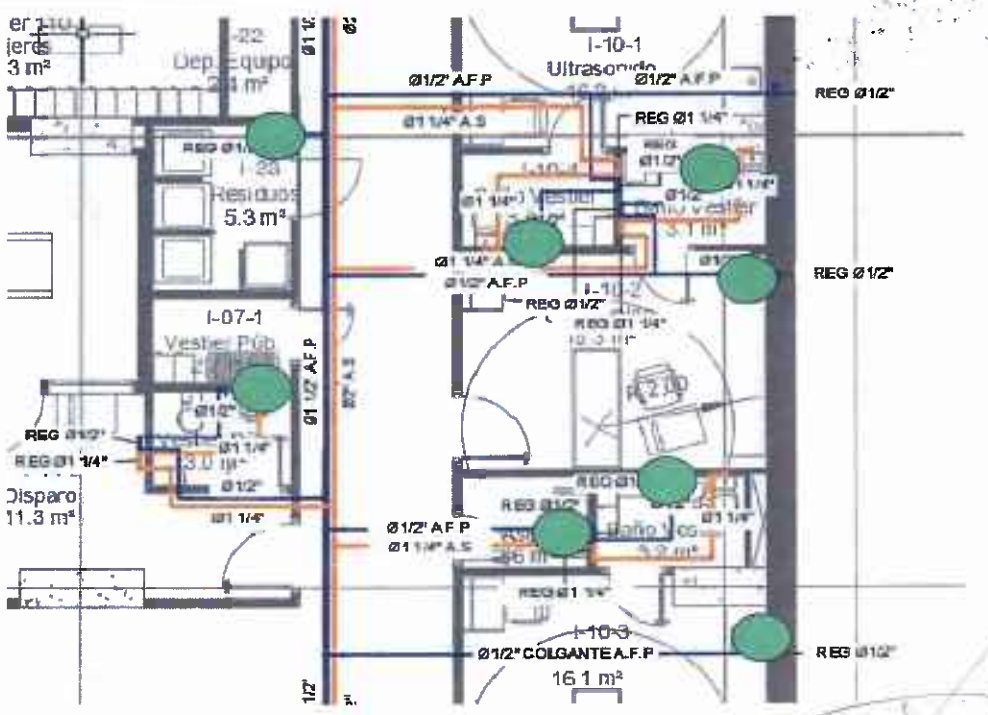

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06		Página 2 de 4	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

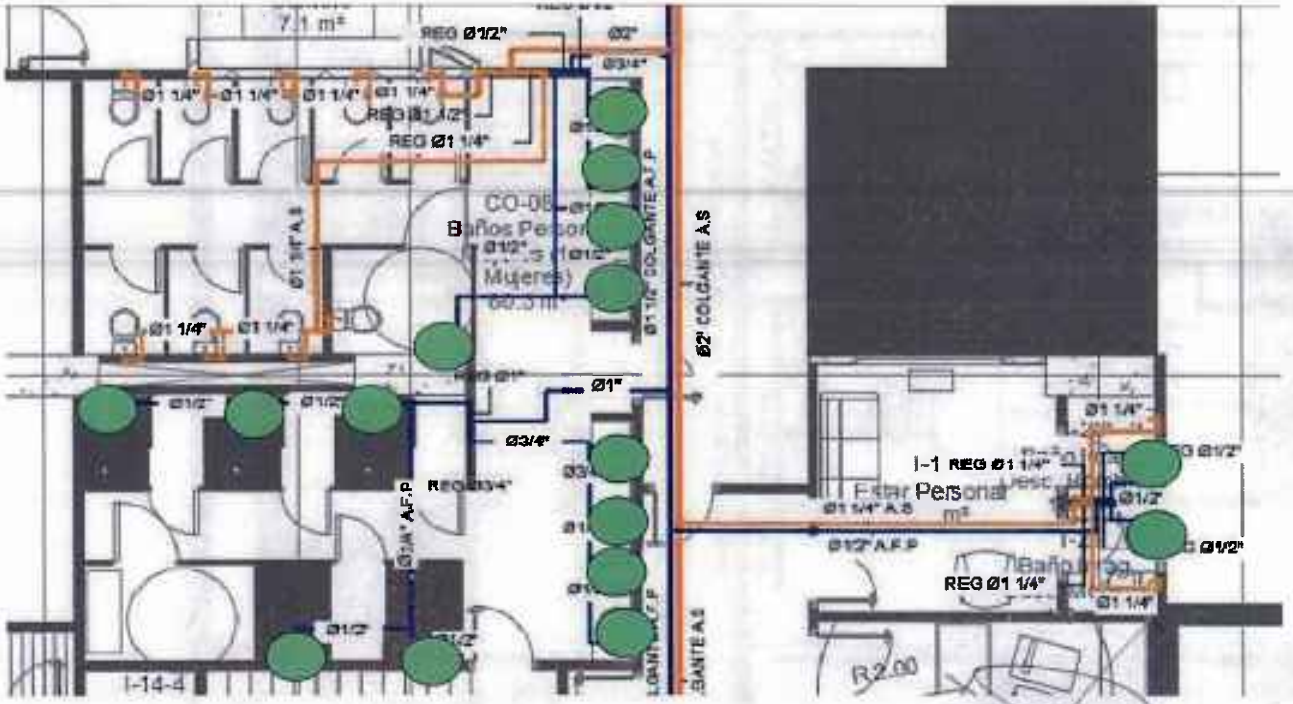

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 4		
		Fecha:			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

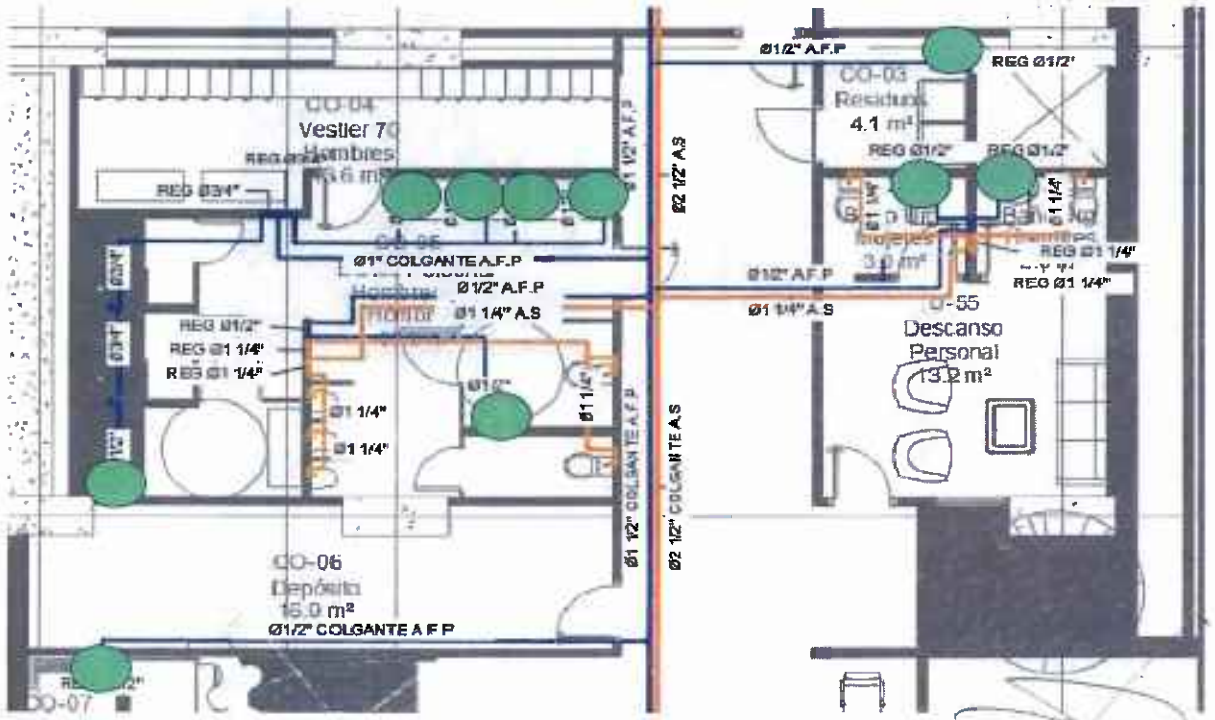

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Loaiza

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 05	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.9.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 2-10 EJE A-F					76,00	76,00
				SUB TOTAL		76,00
				VIENE		48,00
				TOTAL		124,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 2 de 4	
		Fecha	4	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Losada

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09		Página 2 de 4	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

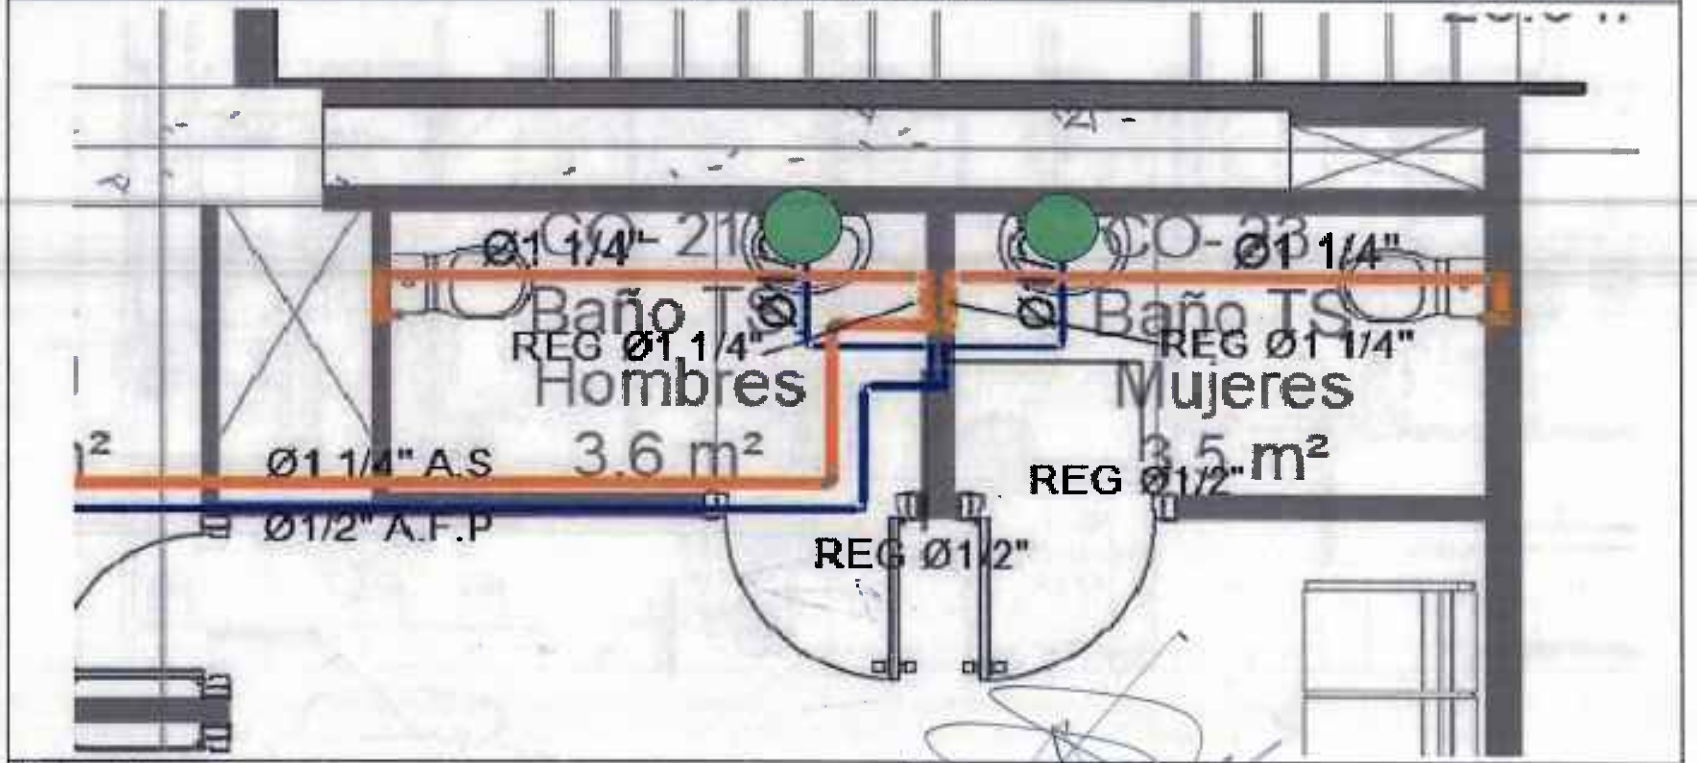

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 4		
		Fecha	8	4	2027

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

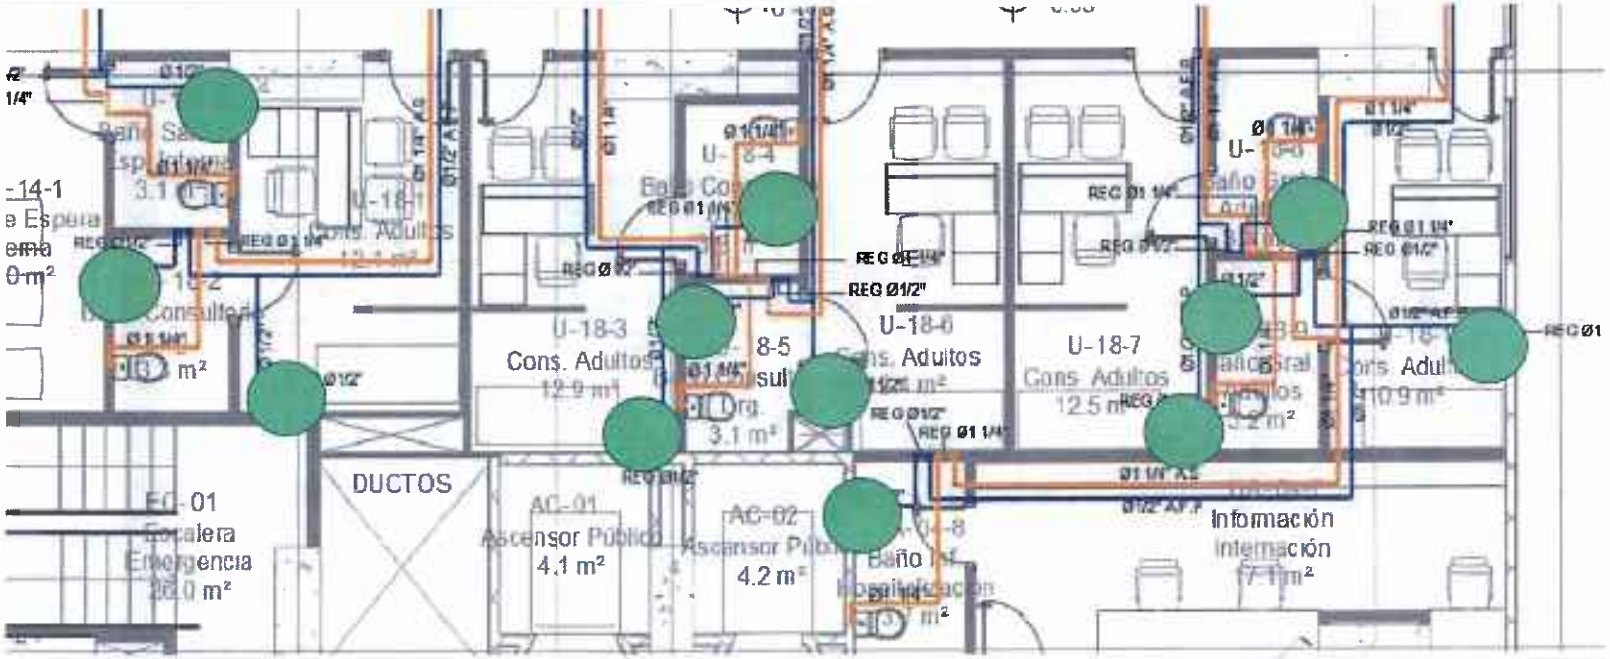

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 4		
		Fecha:	8	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

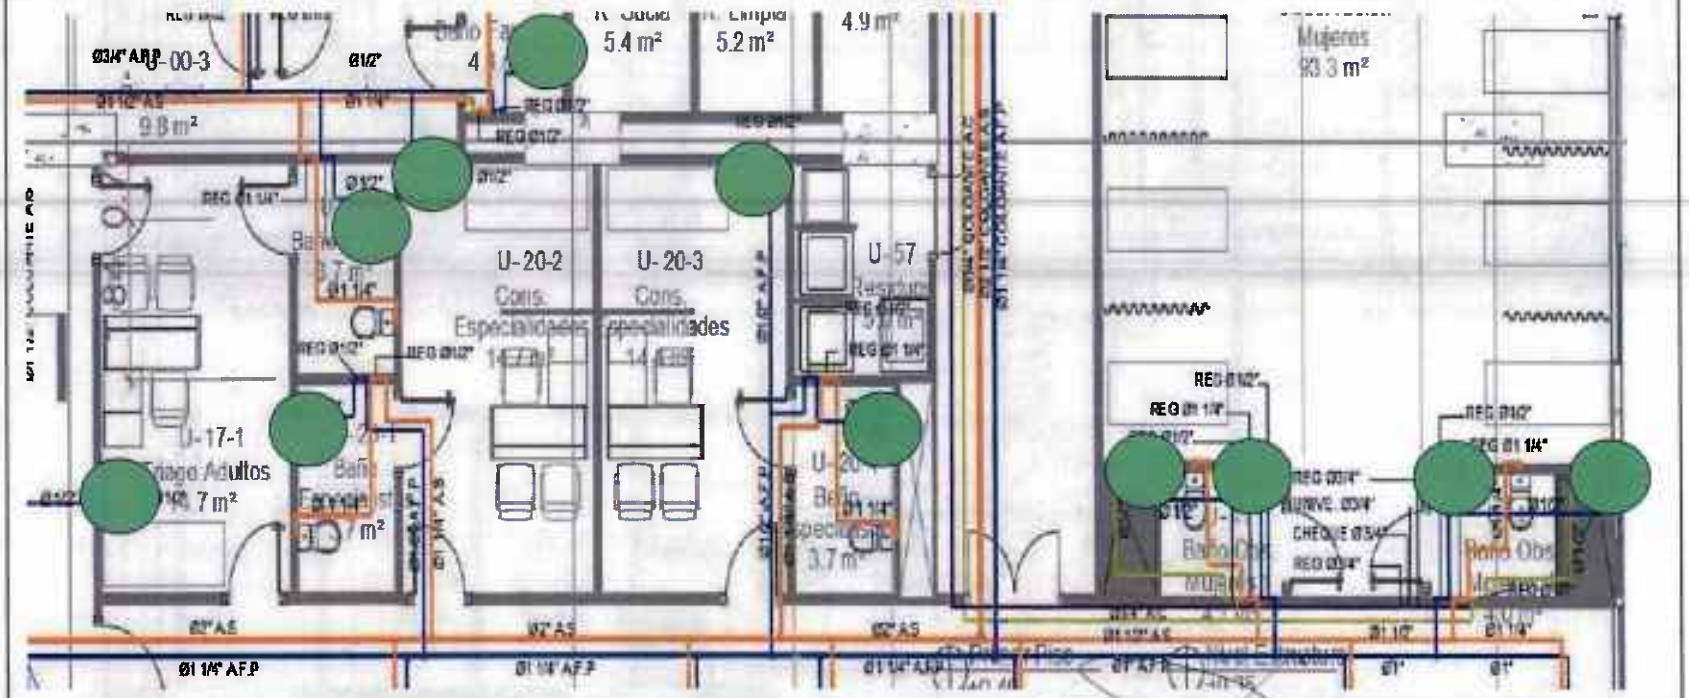

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

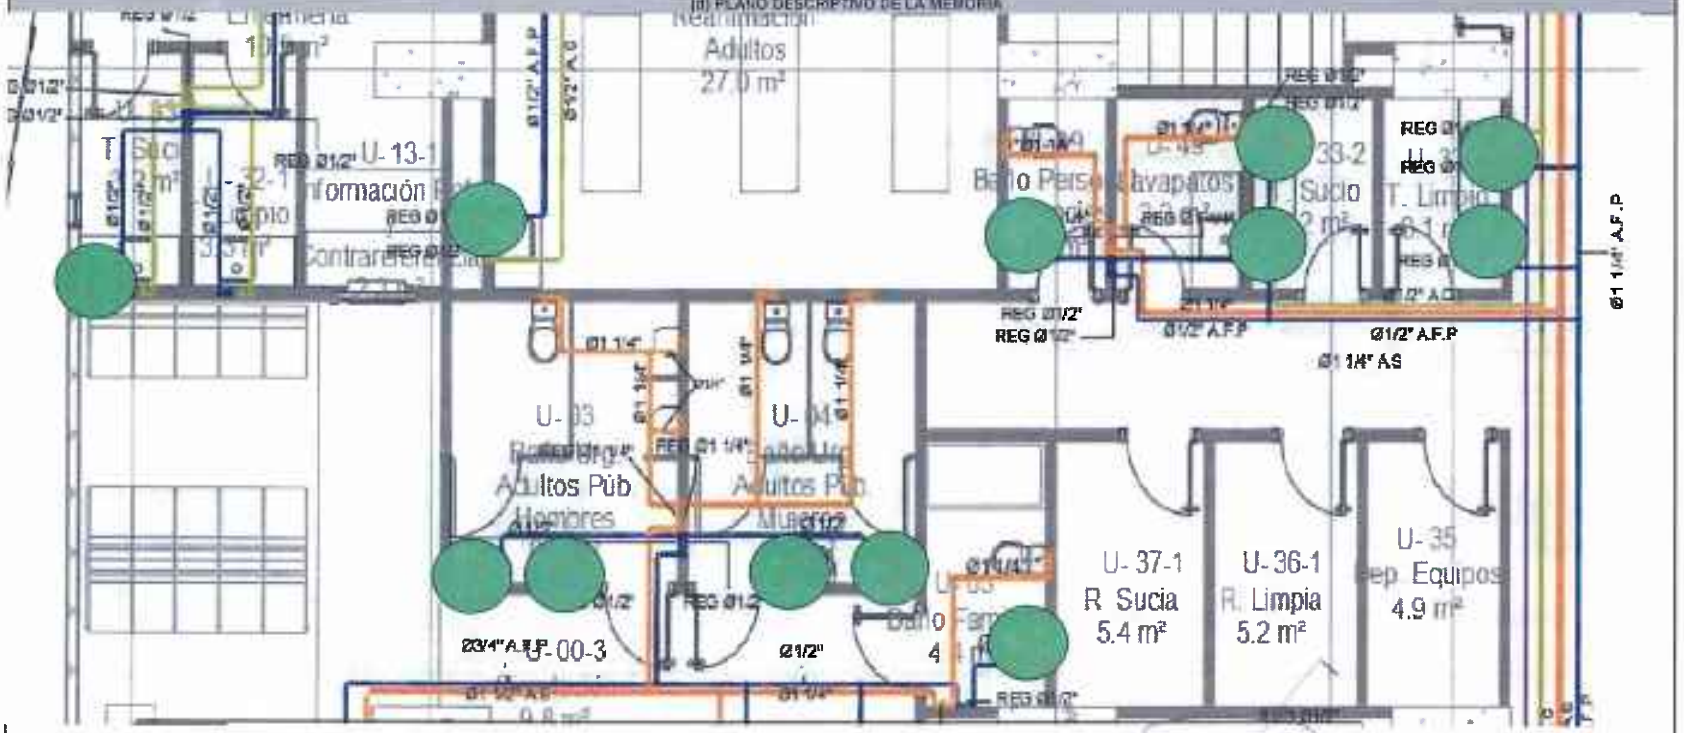

Elaboró

RESIDENTE DE [illegible]
Ing. Alexander [illegible]

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 03		Pagina 2 de 4	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

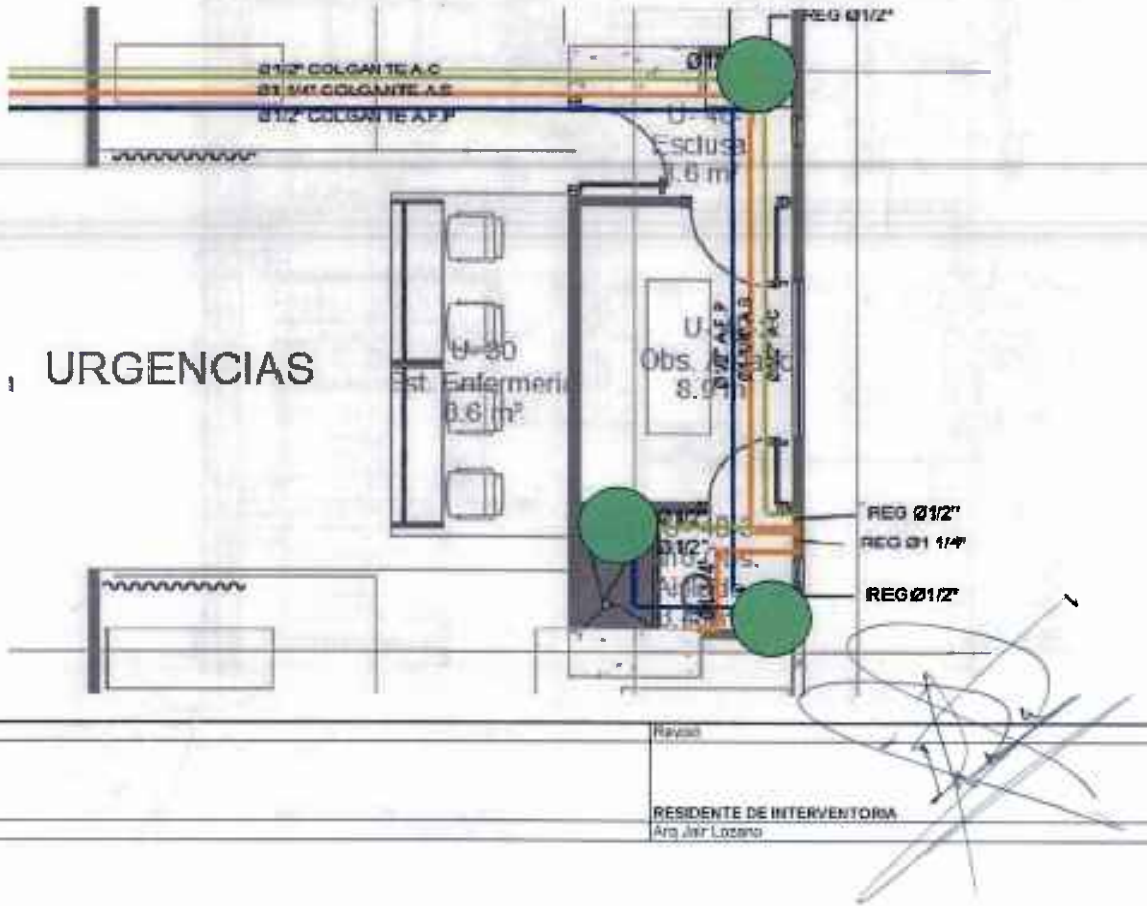

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cardo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No.: 08		Página 2 de 4		
		Fecha:	2	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

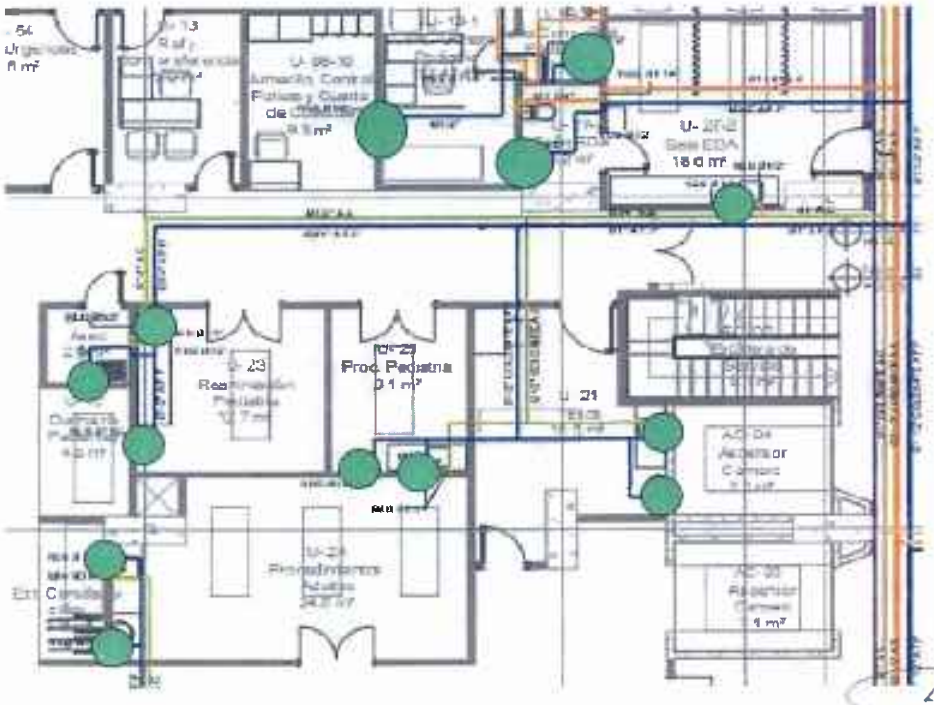

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 4		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

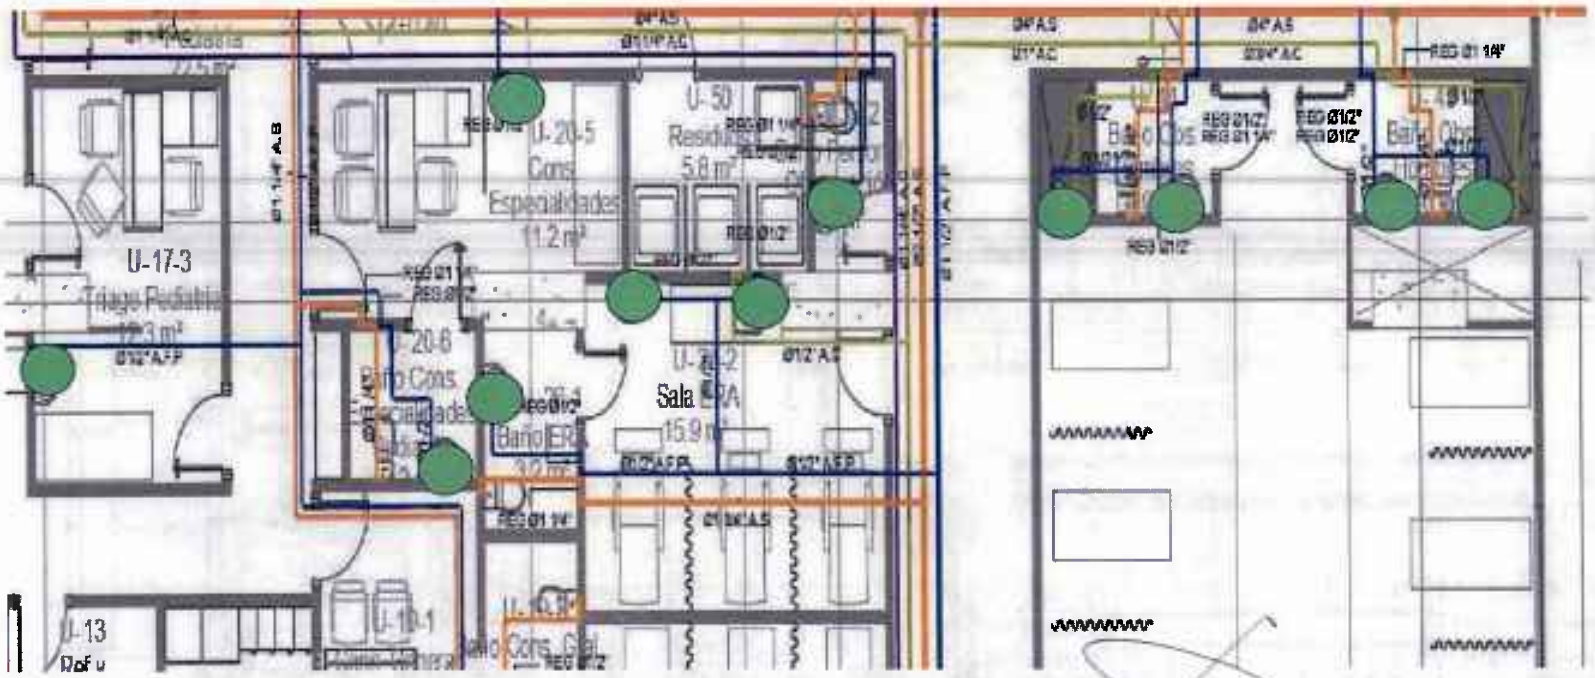

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 4	
		Fecha:	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.9.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

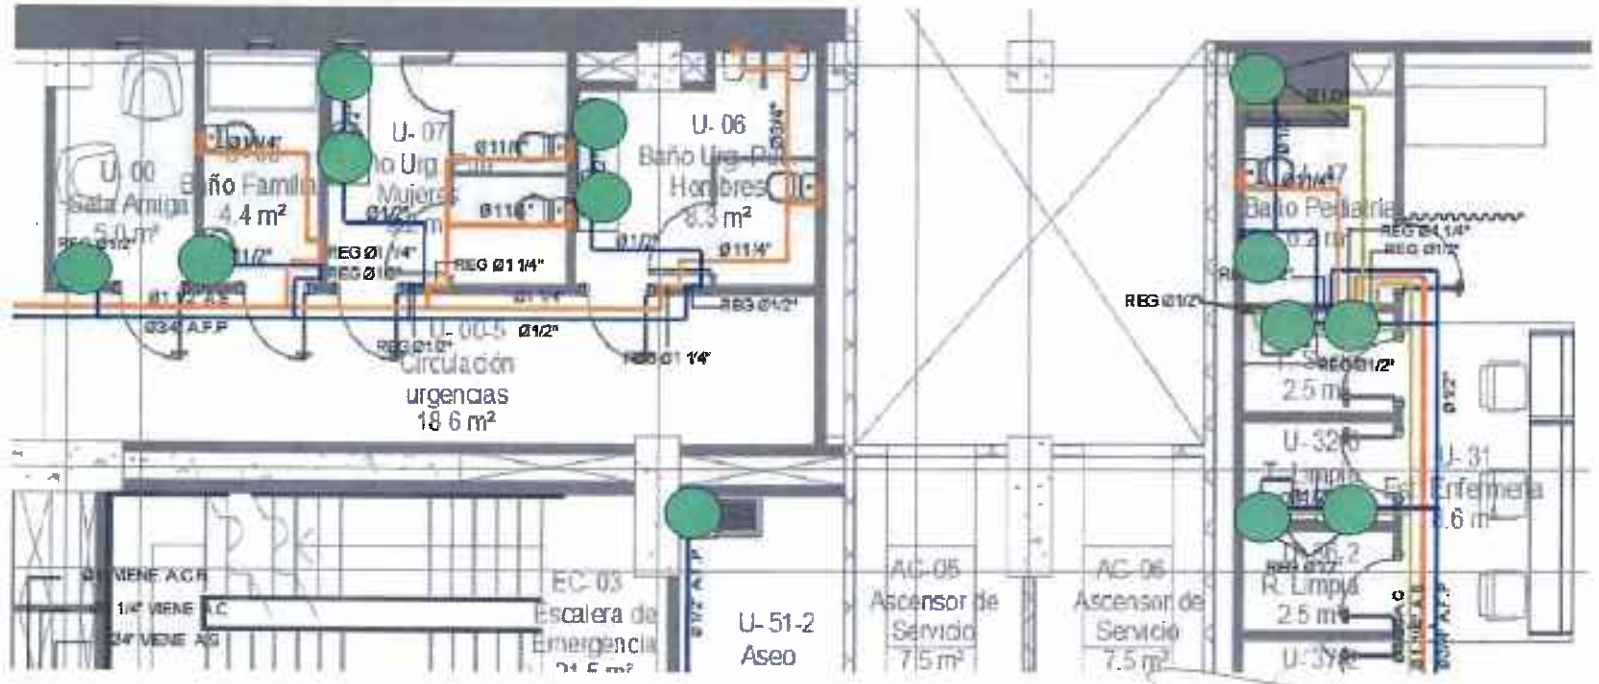

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Iber Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA: INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
ITEM N°:	26.10.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Profundidad			
	SOTANO						
	ENTRE EJE 2-10 EJE A-F					30,00	30,00
	PASAN						30,00

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-09			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.10.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			UND:	UND

(#) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

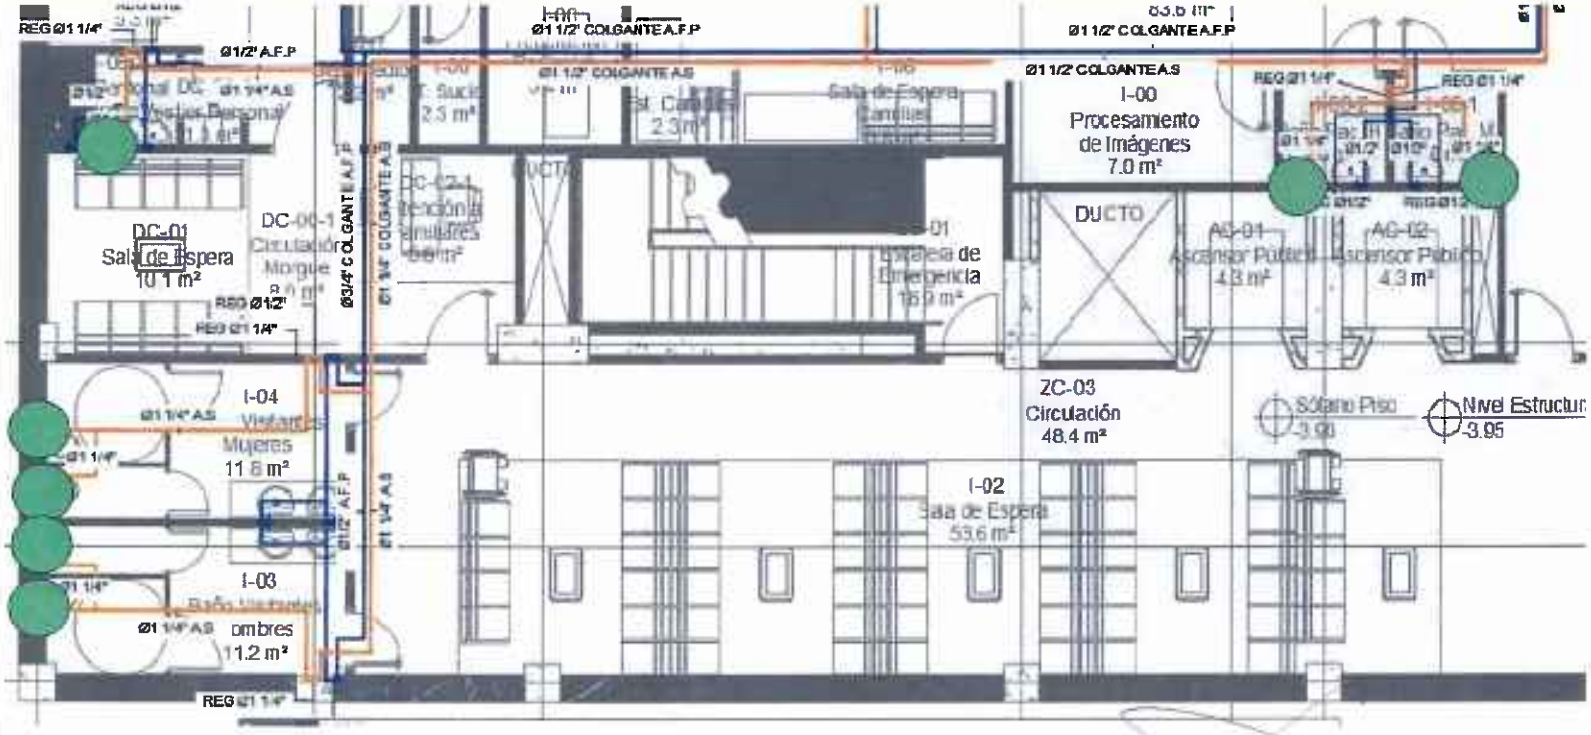

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Javi Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 03		Pagina 2 de 4	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.10.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

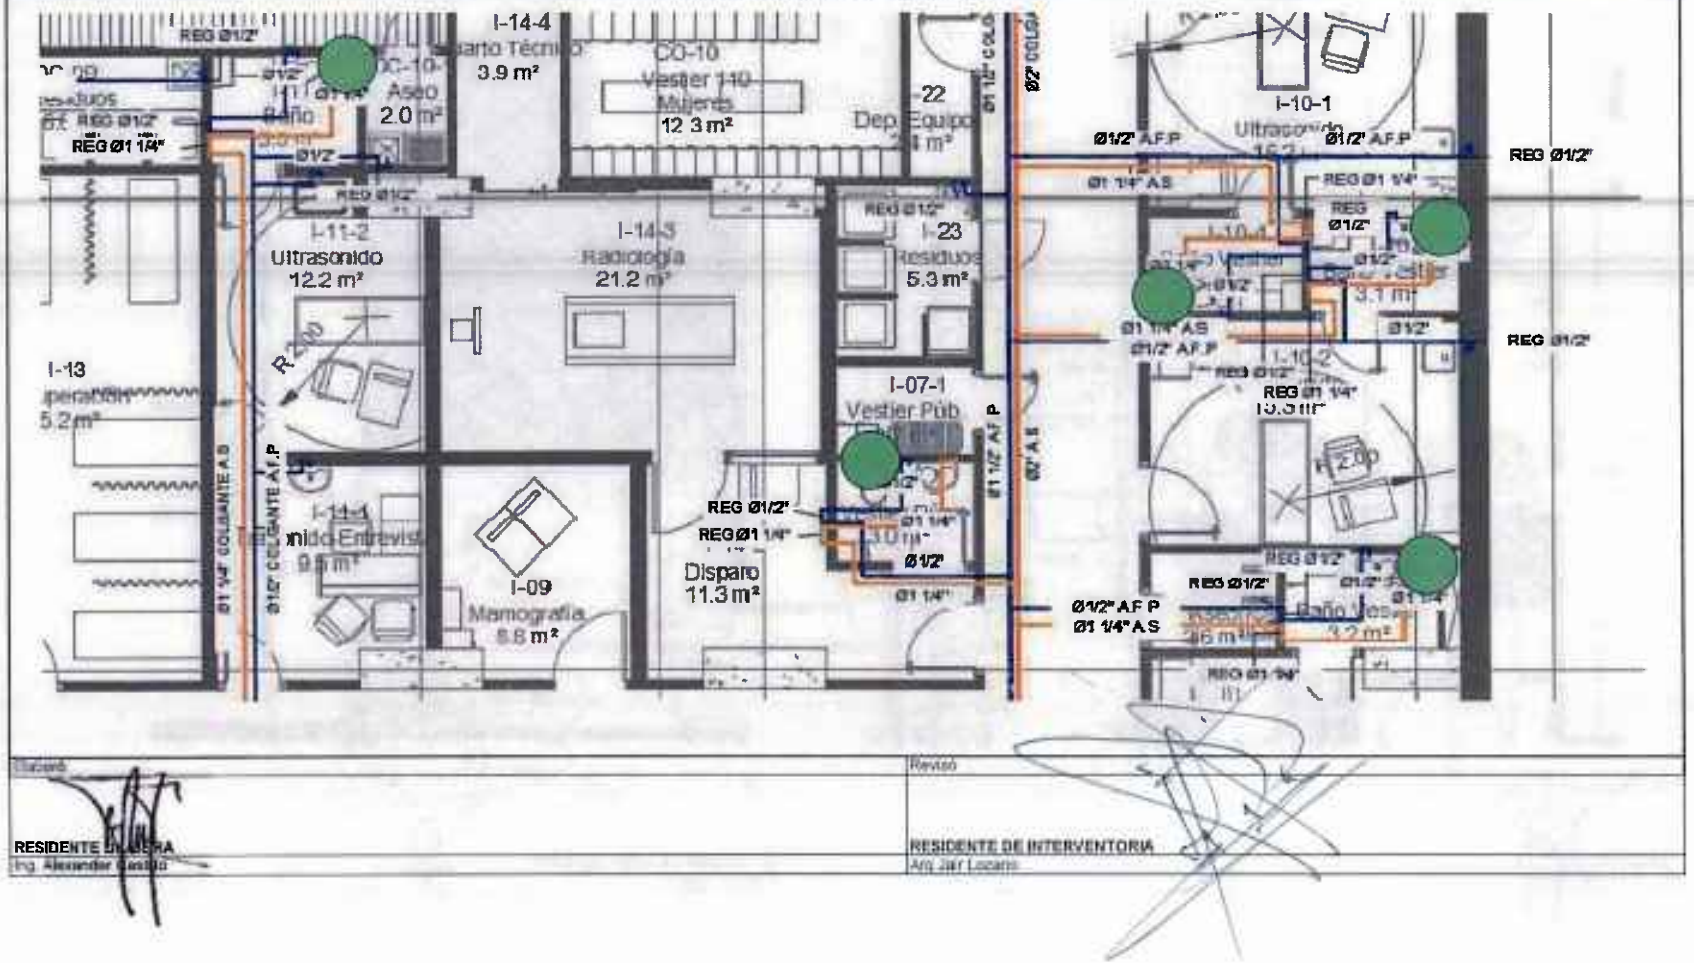

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.10.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			UND:	UND

(@) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

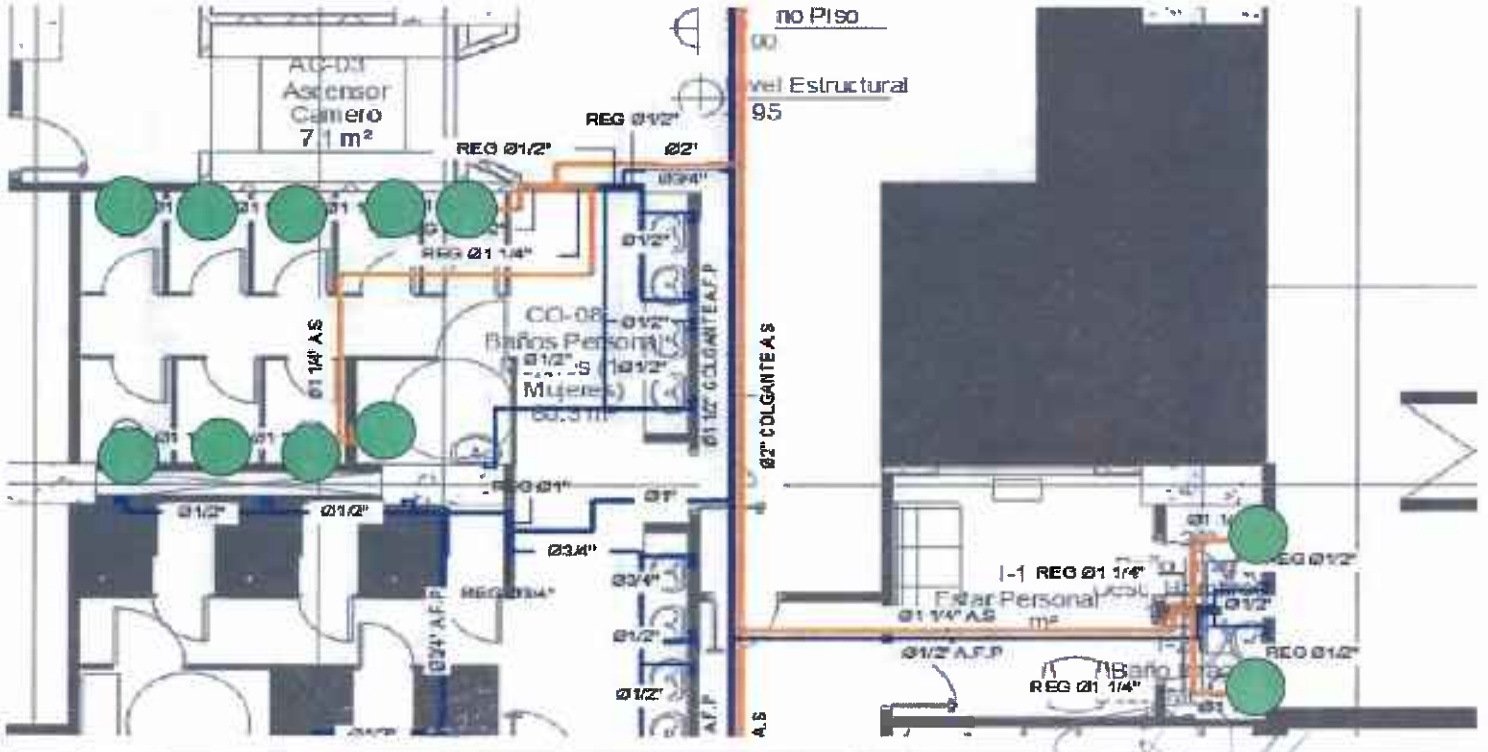

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairi Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.10.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 3-10 EJE A-F					35,00	35,00
SUB TOTAL						35,00
VIENE						30,00
TOTAL						65,00

Elaboró:

RESIDENTE OBRA
Ing. Alexander [illegible]

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 4	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.10.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 2 de 2		
		Fecha:	3	4	2025

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.11.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 7 EJE B-C					4,00	4,00
ENTRE EL EJE 4-5 EJE B-C					5,00	5,00
ENTRE EJE 2-3 EJE B-C					3,00	3,00
ENTRE EL EJE 3-4 EJE E-F					8,00	8,00
ENTRE EL EJE 7 EJ D-E					2,00	2,00
ENTRE ELEEJE 8-10 EJE B-E					10,00	10,00
				SUB TOTAL		32,00
				VIENE		20,00
				TOTAL		50,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página 1 de 1		
		Fecha:	6	4	2026

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.10.1**	**DESCRIPCION ITEM**	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			**UND:**	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

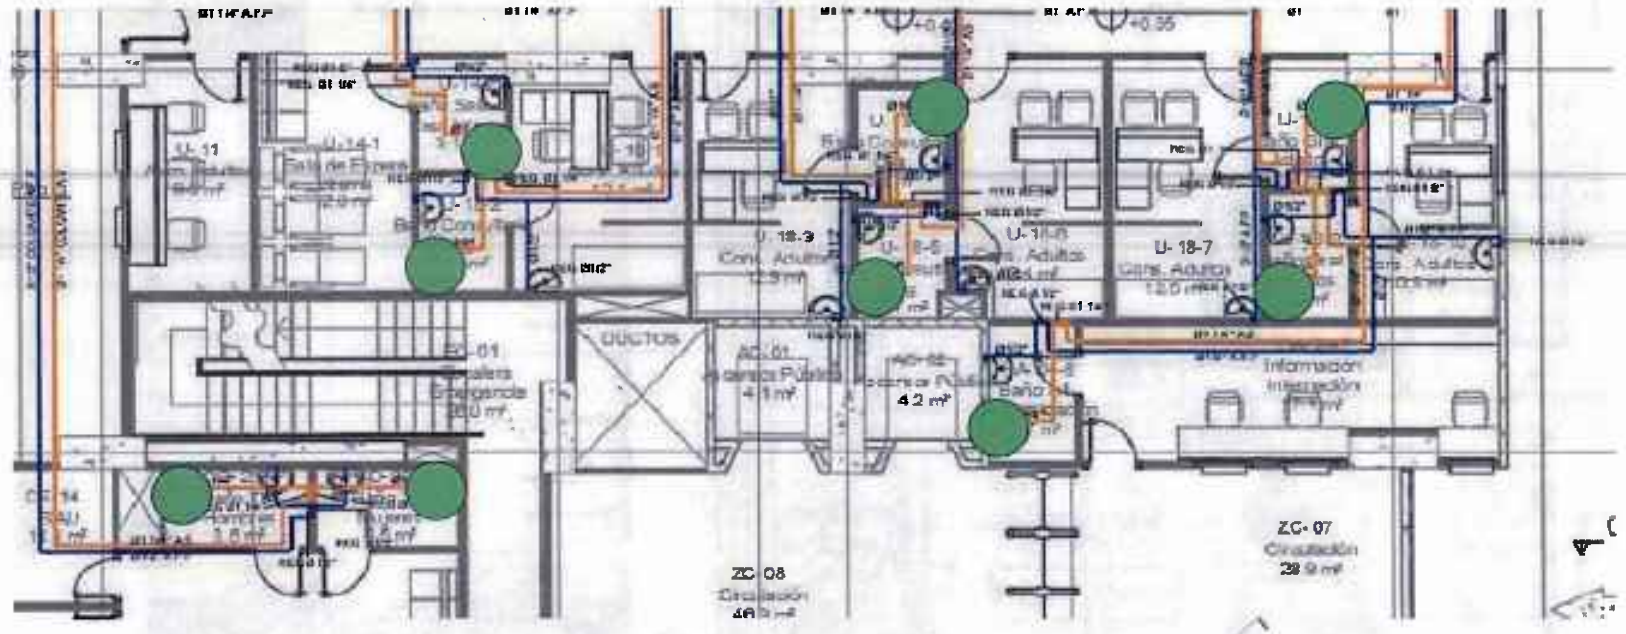

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 2 de 4		
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.10.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.10.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			UND:	UND

(2) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

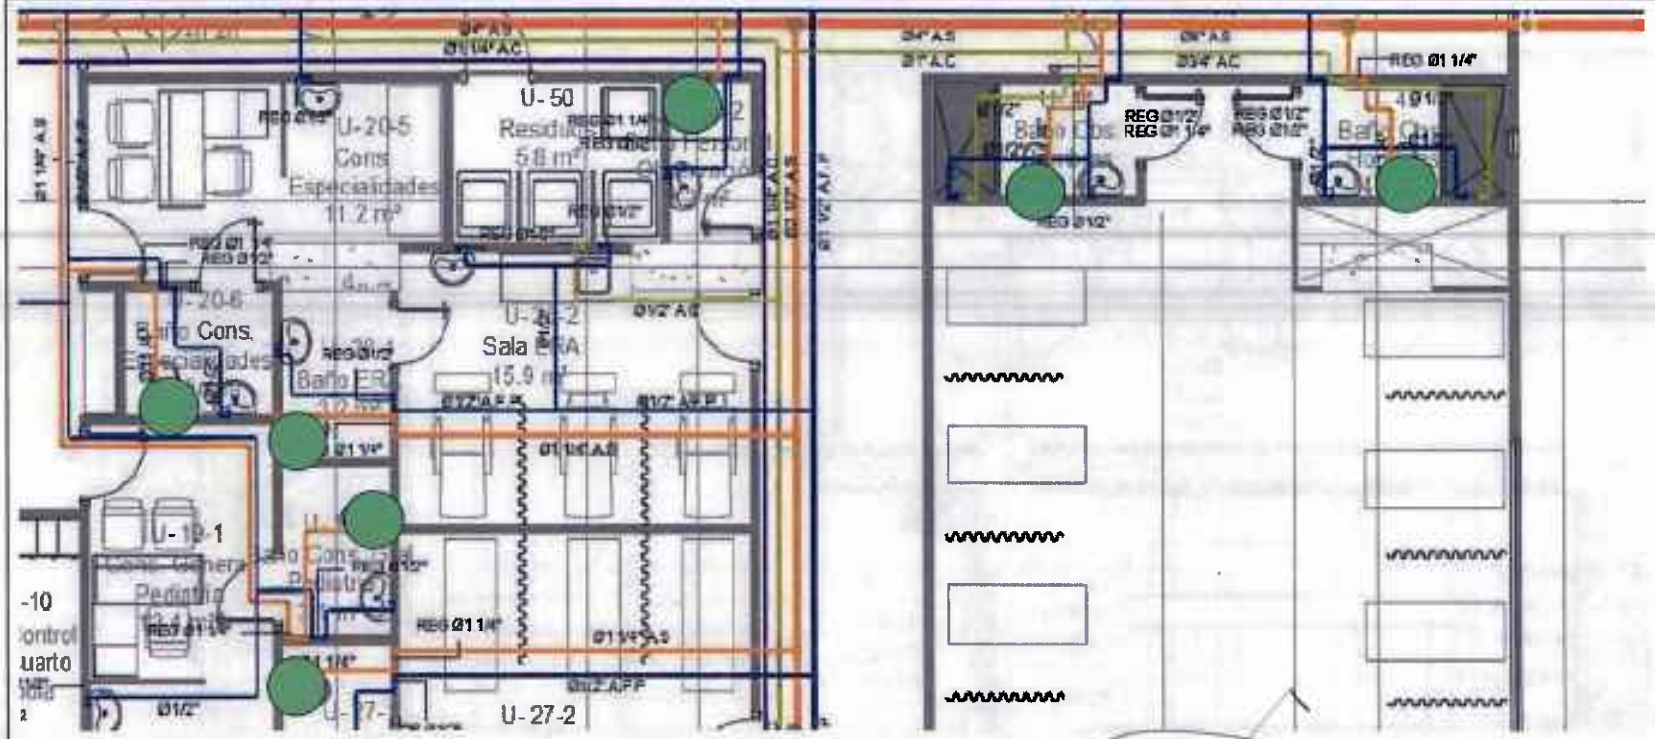

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Ortiz	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 2 de 4		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.10.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

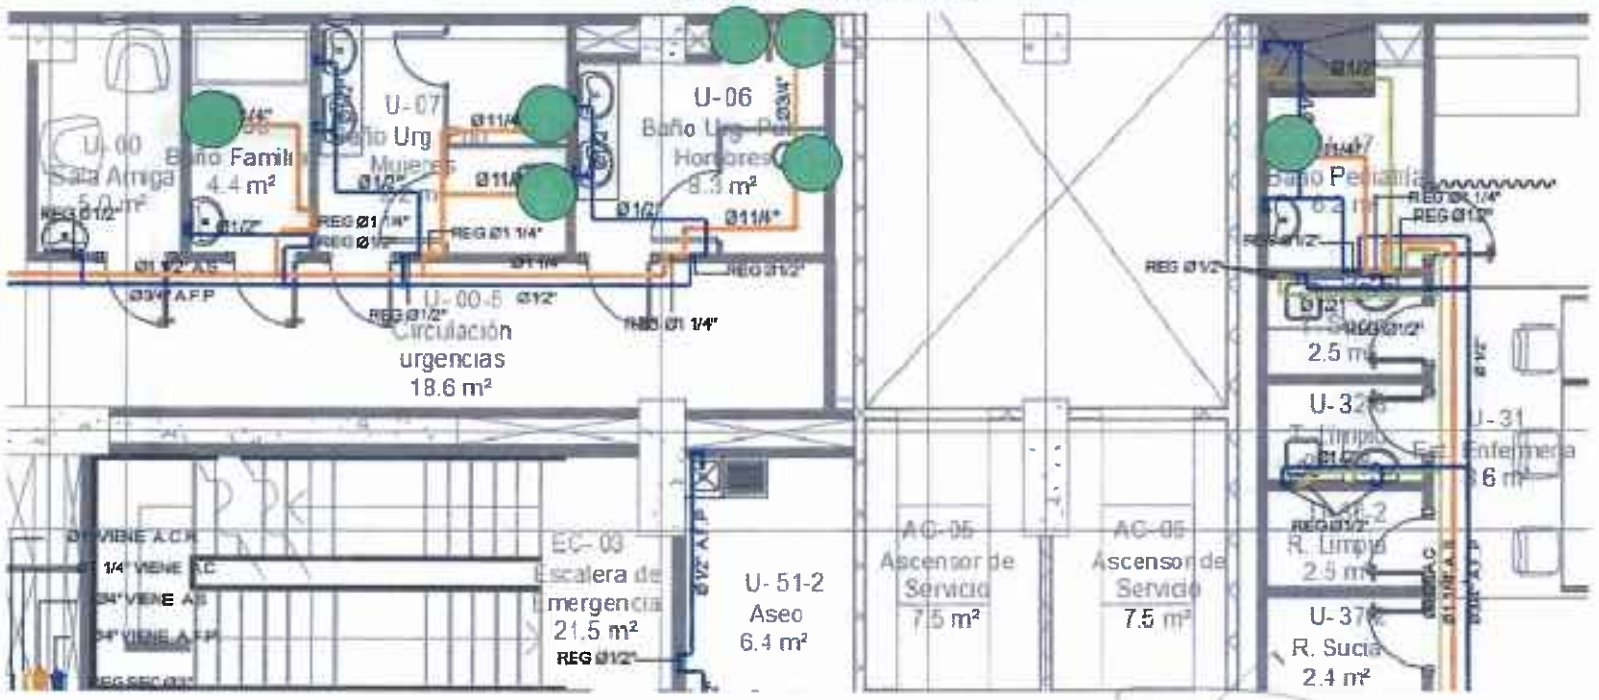

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Juan Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02		Página 1 de 2	
		Fecha:	9	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.11.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE E JE 8-9 EJE E					3,00	3,00
ENTRE EJE 7-8 EJE D-F					3,00	3,00
ENTRE EL EJE 6 EJE D-E					4,00	4,00
ENTRE EL EJE 4-5 EJE E					6,00	6,00
ENTRE EL EJE 8 EJE F					2,00	2,00
ENTRE EL EJE 3E JE F					2,00	2,00
				PASA:		20,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.11.1	DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTO DE AGUA CALIENTE

ENTRE ELE EJE 8-9 EJE E

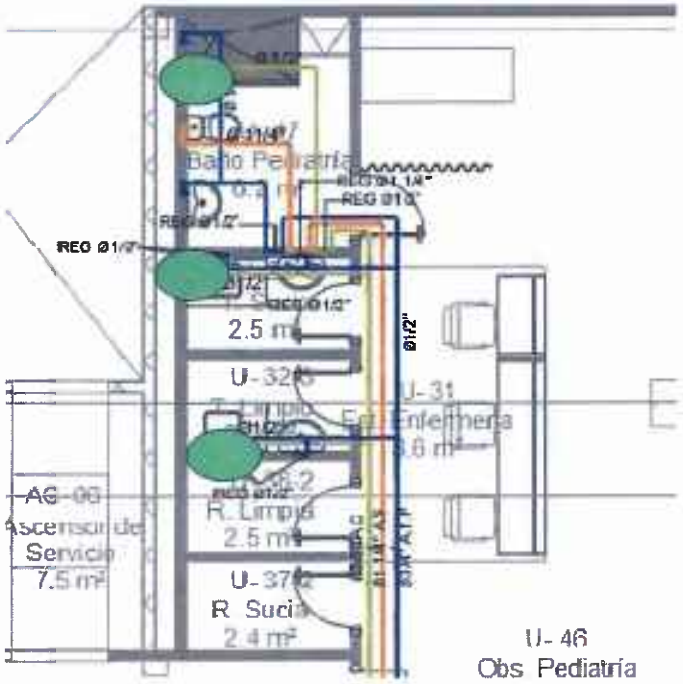

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 3 de 4	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTO DE AGUA CALIENTE

ENTRE ELE 7-8 EJE D-F

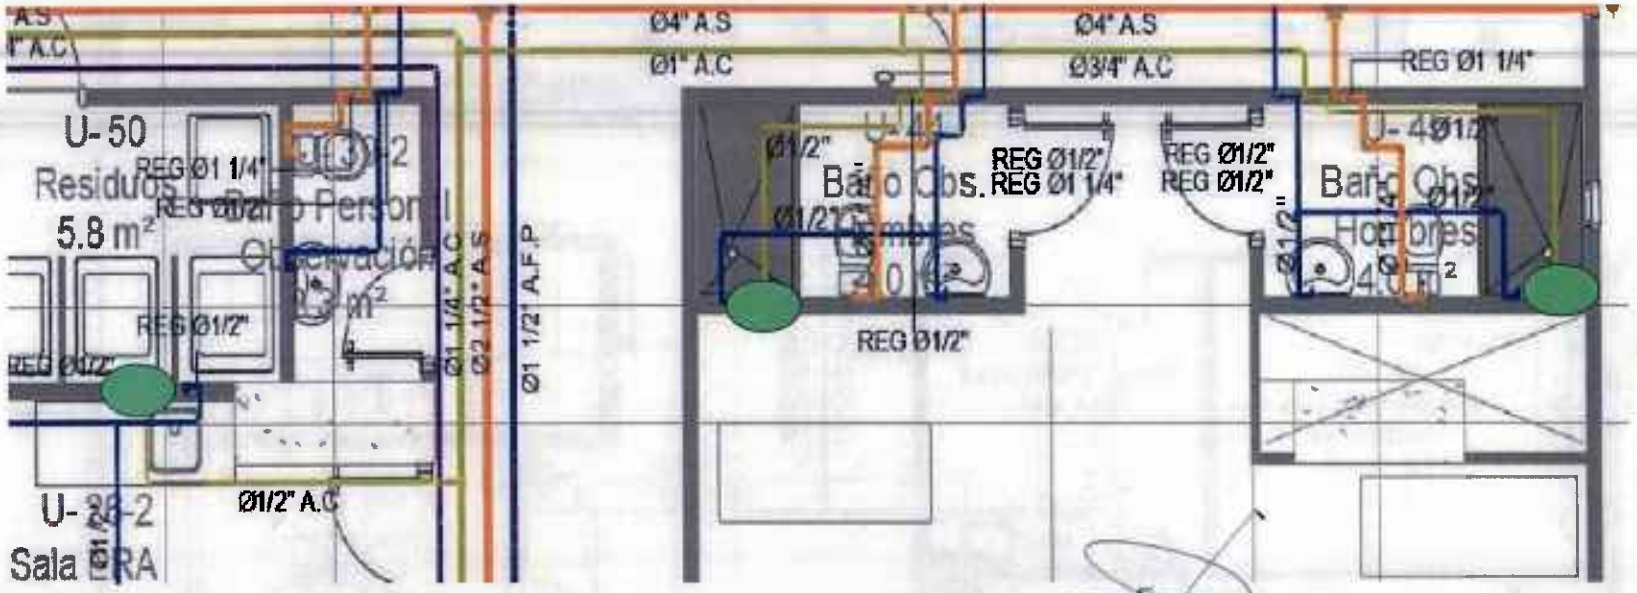

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06		Página 2 de 4	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE EL EJE 6 EJE D-E

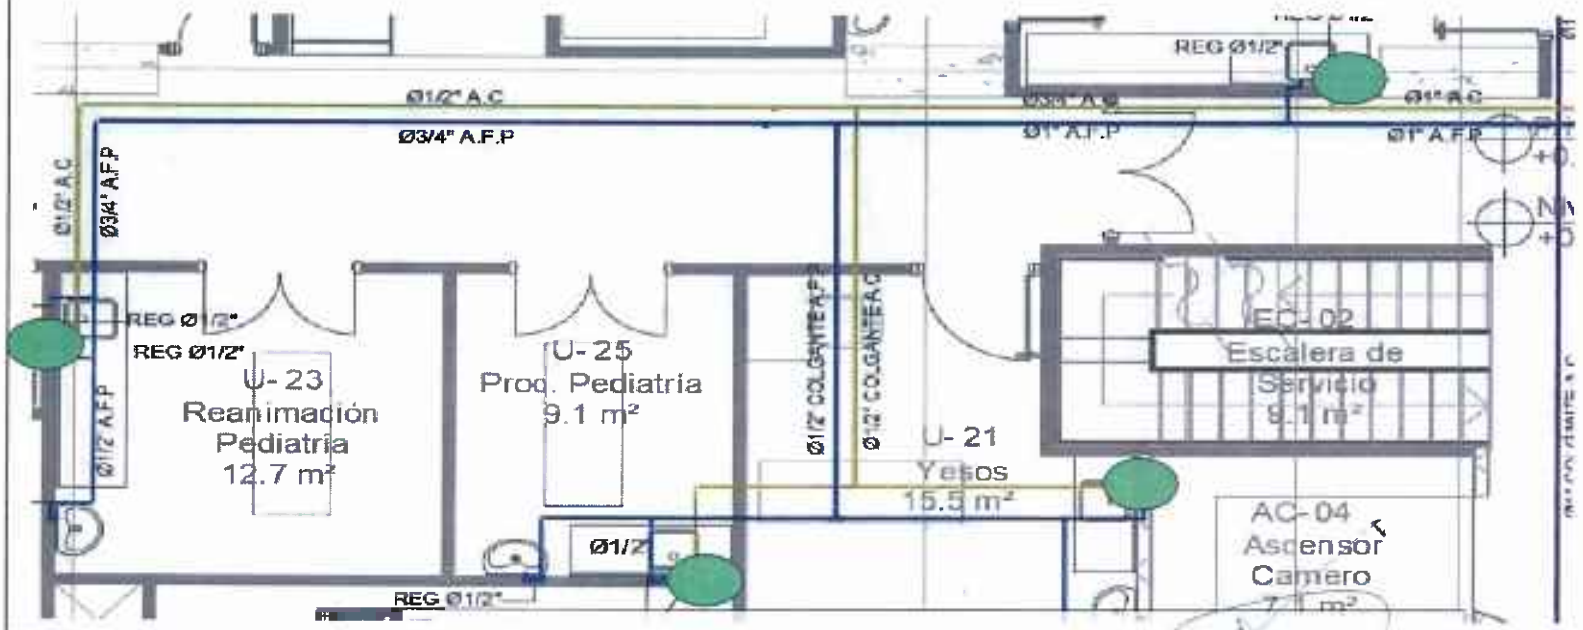

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 4	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE ELE EJE 4-5 EJE B-E

ENTRE ELE EJE 5 EJE F

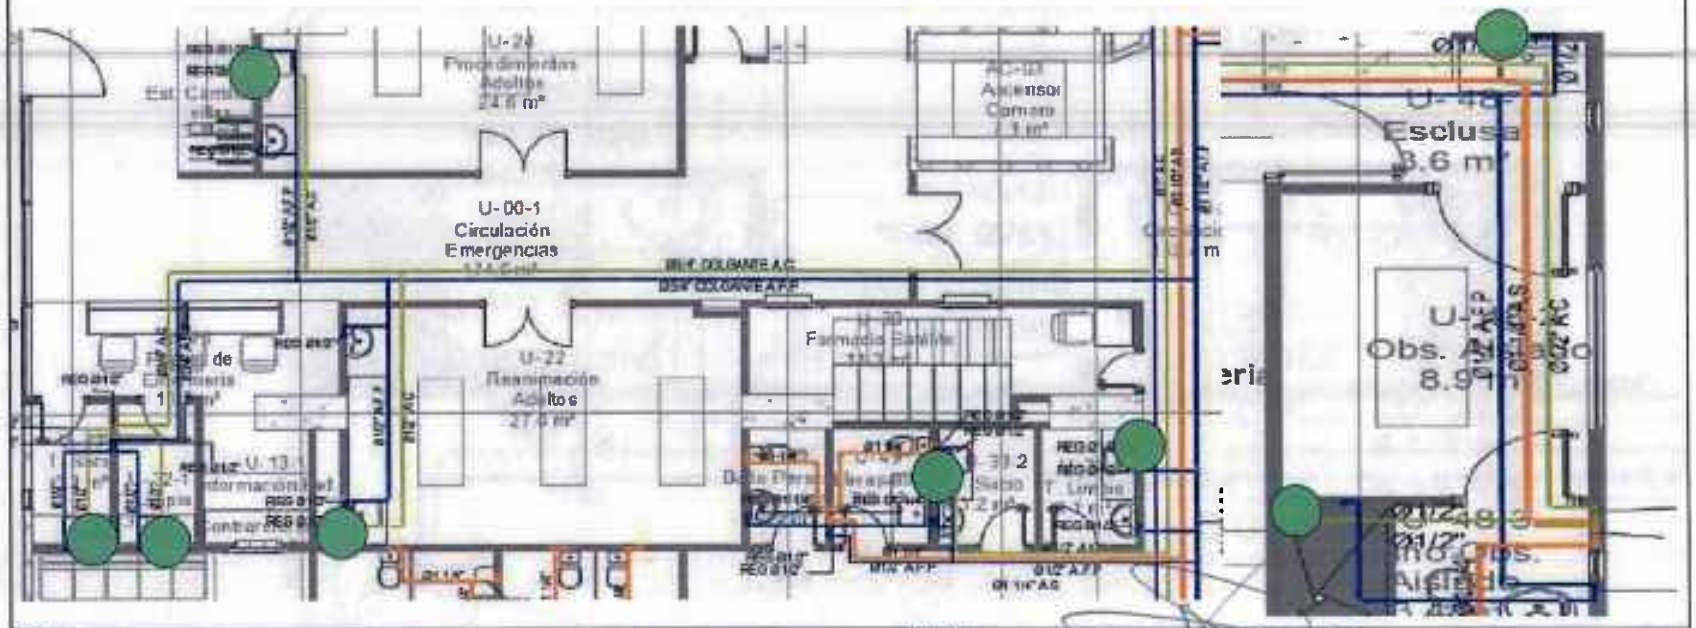

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE DEL CAGUÁN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE EL EJE 3 EJE F

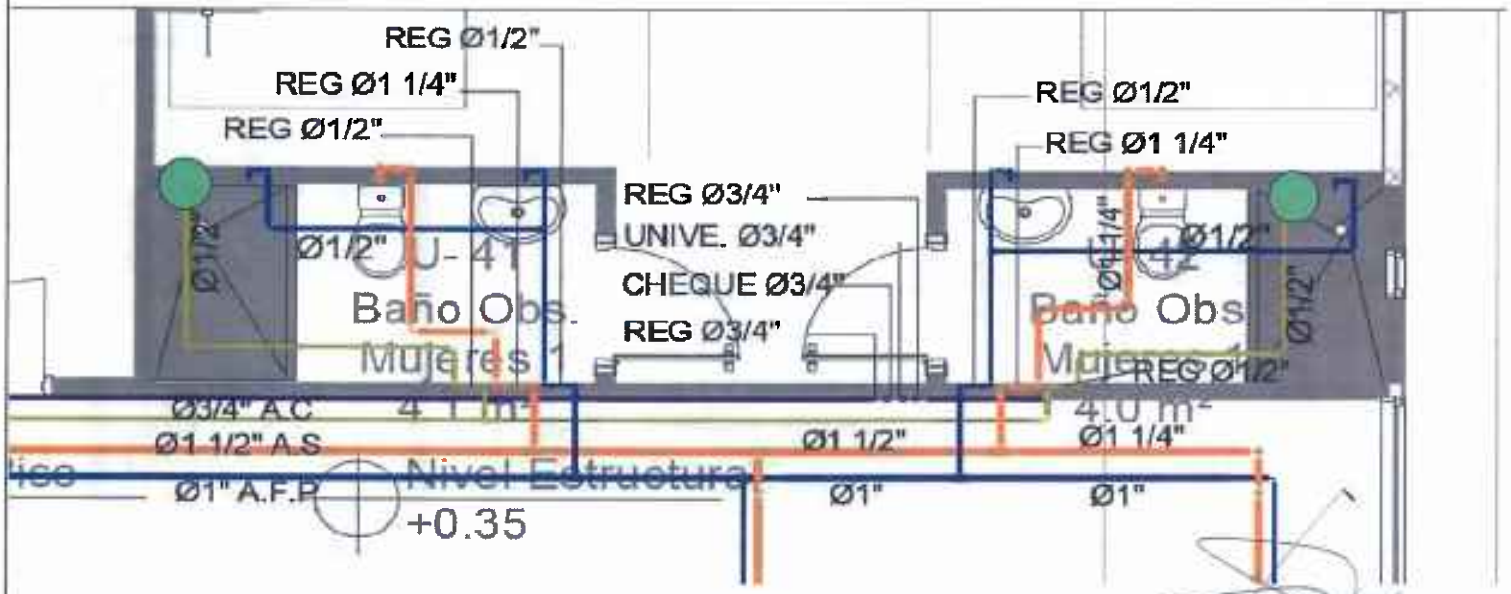

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página 2 de 4		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE ELE EJE 7 EJE B-C

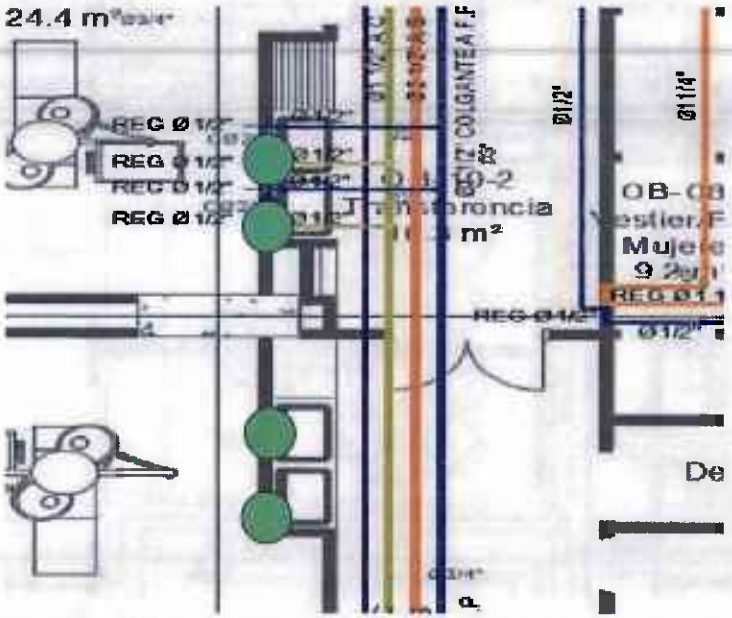

ENTRE ELEEJE 4-6 EJE B-C

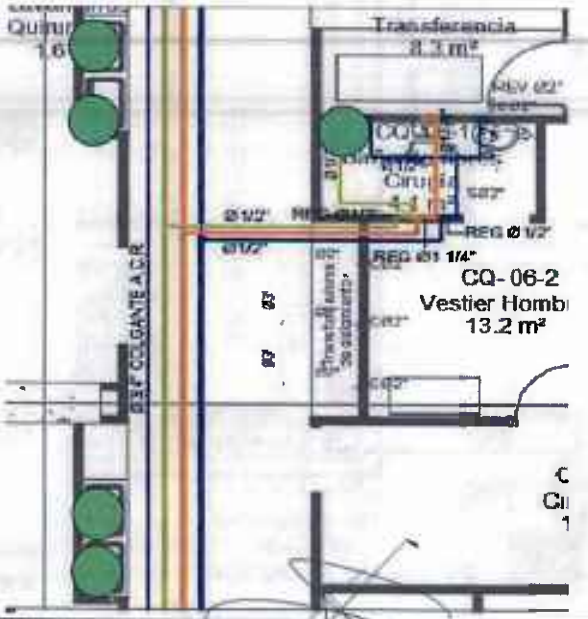

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 2 de 4	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE ELEJE 2-3 EJE B-C

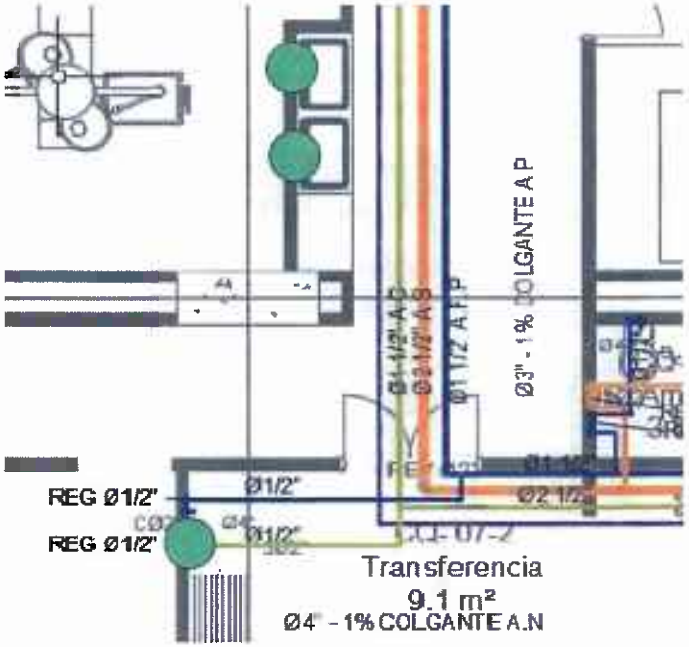

ENTRE EL EJE 3-4 EJE E-F

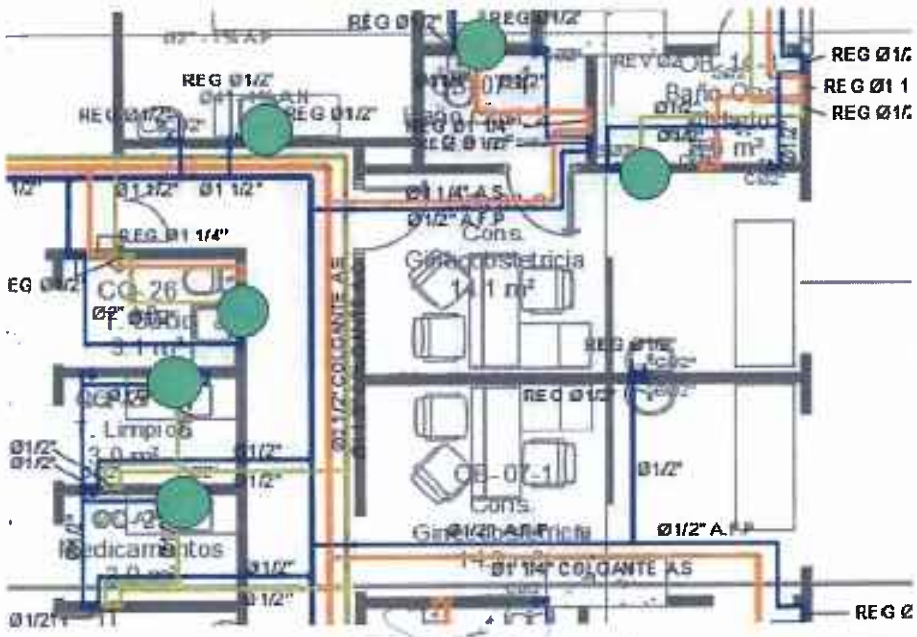

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 4	
		Fecha	1	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PUNTOS DE AGUA CALIENTE

ENTRE EL EJE 5-EJE D-E

ENTRE EL EJE 7 EJ D-E

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 2 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.11.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Punto hidráulico AC CPVC Ø1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE ELEEJE 8-10 EJE B-E

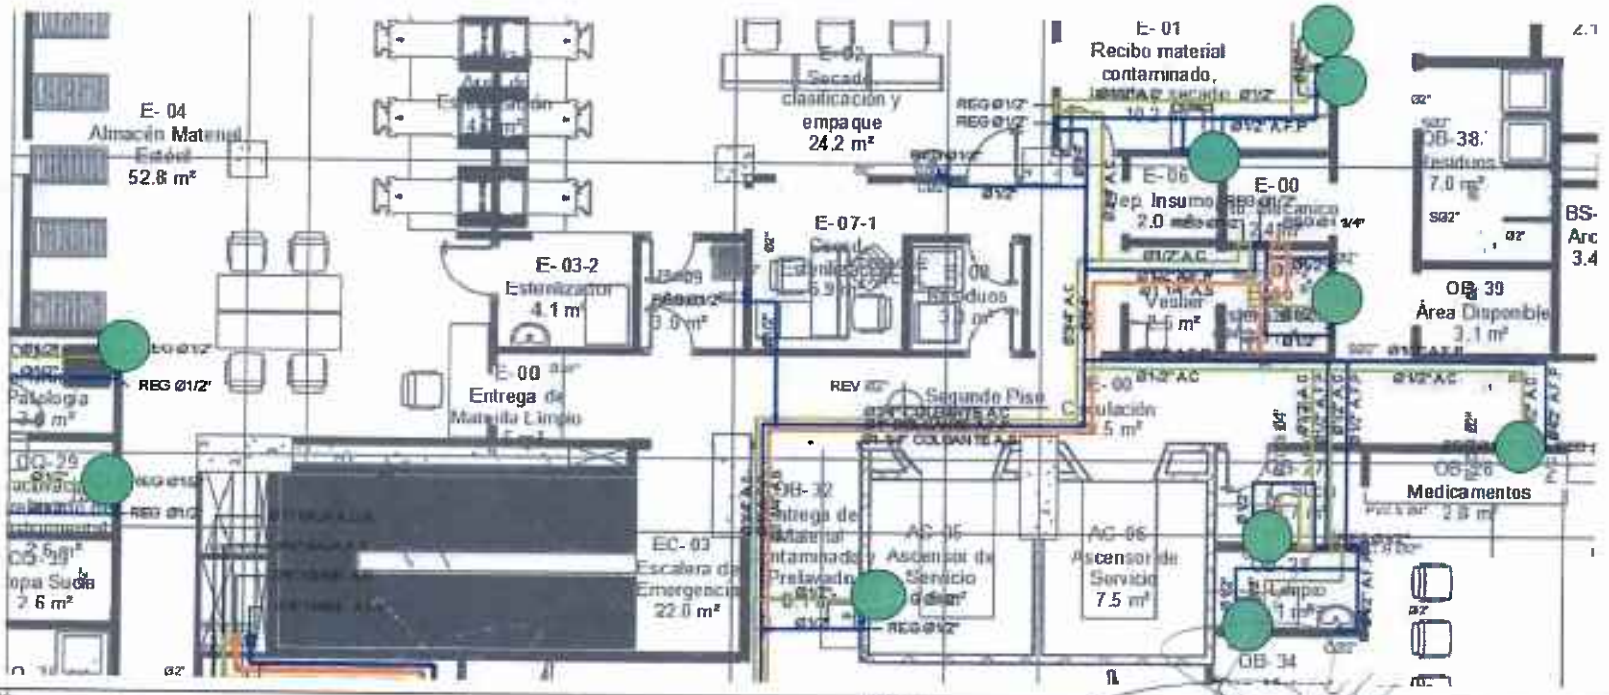

Elaboró:

RESIDENTE DE [illegible]
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jose Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(=) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					25,00	25,00
			PASAN			25,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

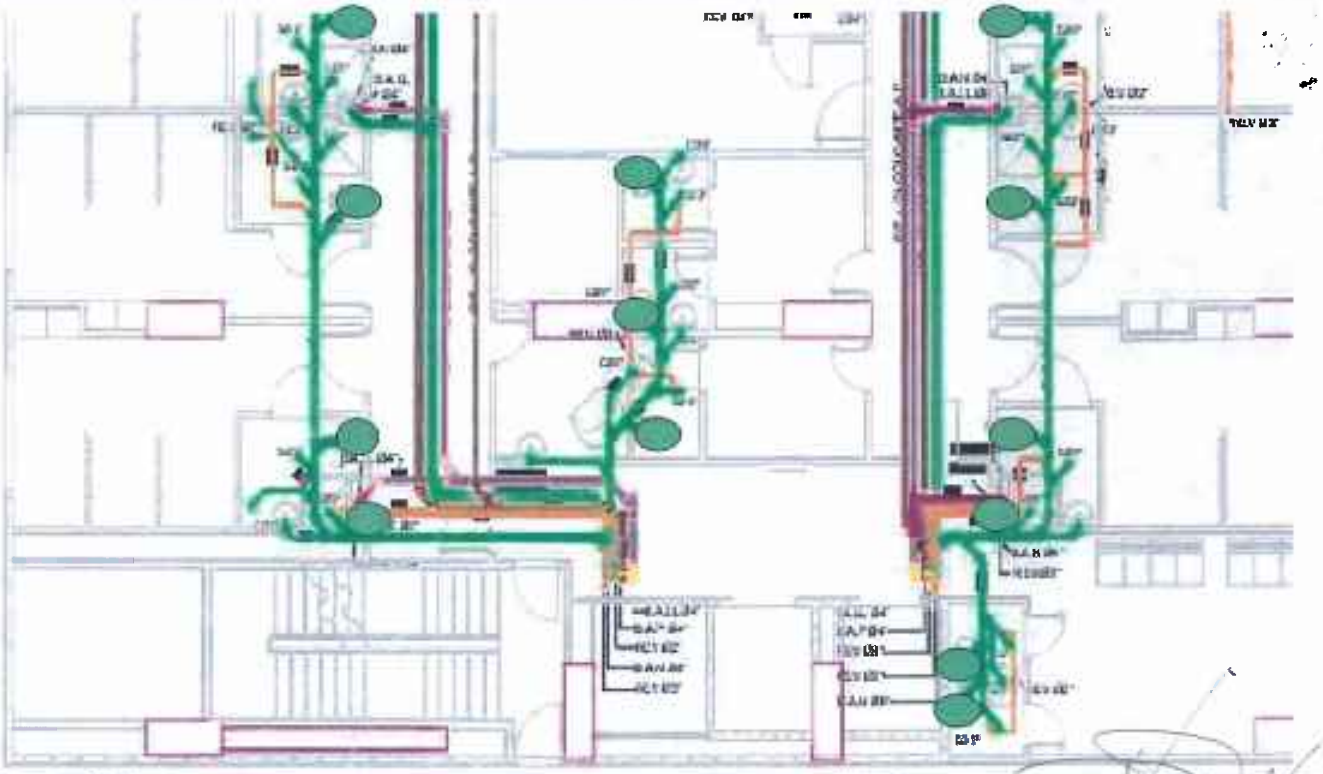

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

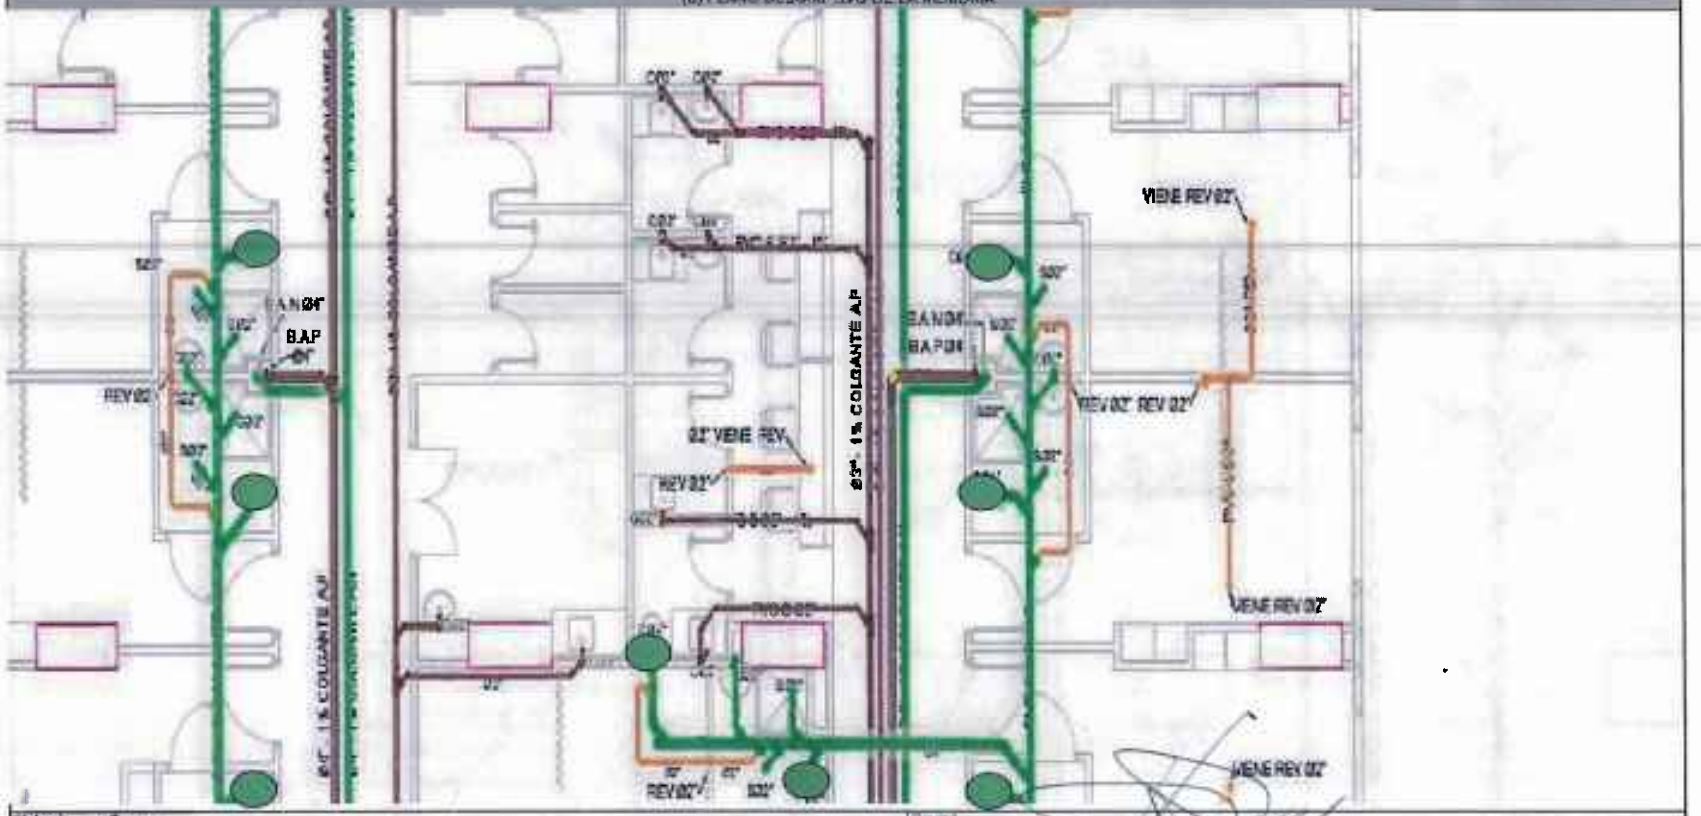
VIENE REV 02
REV 02
REV 02
VIENE REV 02
VIENE REV 02
REV 02
REV 02

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

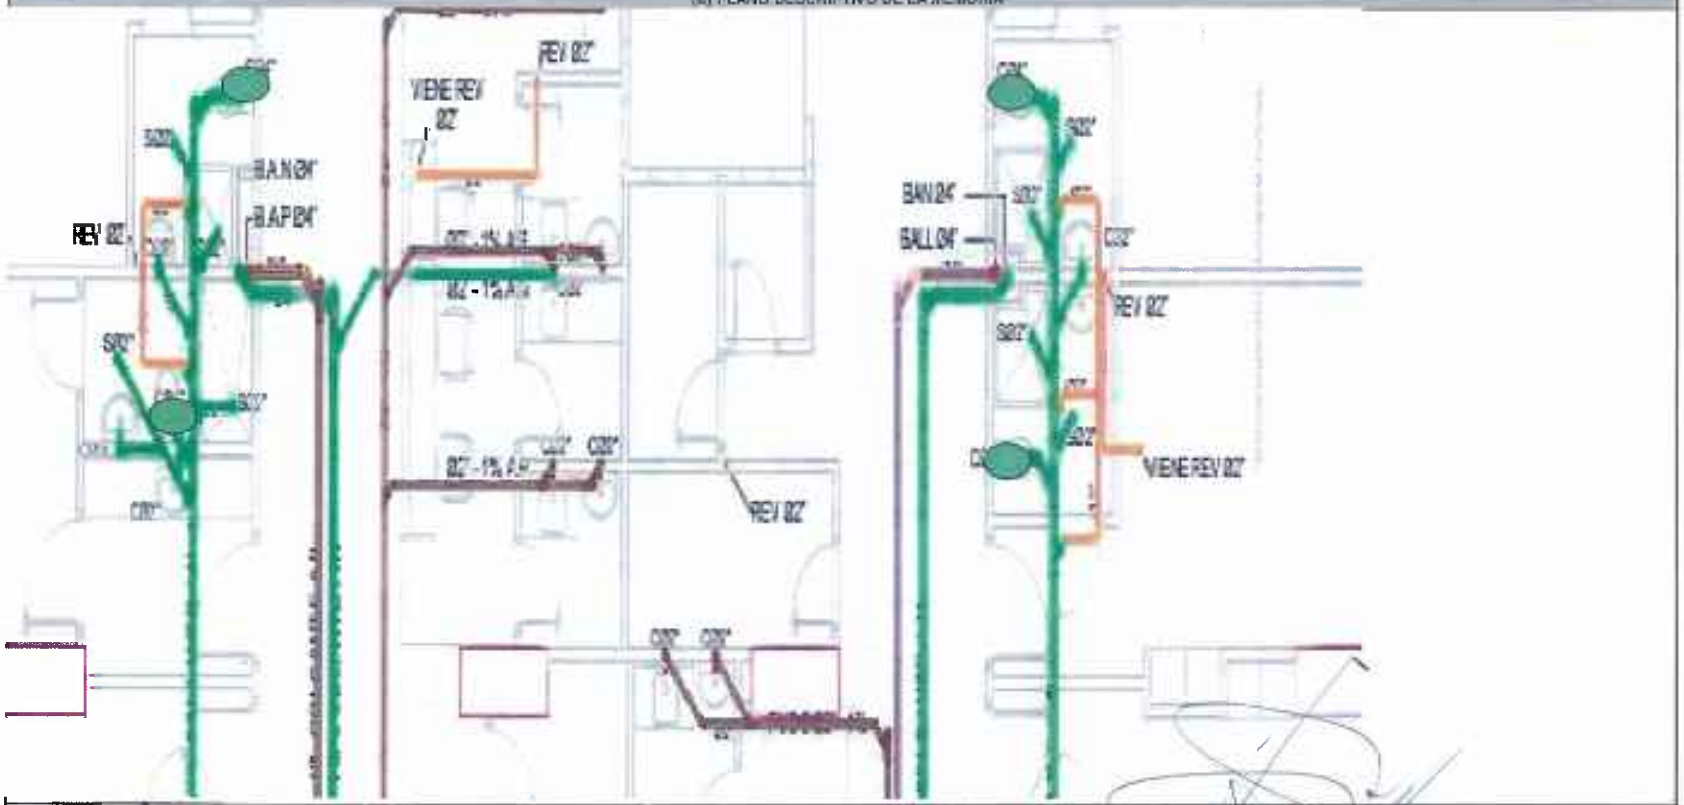

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

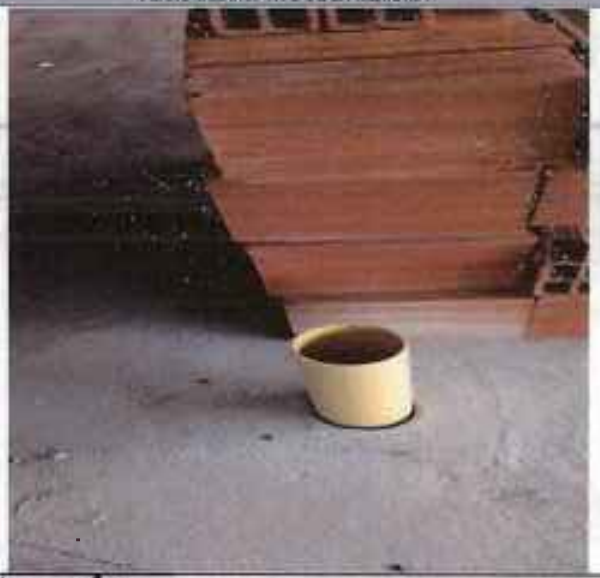

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					12,00	12,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

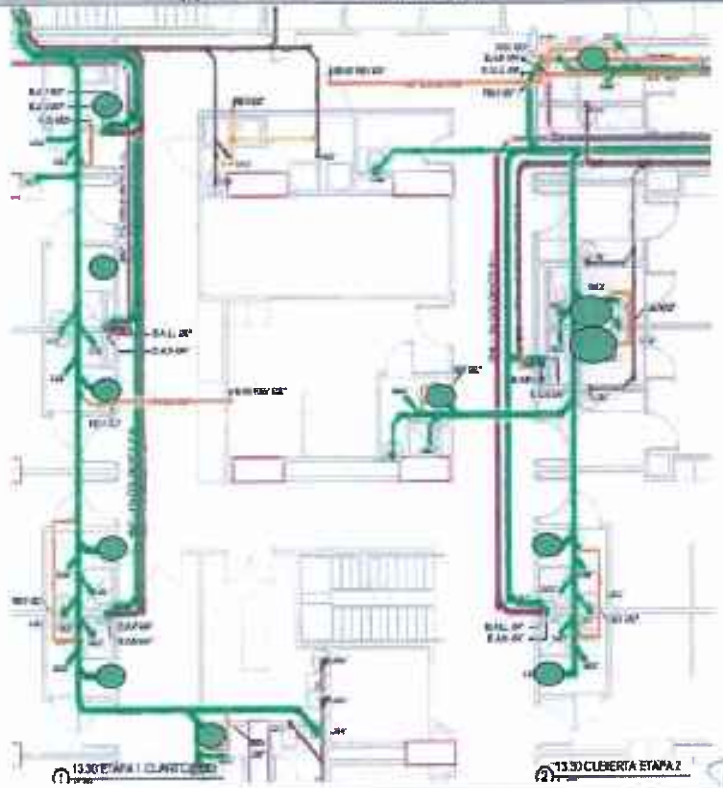

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castilla	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(k) g-m	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE E-F 2-5 Y EJE A-F					21,00	21,00
SUB TOTAL						21,00
VIENE						37,00
PASAN						58,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FT-08			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

01 PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

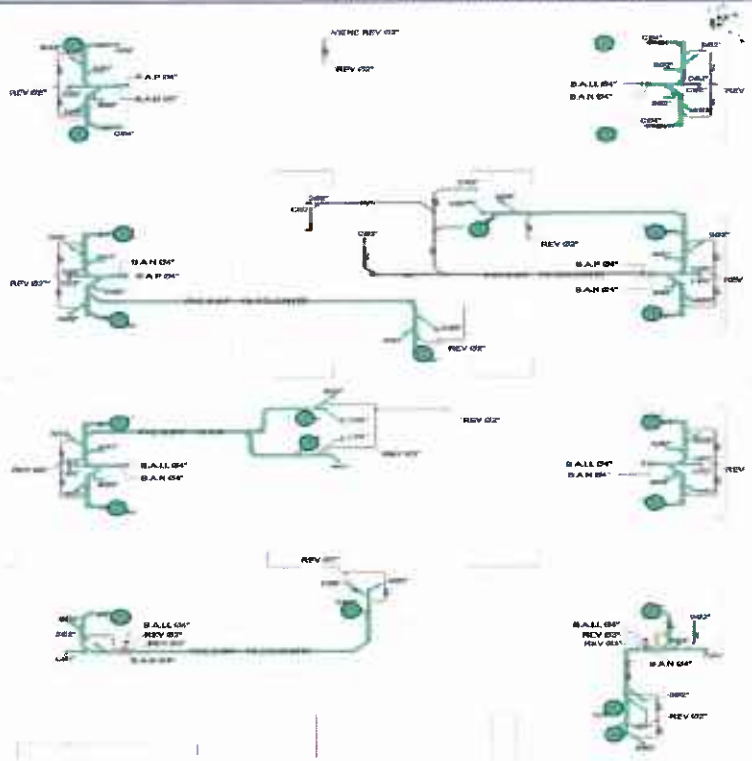

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL	(i) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)			
	QUINTO PISO						
	ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					12,00	12,00
	SUB TOTAL						12,00
	VIENE						58,00
	PASAN						70,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FM-FO-56			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

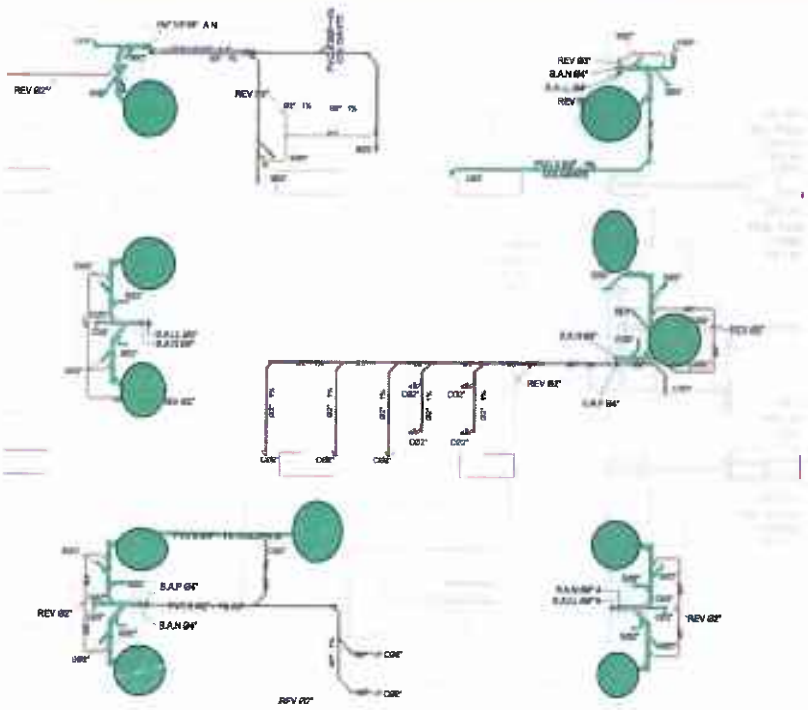

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					20,00	20,00
SUB TOTAL						20,00
VIENE						70,00
PASAN						90,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE DESARROLLO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	25.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(#) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

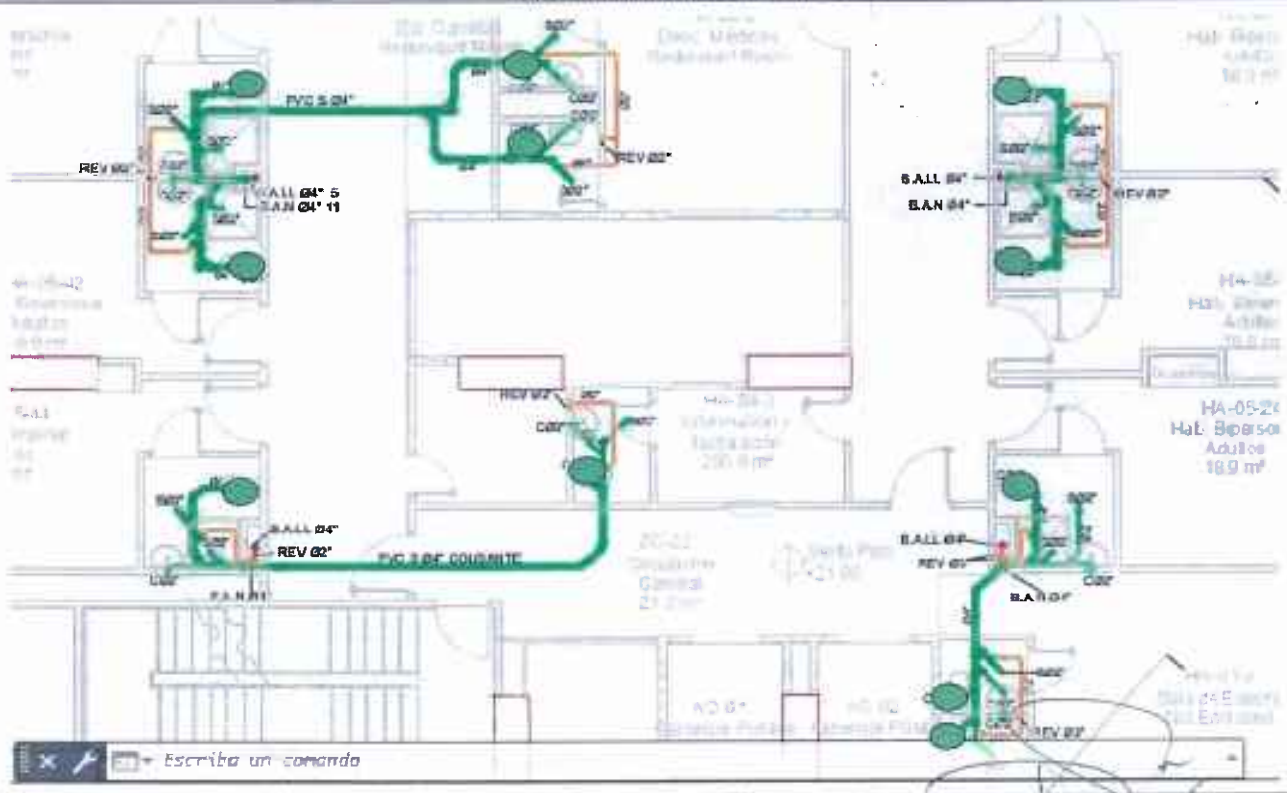

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(K) g/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EL EJE 6-10 EJE A-F					9,00	9,00
SUB TOTAL						9,00
VIENE						90,00
TOTAL						99,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE FONDICOL D	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	8	8	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(4) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

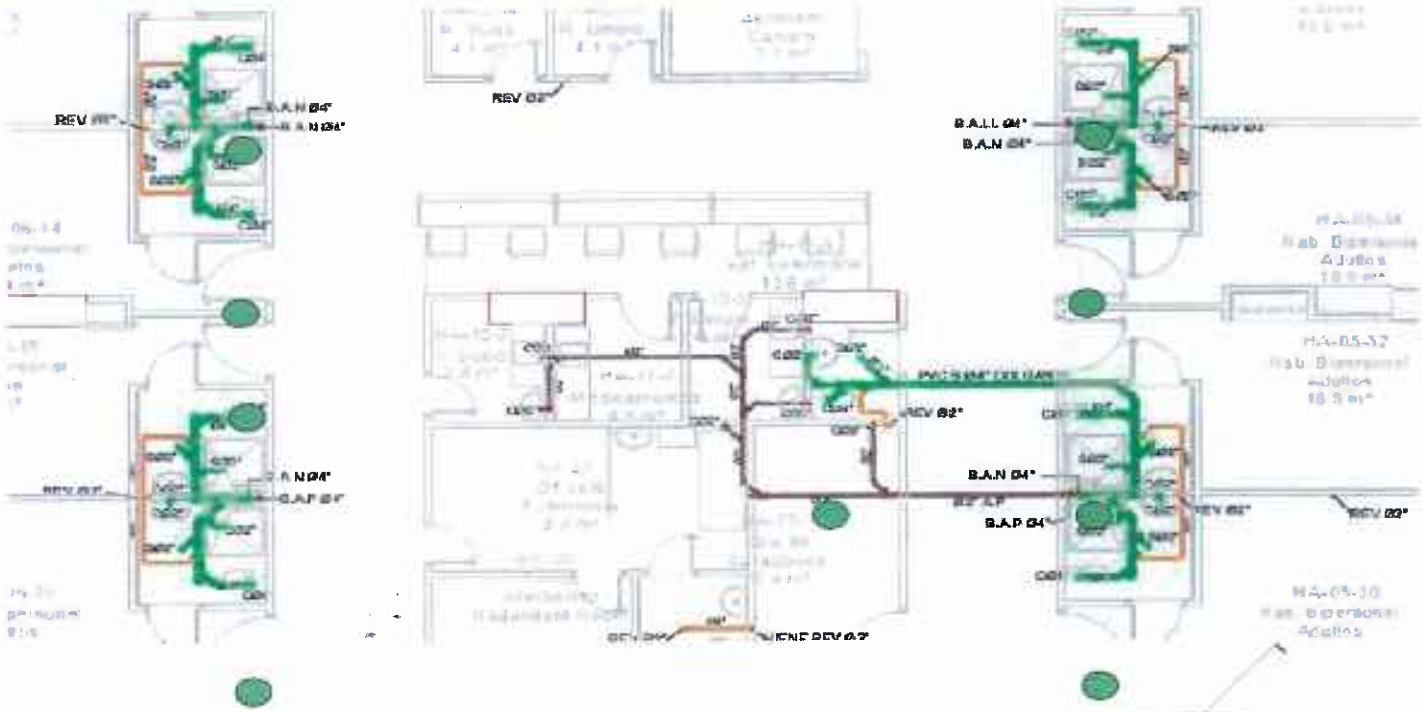

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión no: 08		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

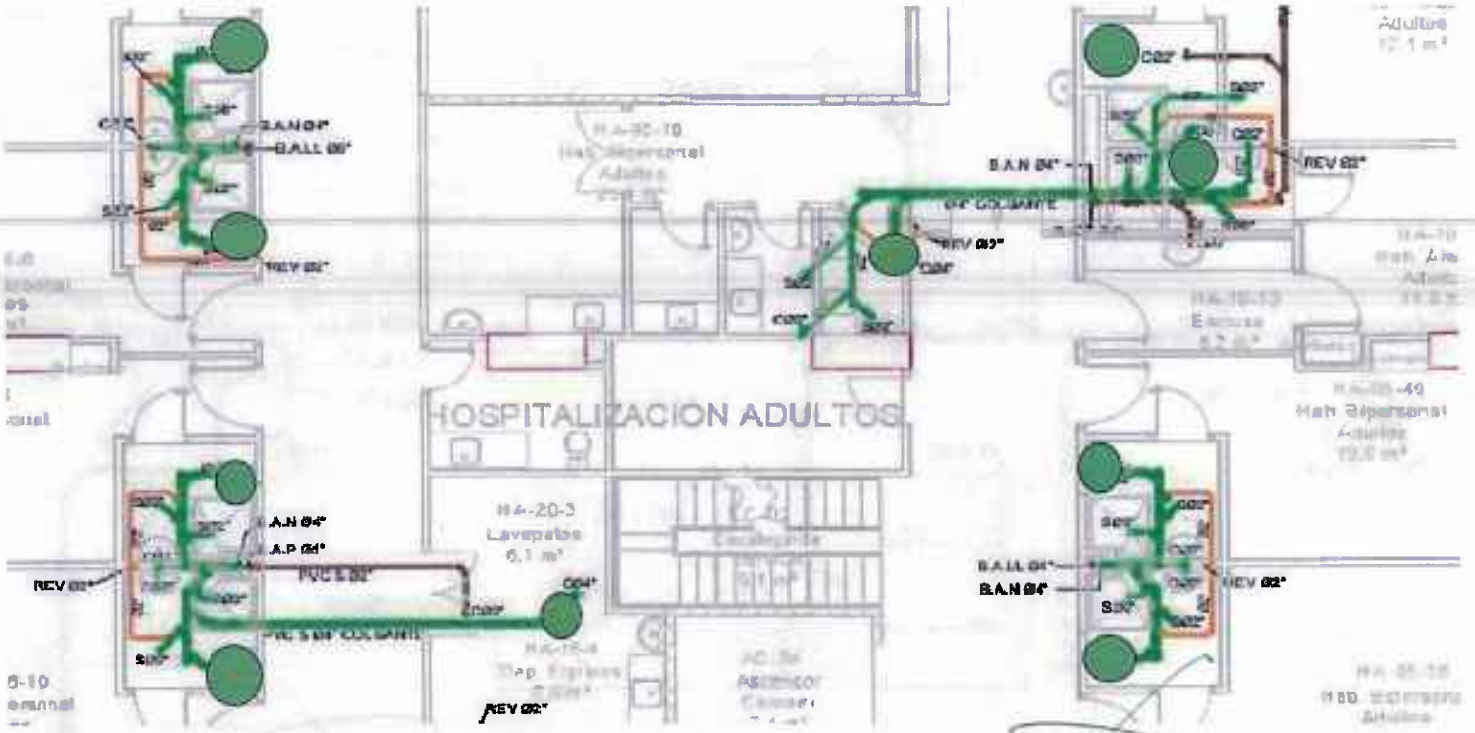

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.1	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

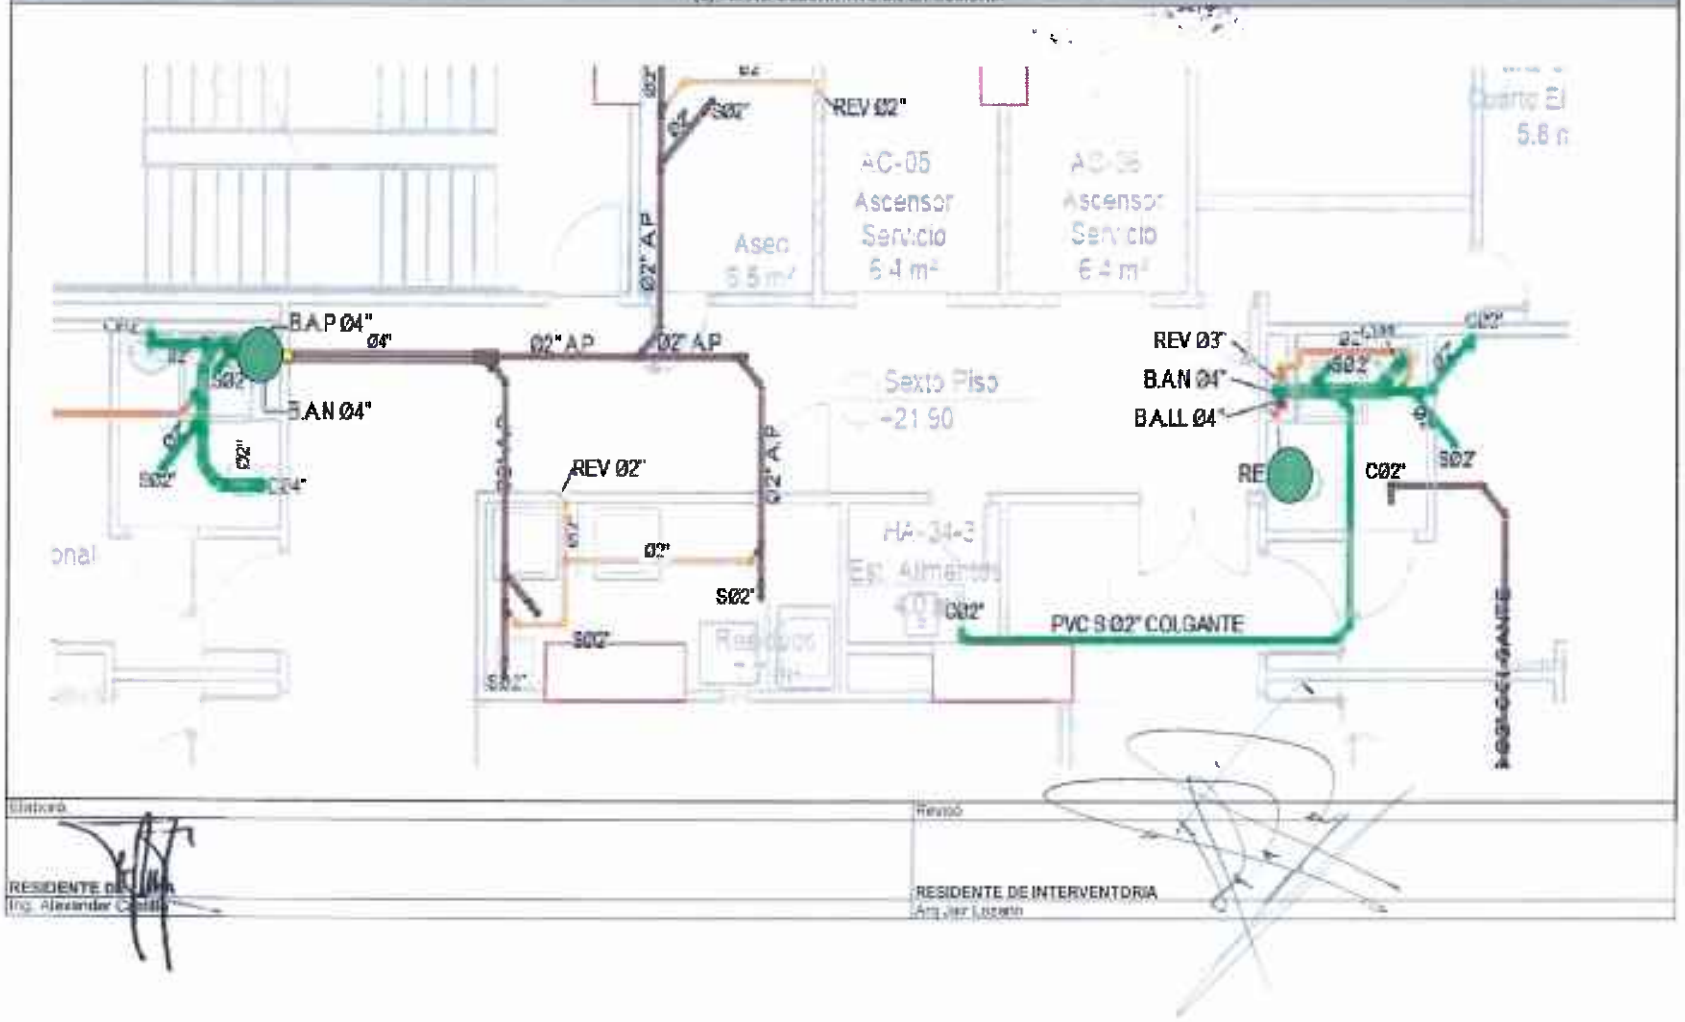

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(#) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(I) MEDIDA PARCIAL	(I) N° DE ELEMENTOS	(M) MEDIDA TOTAL
	(l) Ancho	(a) Longitud	(Kg/m)			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					63,00	63,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 30		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

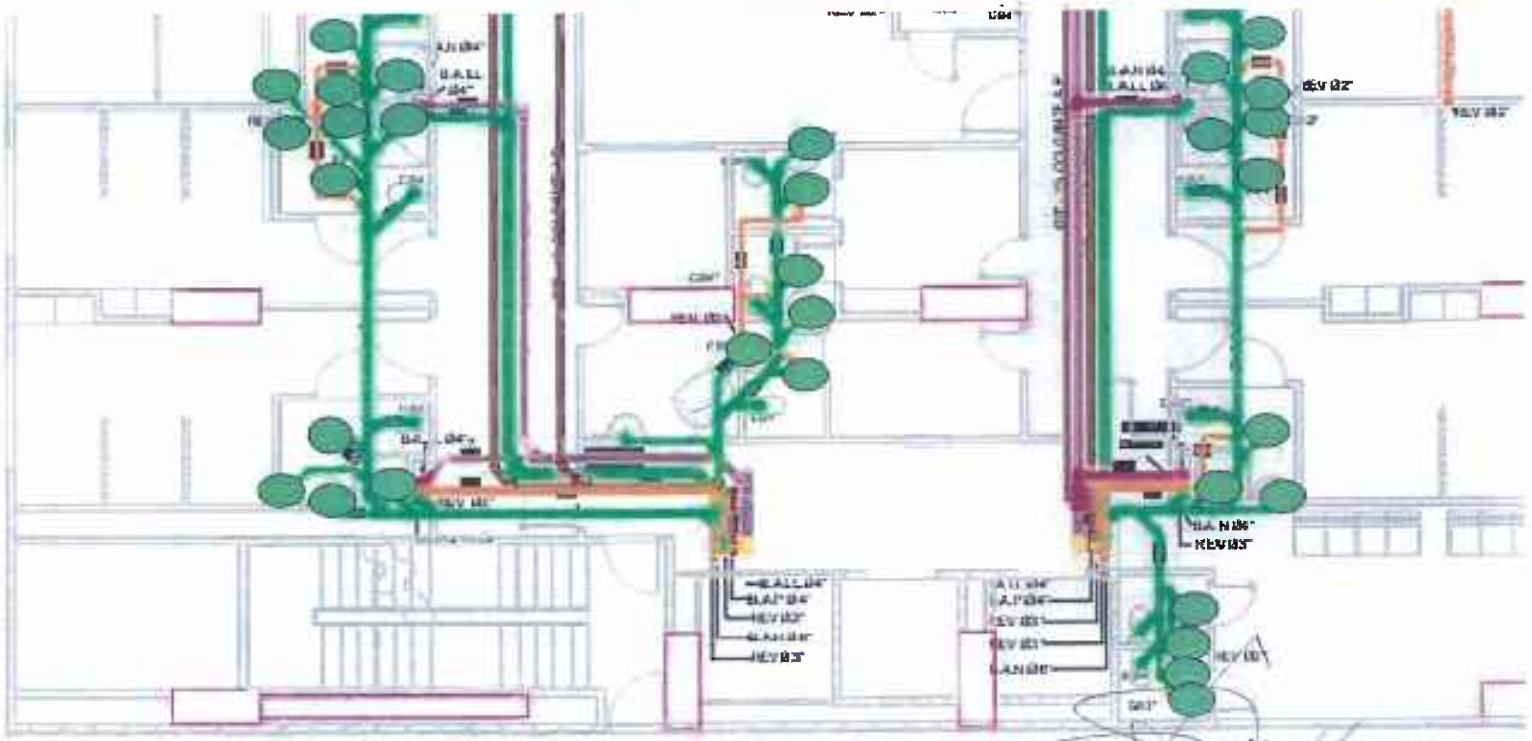

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"		UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

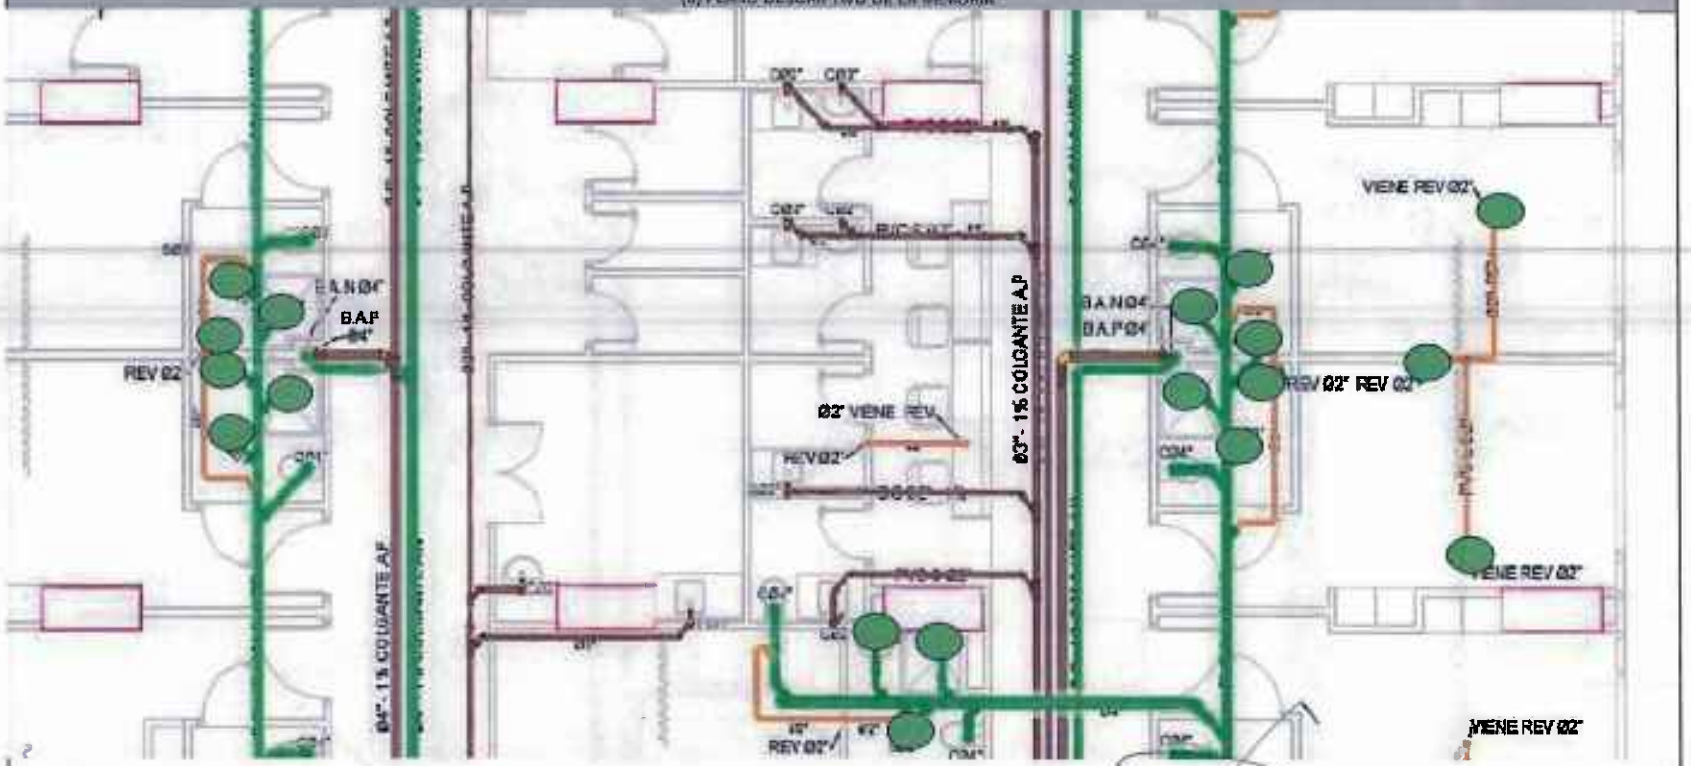

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	D	M	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

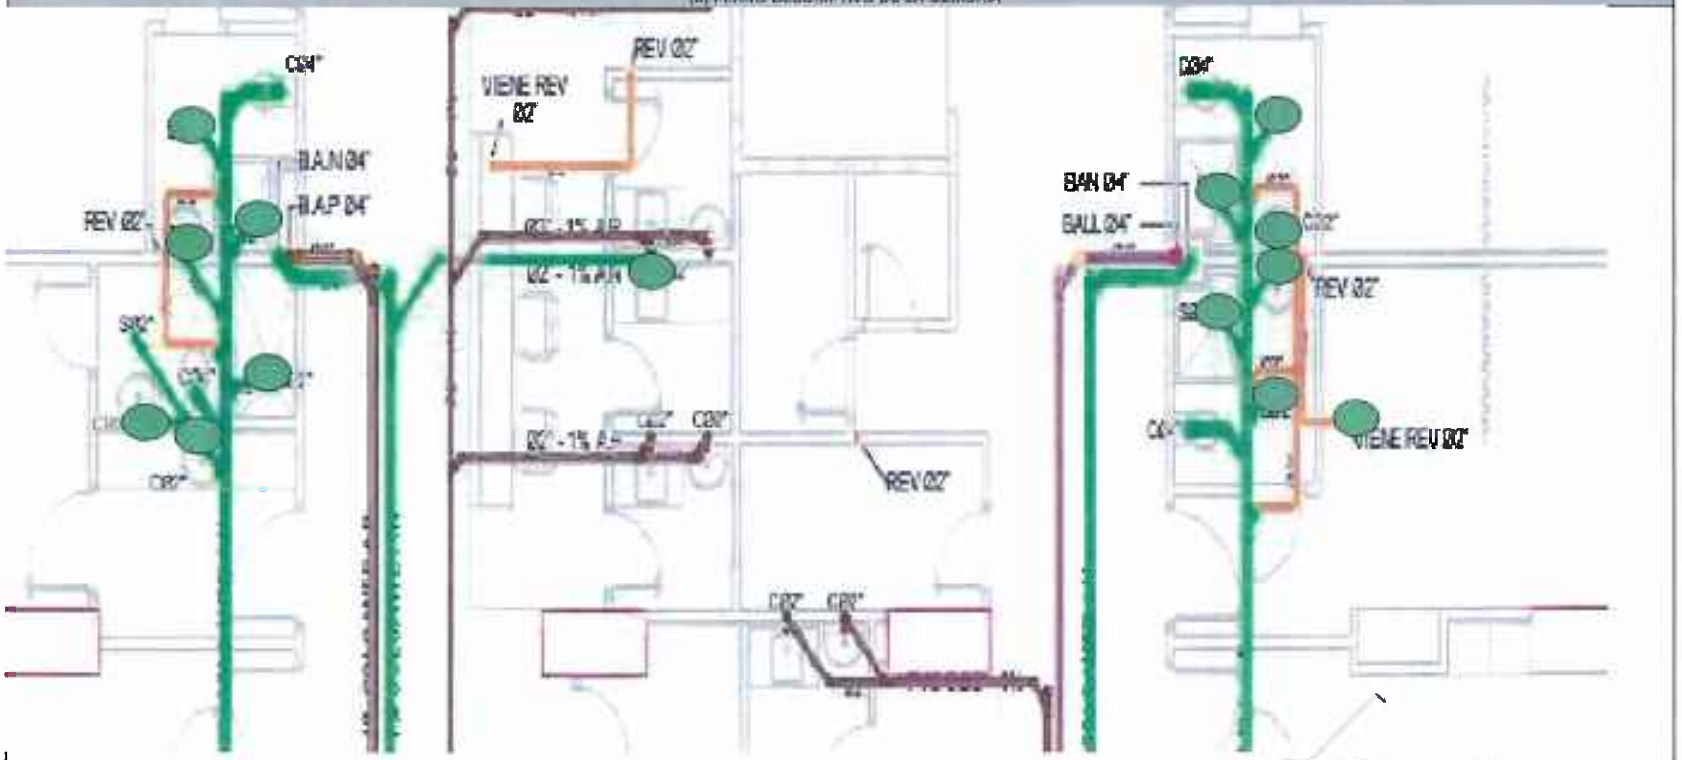

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	6	2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kgml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF					34,00	34,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSROCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

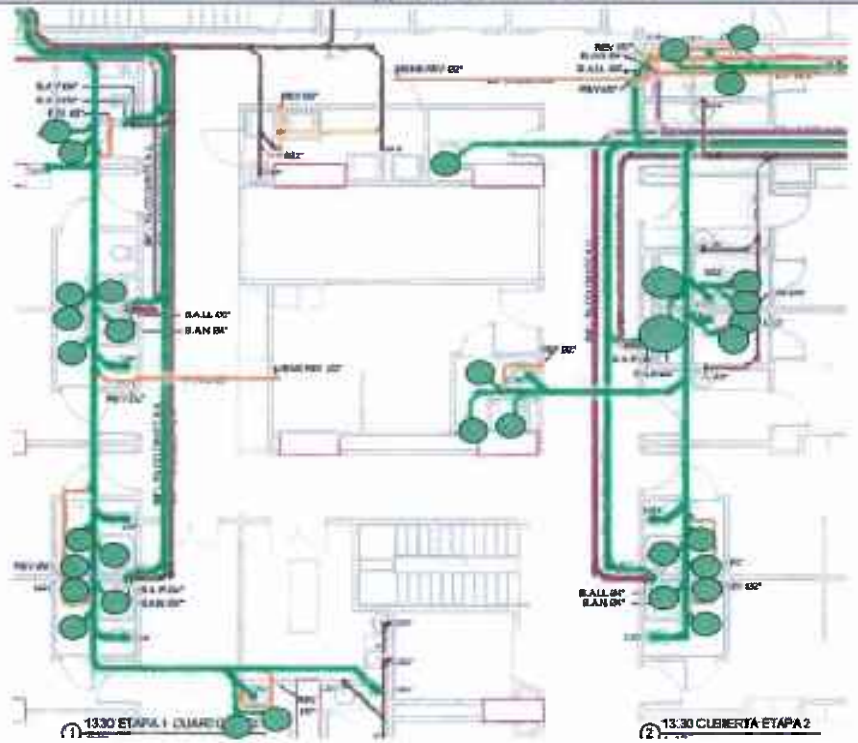

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					57,00	57,00
SUB TOTAL						57,00
VIENE						57,00
PASAN						114,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

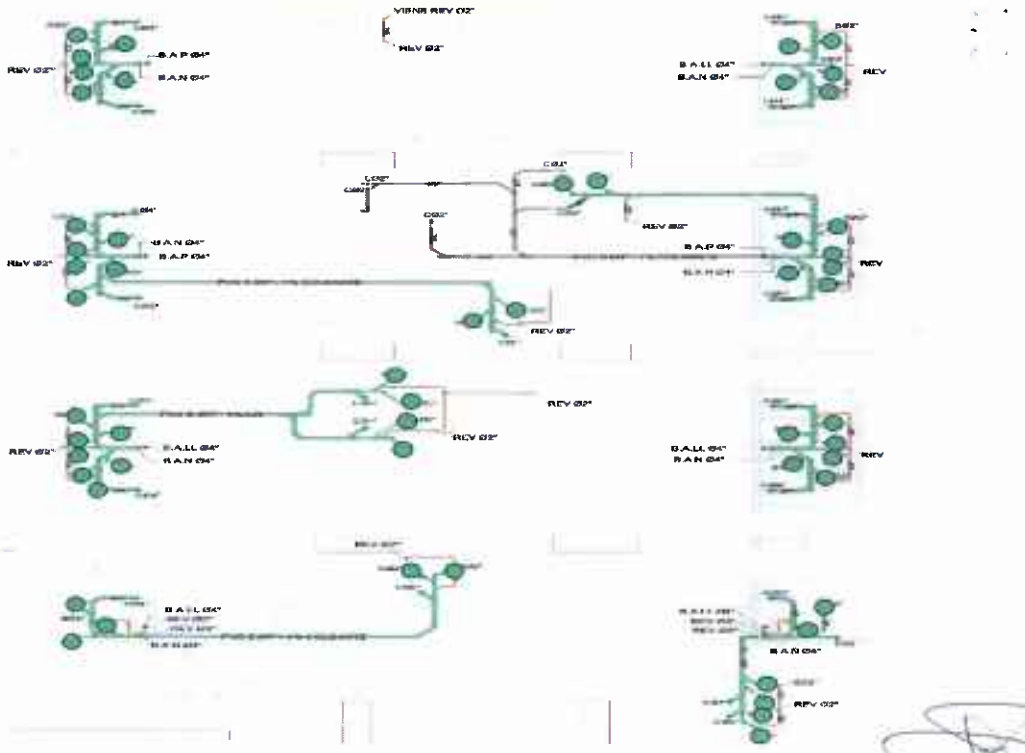

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	4	2022

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					33,00	33,00
SUB TOTAL						33,00
VIENE						154,00
PASA						187,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

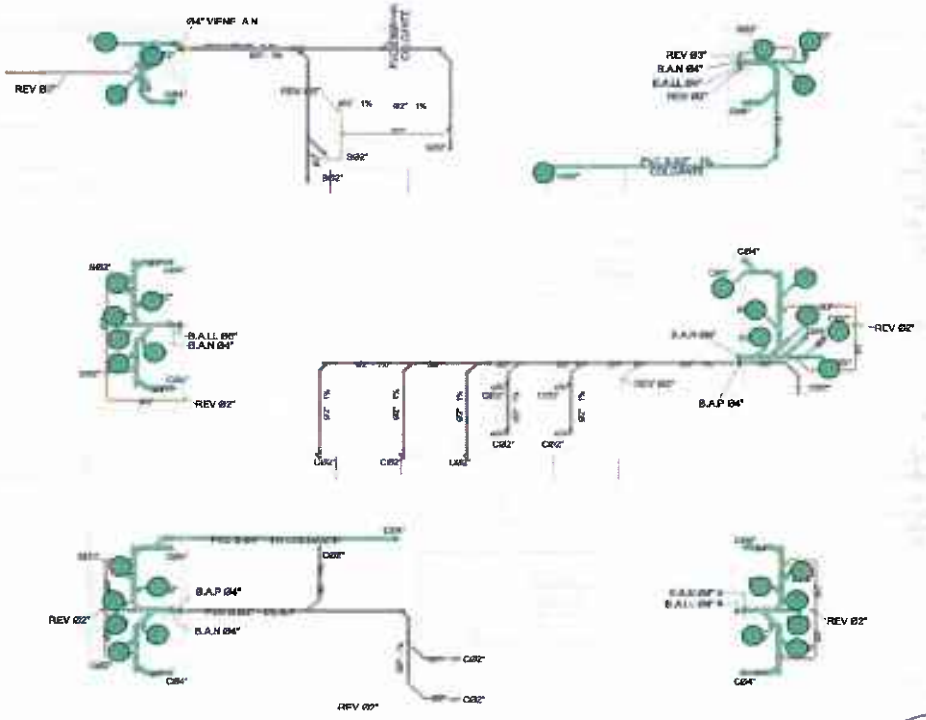

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLASO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					54,00	54,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-20			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

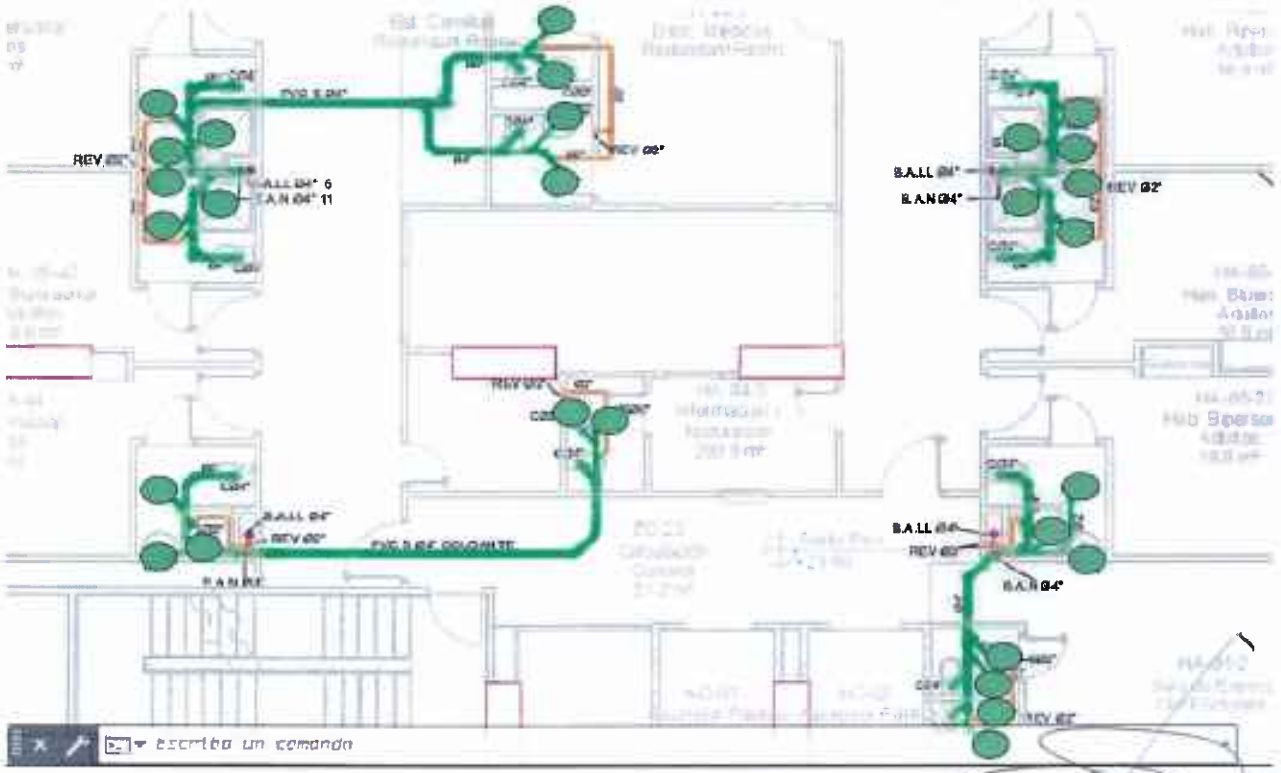

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EL EJE 8-10 Y EJE A-F					33,00	33,00

SAN VICENTE FONDICO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

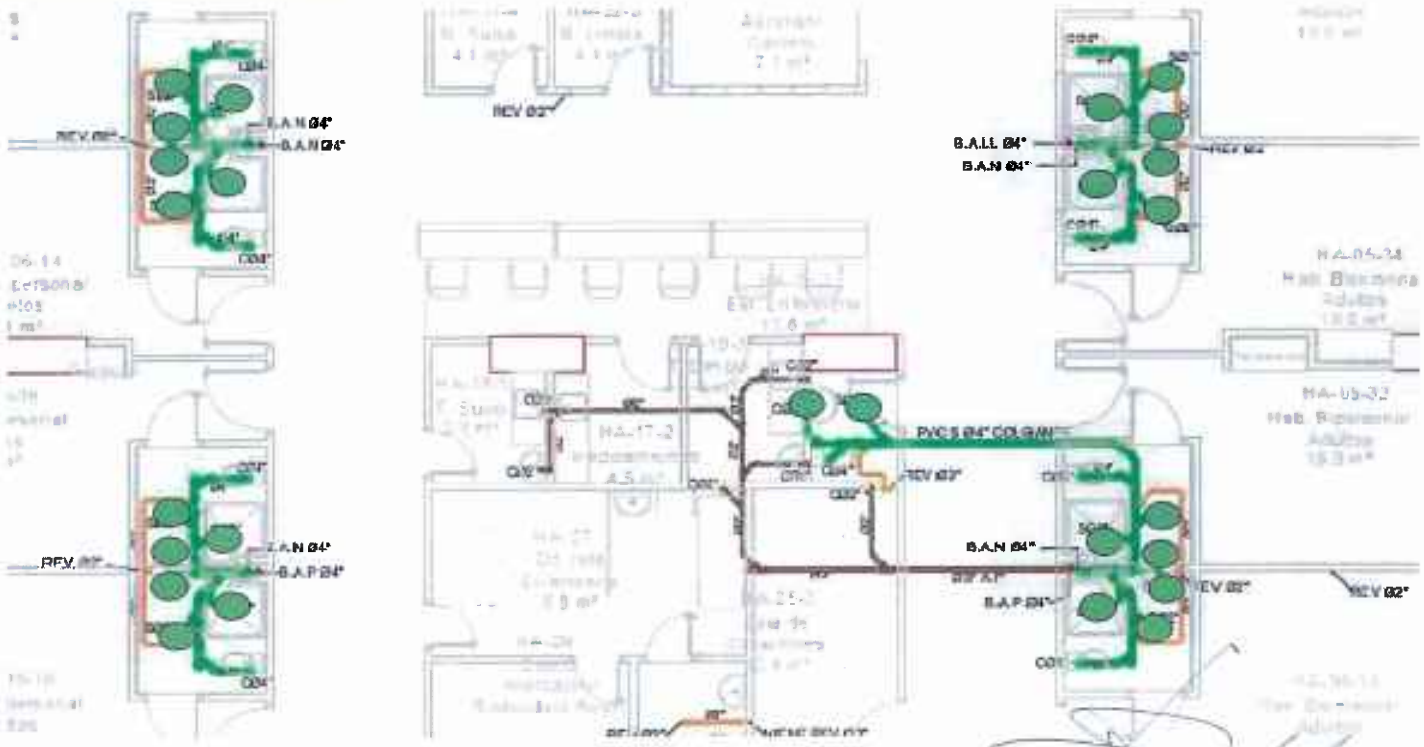

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Osorio	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

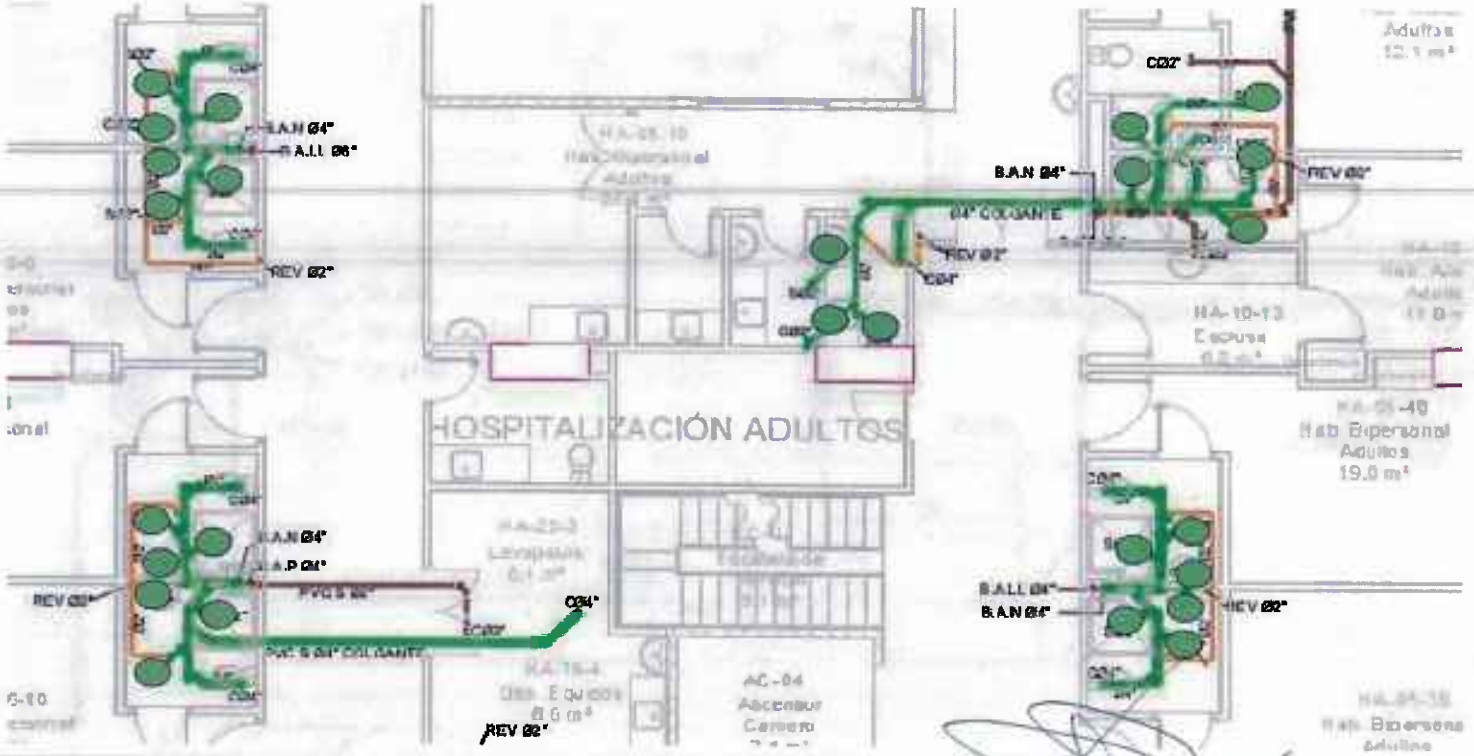

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

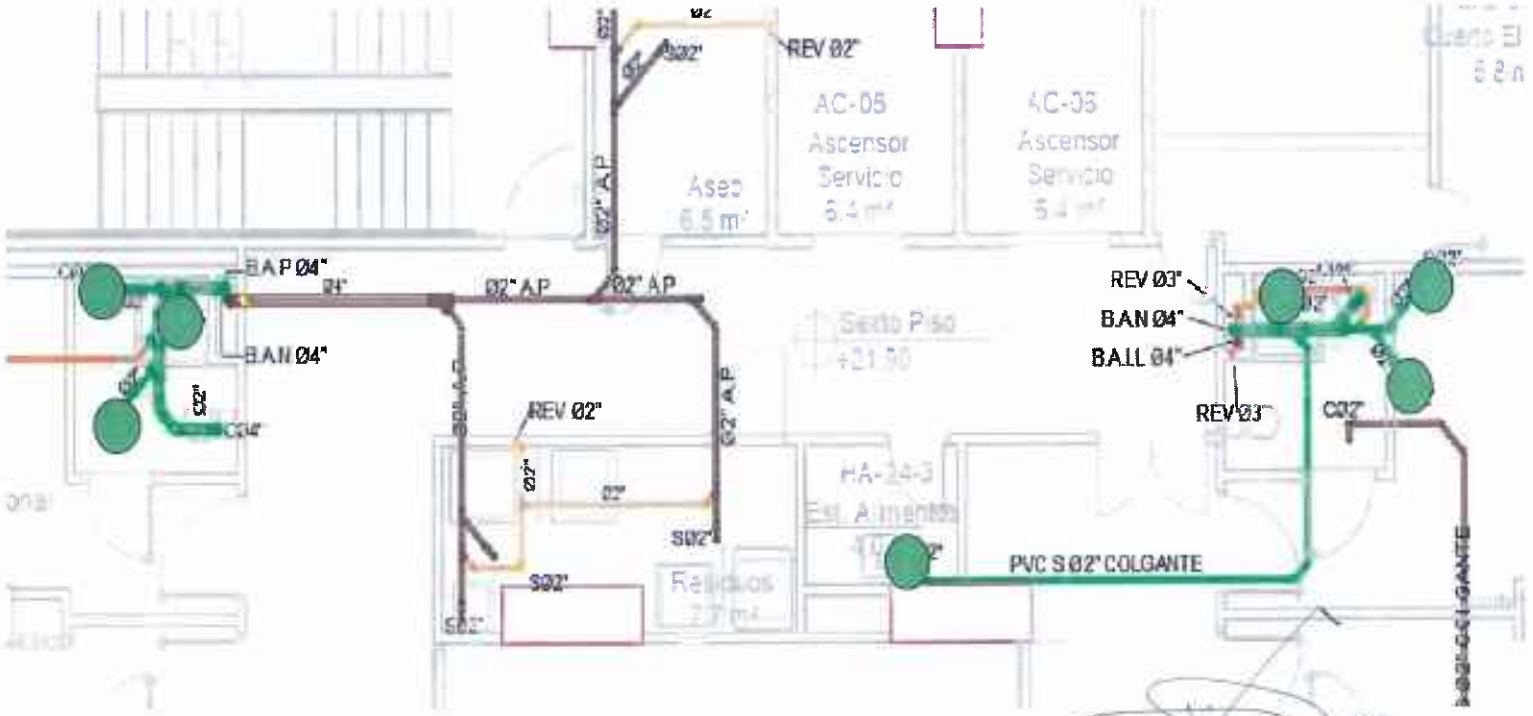

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
	CUARTO PISO						
	ENTRE EJE 2-3 Y EJE A-F					63,00	63,00
						35,00	35,00
					PASAN		63,00

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	9	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

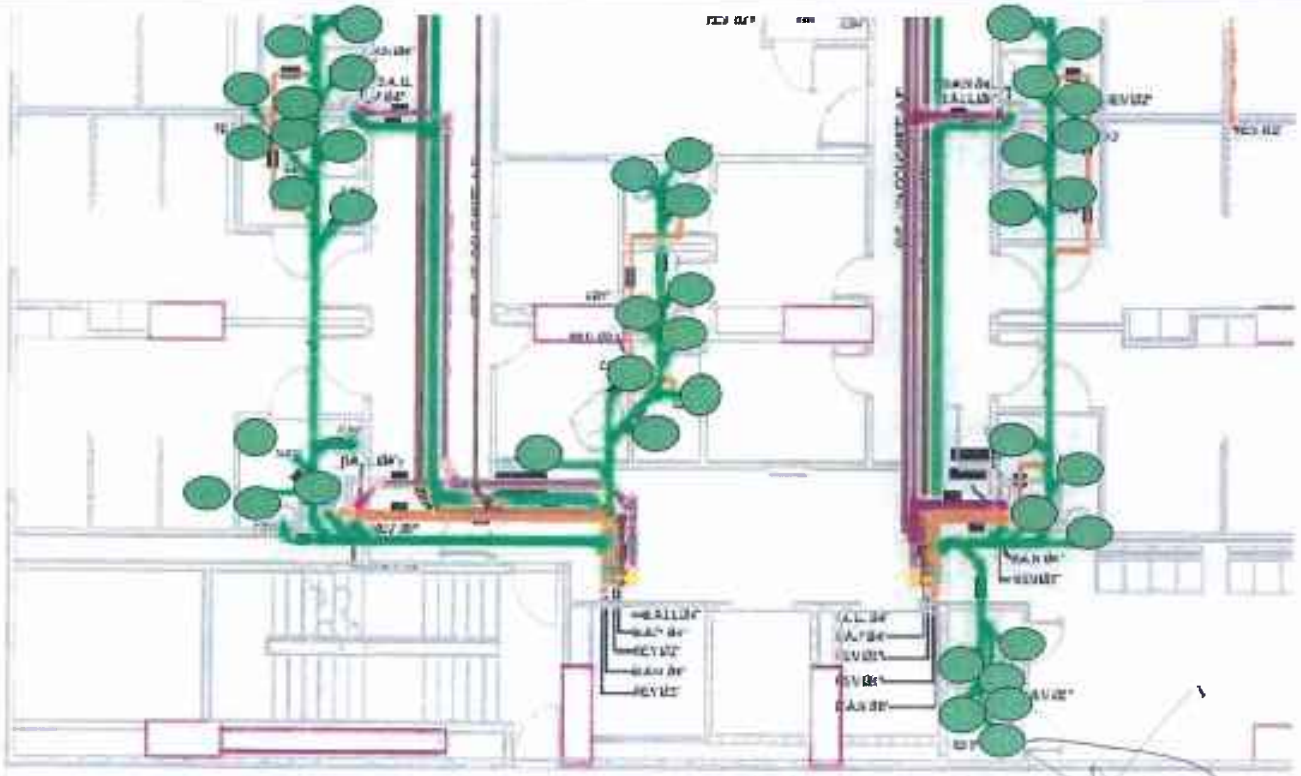

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Joir Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	6	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					34,00	34,00
					12,00	12,00
SUB TOTAL						46,00
VIENE						63,00
PASAN						109,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PM-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	6	4	2025

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**		
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.12.5**	**DESCRIPCION ITEM**	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

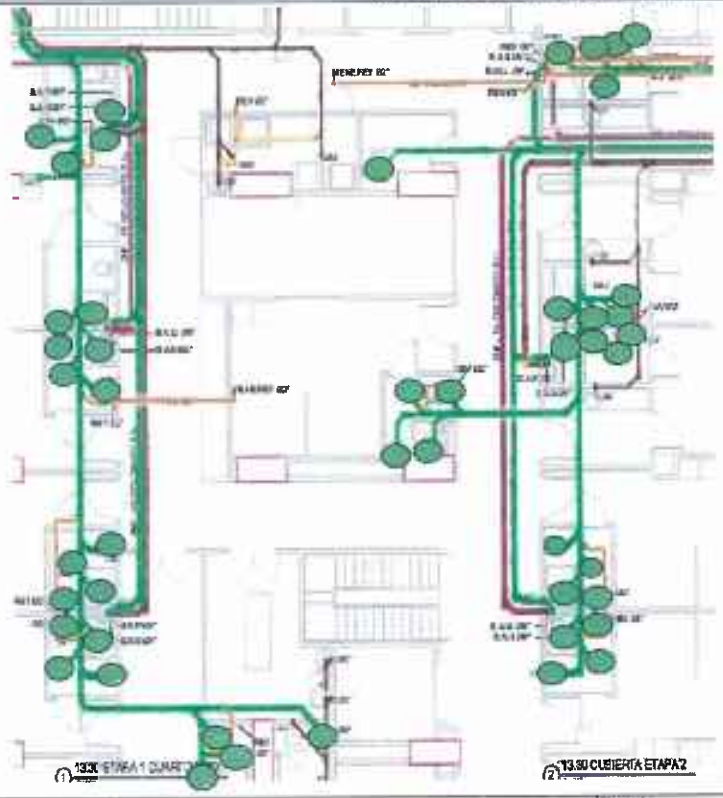

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	4	4	2022

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

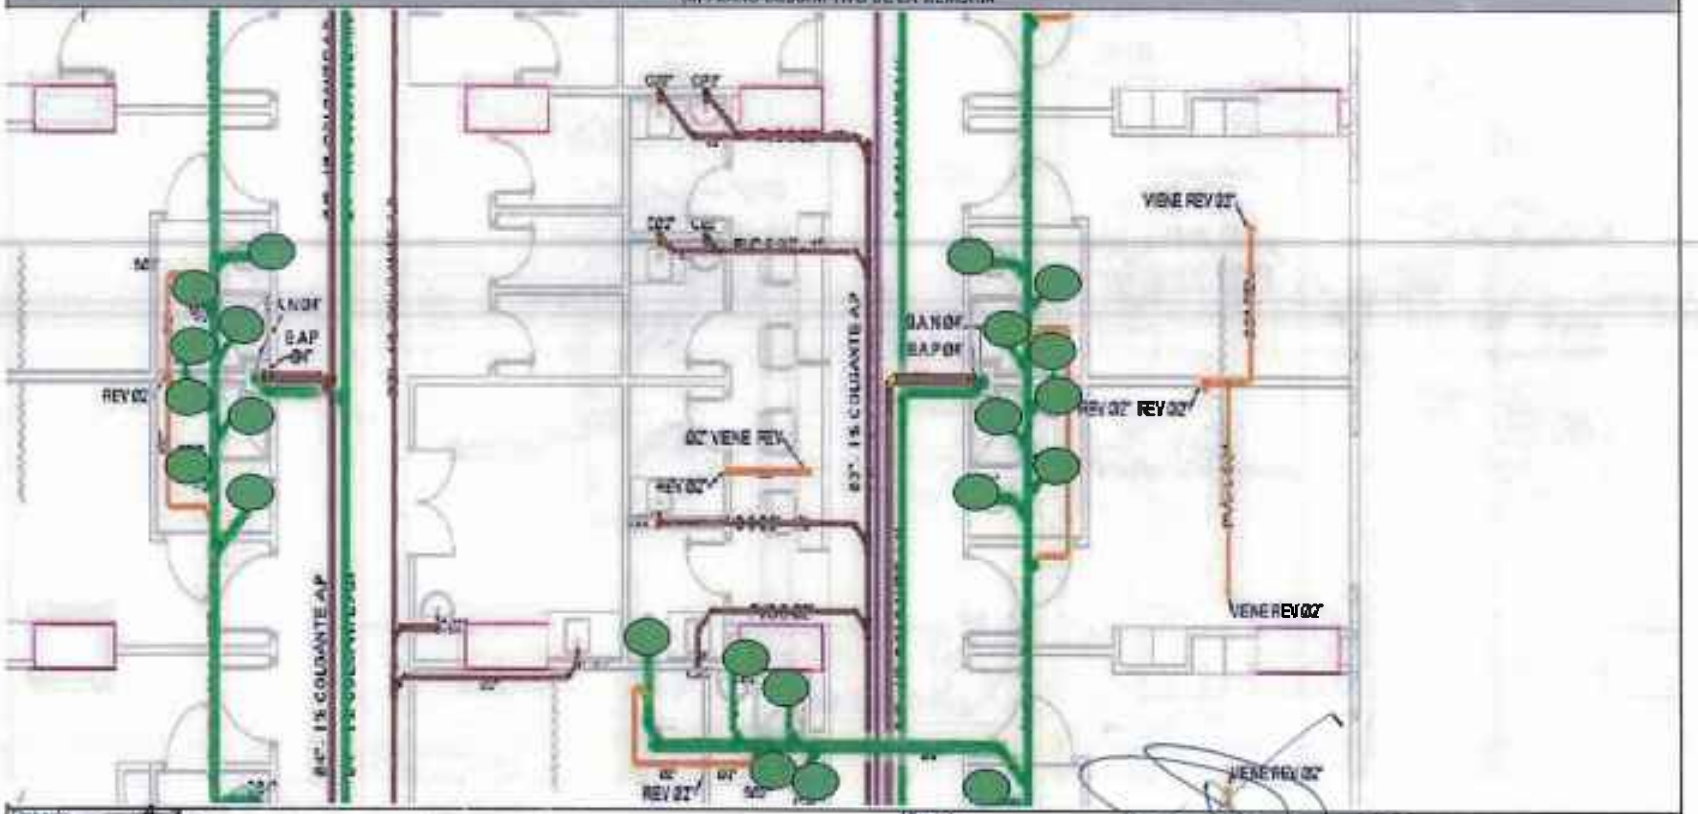
VIENE REV 02"
REV 02"
VIENE REV
REV 02"
REV 02"
REV 02"

SAN VICENTE DINOFELTO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión no. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(4) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

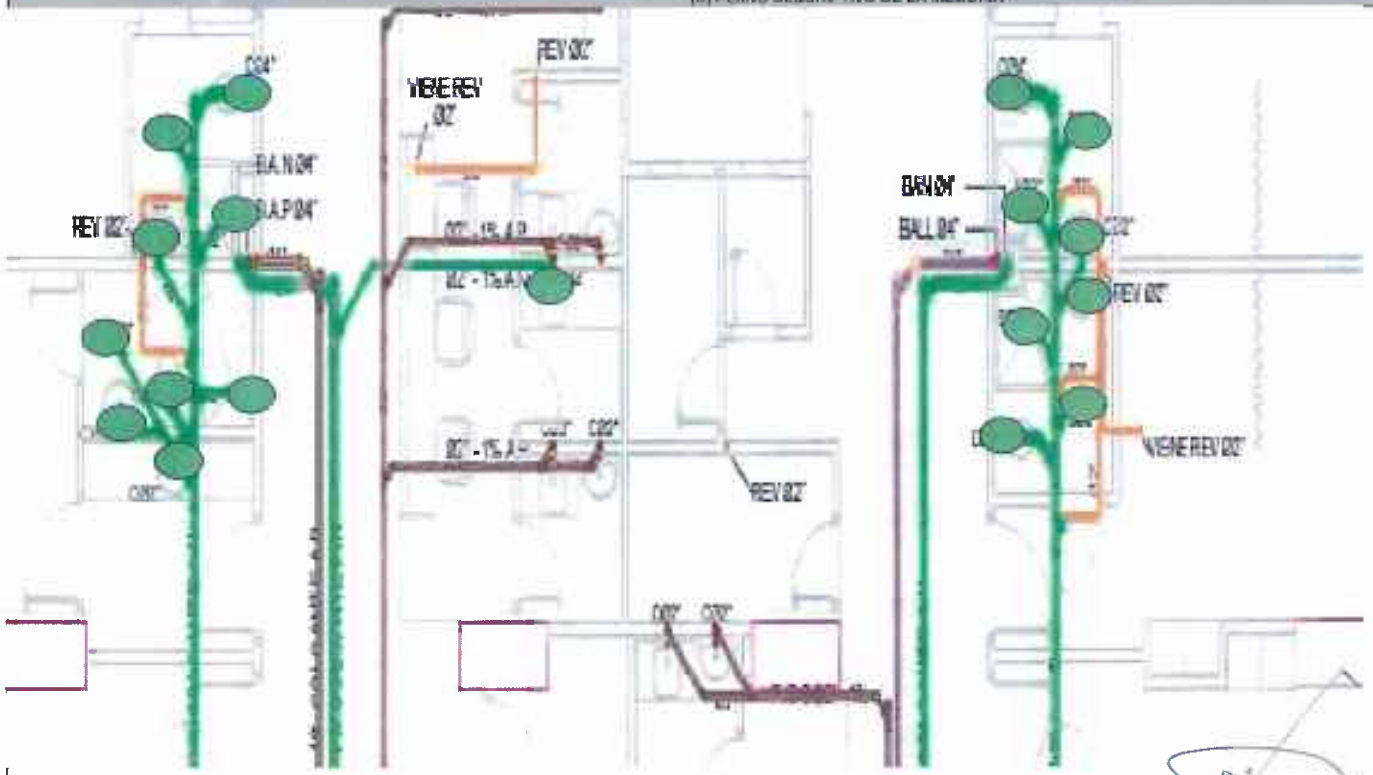

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE UNIPROCO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 1		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 2-3 Y EJE A-F					57,00	57,00
					21,00	21,00
SUB TOTAL						78,00
VIENE						109,00
PASAN						187,00

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

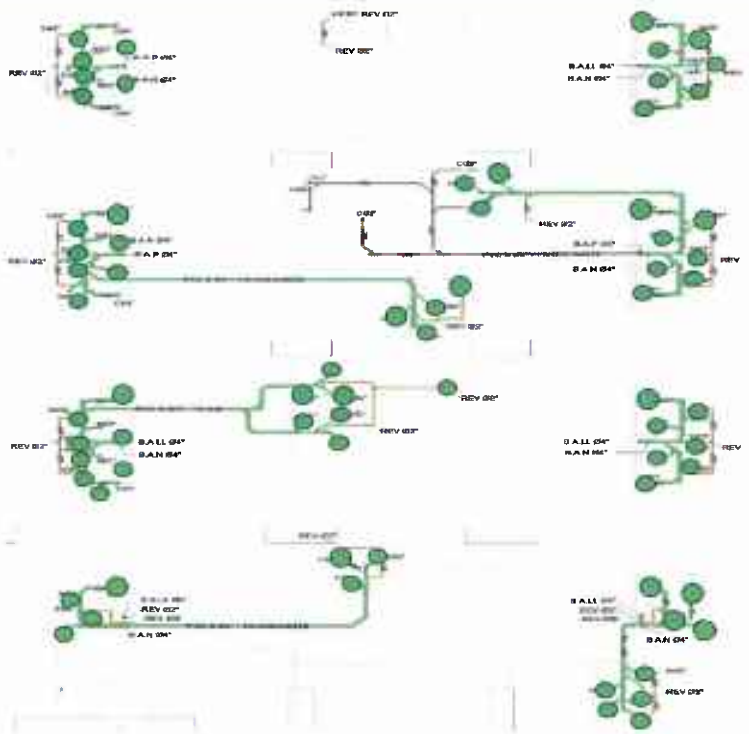

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
	QUINTO PISO						
	ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					33,00	33,00
						12,00	12,00
	SUB TOTAL						45,00
	VIENE						187,50
	PASAN						232,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

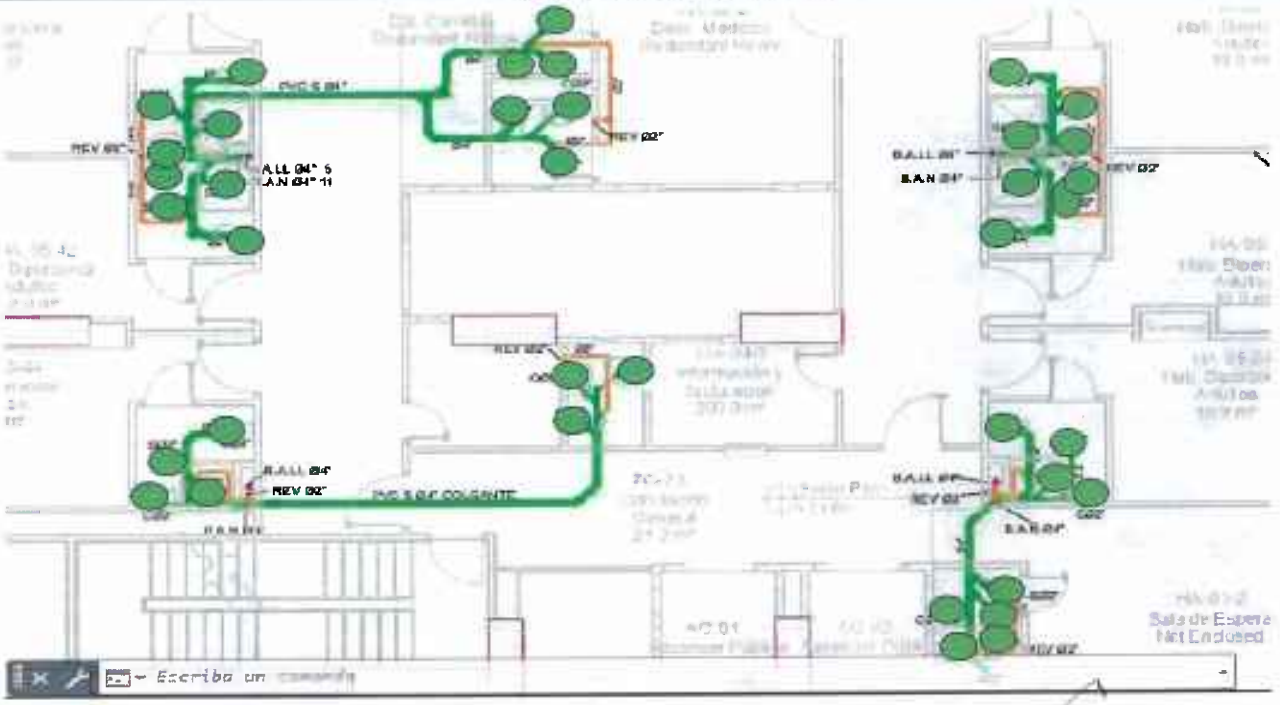

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) m	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EL EJE 6-10 Y EJE A-F					19,00	19,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-39			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	E	A	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

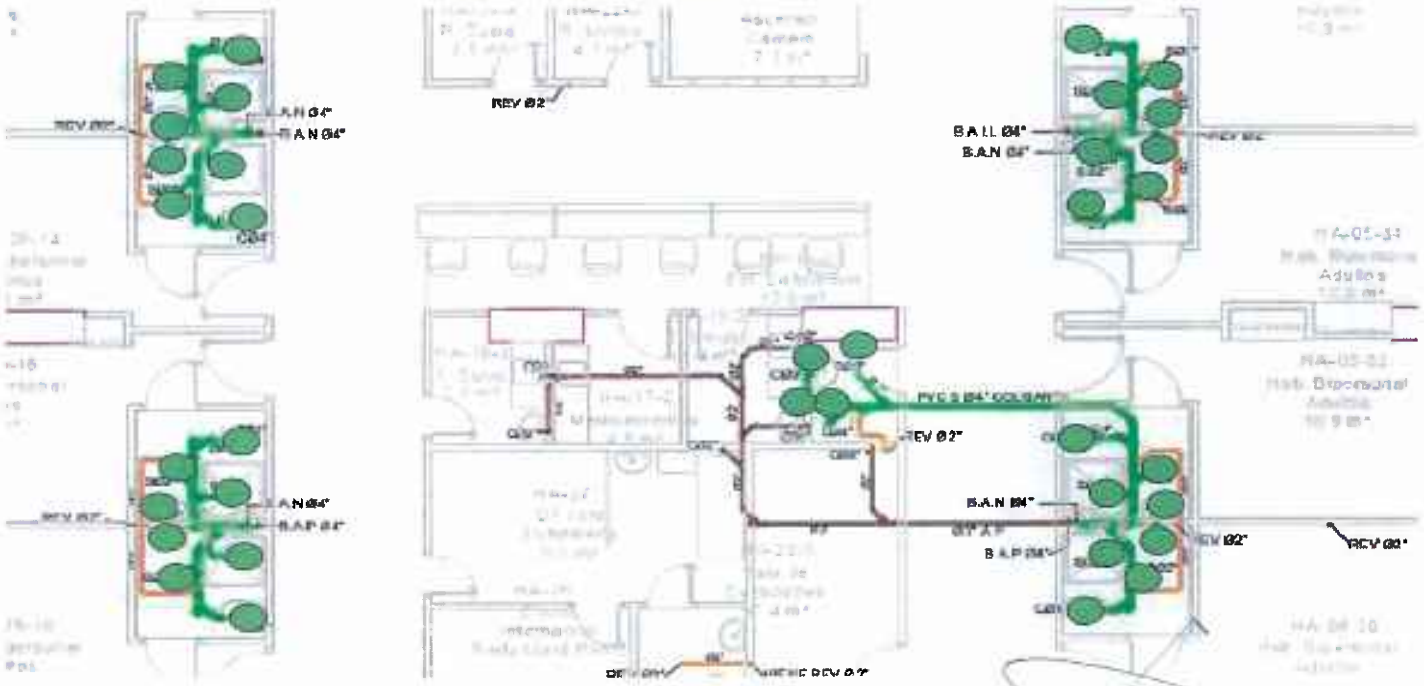

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cardo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

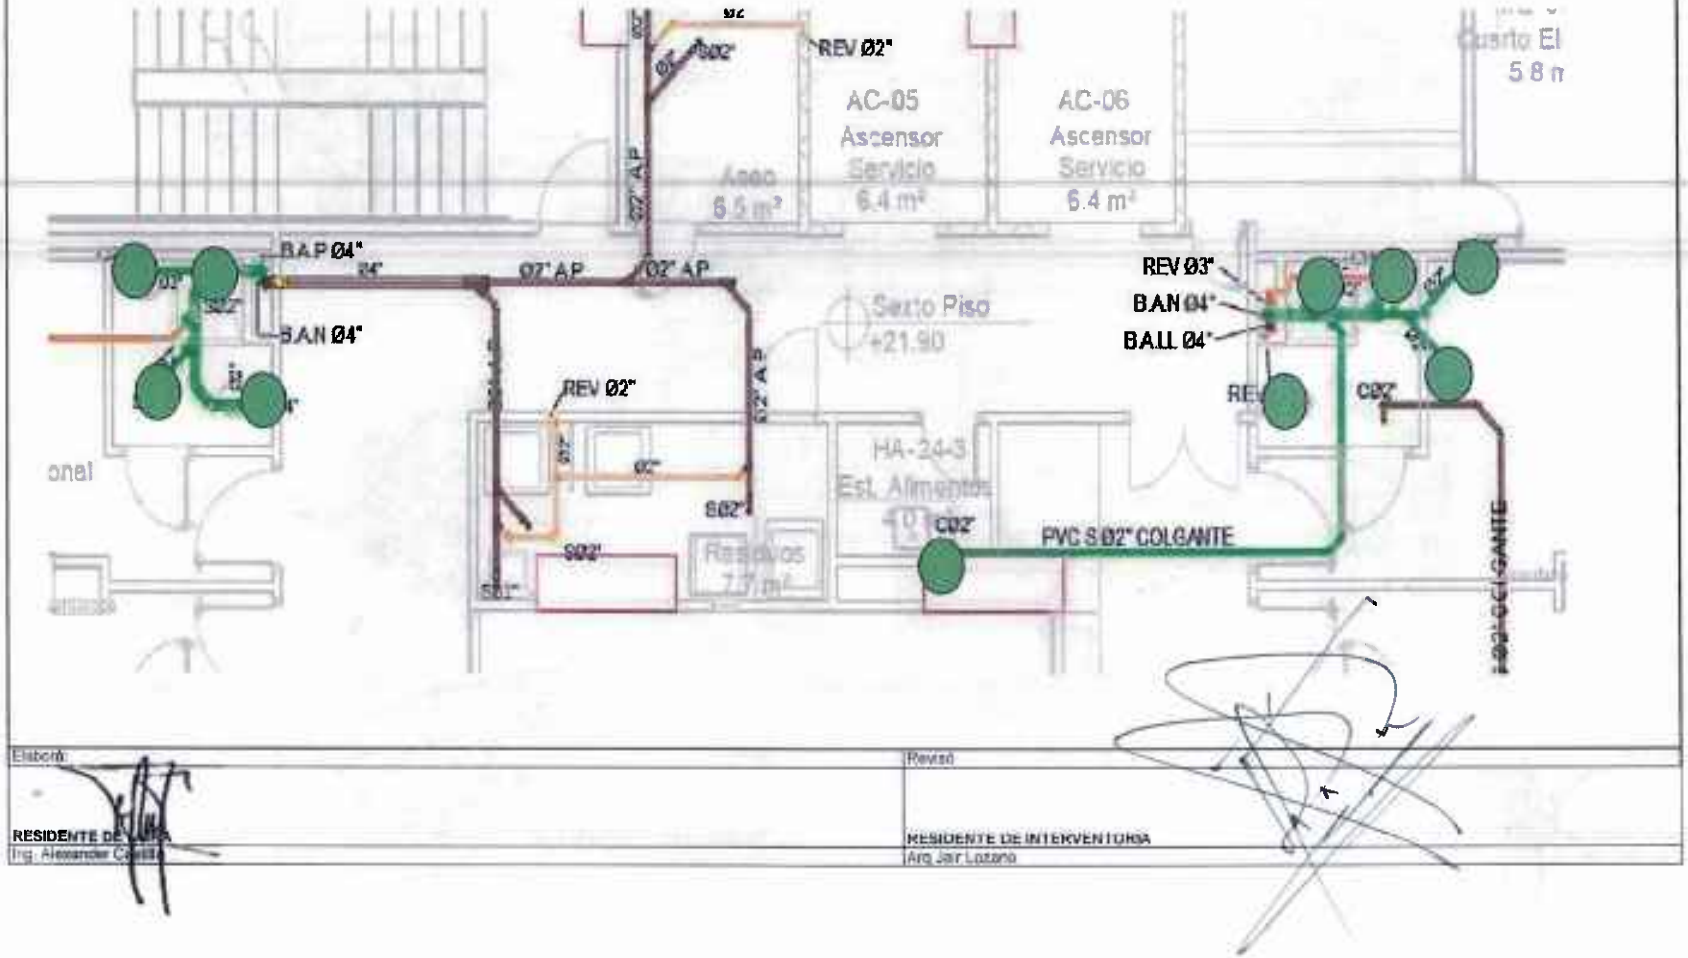

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castilla	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.5	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

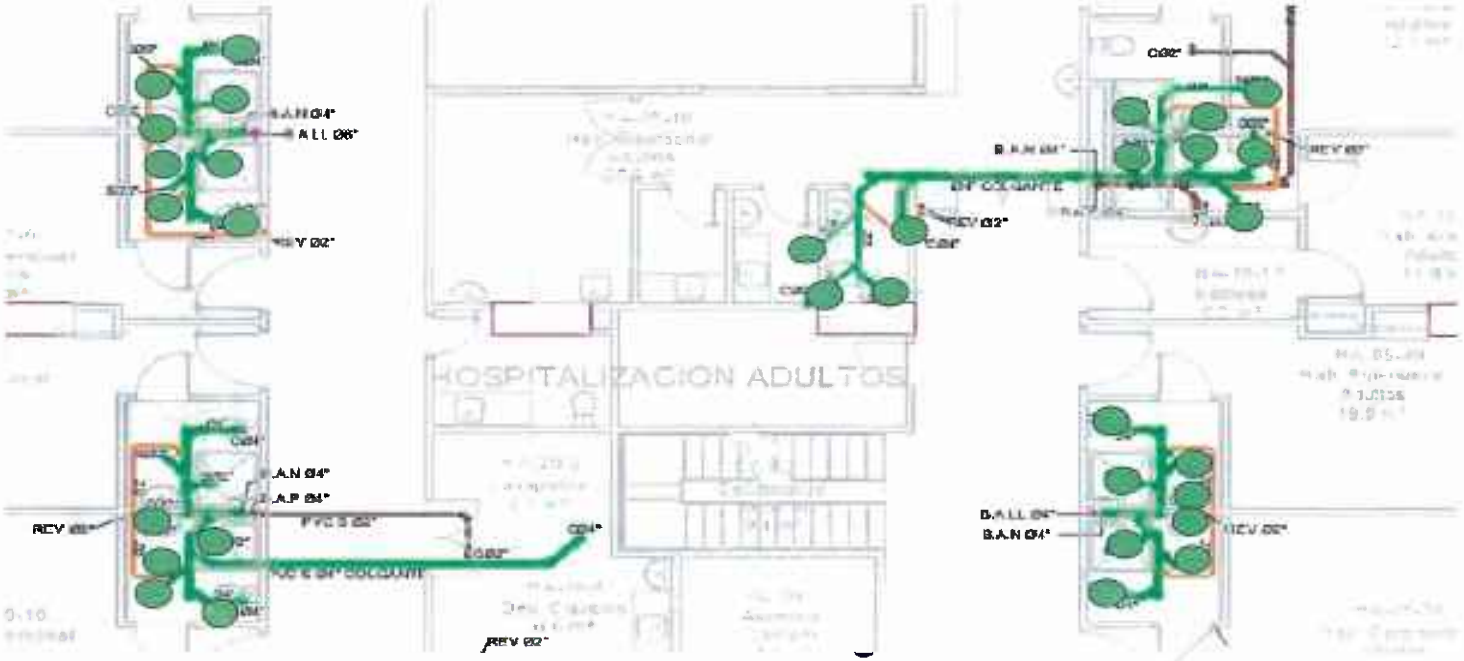

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castilla	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 2	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.7	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø4" con maquina sacanucleos			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kgms)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 3-5 Y EJE A-F					2,00	2,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.7	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø4" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(4) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

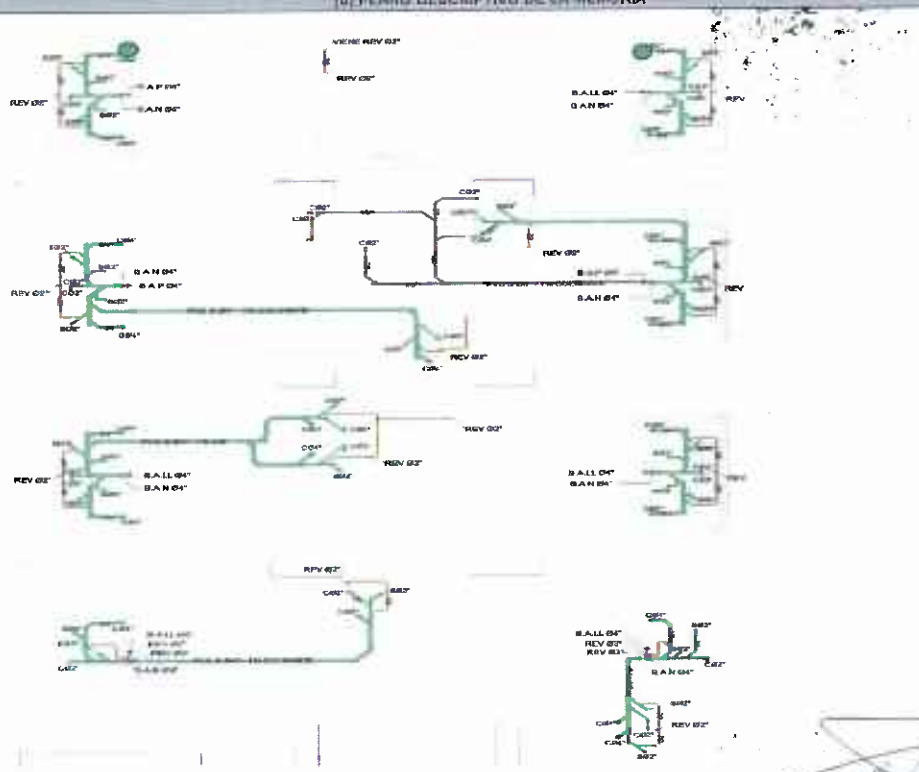

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO ENTRE EJE 2-8 Y EJE A-F					54,00	54,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

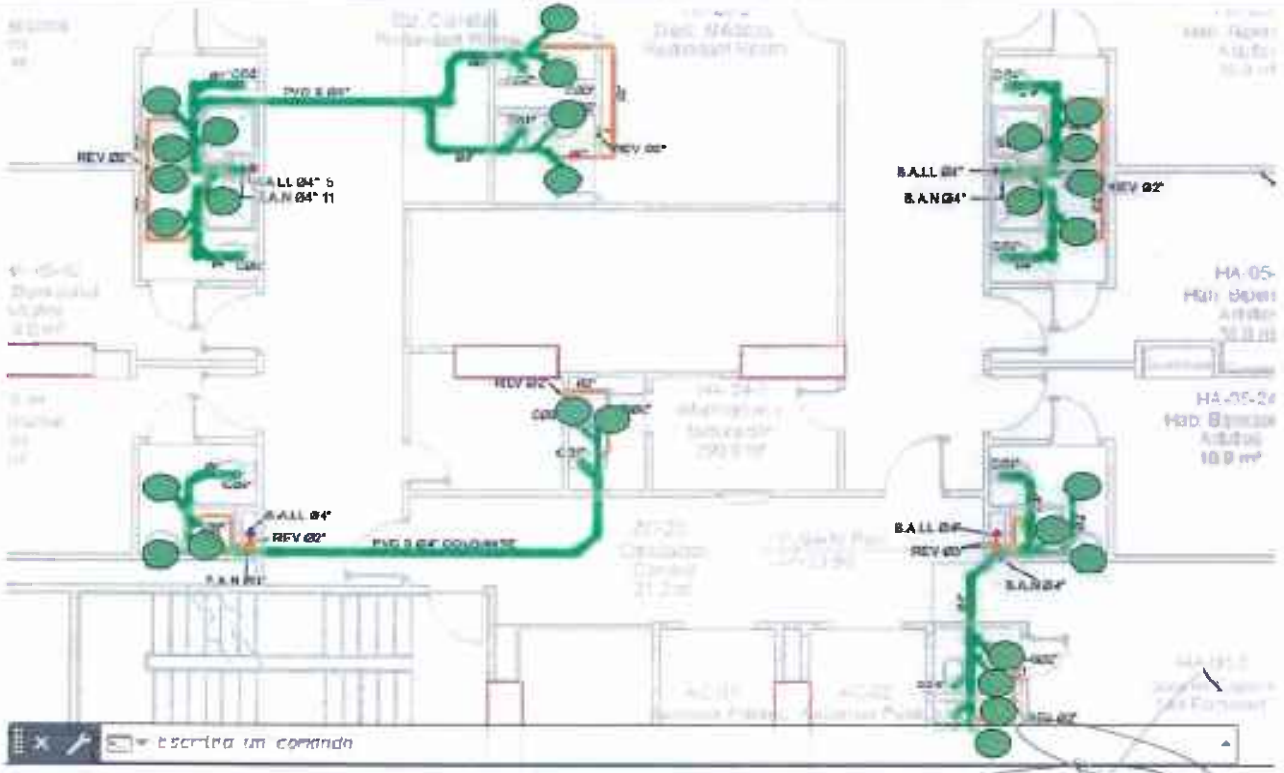

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-39			
		Version No. 08	Pagina 1 de 1		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EL EJE 6-10 Y EJE A-F					33,00	33,00
				SUB-TOTAL		33,00
				VIENE		54,00
				TOTAL		87,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lizarazo

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

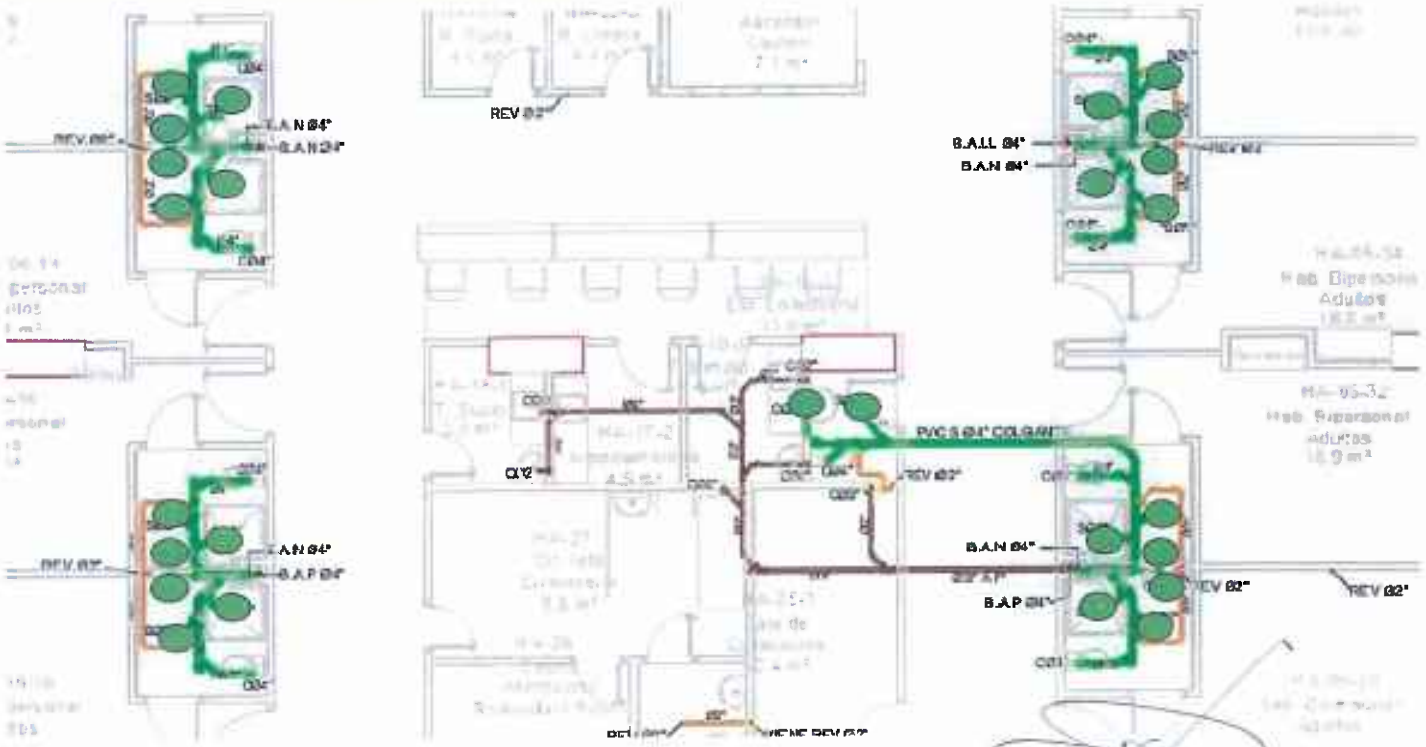

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(II) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

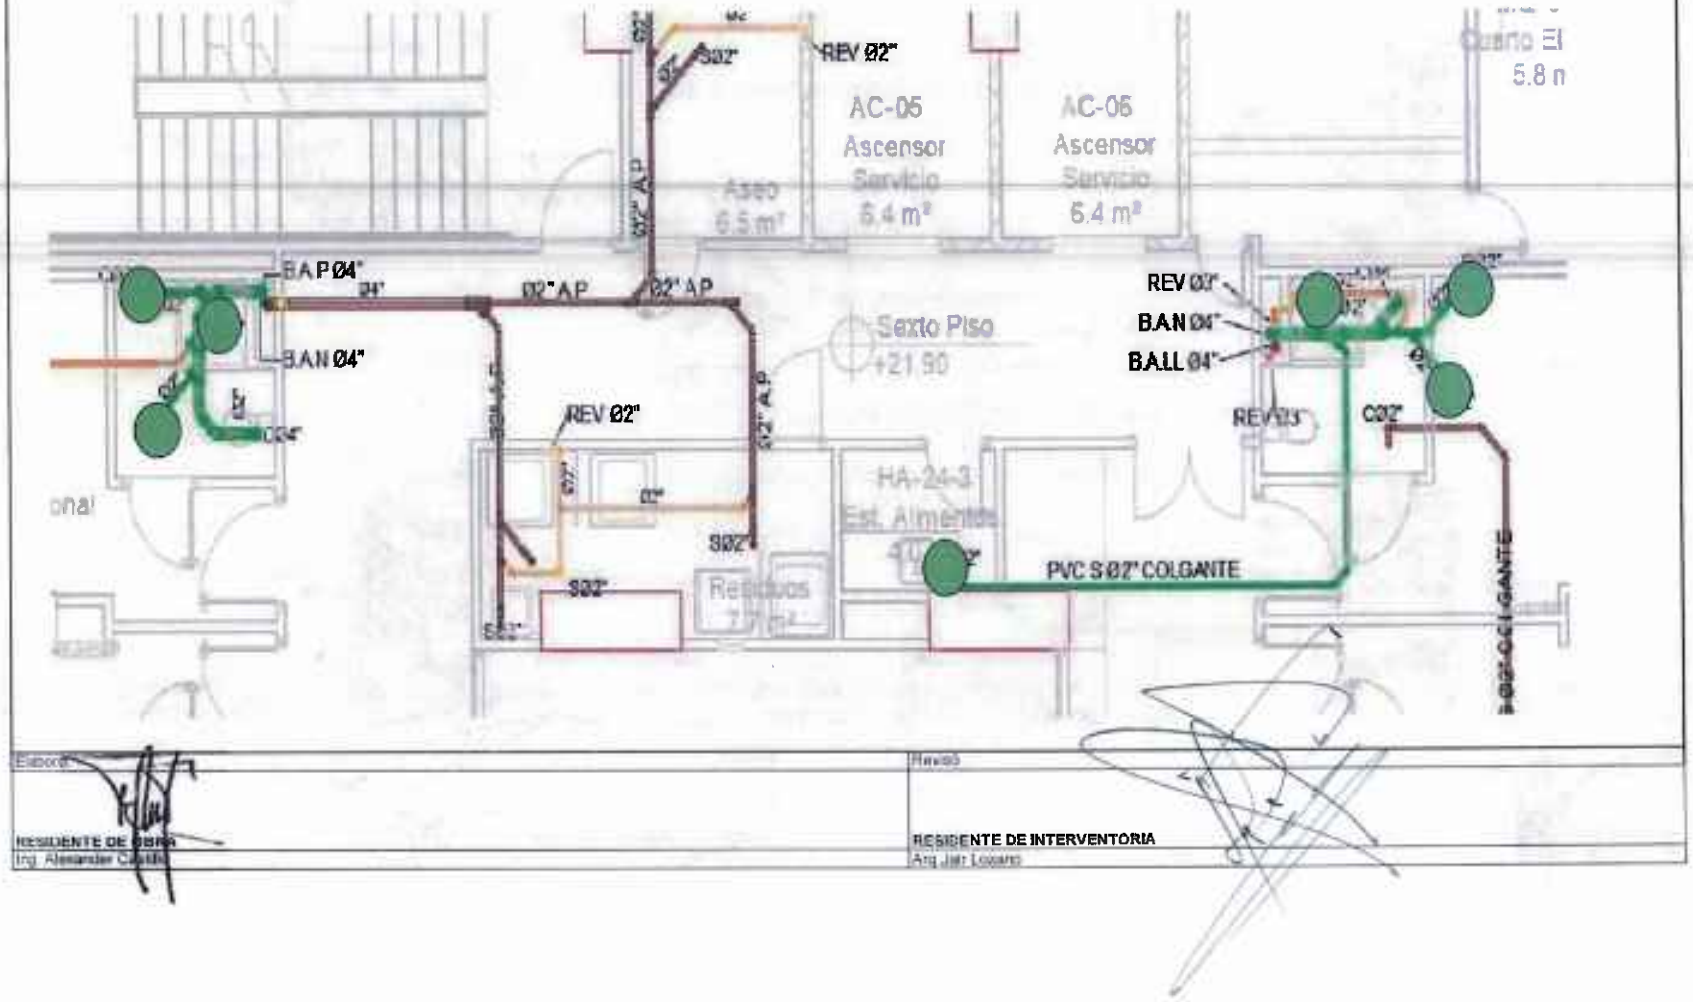

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	6	4	2024

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.12.8	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

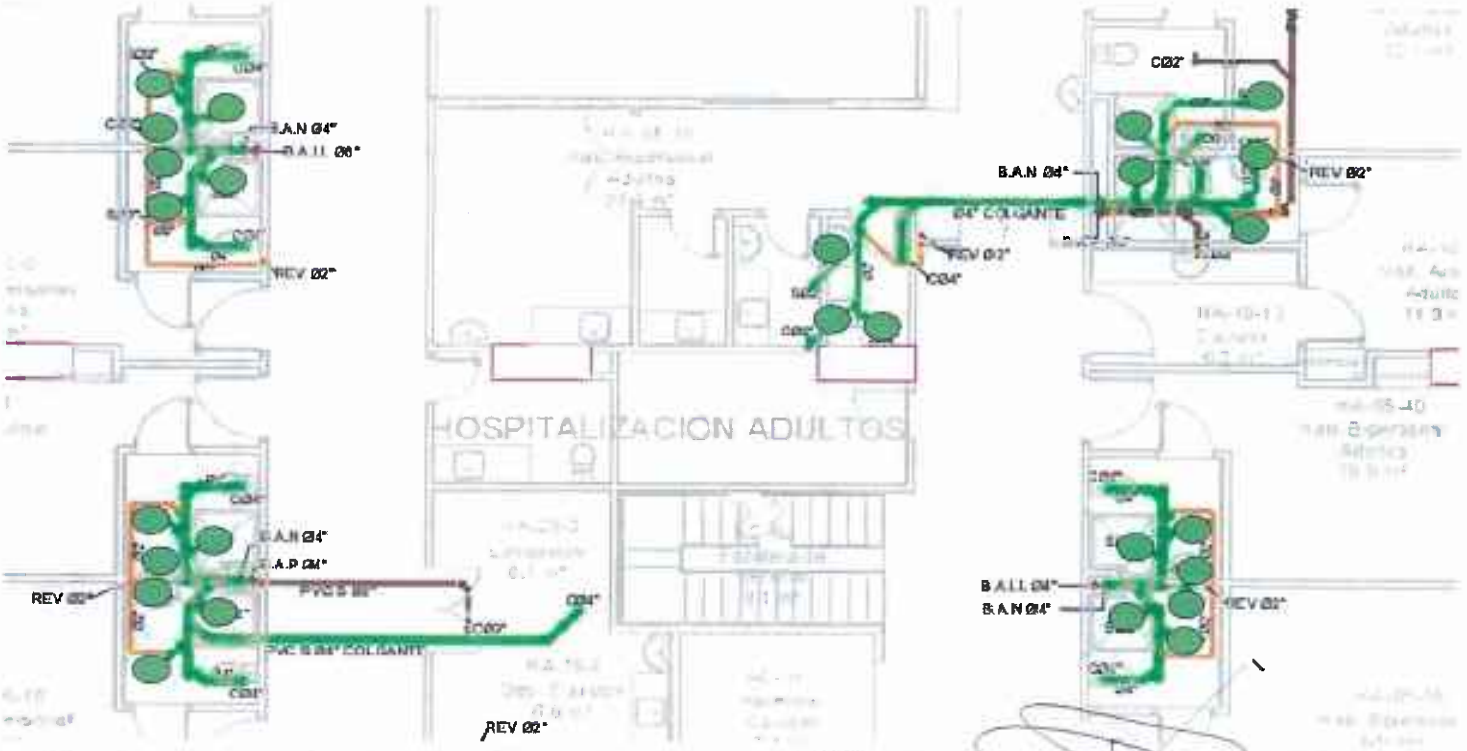

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Luciano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 3-6 EJE AF					15,00	15,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 1	
		Fecha	1	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

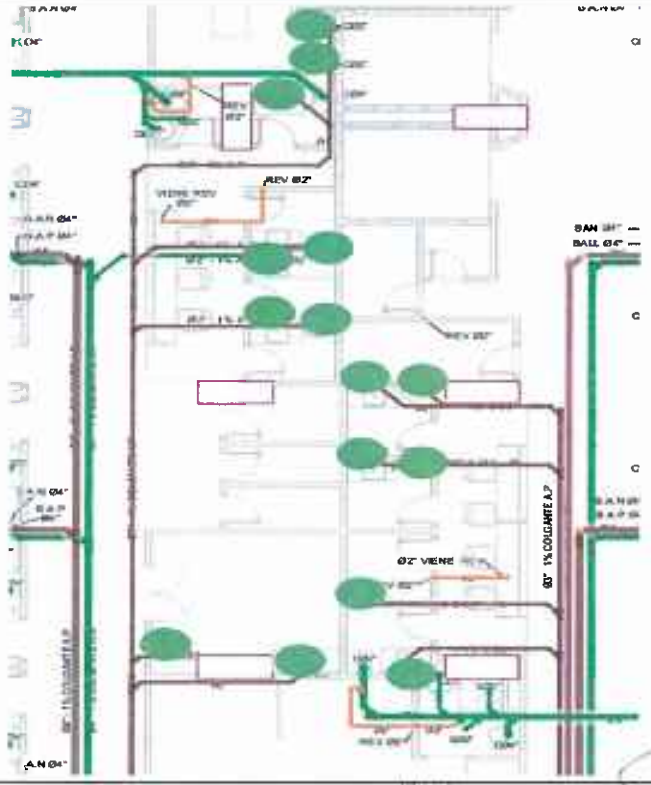

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2021

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
ITEM Nº:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF					8,00	8,00
				SUB TOTAL		8,00
				VIENE		15,00
				PASAN		23,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

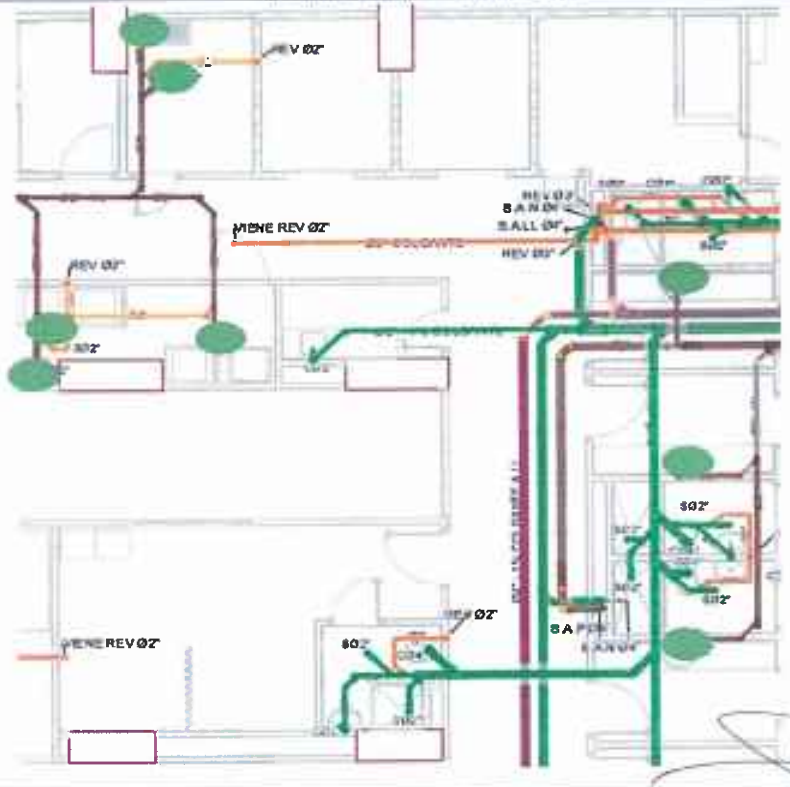

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					6.00	6.00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSROCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

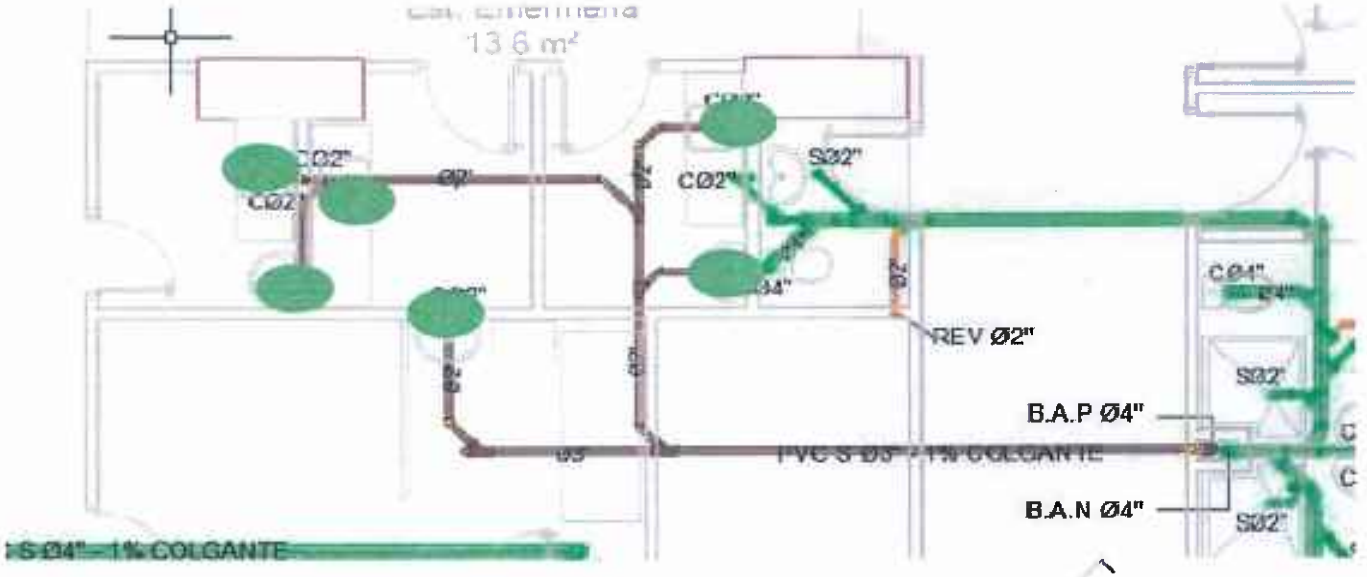

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					15,00	15,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

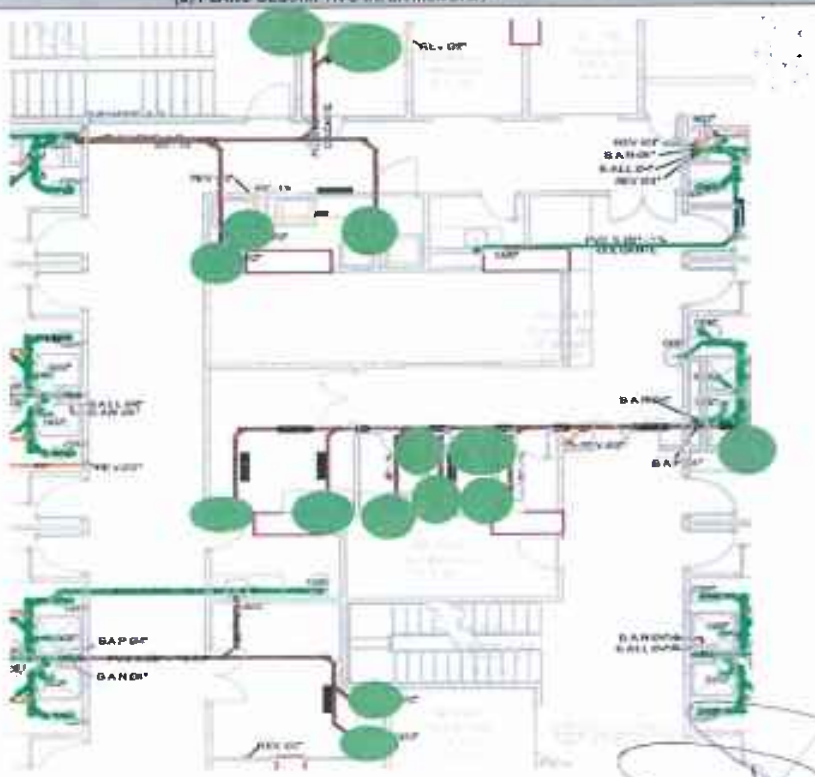

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo. PA-FO-30			
		Version No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	0	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					3,00	3,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.2	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

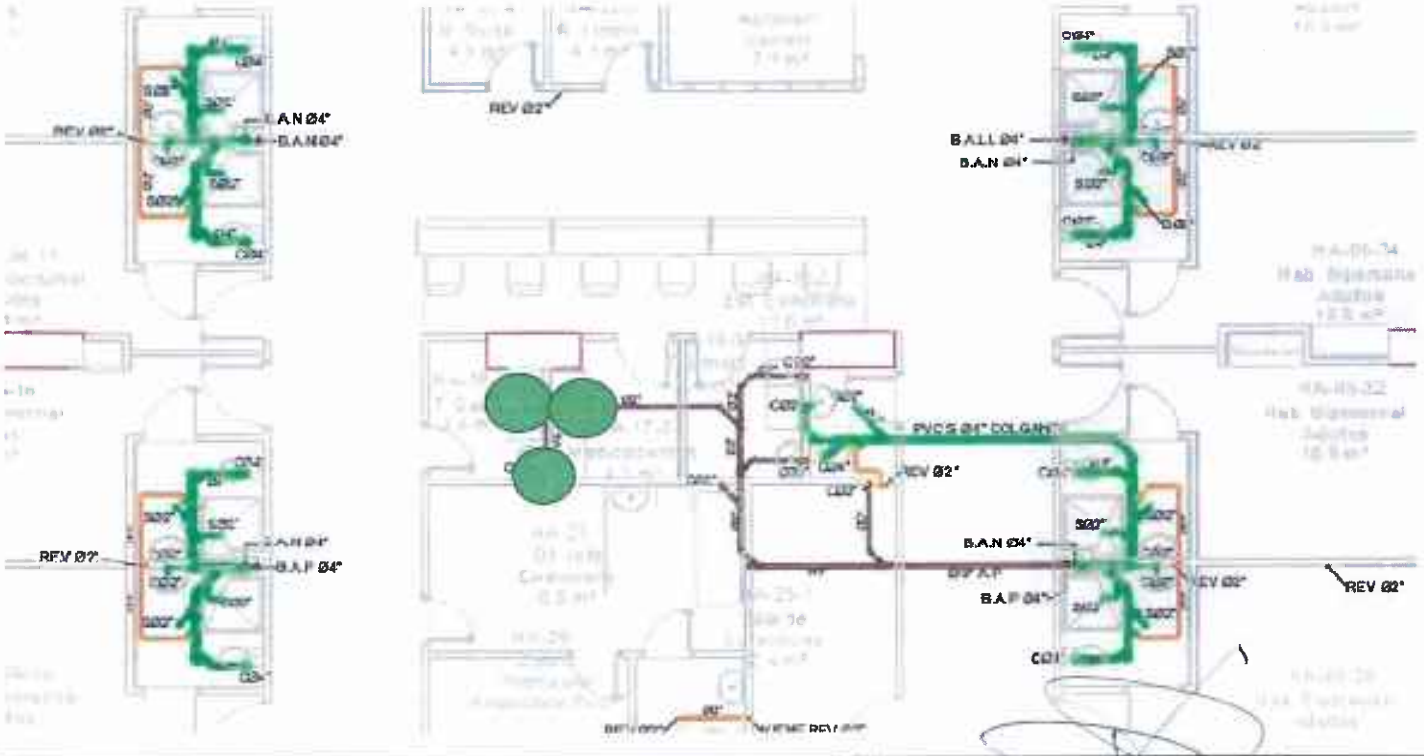

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	0	4	2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					15,00	15,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión: 06	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(V) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

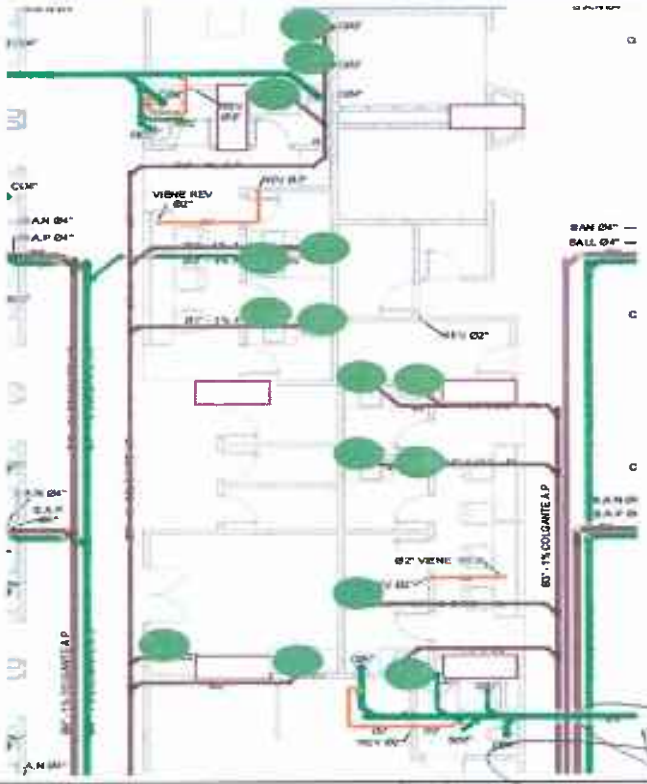

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
	CUARTO PISO						
	ENTRE EJE 5-10 EJE AF					8	8,00
	SUB TOTAL						8,00
	VIENE						15,00
	PASAN						23,00

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

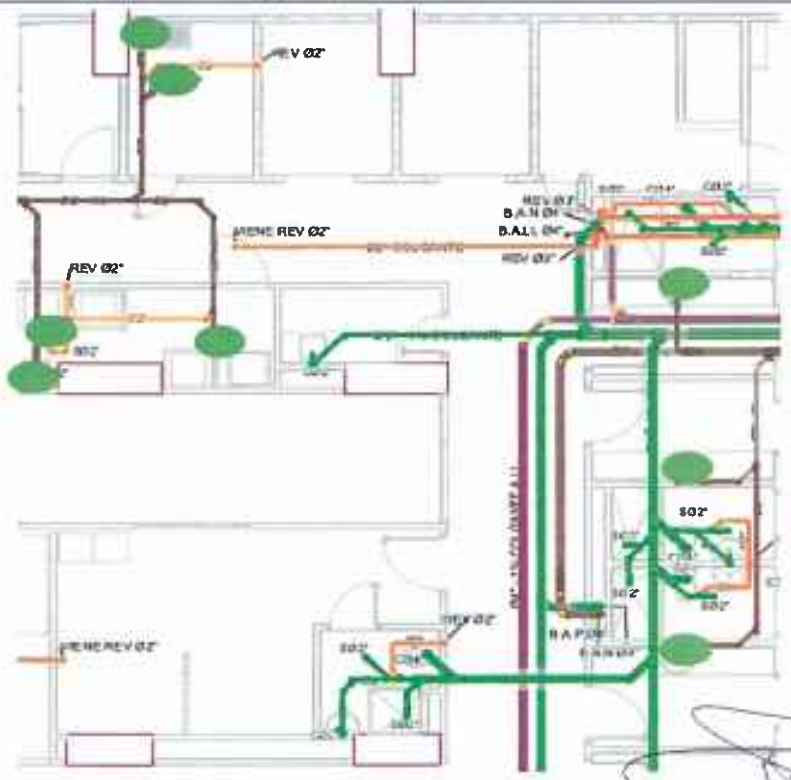
REV Ø2"
VIENE REV Ø2"
REV Ø2"
B.A.N Ø2"
B.A.L Ø2"
REV Ø2"
Ø2"
Ø2"

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Salidas Sanitarias PVC-S Ø2"		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (K)/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					6,00	6,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo PA-FO-30			
		Edición No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSROCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

III PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

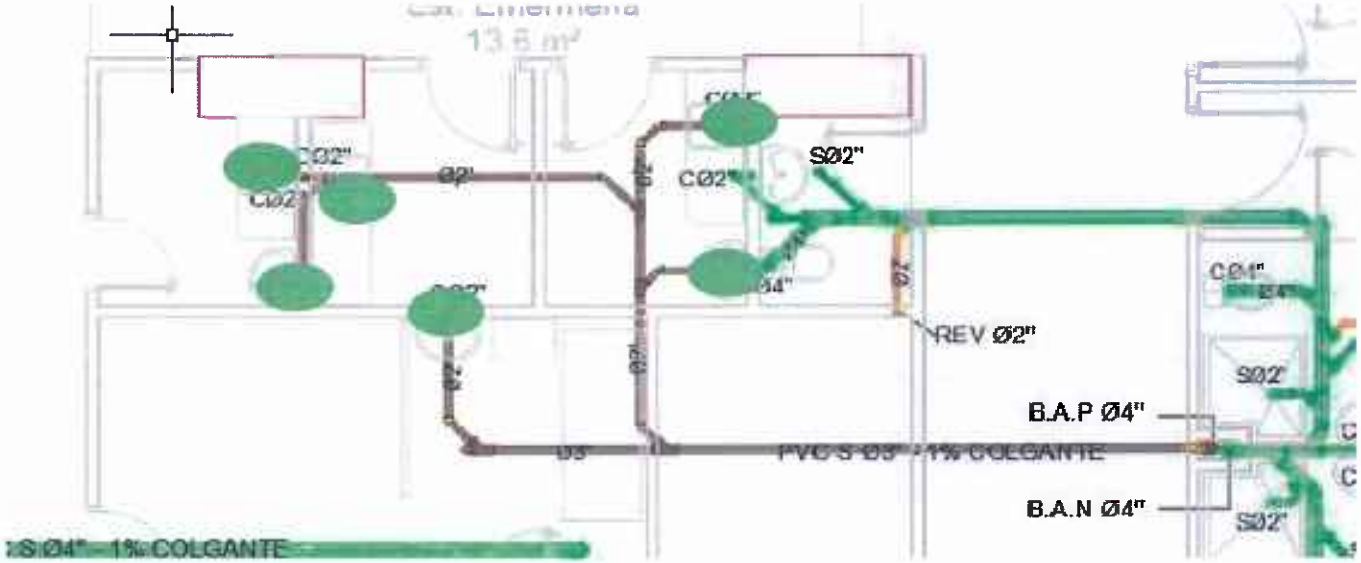

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
QUINTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 AF					15,00	15,00
SUB TOTAL 1						15,00
VIENE						29,00
PASAN						44,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	**26.13.3**	**DESCRIPCION ITEM**	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

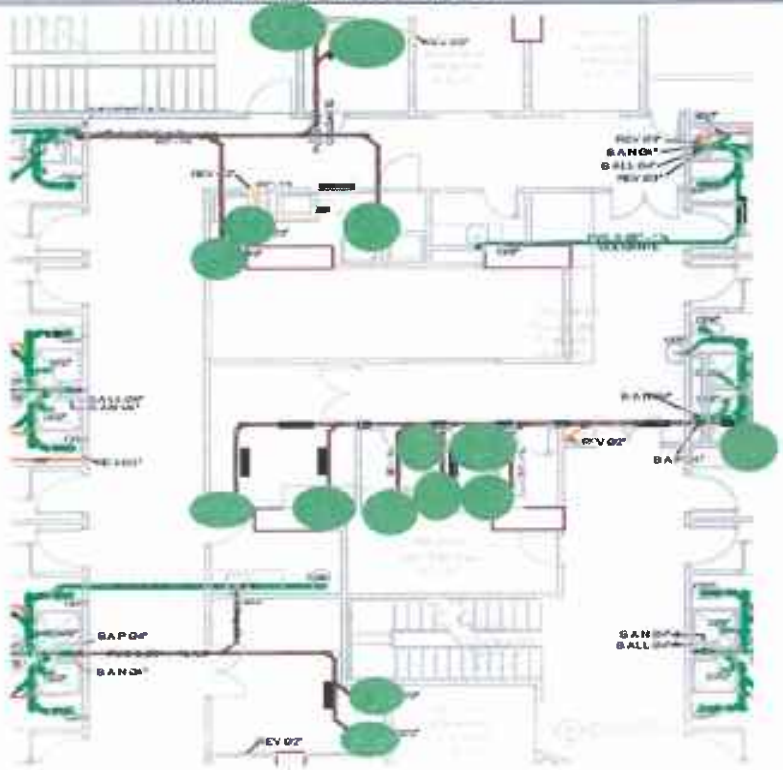

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					6,00	6,00
SUB TOTAL						6,00
VIENE						44,00
PASAN						50,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

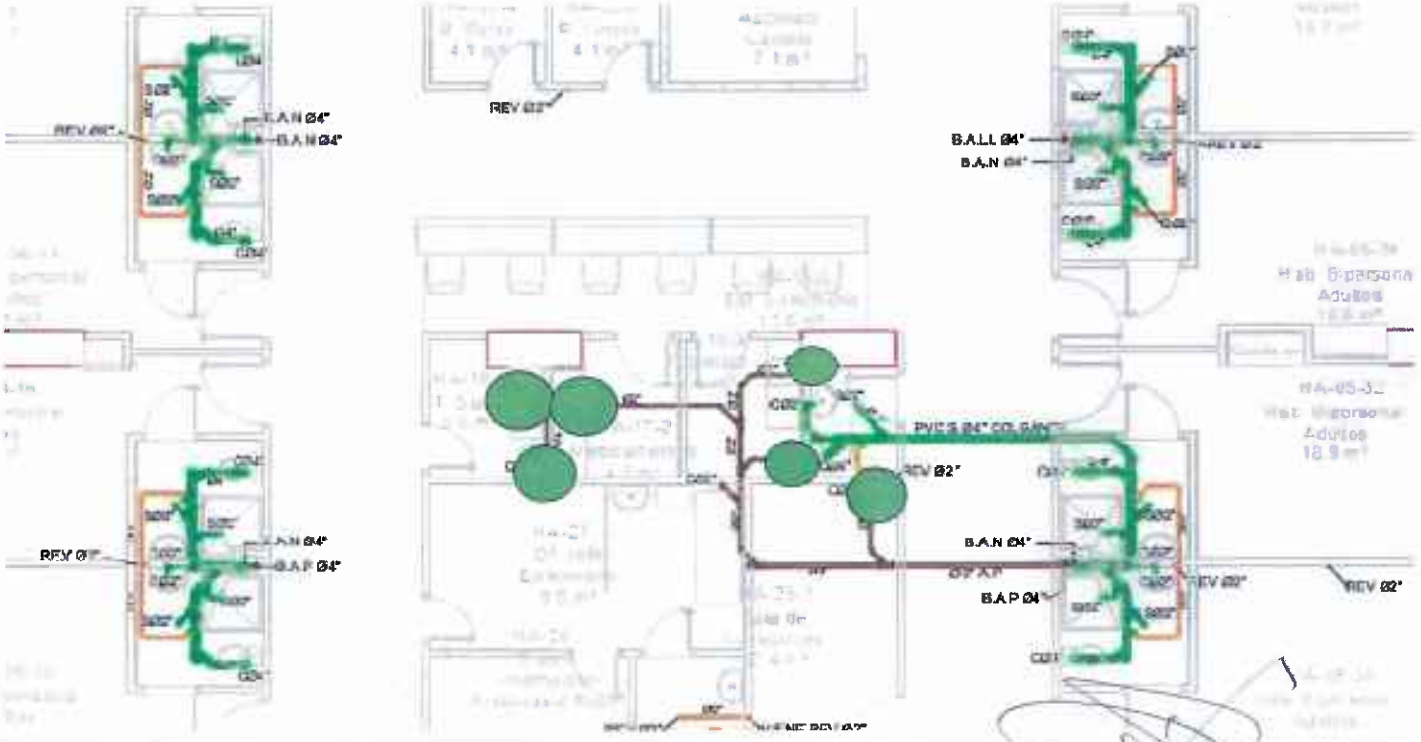

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UNO

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(n) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEXTO PISO						
ENTRE EL EJE 5-10 Y EJE A-F					9,00	9,00
SUB TOTAL						9,00
VIGAS						50,00
TOTAL						59,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2027

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

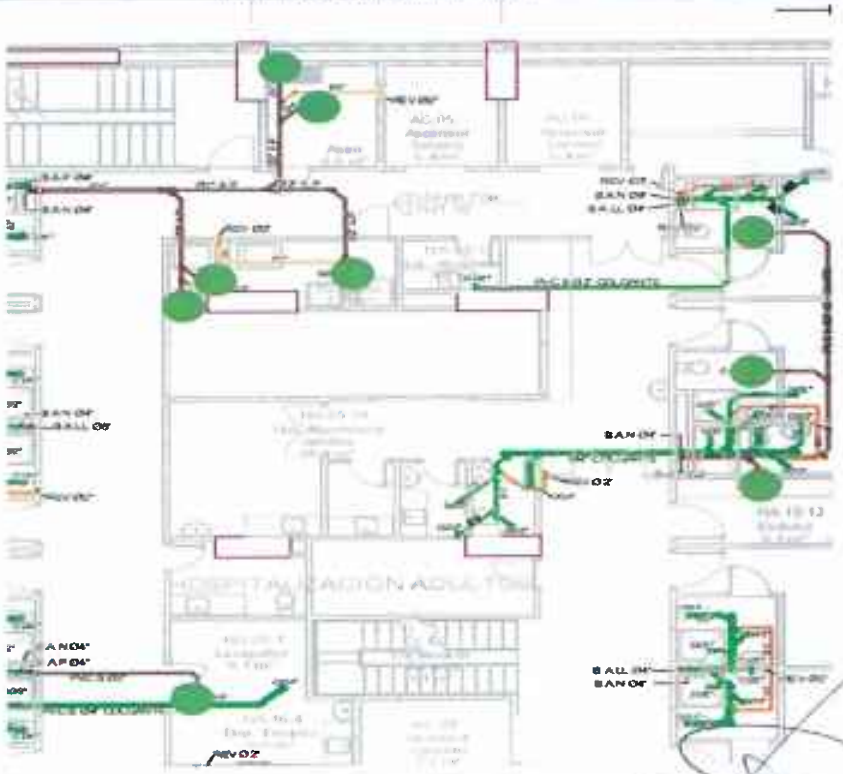

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
ITEM N°:	26.13.6	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-3 EJE AF					15,00	15,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	E	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.3	DESCRIPCION ITEM	Tapones de prueba Ø3" y Ø2"			UND:	UND

10) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

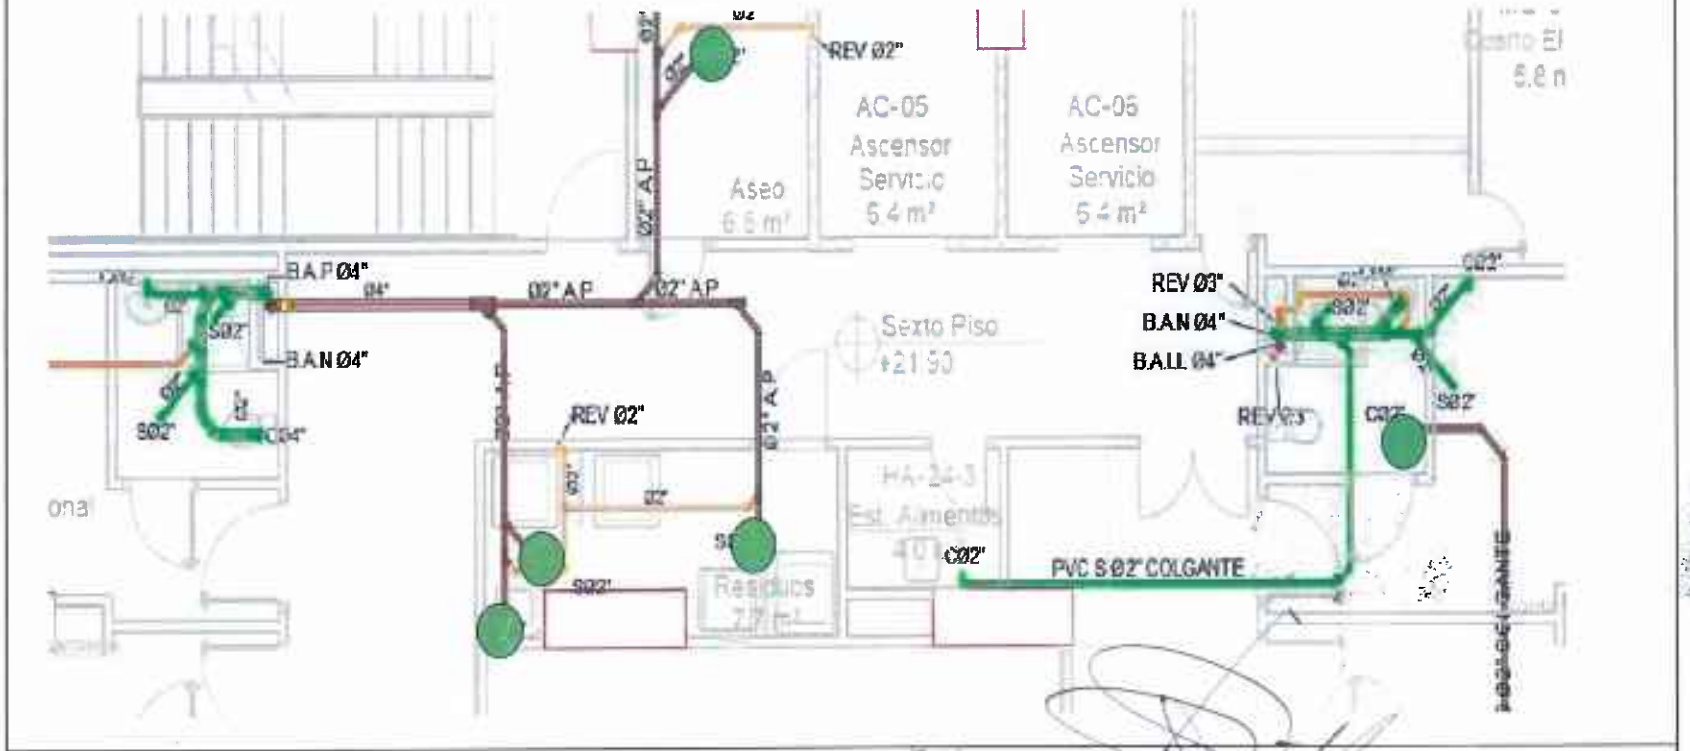

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Iber Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA:	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.6	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kgms)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF					5,00	5,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FD-30				
		Versión No: 08		Página 1 de 1		
		Fecha:	8	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.6	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(02) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

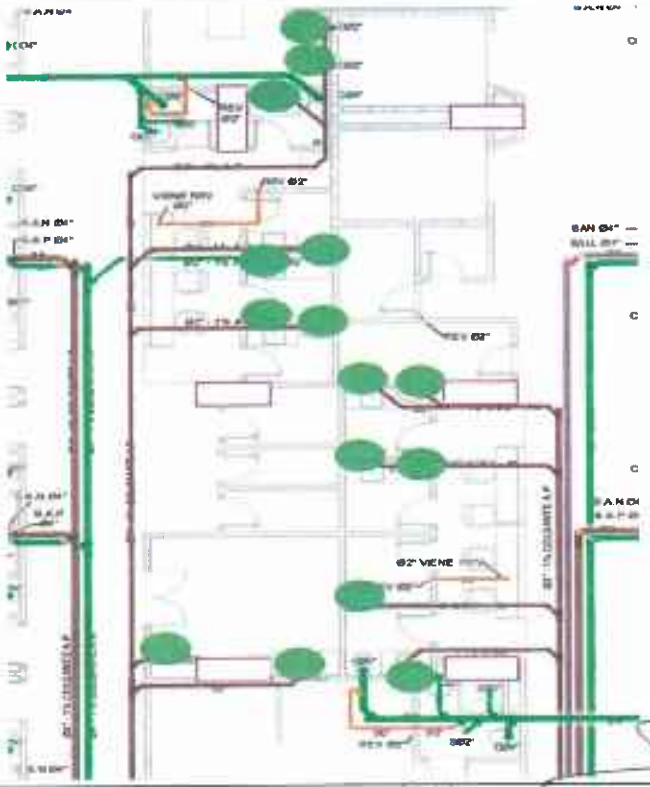

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	8	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.4	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 2 EJE F - BAJANTE		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F BAJANTE		6,00				6,00
			PASAN			12,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.13.6	DESCRIPCION ITEM	Pases por placa Ø2" con maquina sacanucleos			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

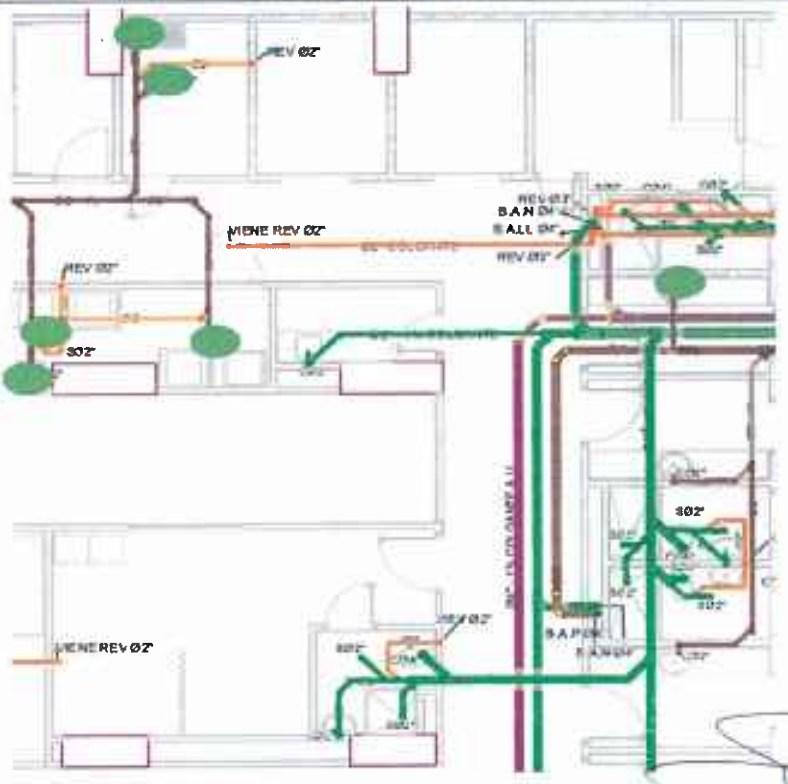

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cassiani

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EL EJE A-F						0,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE F - BAJANTE		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE 9 EJE F - BAJANTE		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE F– BAJANTE		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE 9- EJE 5 - BAJANTE		6,00				6,00
SUBTOTAL						24,00
VIENE						12,00
TOTAL						36,00

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

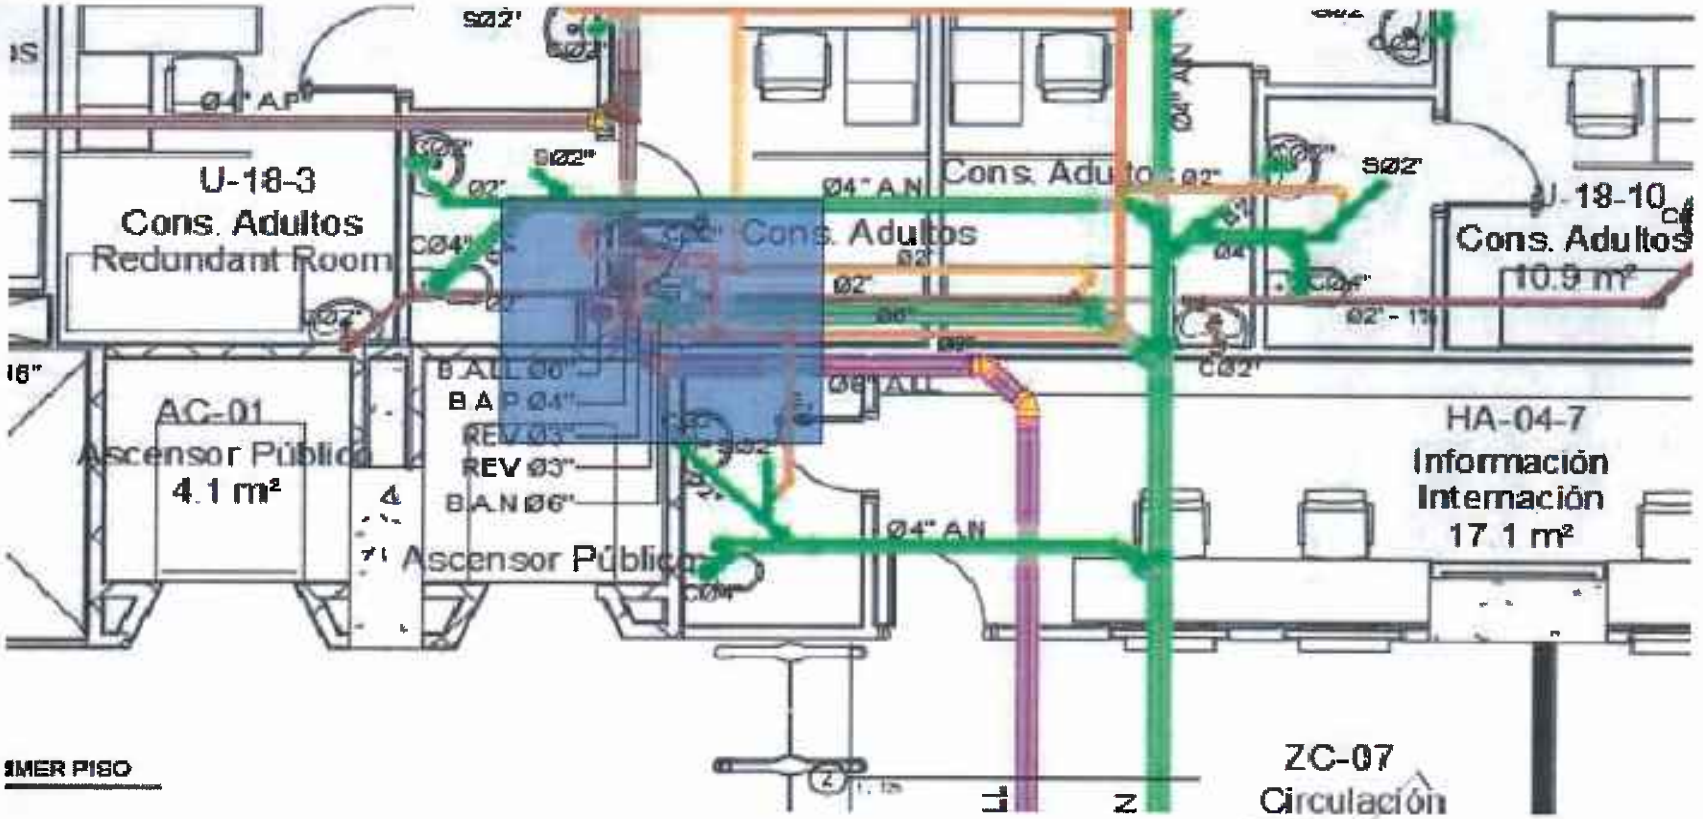

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 08		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE AF		31,40				31,40
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 2 EJE F - BAJANTE		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F BAJANTE		6,00				6,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

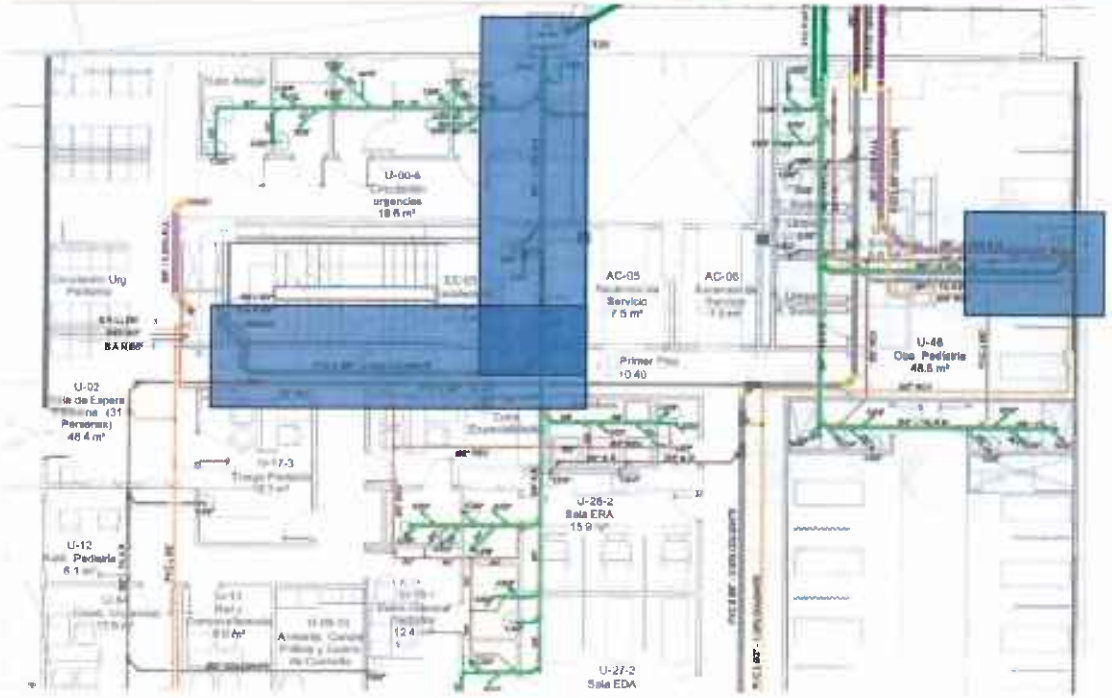

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ETAPA 1 AL 5-10 Y EJE AF		42,50				42,50
SUB TOTAL						42,50
VIENE						43,40
PASAN						85,90

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E,S,E, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

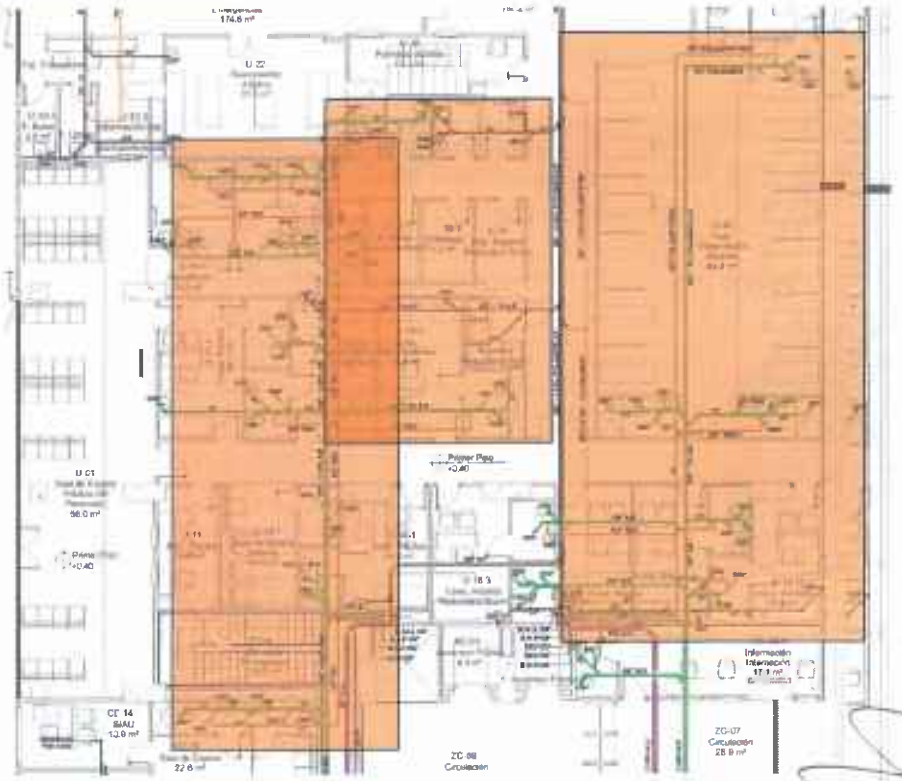

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 5 de 5	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 3-5 EJE AF		81,00				81,00
SUB TOTAL						81,00
VIENE						86,00
PASAN						167,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jhir Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m2)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO ENTRE EJE 5-10 Y EJE AF		35,30				35,30
SUB TOTAL						35,30
VIENE						167,00
PASAN						202,30

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (md)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		42,40				42,40
SUB TOTAL						42,40
VIENE						202,30
PASAN						244,70

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

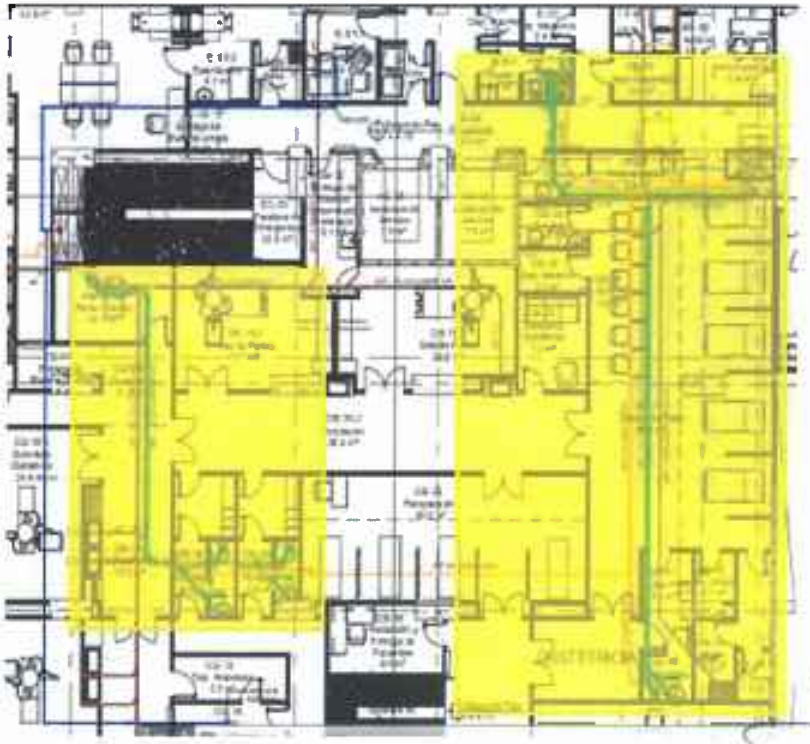

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF		28,30				28,30

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 10	Página 2 de 2		
		Fecha	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 2	
		Fecha	6	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND.	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		91,50				91,50
SUB TOTAL						91,50
VIENE						272,90
PASAN						364,60

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 06		Página 2 de 2	
		Fecha	E	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

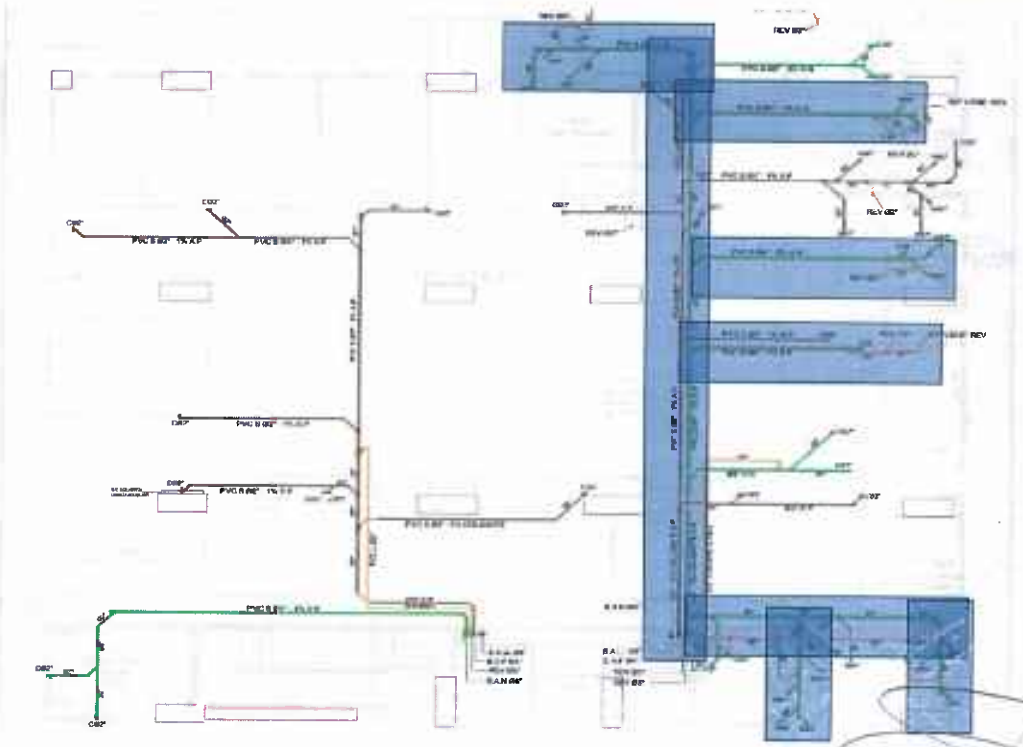

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cano S.

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE S-10 E.JE AF		66,00				66,00
				SUB TOTAL		66,00
				VIENE		364,50
				TOTAL		430,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 2		
		Fecha.	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

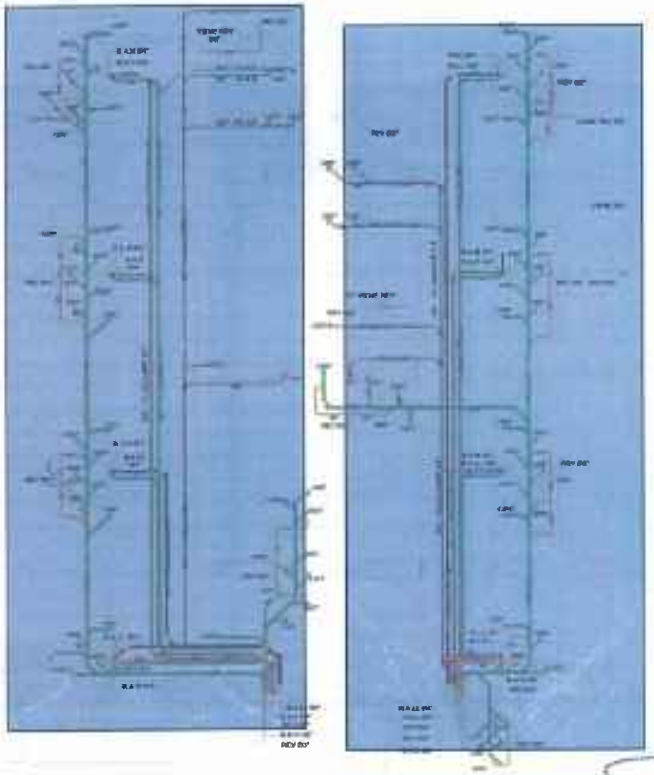

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE UNIVERSIDAD	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2 Y EJE B-D		10,00				10,00
					TOTAL	10,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-10			
		Versión No: 08	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

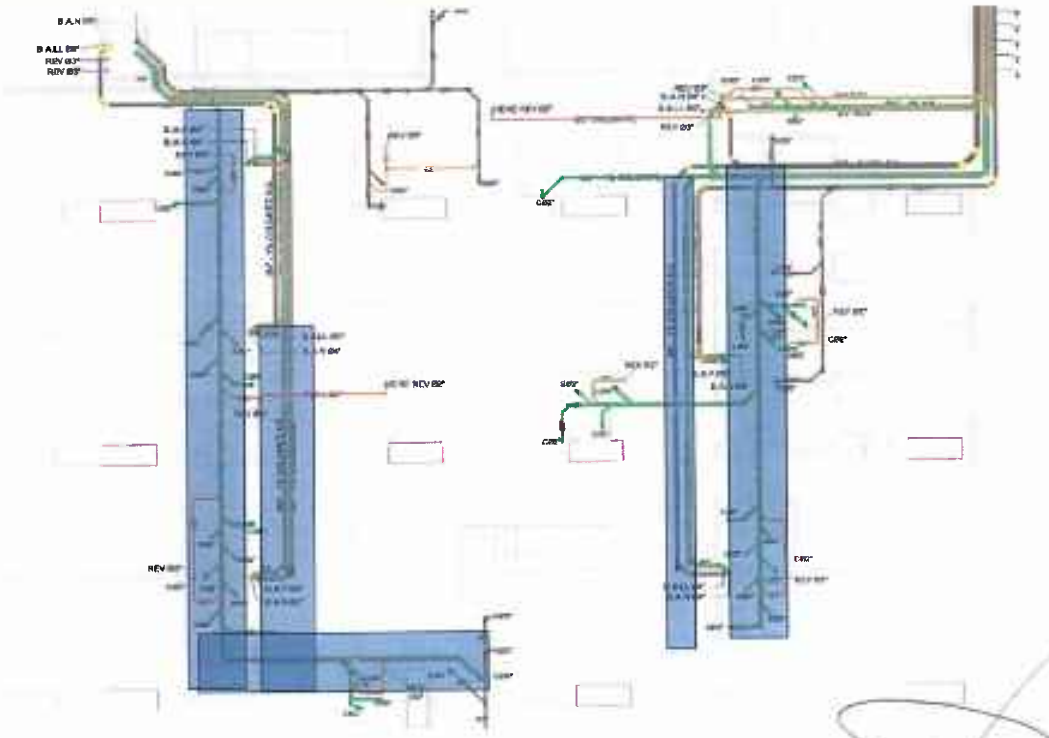

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 3	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		36,00				36,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.15.6**	**DESCRIPCION ITEM**	Tubería PVC sanitaria Ø3"			**UND:**	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

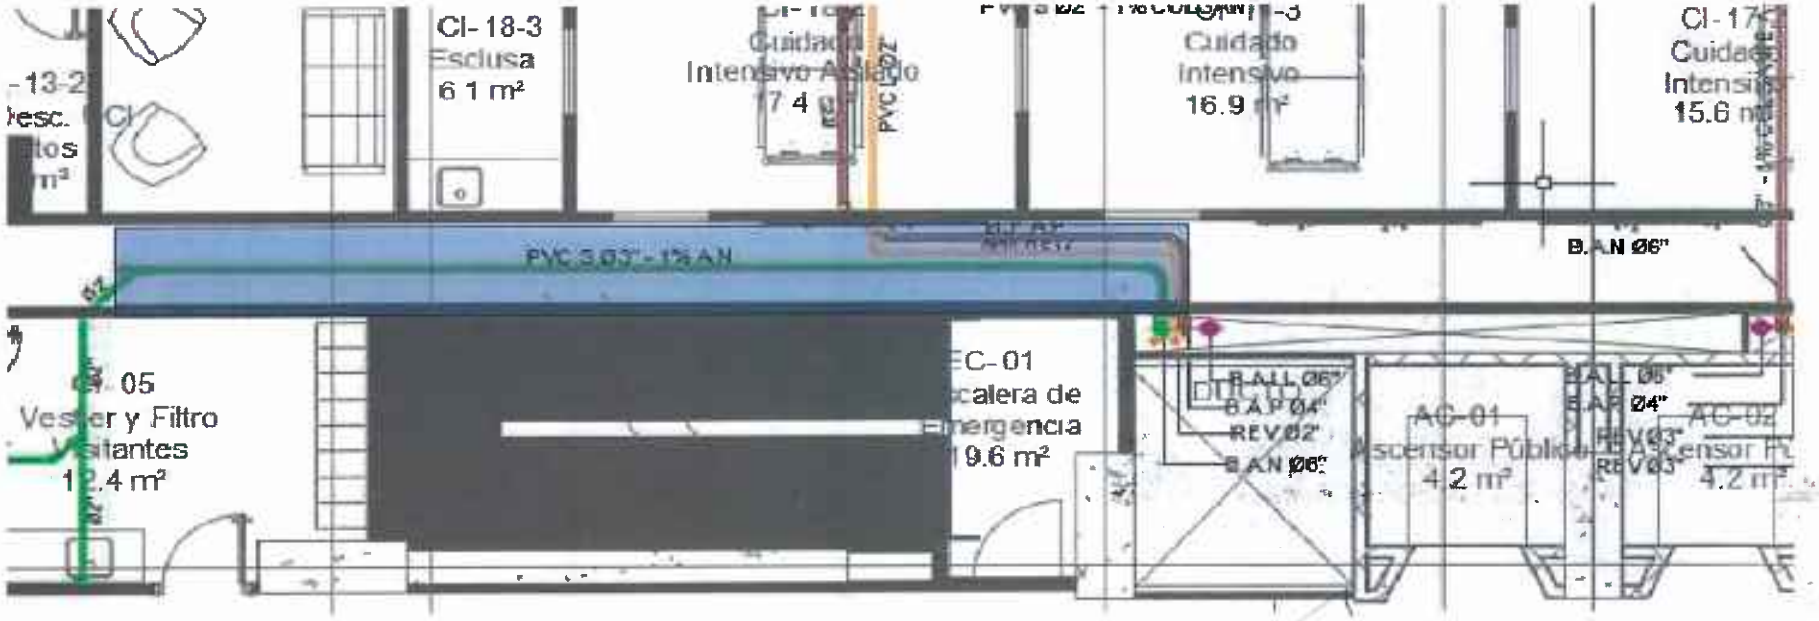

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 3	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF		19,00				19,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

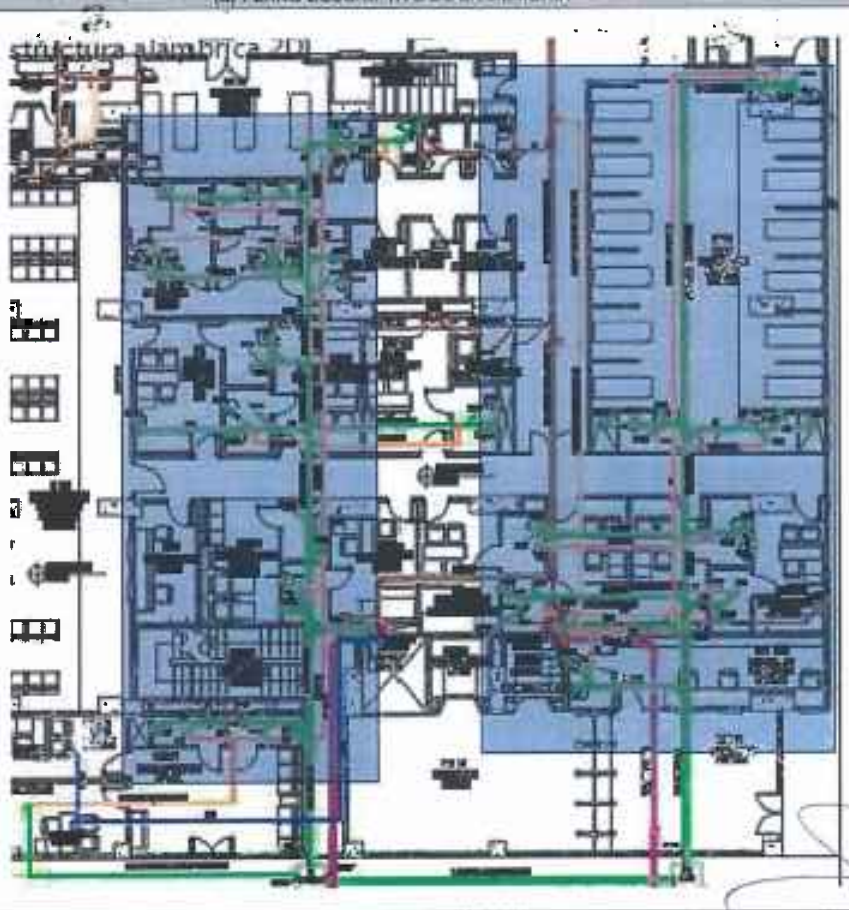

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y AF		11,05				11,05

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

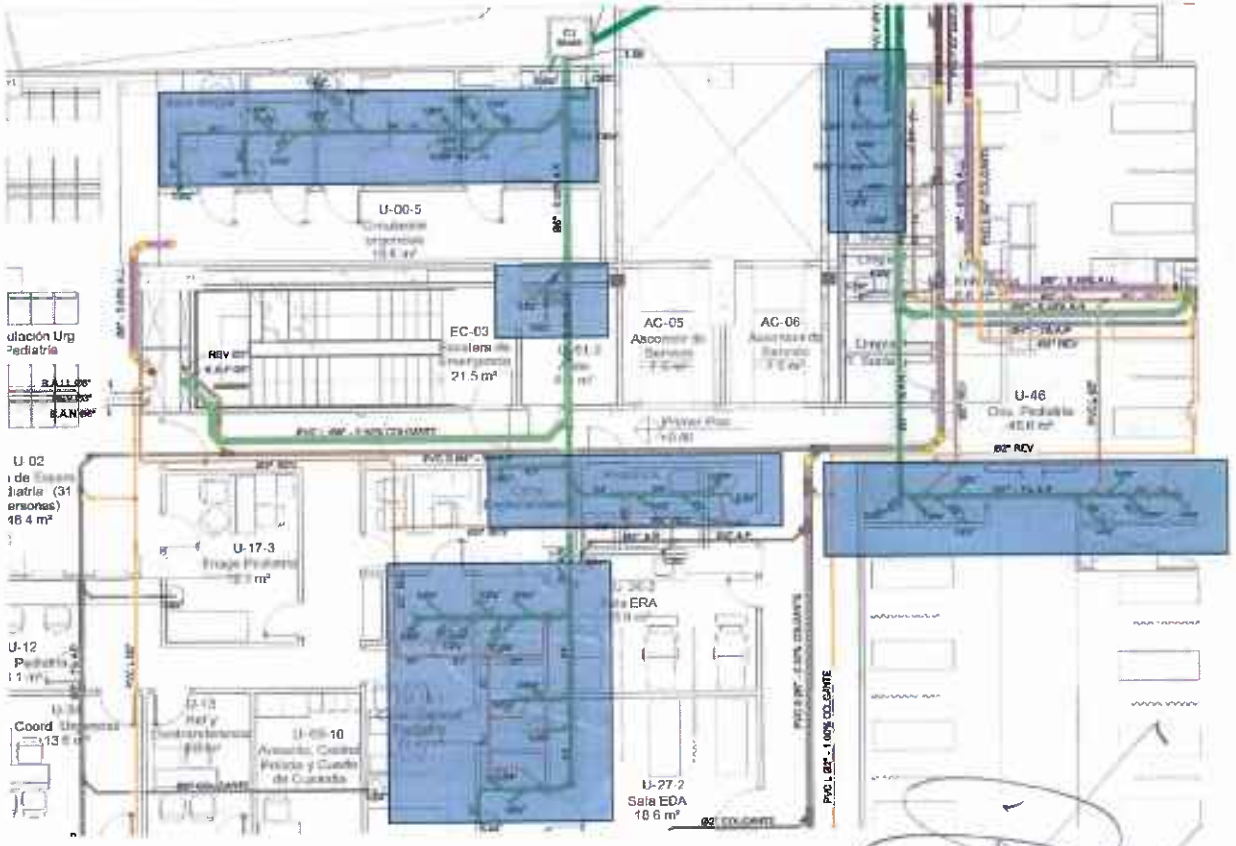

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 AF		4,40				4,40

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

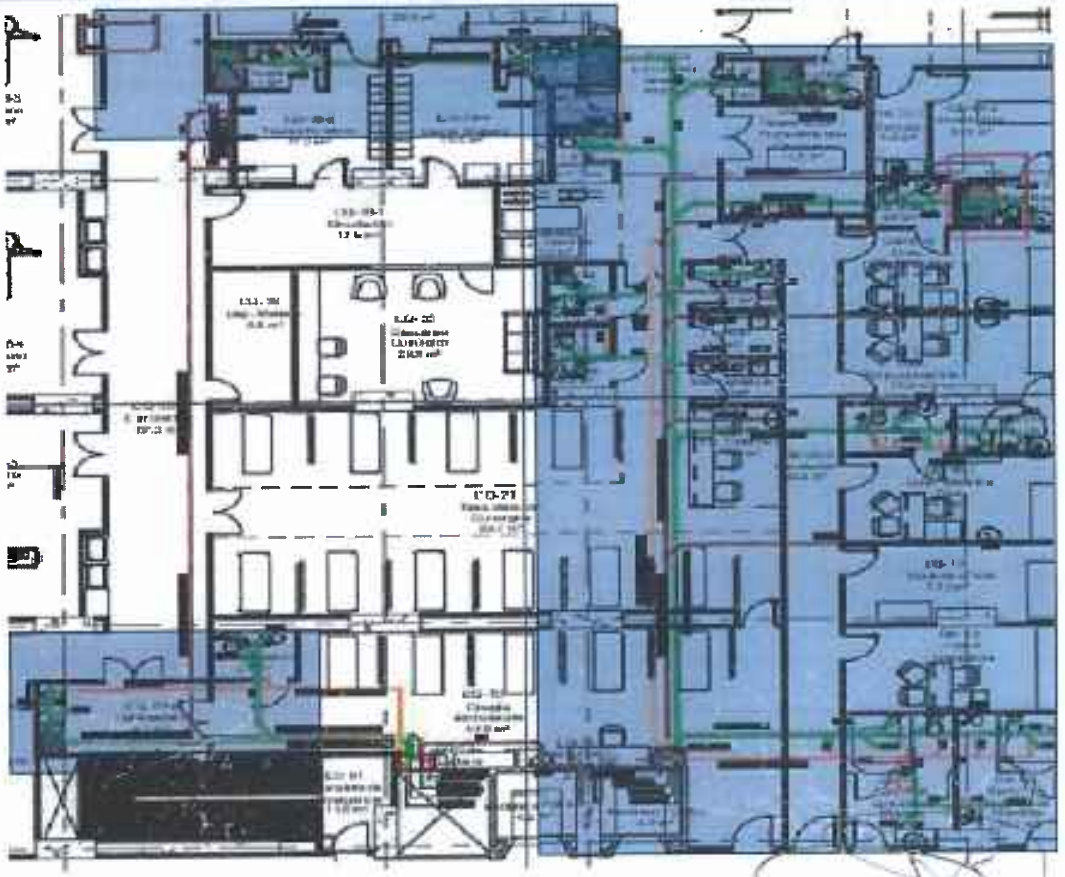

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 10		Página 3 de 3	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		25,81				26,81

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

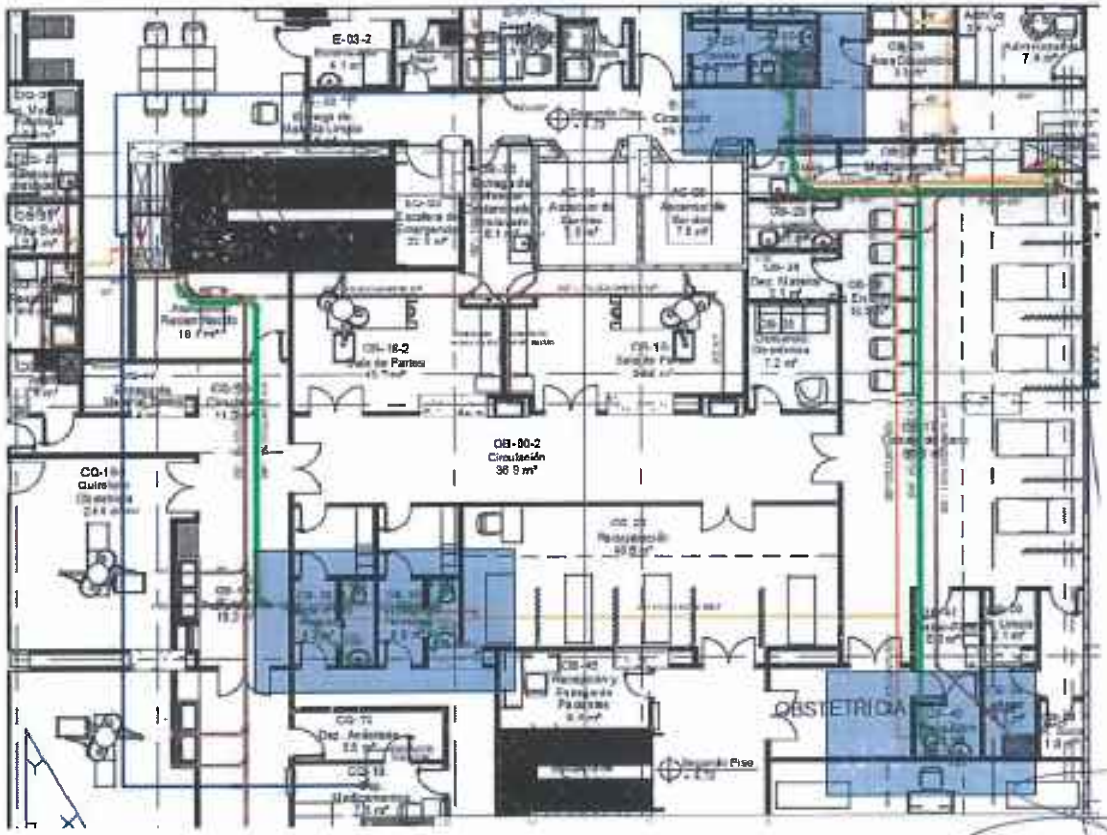

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 3 de 3	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 AF		45,40				45,40
SUB TOTAL						45,40
VIENE						97,26
PASAN						142,66

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No.: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

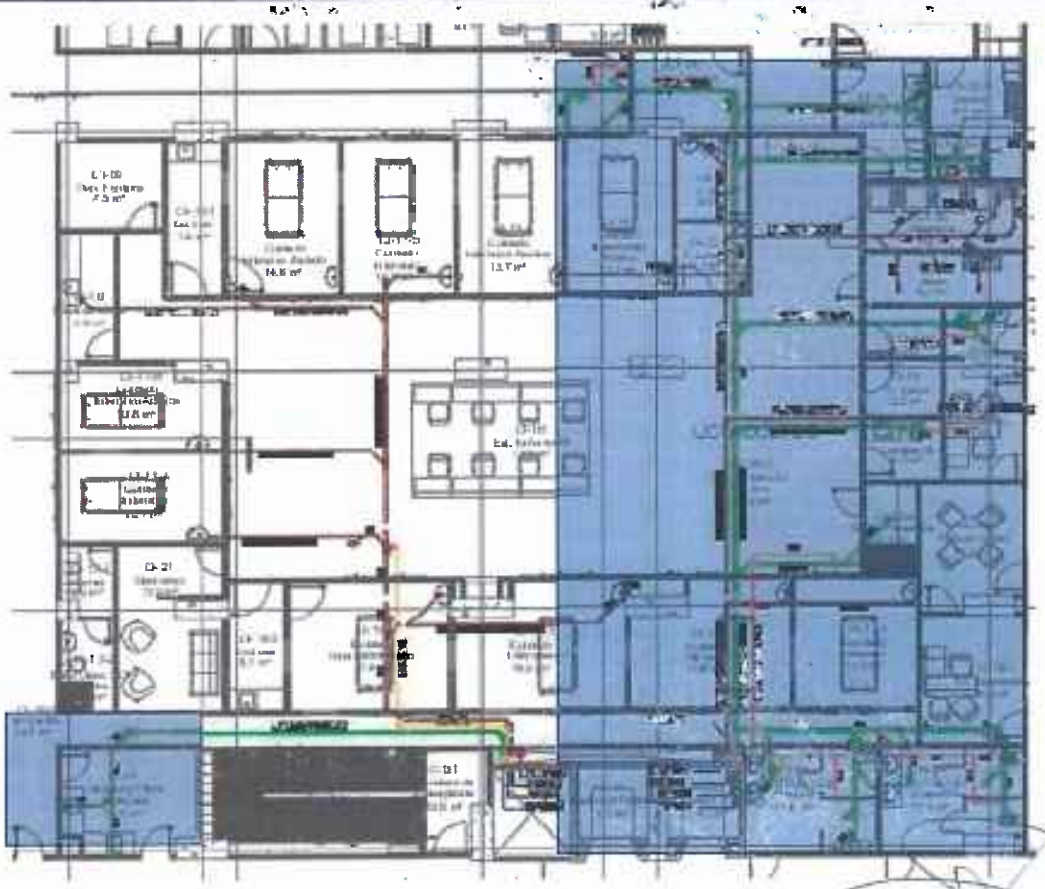

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 3 de 3	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		5,82				5,82

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.15.7**	**DESCRIPCION ITEM**	Tubería PVC sanitaria Ø2"			**UND:**	ML

[d] PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

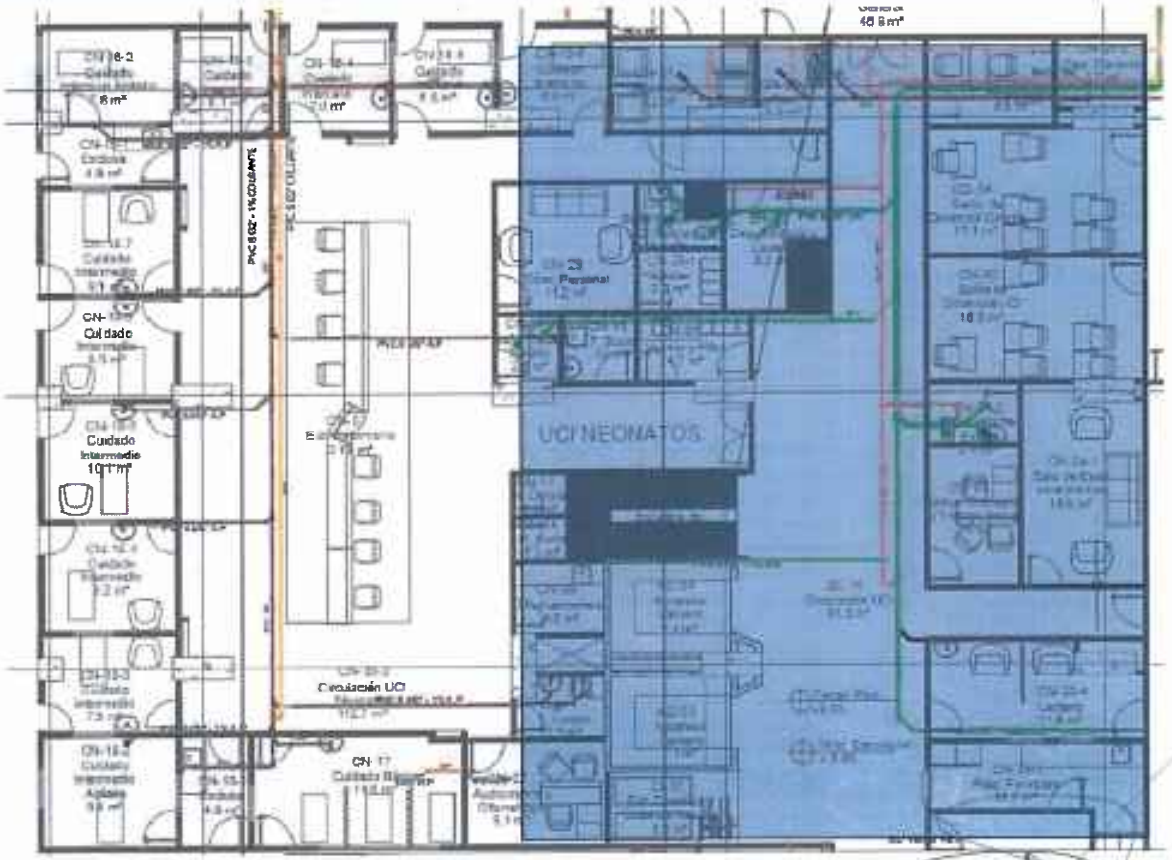

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		5,82				5,82
SUB TOTAL						5,82
VIENE						148,48
TOTAL						154,30

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ant Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

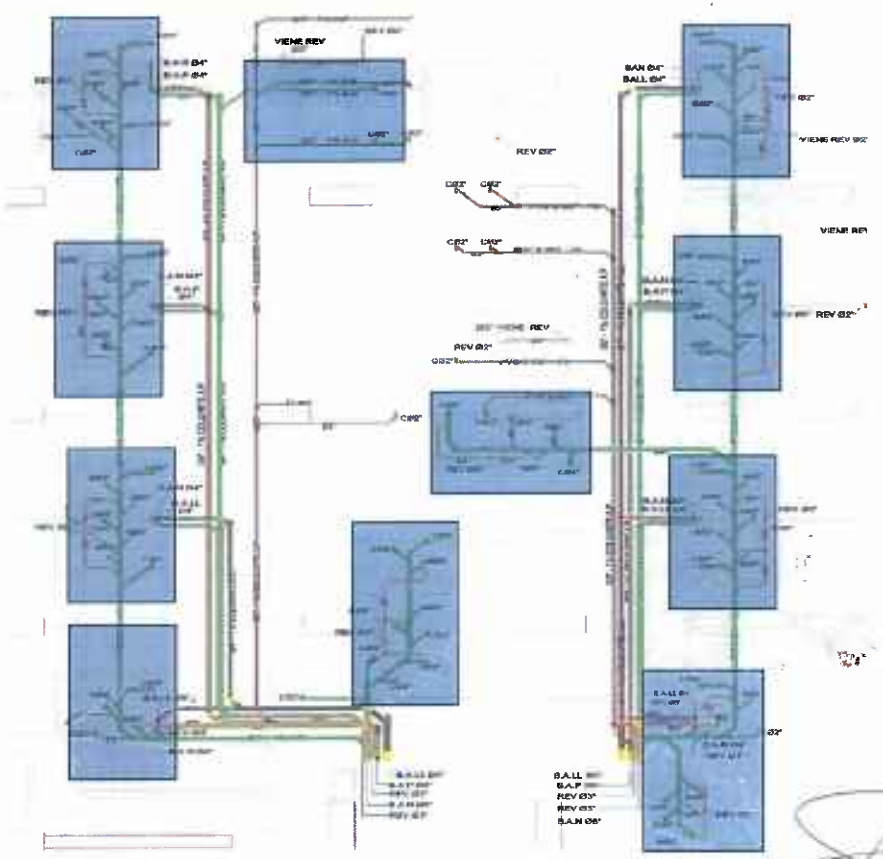

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-6 AF		4,40				4,40
		21,00				21,00
		4,70				4,70
		2,25				2,25
		5,60				5,60
		4,60				4,60
		2,20				2,20
		3,50				3,50
		20,00				20,00
		0,60				0,60
		3,00				3,00
		4,50				4,50
		1,30				1,30
		1,75				1,75
		3,80				3,80
			PASAN			83,20

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

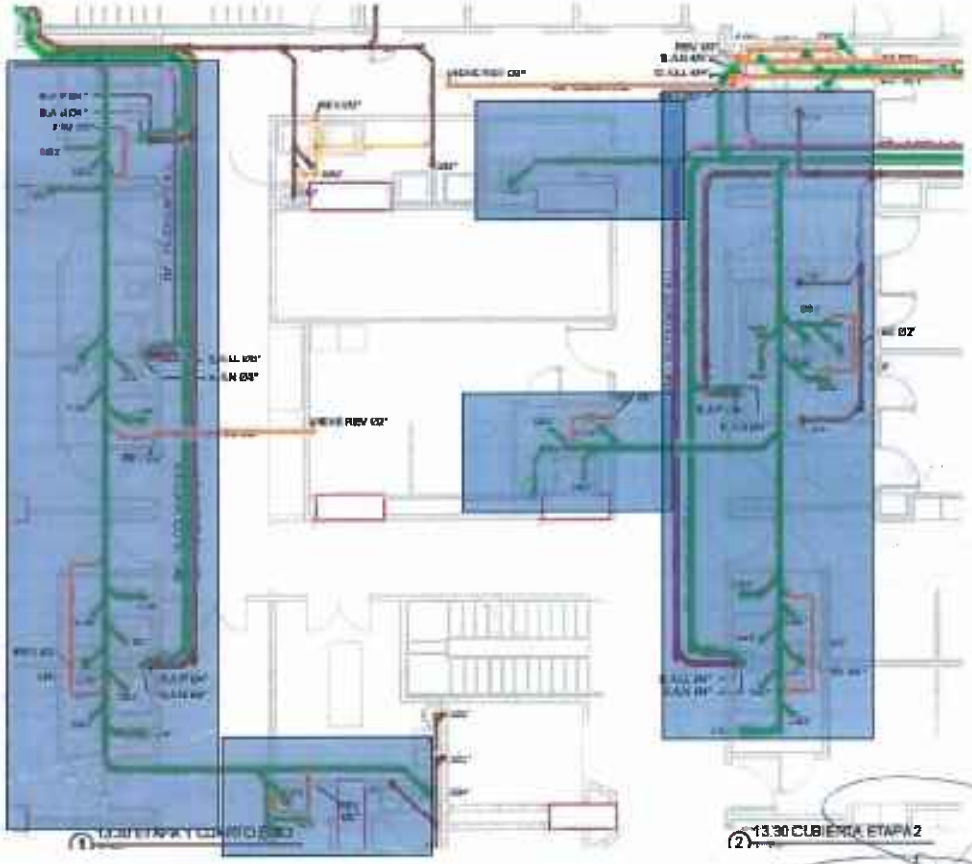

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF		4,80				4,80
		3,40				3,40
		0,70				0,70
		7,65				7,65
		0,70				0,70
		4,40				4,40
		4,00				4,00
		6,10				6,10
		4,70				4,70
SUB TOTAL						36,45
VIENE						83,20
PASAN						119,65

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Carrillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

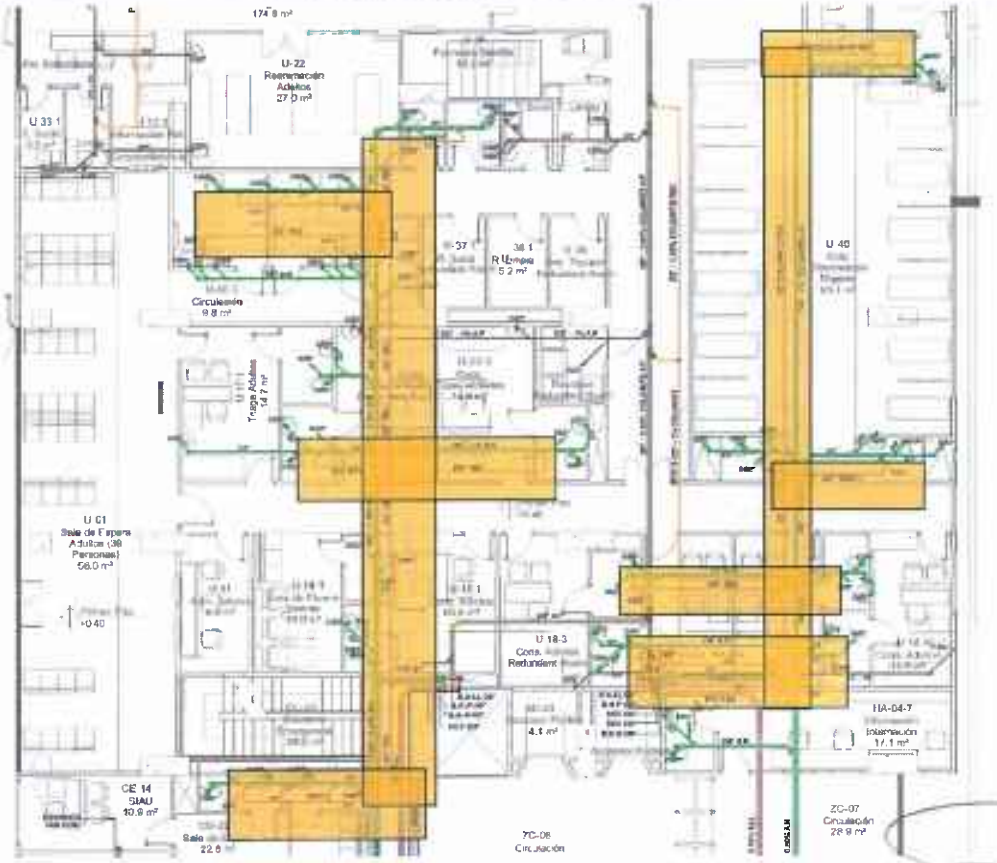

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE AF		8,60				8,60
		9,00				9,00
		2,40				2,40
		0,60				0,60
		0,60				0,60
		0,60				0,60
		0,60				0,60
		0,60				0,60
		3,10				3,10
		0,40				0,40
		0,40				0,40
		0,40				0,40
		1,60				1,60
		1,70				1,70
		1,50				1,50
		1,70				1,70
		1,00				1,00
SUB TOTAL						34,80
VIENE						119,65
PASAN						154,45

Elaboro:

RESIDENTE DE Obra
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

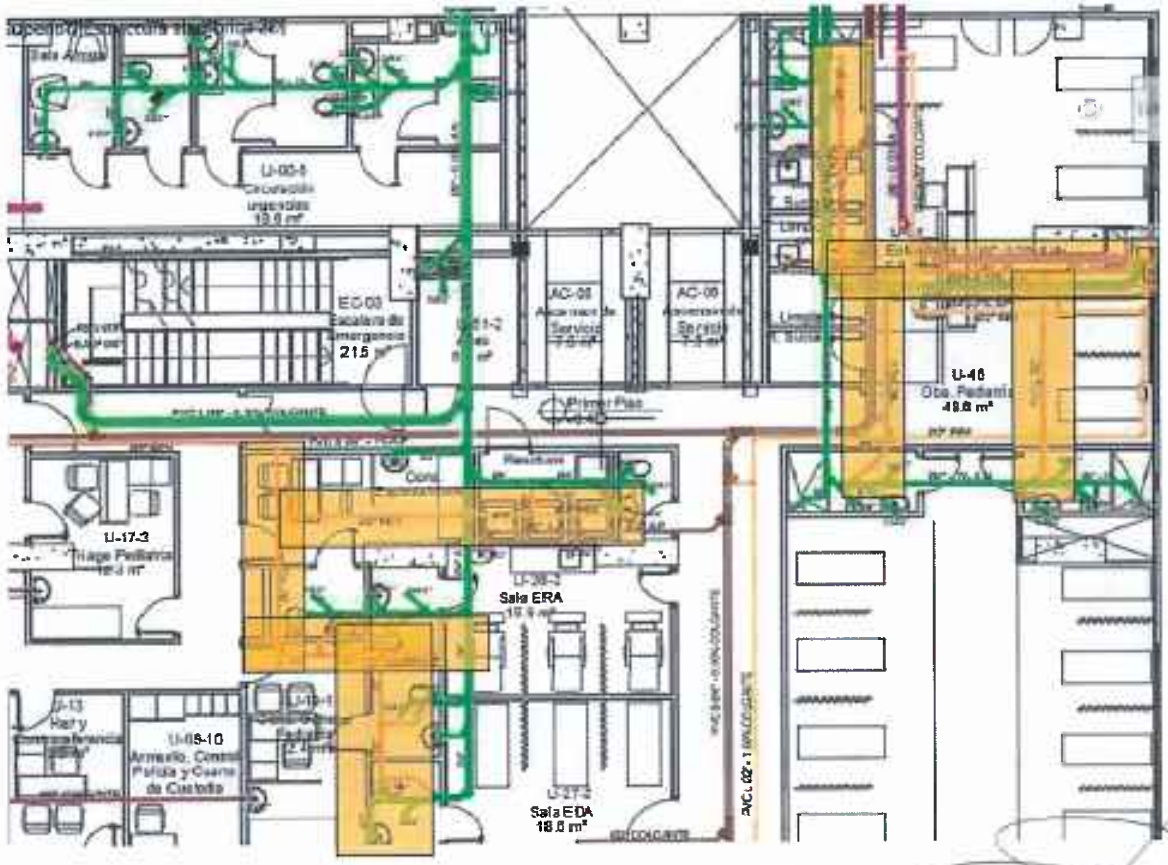

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

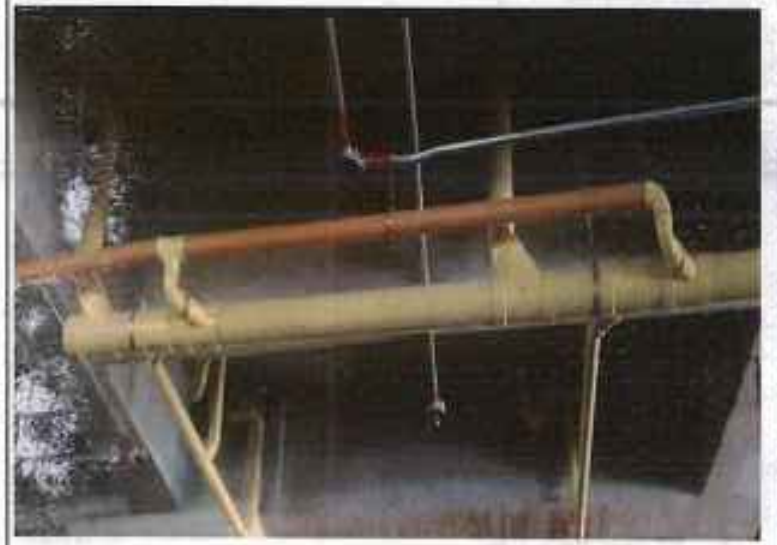

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE AF		16,00				16,00
		1,70				1,70
		16,20				16,20
		6,20				6,20
		3,10				3,10
SUB TOTAL						43,20
VIENE						154,45
PASAN						197,65

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03		Página: 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

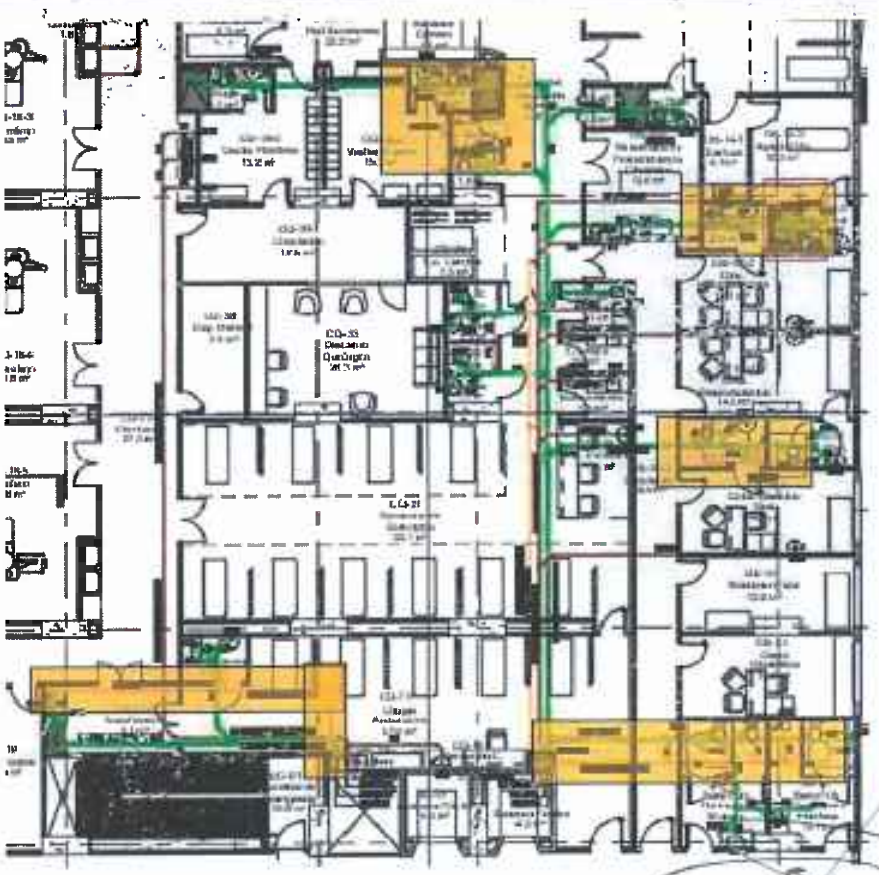

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		7,20				7,20
		9,70				9,70
		2,20				2,20
		0,40				0,40
		0,40				0,40
		0,50				0,50
		0,50				0,50
		0,50				0,50
SUB TOTAL						21,40
VIENE						197,65
PASAN						219,05

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUYE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

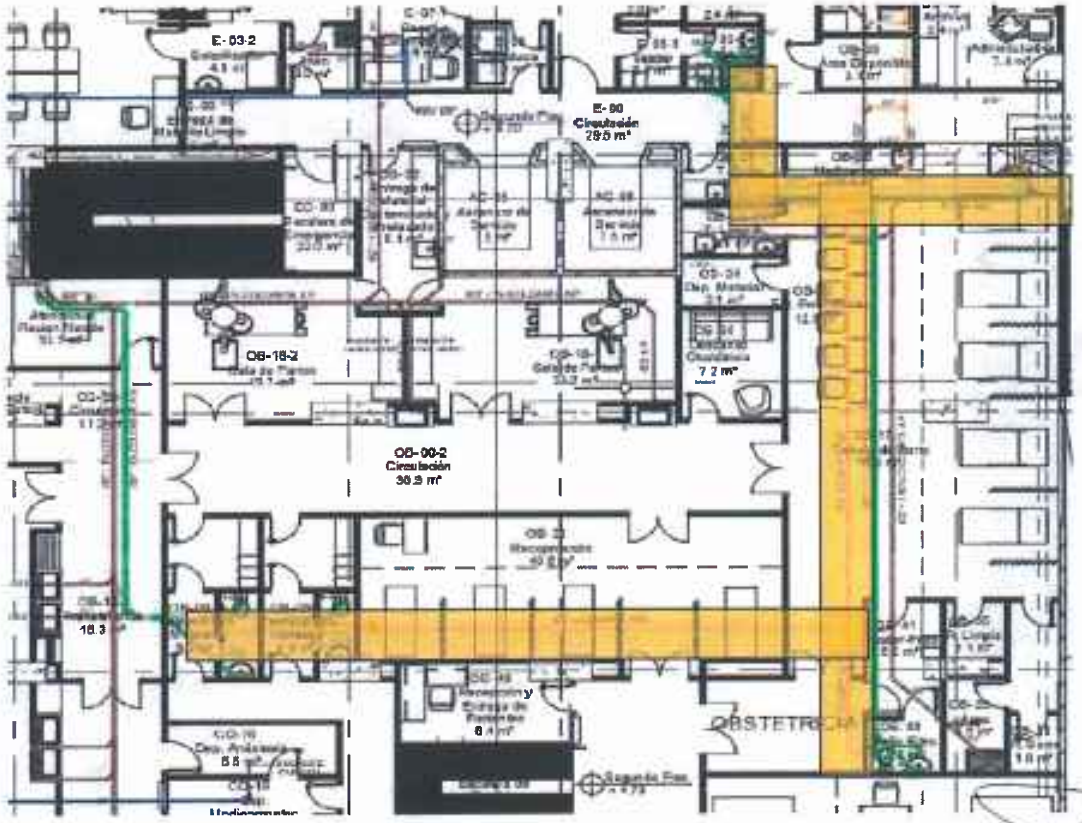

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	3	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE 5-10 EJE AF		14,10				14,10
		2,10				2,10
		5,00				5,00
		7,00				7,00
SUB TOTAL						28,20
VIENE						219,05
PASAN						247,25

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

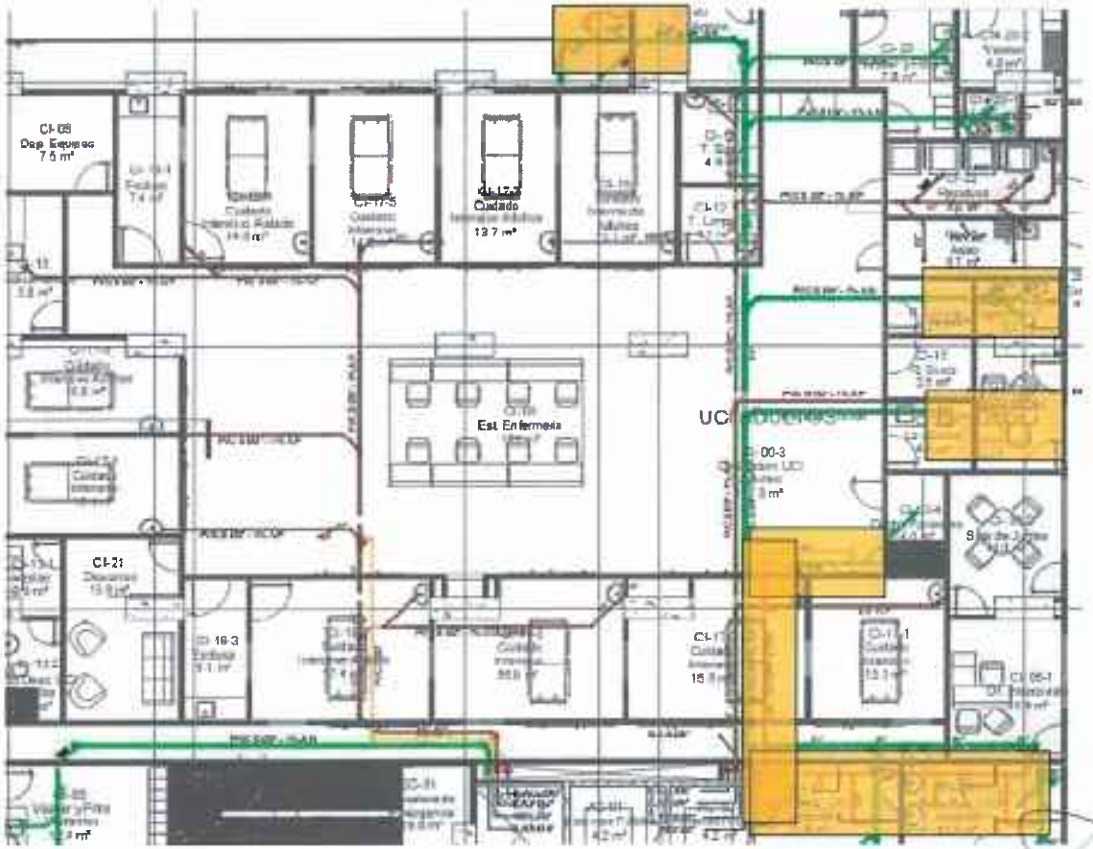

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE AF		30,75				30,75
				SUB TOTAL		30,75
				VIENE		247,25
				PASAN		278,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

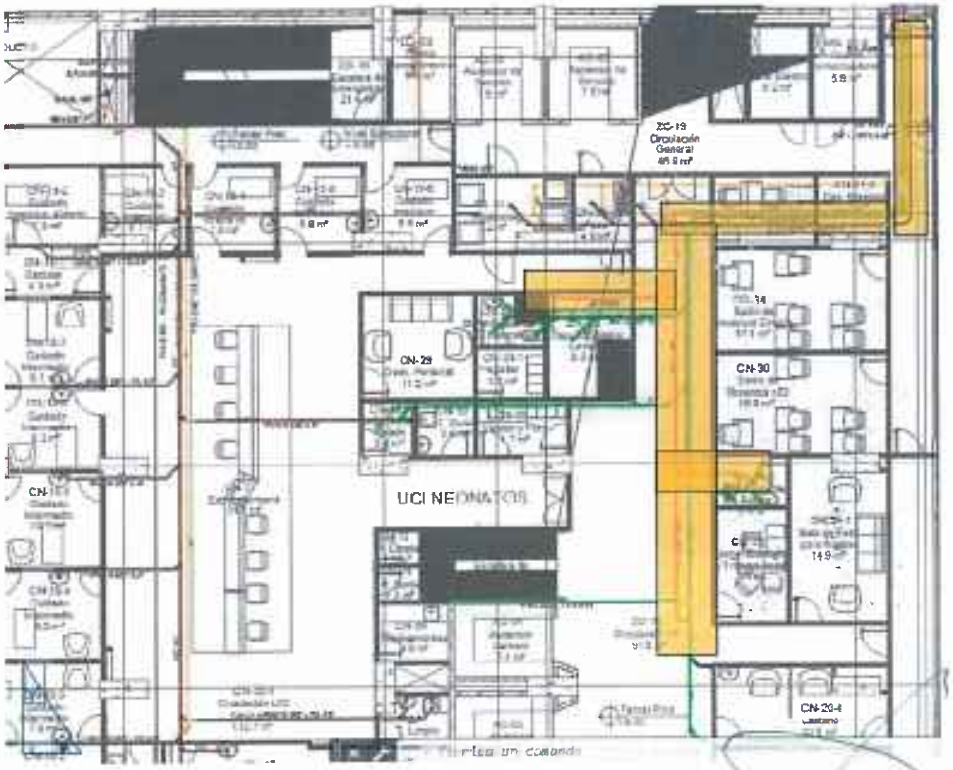

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 A-F		20,50				20,50
					SUB TOTAL	20,50
					VIENE	278,00
					TOTAL	298,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jairr Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

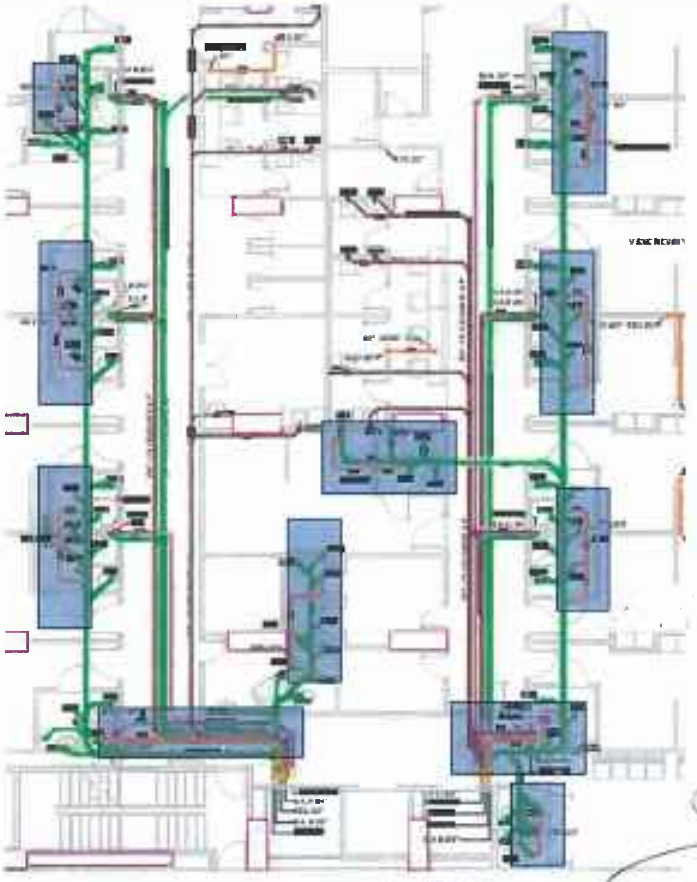

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y E-F					49,00	49,00
ENTRE EL PISO 1 Y EL PISO 2 EN LOS EJE 2 YE EJE F					4,00	4,00
PASAN						53,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cantillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.10	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

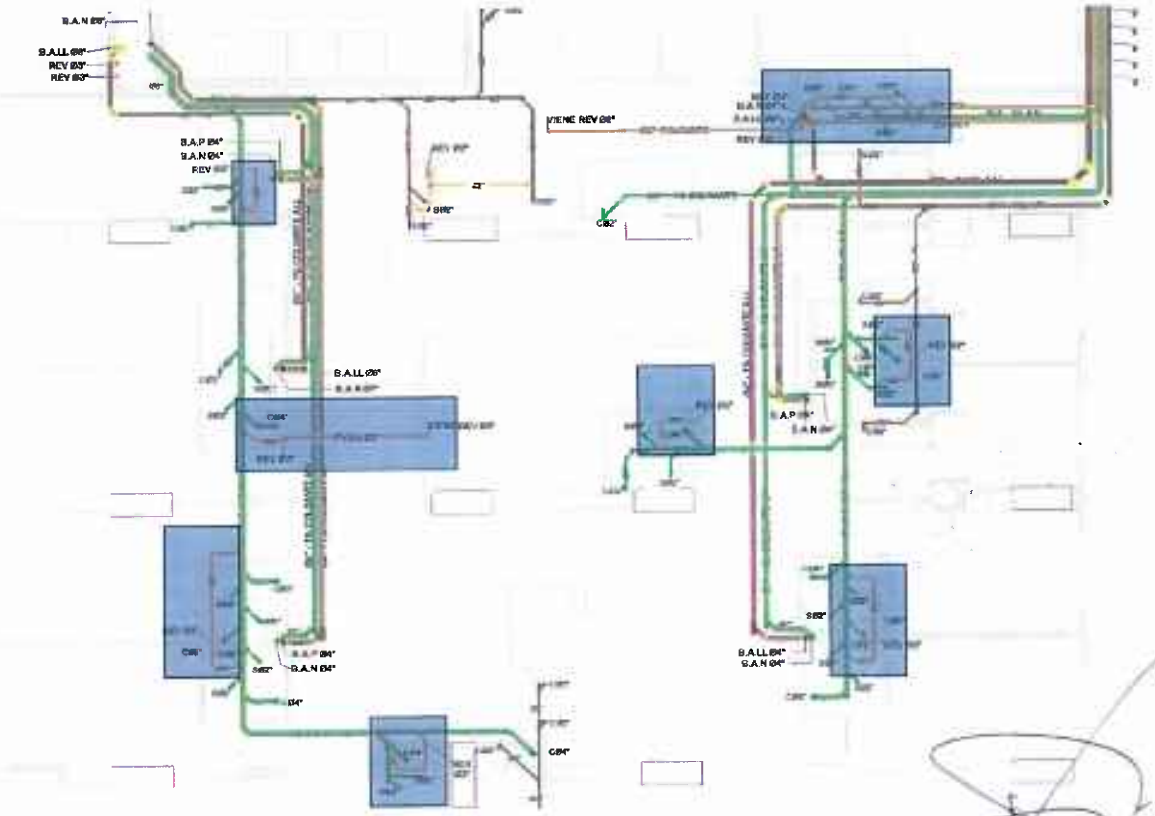

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA –
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJES 7-10 Y C-F					21,00	21,00
ENTRE EL PISO 1 Y EL PISO 2 EN LOS EJE 9 YE EJE F					4,00	4,00
ENTRE EL PISO 1 Y EL PISO 2 EN LOS EJE 8 YE EJE B					4,00	4,00
SUB TOTAL						29,00
VIENE						53,00
TOTAL						82,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

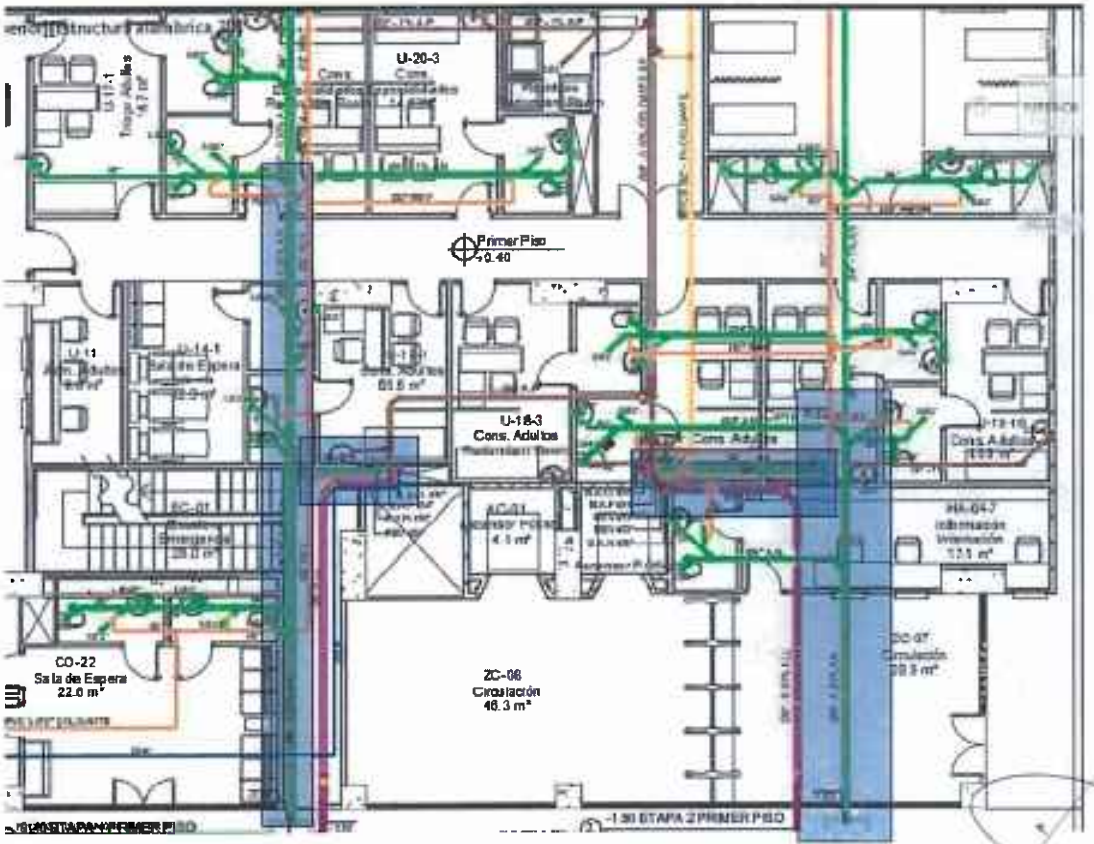

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y A-F					133,00	133,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

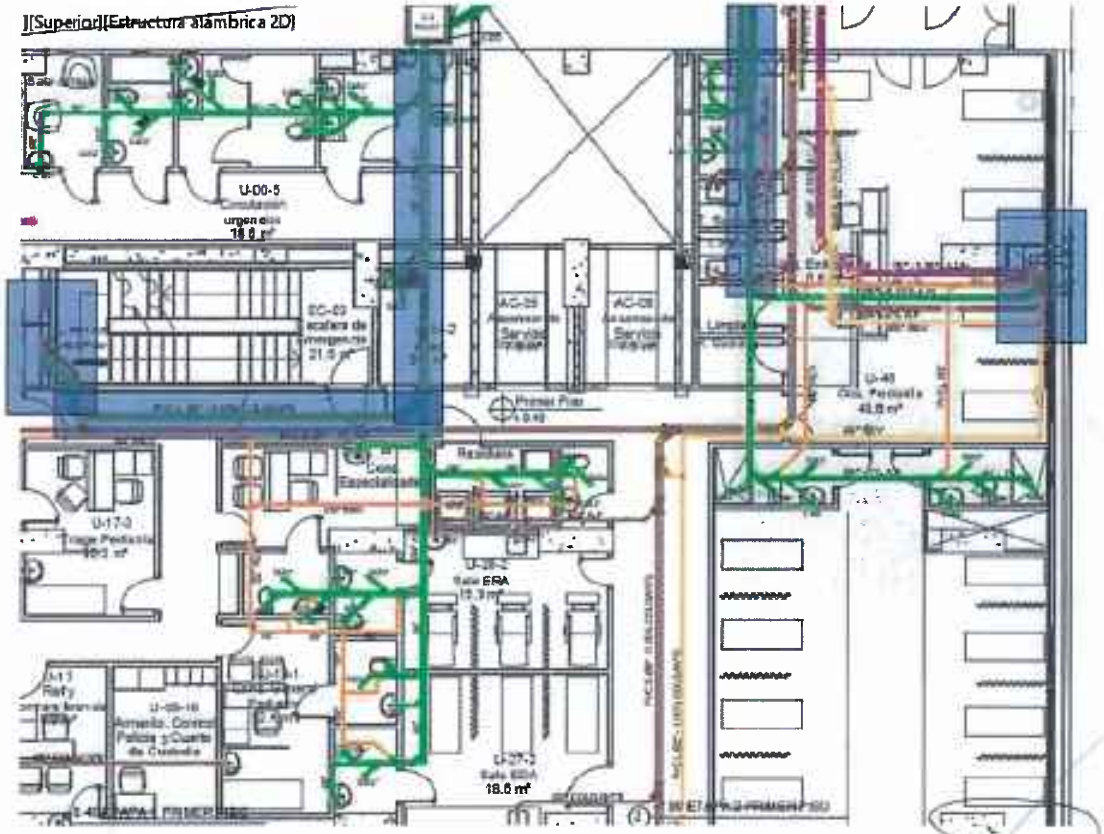

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EL 6-10 Y A-F					100,00	100,00
SUB TOTAL						100,00
VIENE						133,00
PASAN						233,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.15.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

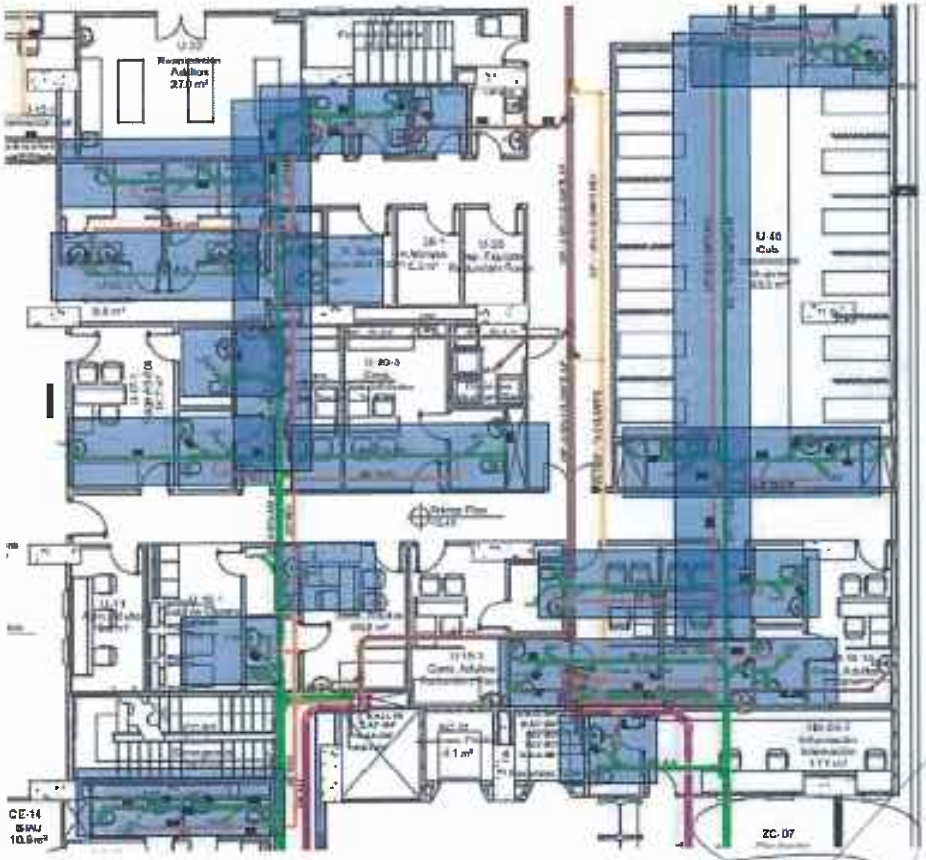

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EL EJE 2-5 Y A-F					115,00	115,00
SUB TOTAL						115,00
VIENE						233,00
PASAN						348,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

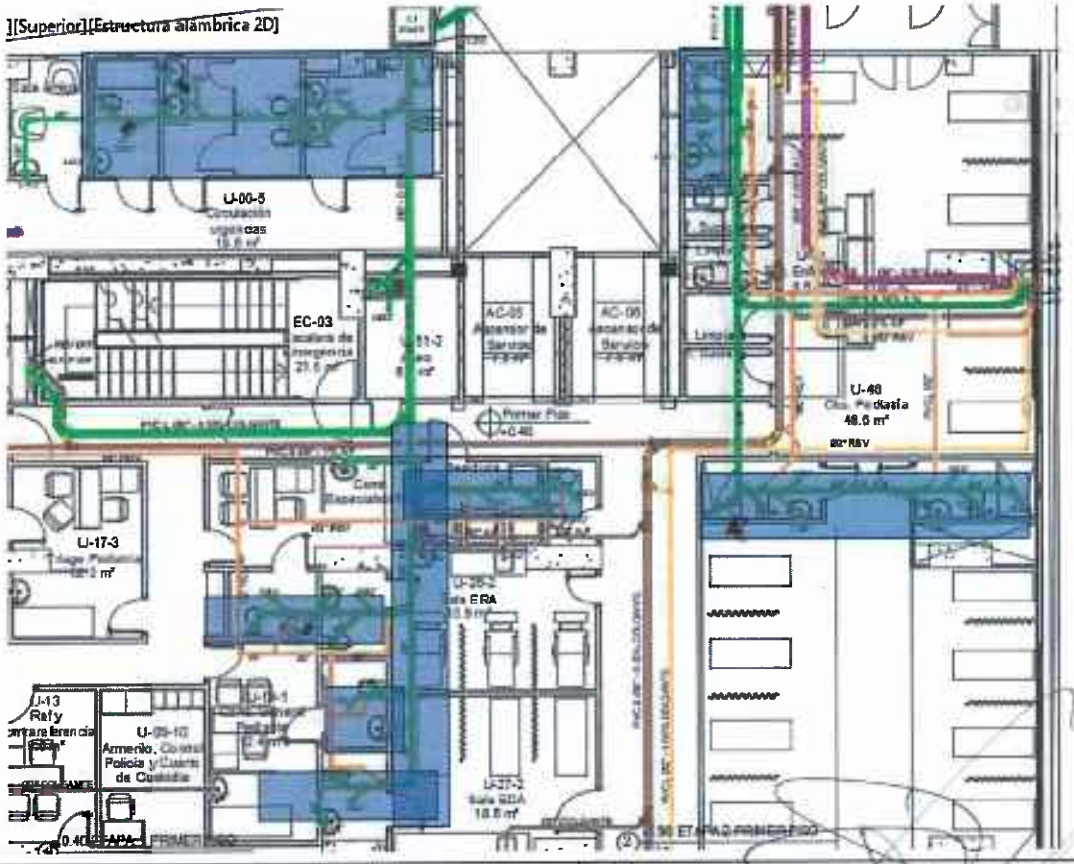

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EL EJE 6-10 Y A-F					36,00	36,00
SUB TOTAL						36,00
VIENE						348,00
PASAN						384,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2026

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.15.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

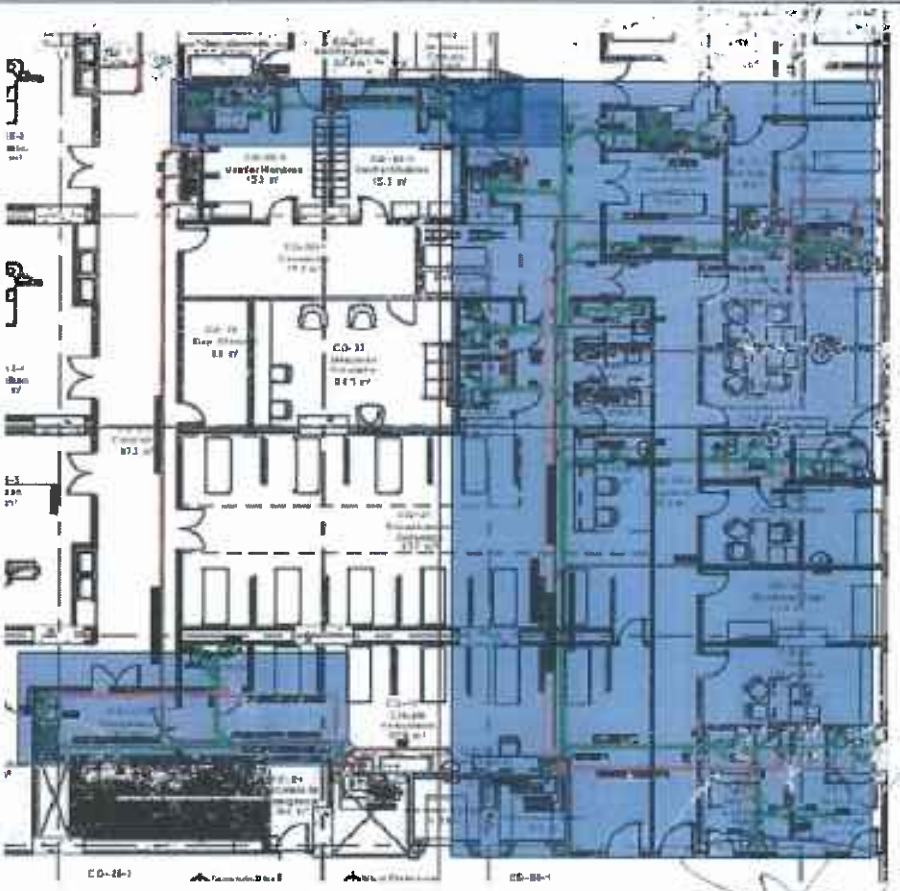

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5EJE A-F					84,00	84,00
SUB TOTAL						84,00
VIENE						384,00
PASAN						468,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.15.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

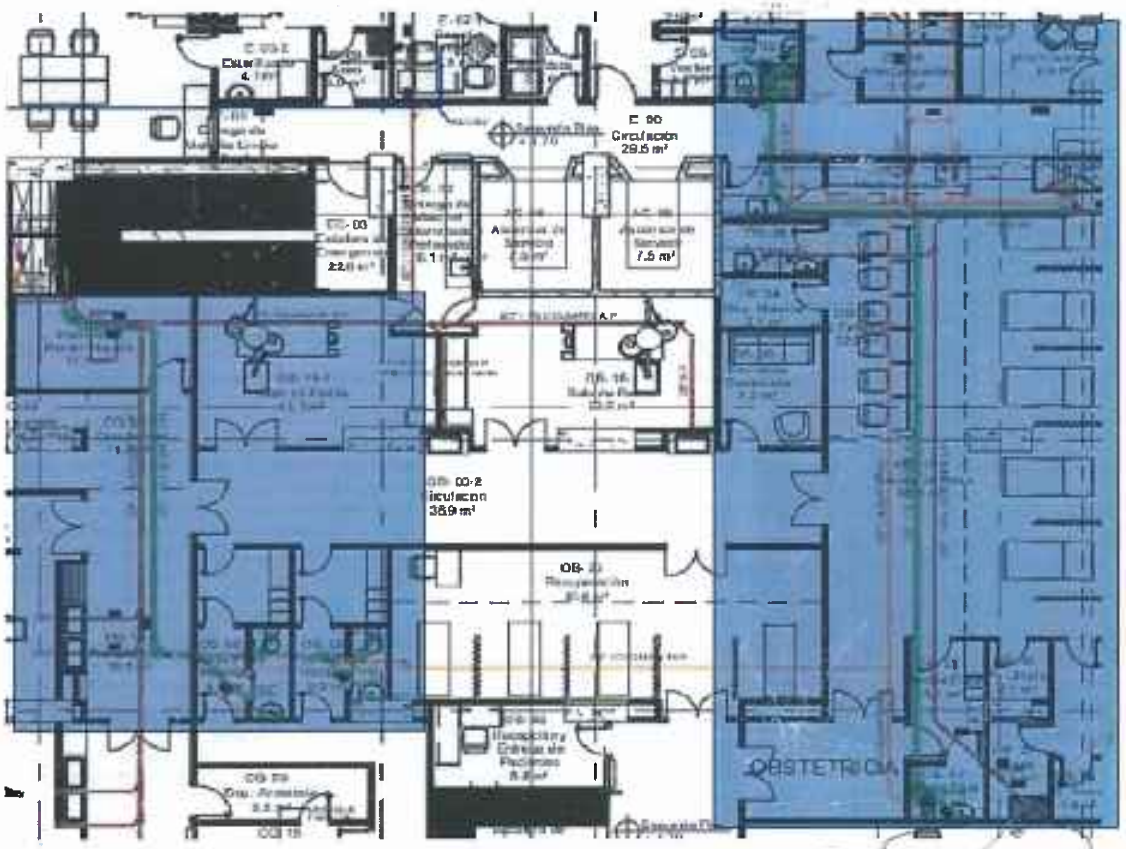

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					30,00	30,00
SUB TOTAL						30,00
VIENE						468,00
PASAN						498,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.15.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

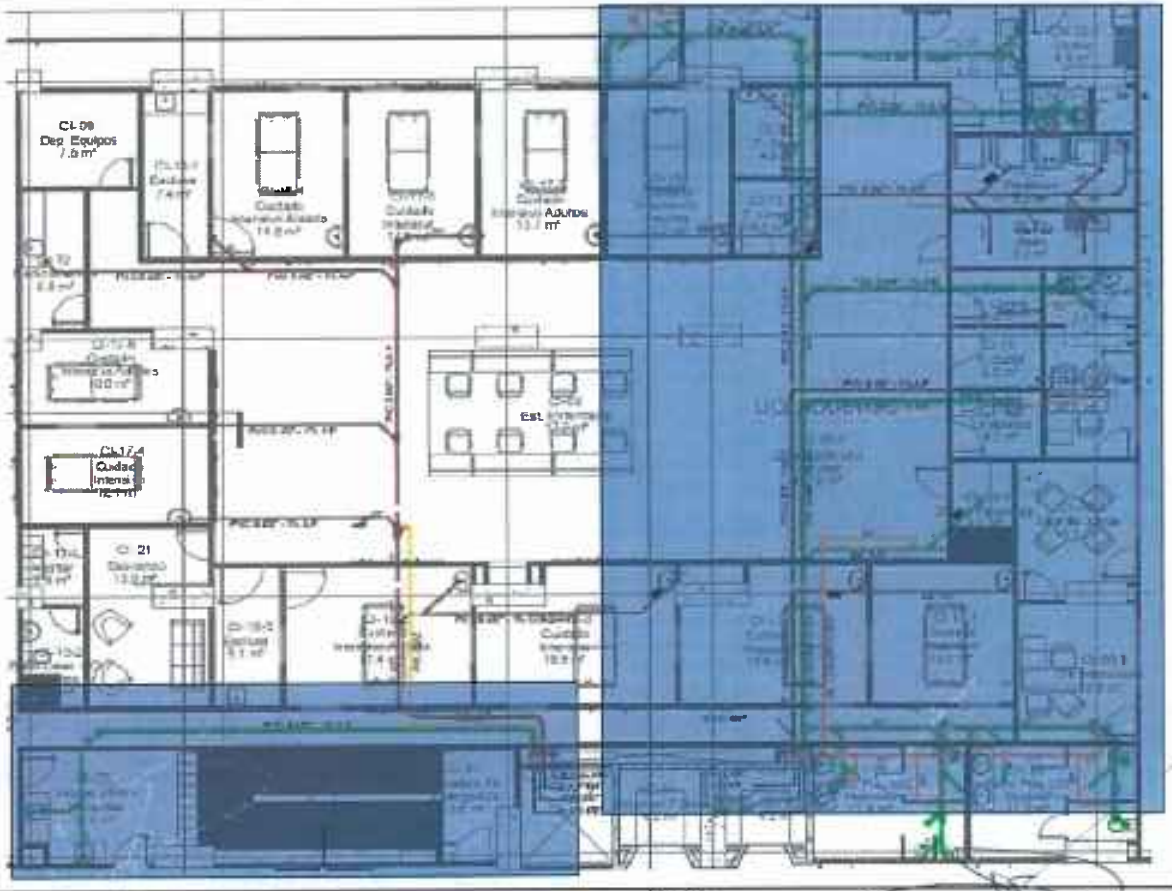

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM:	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 1-5 EJE A-F					188,00	188,00
SUB TOTAL						188,00
VIENE						498,00
PASAN						686,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

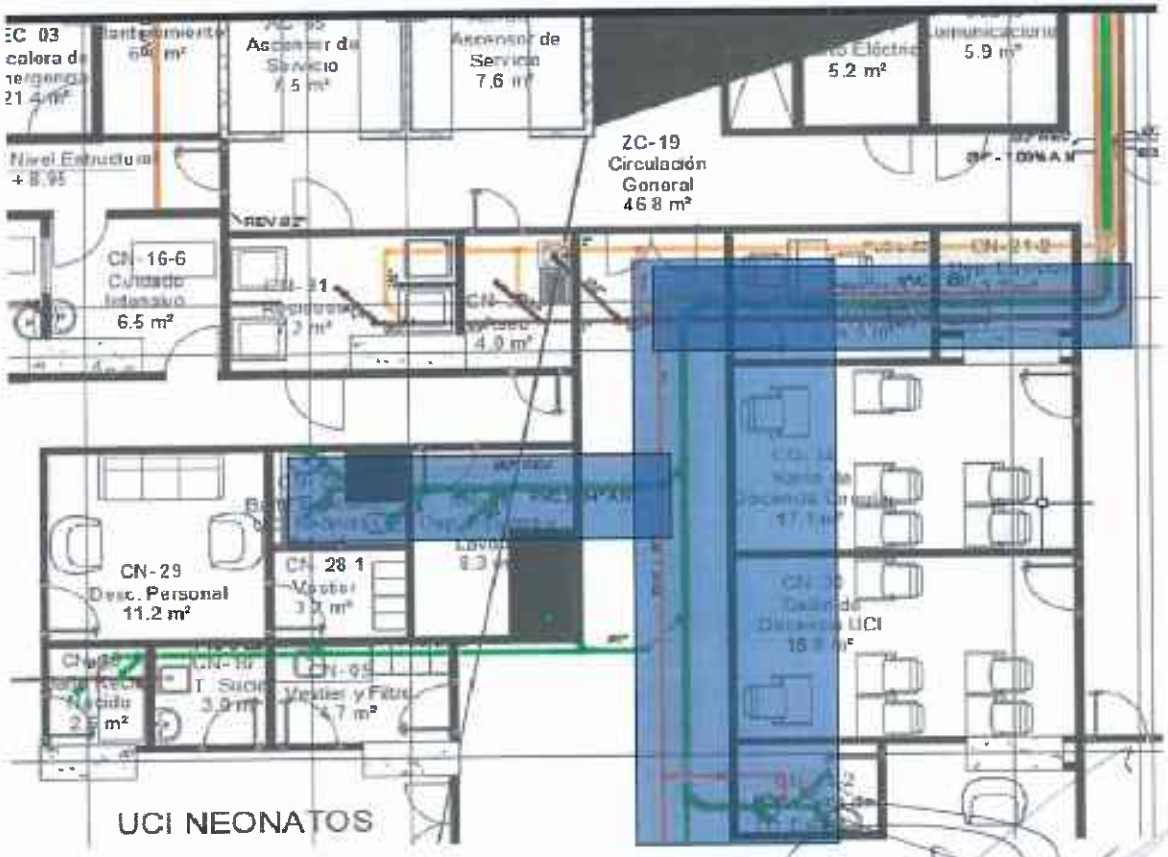

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	090 DE 2024		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					103,00	103,00
SUB TOTAL						103,00
VIENE						686,00
TOTAL						789,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.15.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			**UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

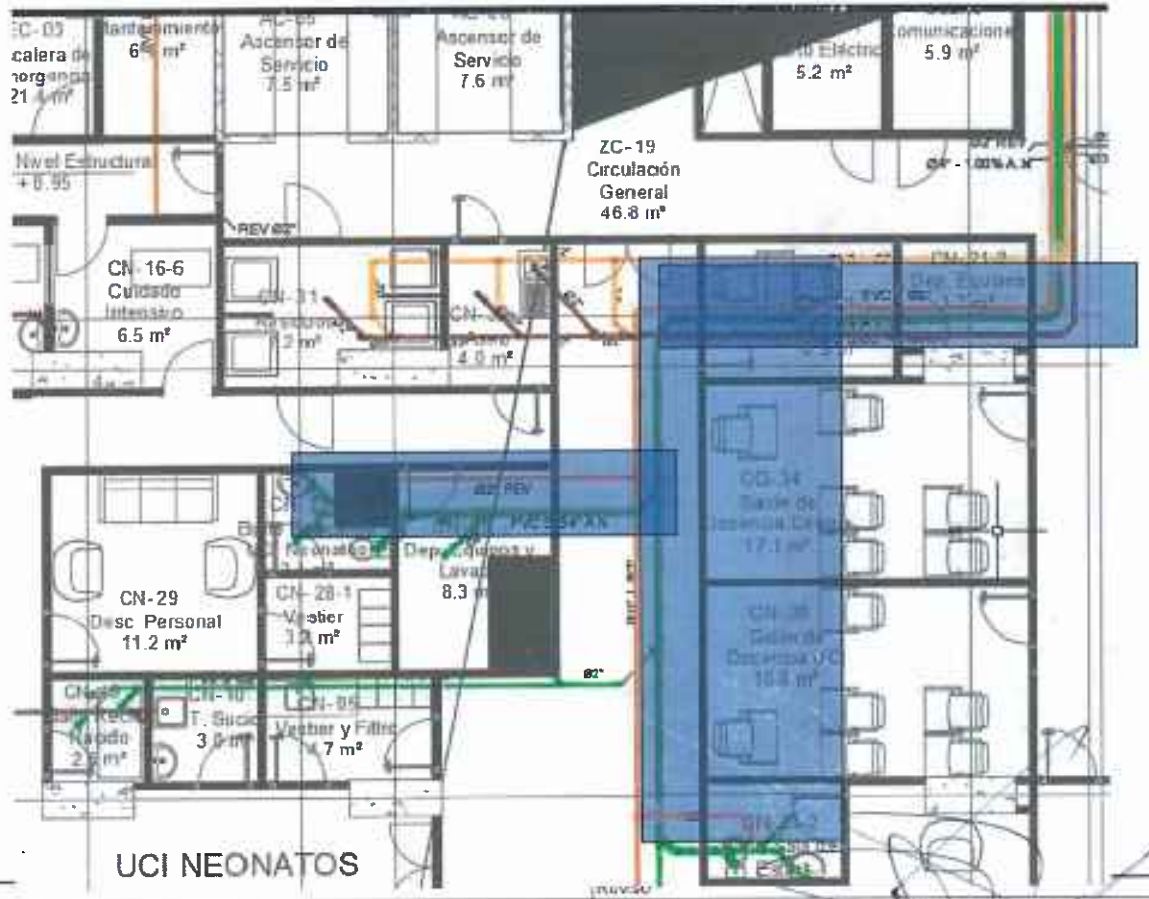

Elaboró.

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.14	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

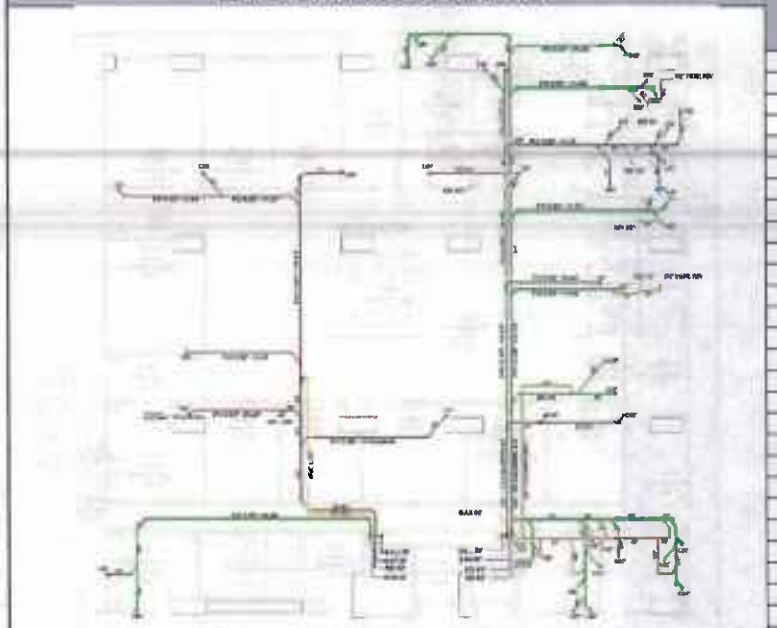

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2 B-D					8,00	8,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

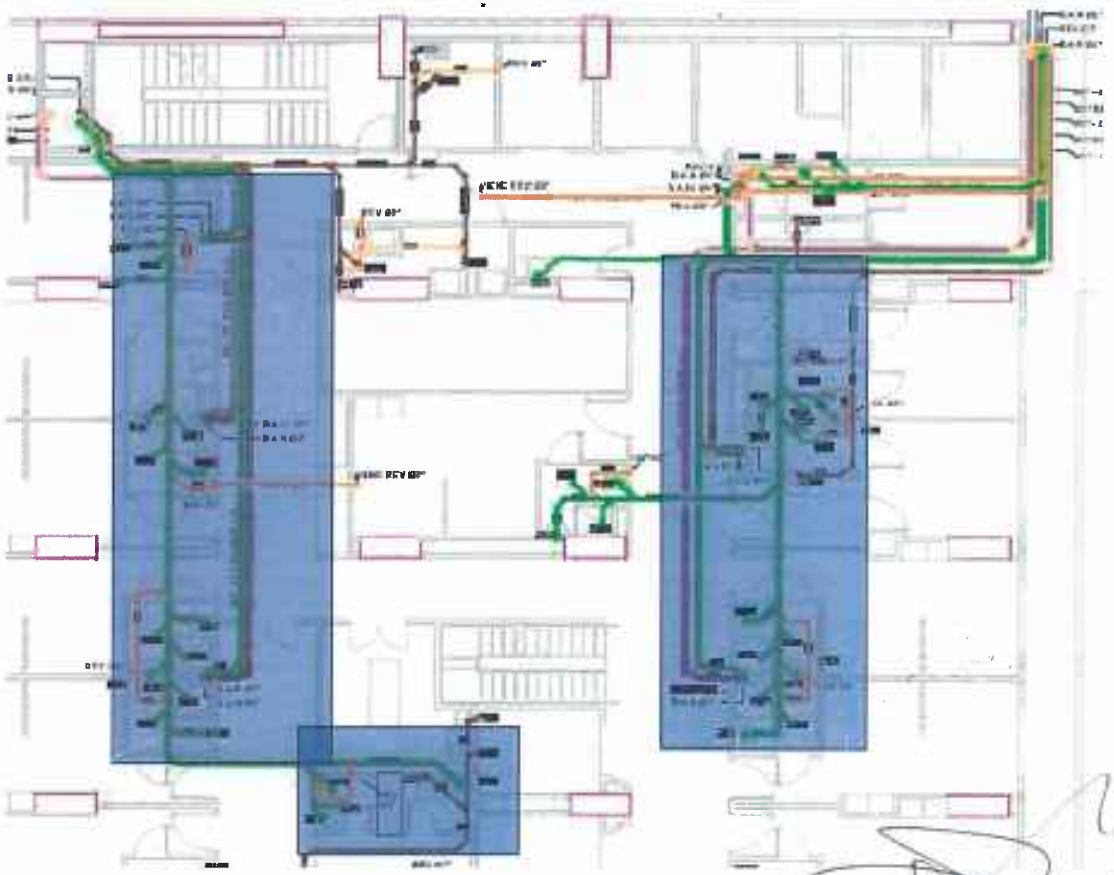

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y C-E					140,00	140,00
PASAN						140,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.14	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

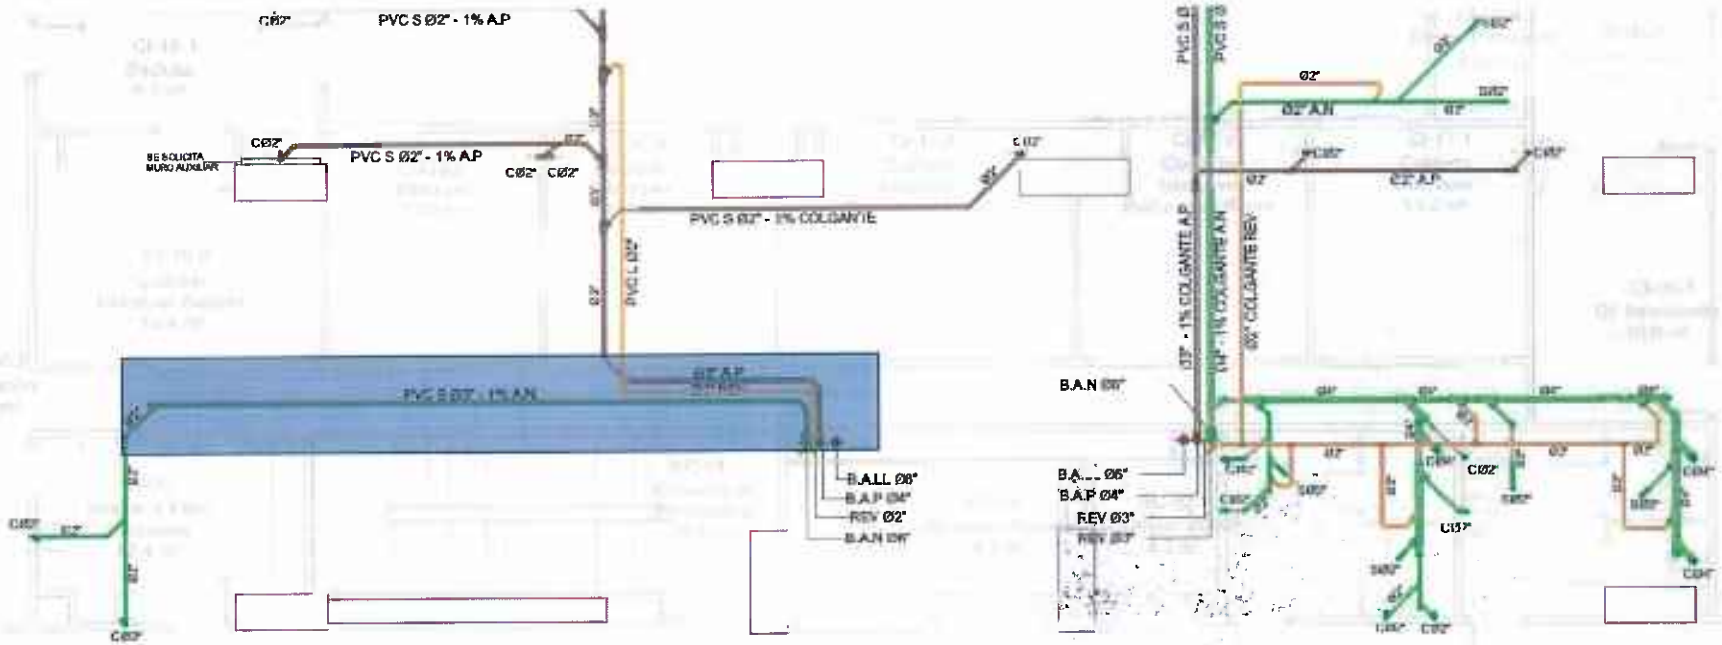

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y A-B					110,00	110,00
SUB TOTAL						110,00
VIENE						140,00
PASAN						250,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	1	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

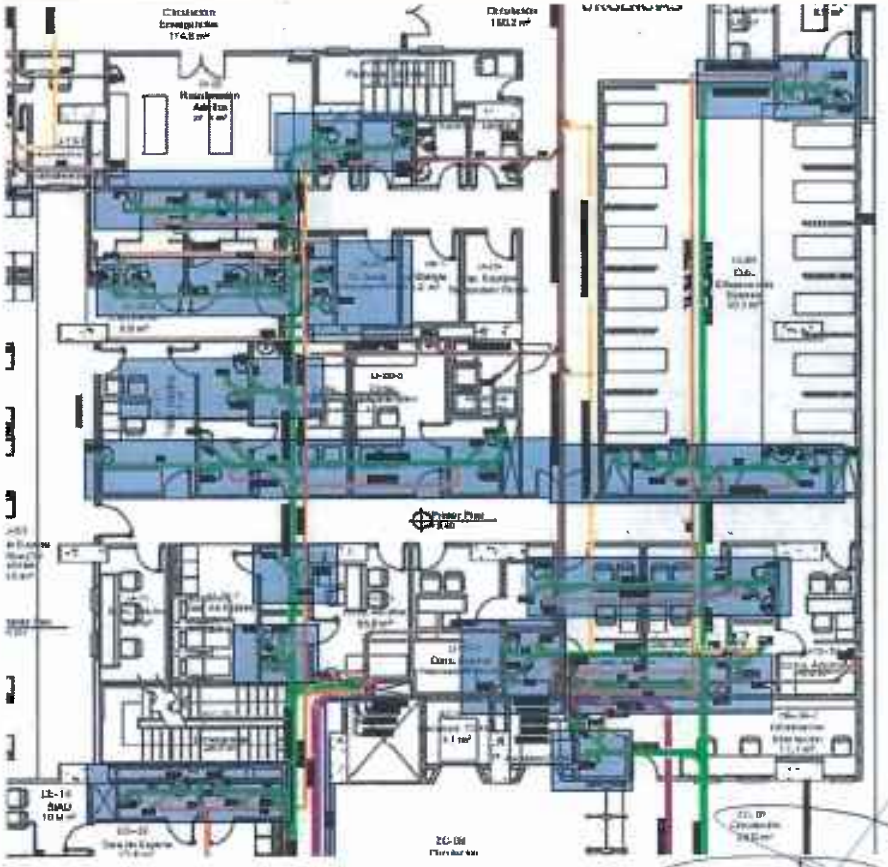

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-3 EJE A-F					100,00	100,00
SUB TOTAL						100,00
VIENE						250,00
PASAN						350,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.15.15	(b) DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			(c) UND:	Und

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

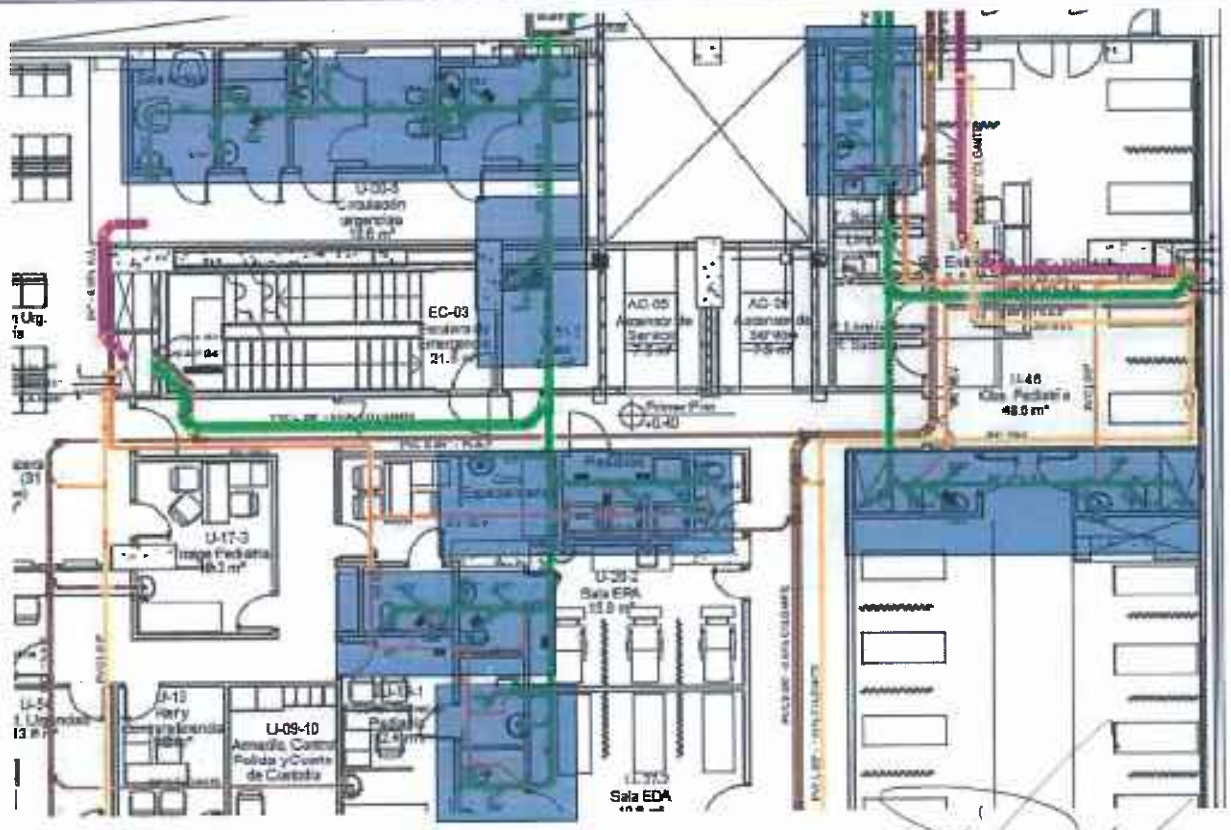

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 09	Pagina 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EL EJE 5-10 Y EJE A-F					25,00	25,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.15.15	(b) DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

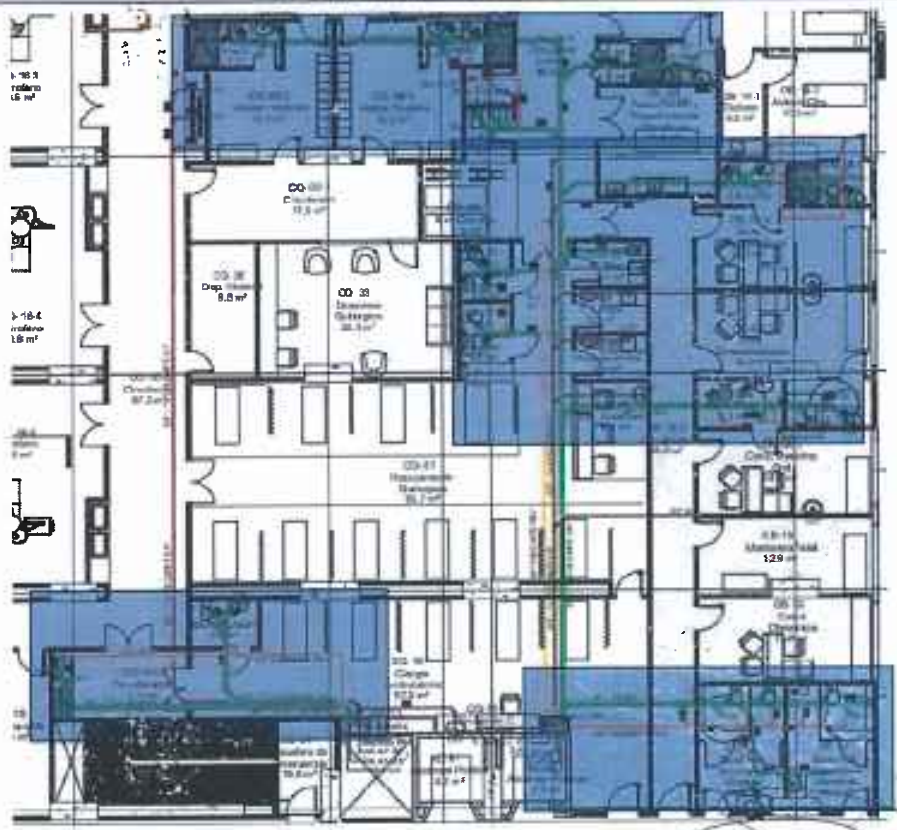

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m2)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					90,00	90,00
SUB TOTAL						90,00
VIENE						375,00
PASAN						465,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 20		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.15.15	(b) DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			(c) UND:	Und

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

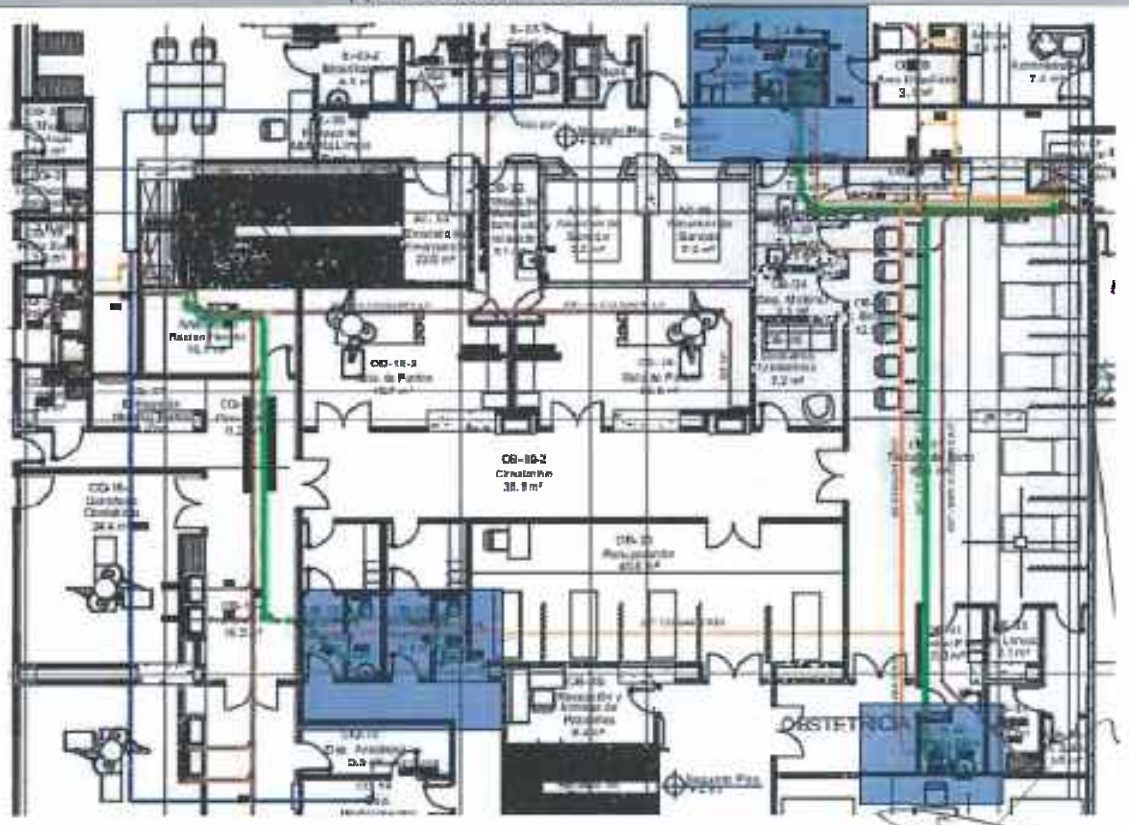

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					50,00	50,00
SUB TOTAL						50,00
VIENE						465,00
PASAN						515,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**26.15.15**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			**(c) UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

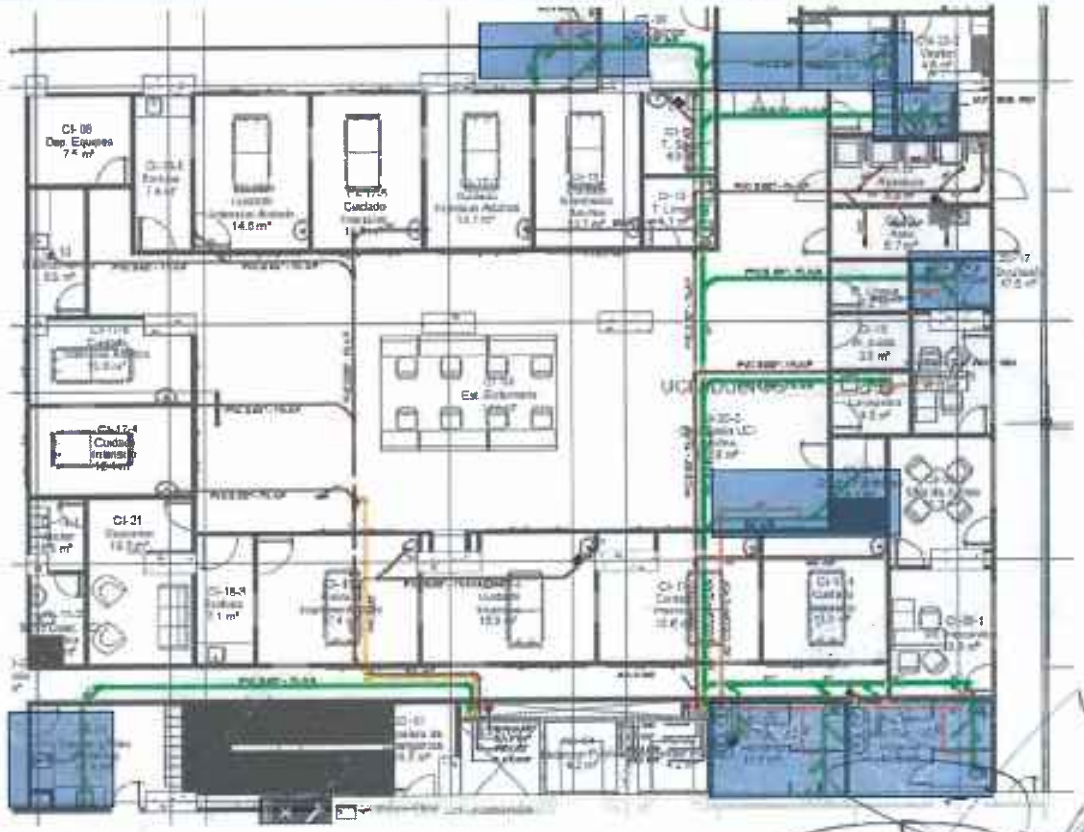

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					140,00	140,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	26.15.15	(b) DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.15	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					100,00	100,00
SUB TOTAL						100,00
VIENE						655,00
TOTAL						755,00

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**26.15.15**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			**(c) UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

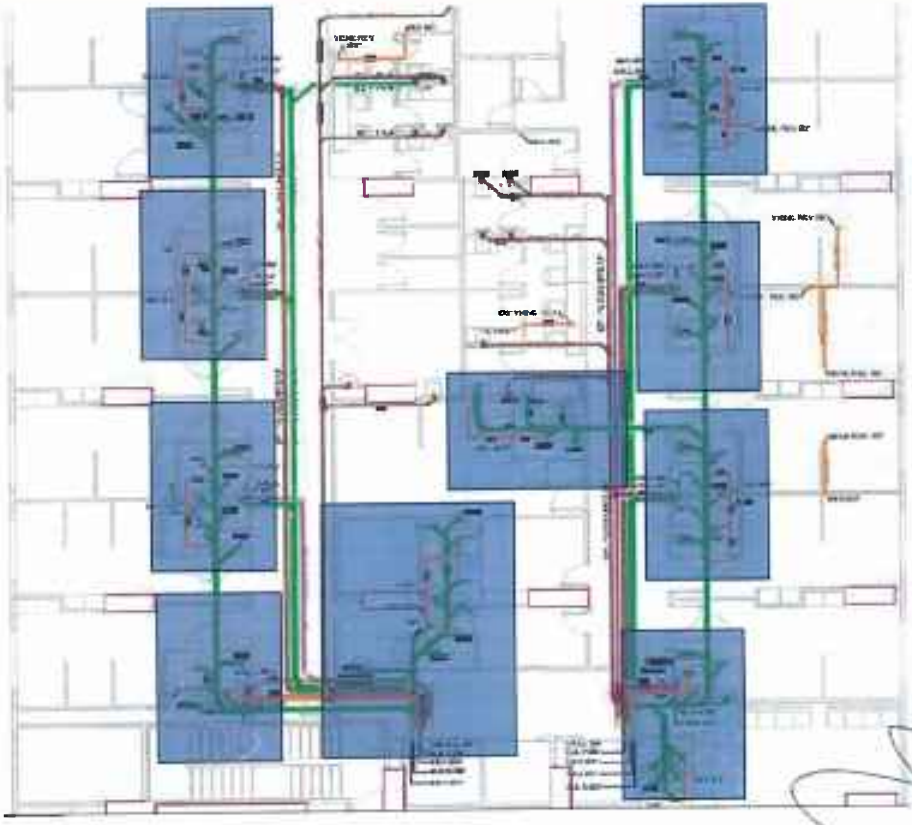

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					50,00	50,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
(a) ITEM N°:	**26.15.15**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			**(c) UND:**	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

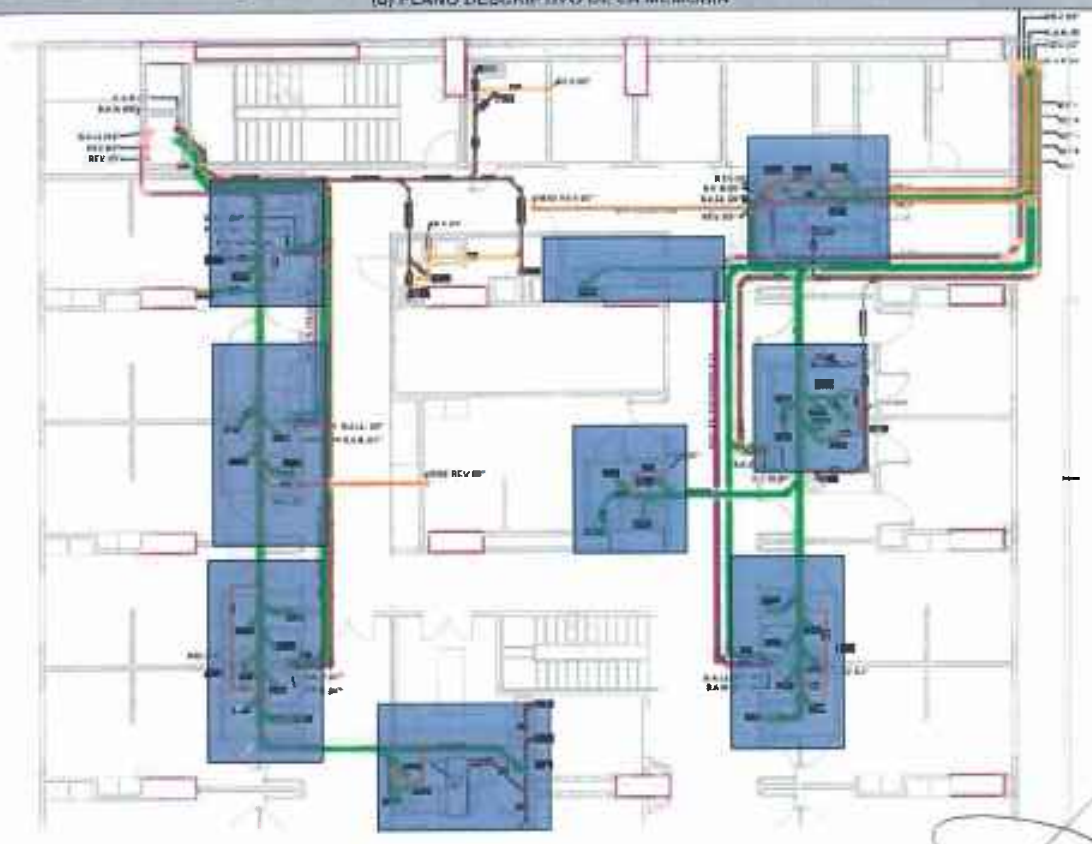

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

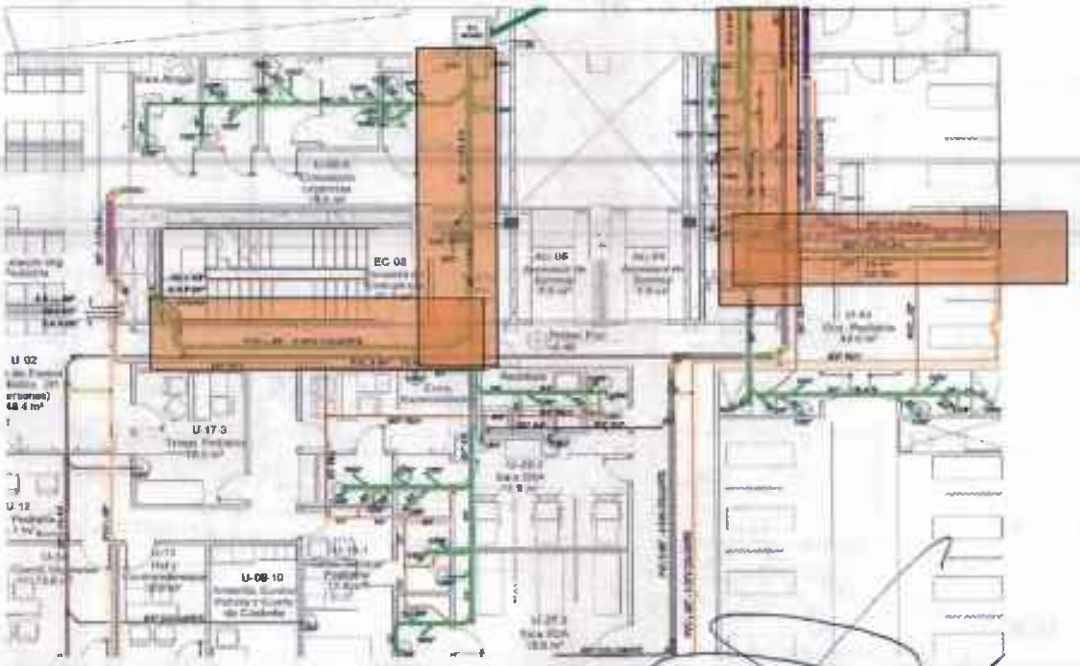

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-35			
		Versión No: 33	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

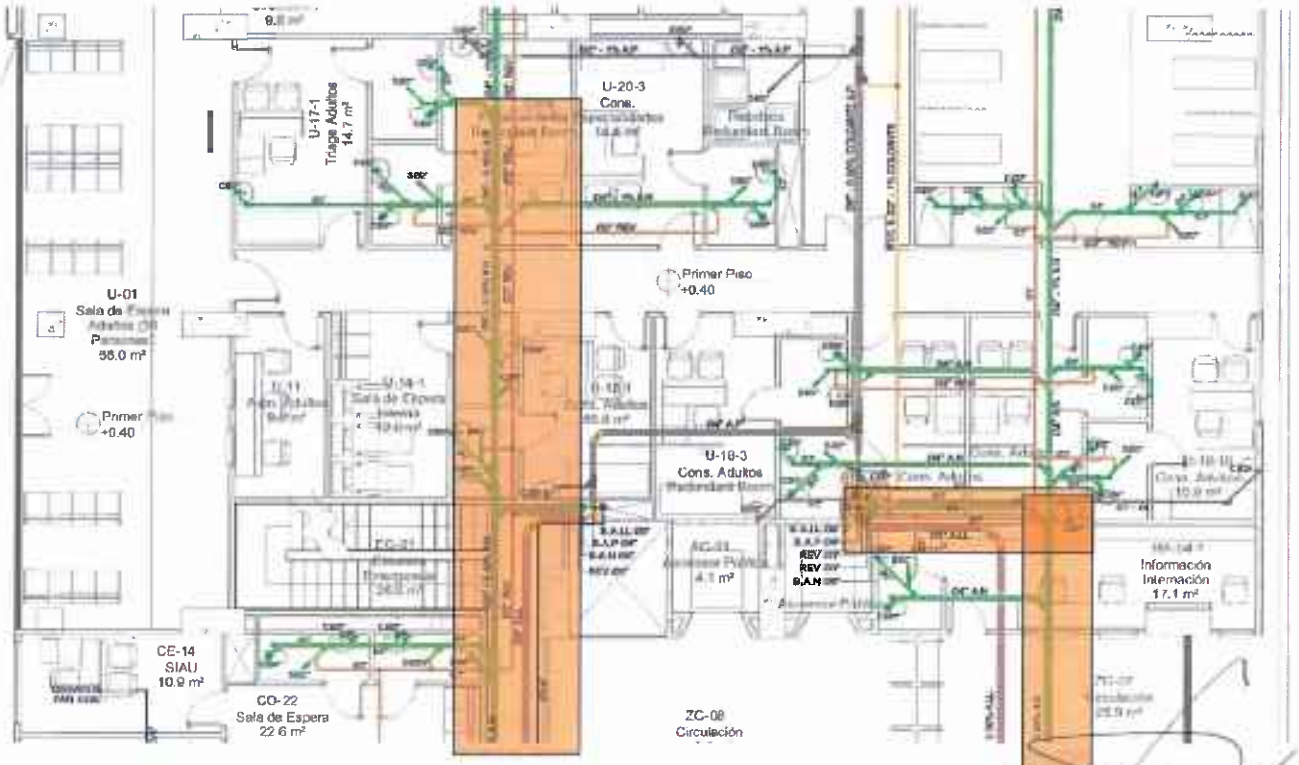

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y EJE A-F					16,00	16,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.15.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

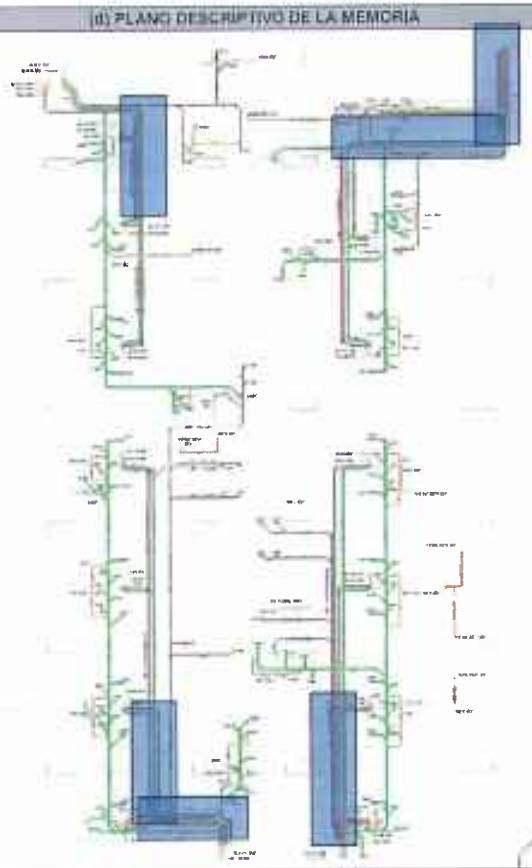

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 3		
		Fecha:	4	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					40,00	40,00
			PASAN			40,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 3 de 3	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

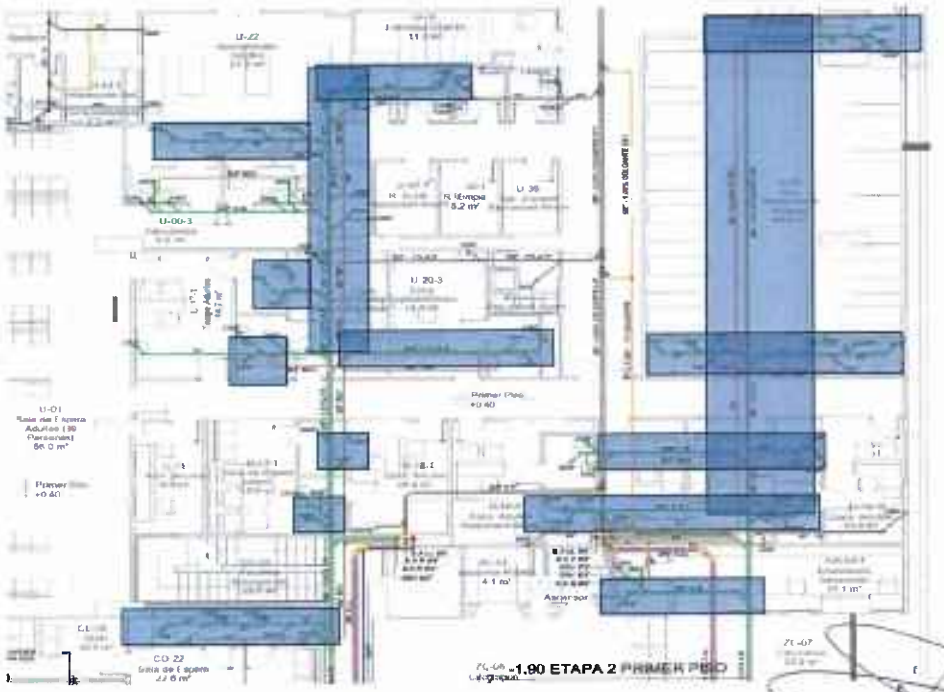

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. III	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					30,00	30,00
SUB TOTAL						30,00
VIENE						40,00
PASAN						70,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

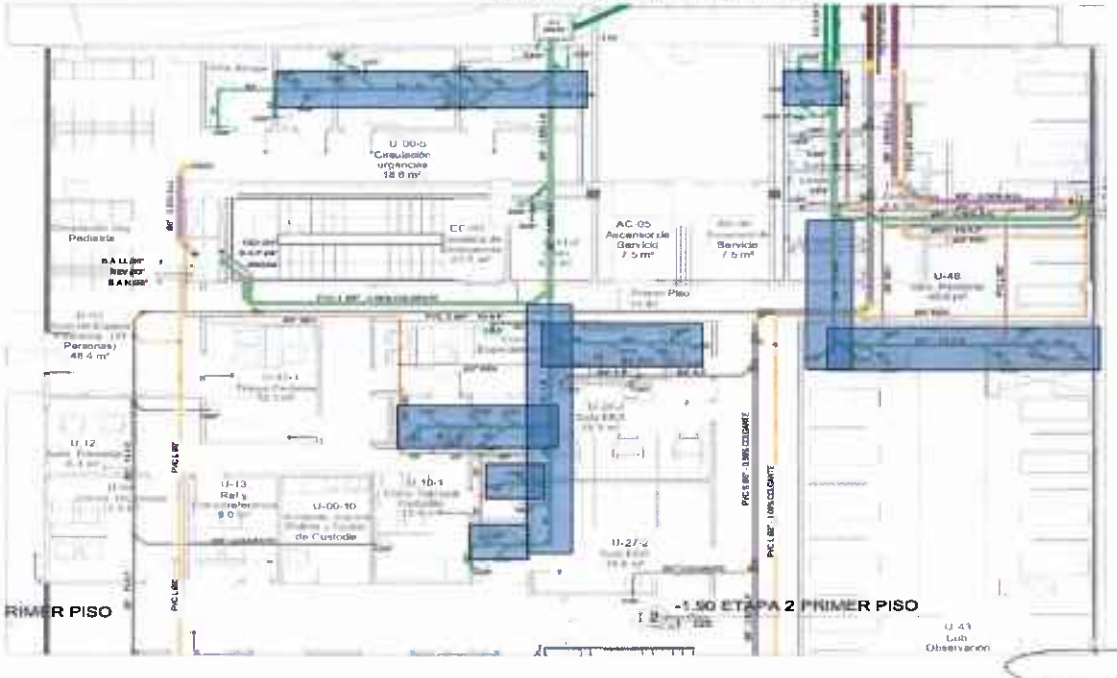

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUDO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					36,00	36,00
SUB TOTAL						36,00
VIENE						70,00
PASAN						106,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión: No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

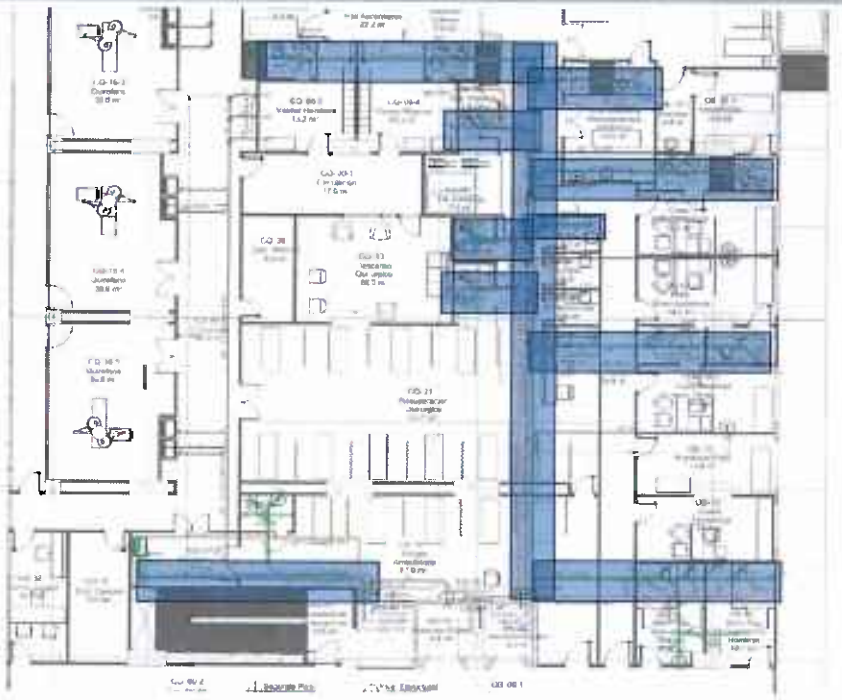

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.15.17**	**DESCRIPCION ITEM**	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					20,00	20,00
				SUB TOTAL		20,00
				VIENE		106,00
				PASAN		126,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

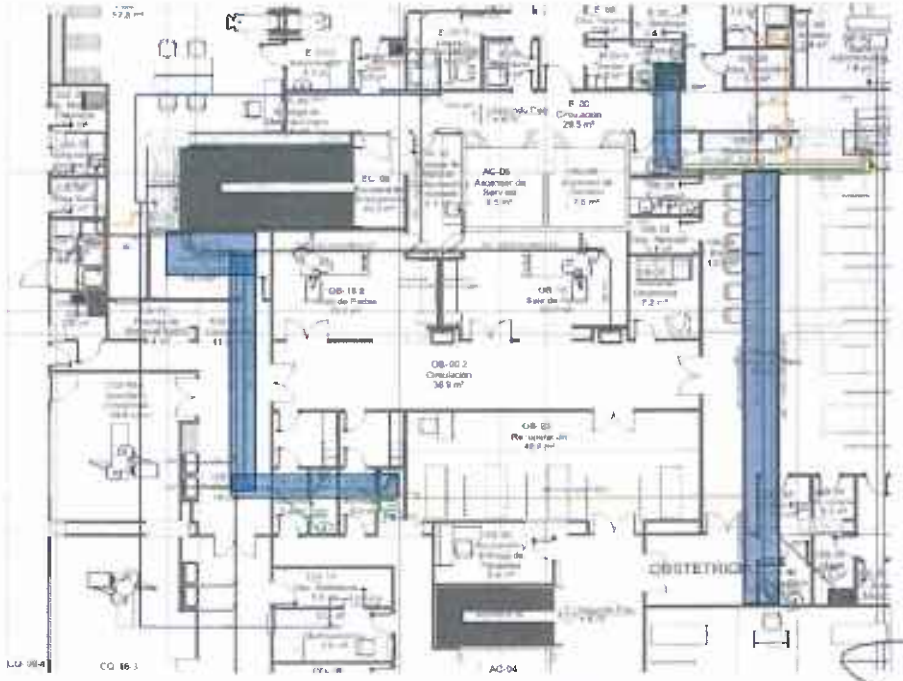

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					40,00	40,00
SUB TOTAL						40,00
VIENE						126,00
PASAN						166,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 02 | Página 3 de 5 Fecha: 5 | 4 | 2025	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

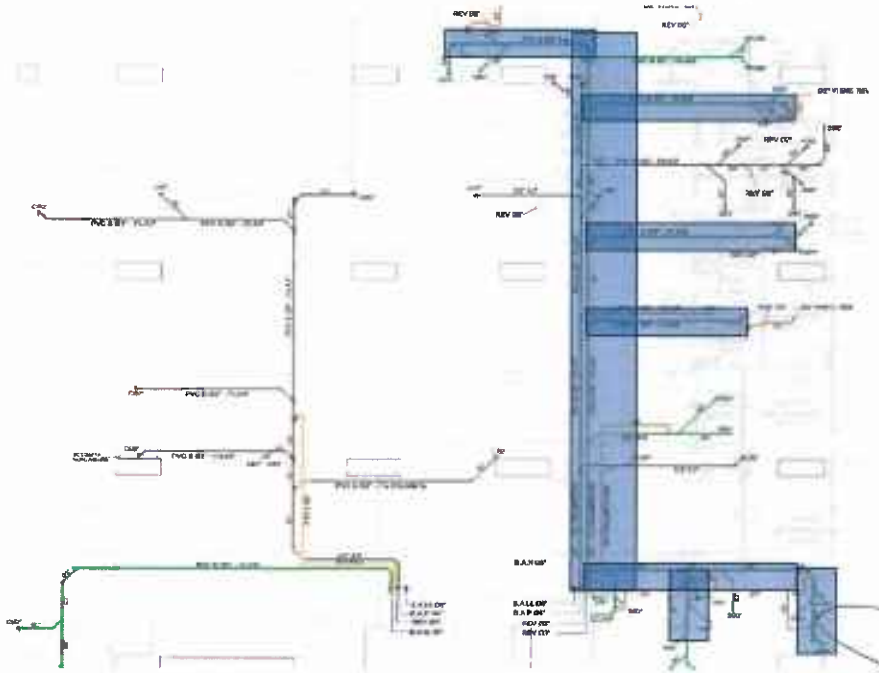

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 3 de 3	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					25,00	25,00
SUB TOTAL						25,00
VIENE						166,00
PASAN						191,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

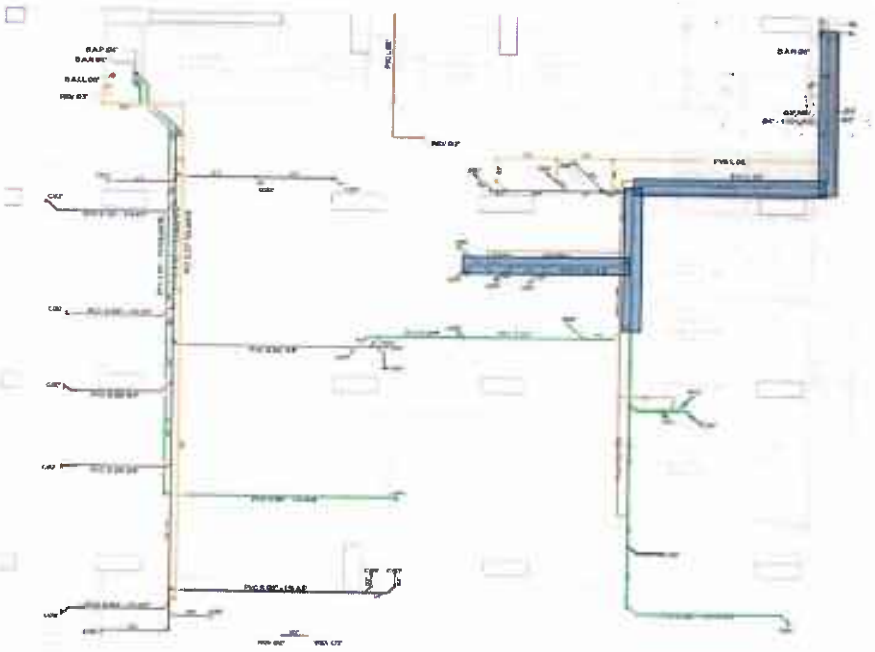

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					60,00	60,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 5	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

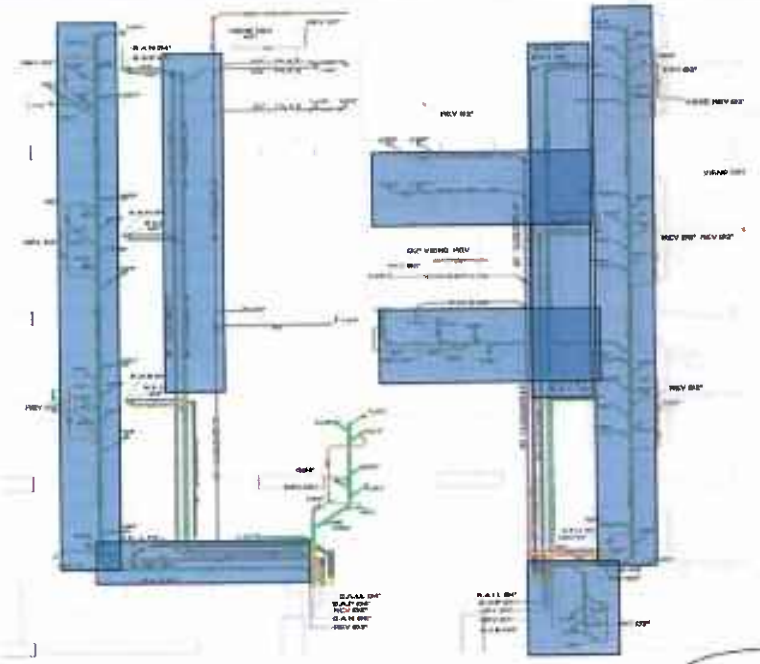

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					50,00	50,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

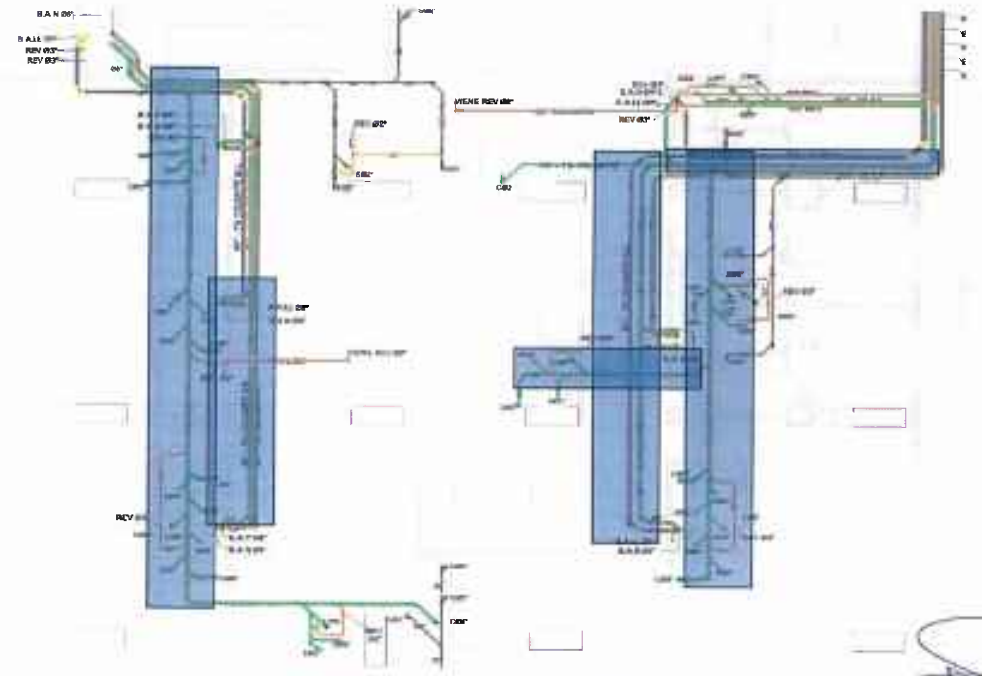

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.18	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

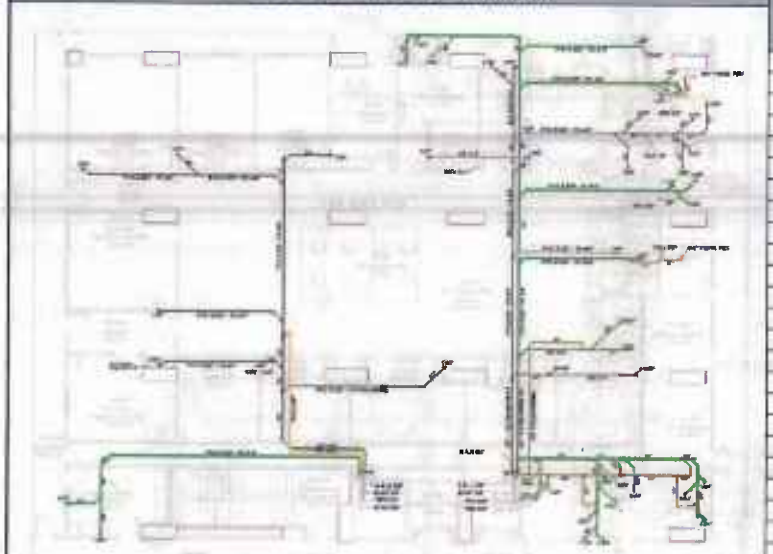

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2 Y EJE B-D					5,00	5,00
TOTAL						5,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.18	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

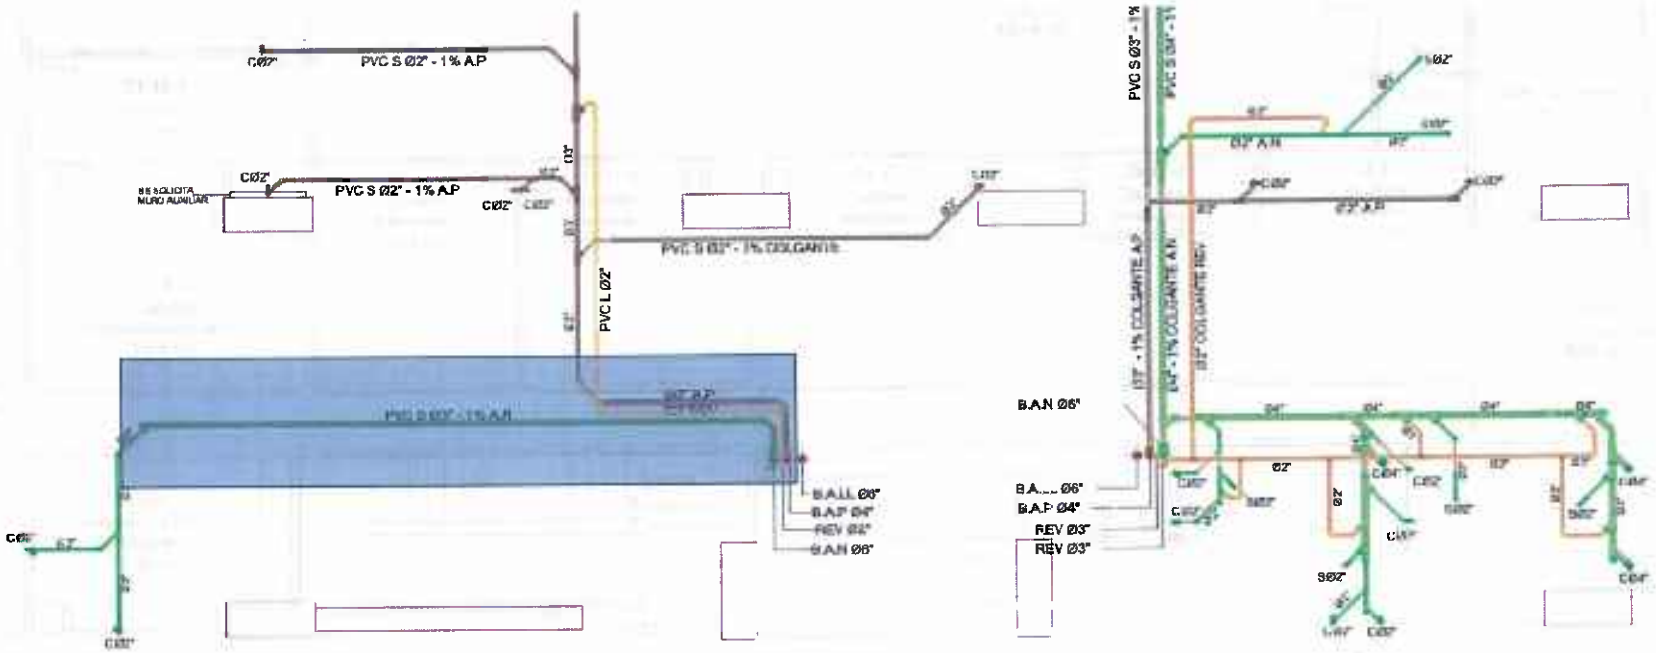

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 2	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y A-F					80,00	80,00
			PASAN			80,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2021

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

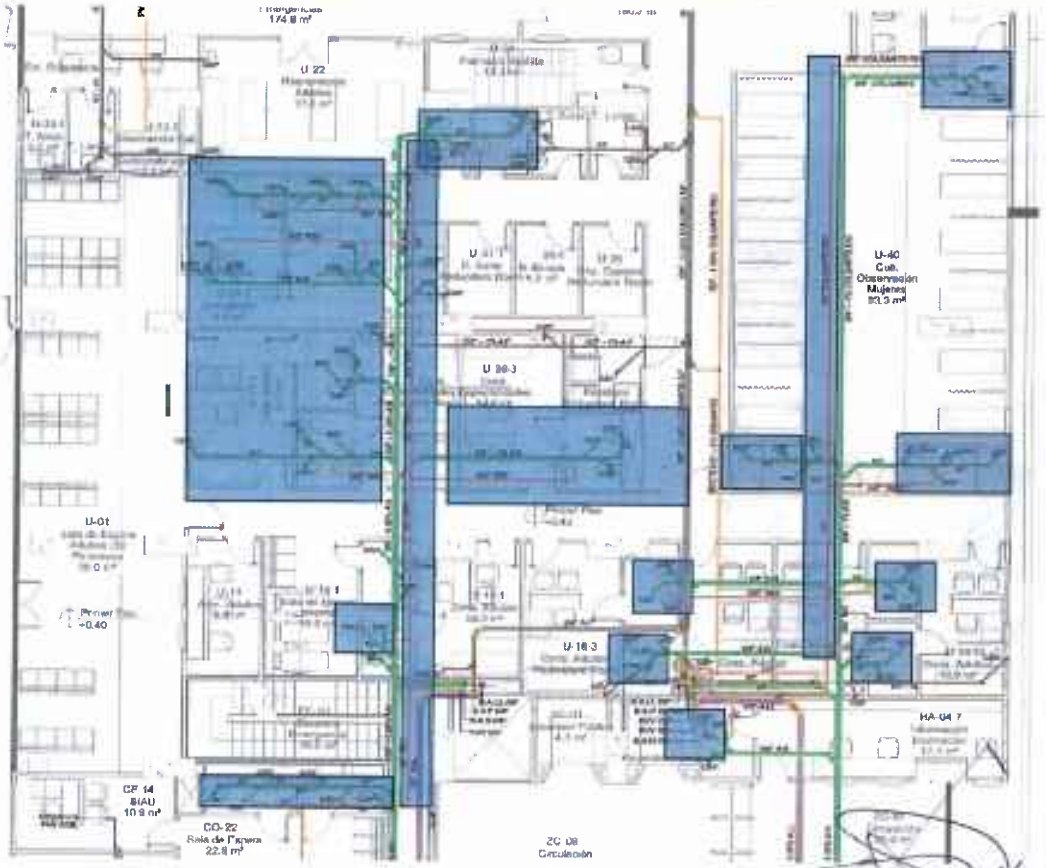

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM:	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					80,00	80,00
SUB TOTAL						80,00
VIENE						80,00
PASAN						160,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

1d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

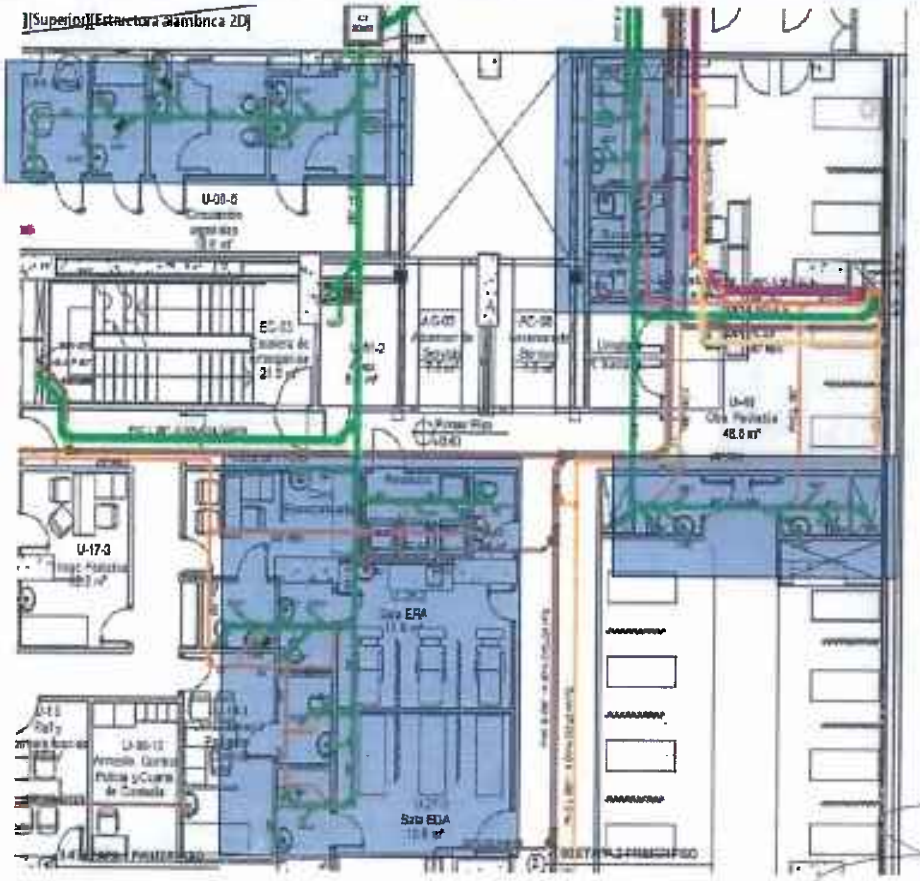

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Locano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EL EJE 2-5 EJE A-F					70,00	70,00
SUB TOTAL						70,00
VIENE						160,00
PASAN						230,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

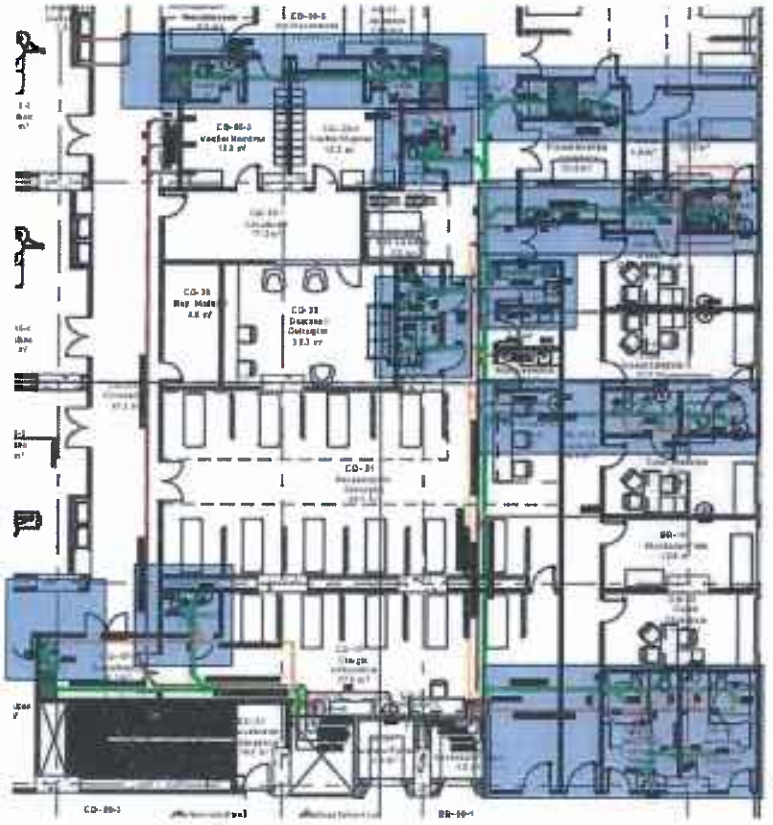

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No. 09		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

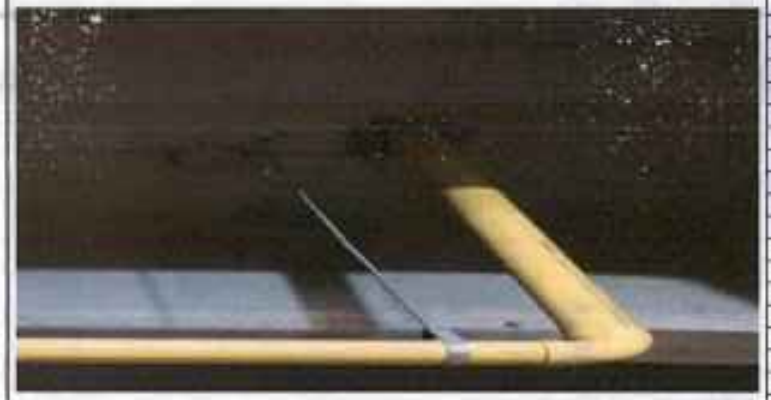

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					35,00	35,00
				SUB TOTAL		35,00
				VIENE		230,00
				PASAN		265,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

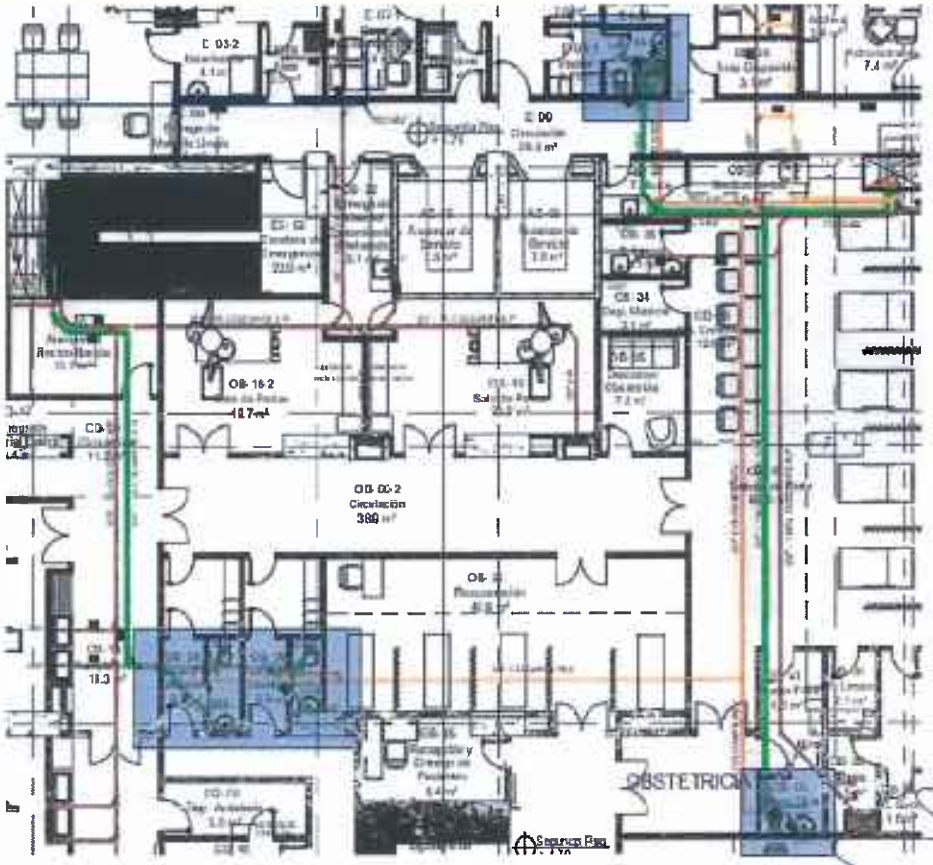

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/mt			
TERCER PISO						
ENTREEJE 2-5 EJE A-F					20,00	20,00
SUB TOTAL						20,00
VIENE						265,00
PASAN						285,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-35			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

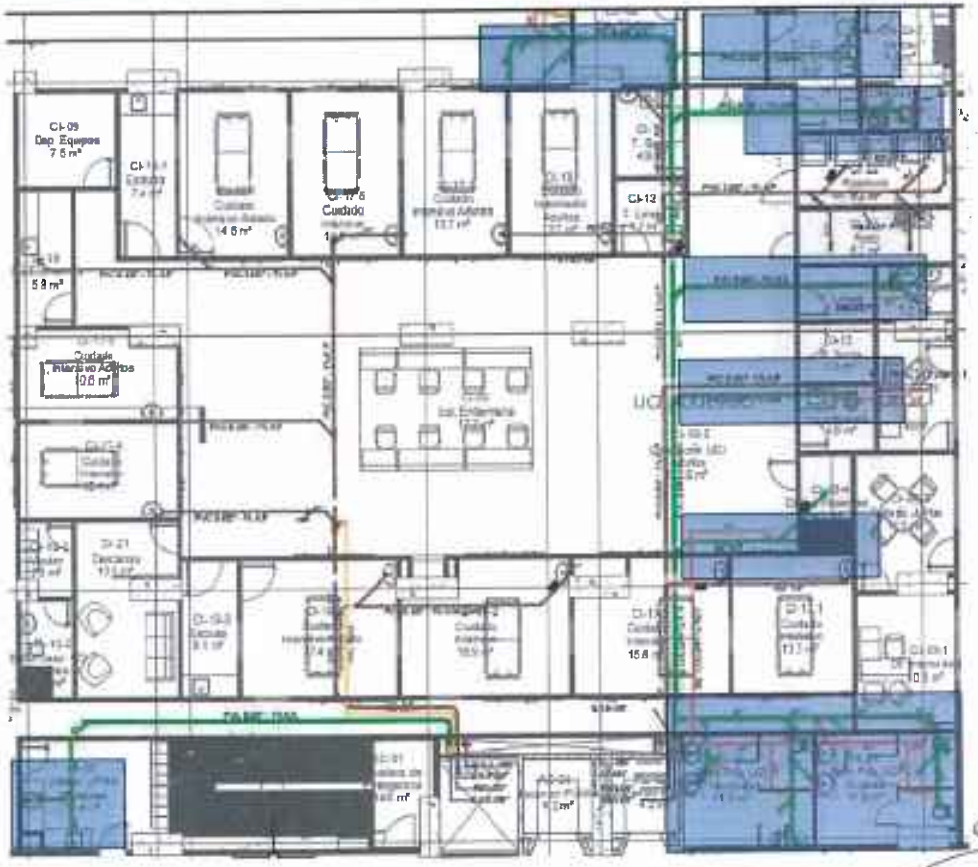

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 09	Pagina 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					20,00	20,00
SUB TOTAL						20,0
VIENE						285,00
PASAN						305,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

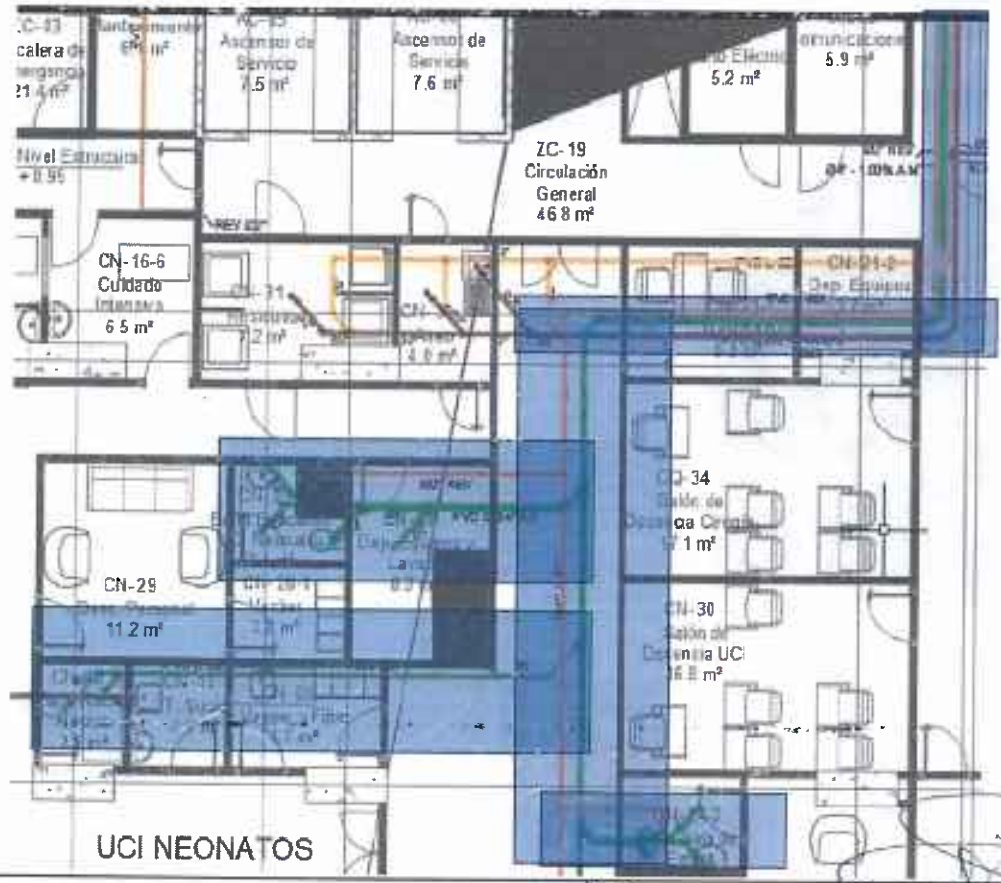

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EL EJE 2-5 EJE A-F					23,00	23,00
SUB TOTAL						23,00
VIENE						305,00
PASAN						328,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

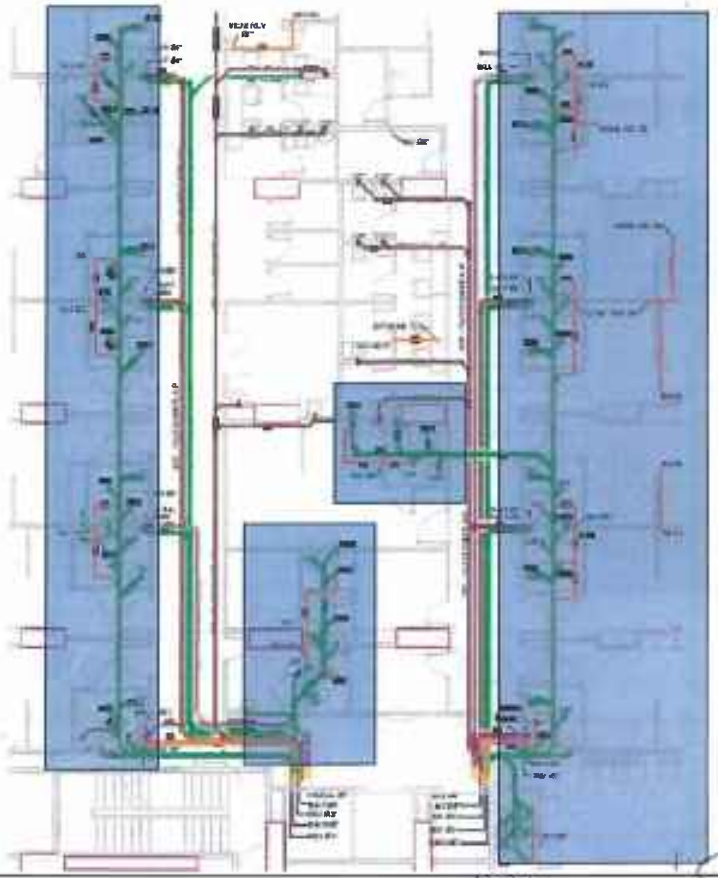

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					50,00	50,00
				SUB TOTAL		50,00
				VIENE		328,00
				TOTAL		378,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.19	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

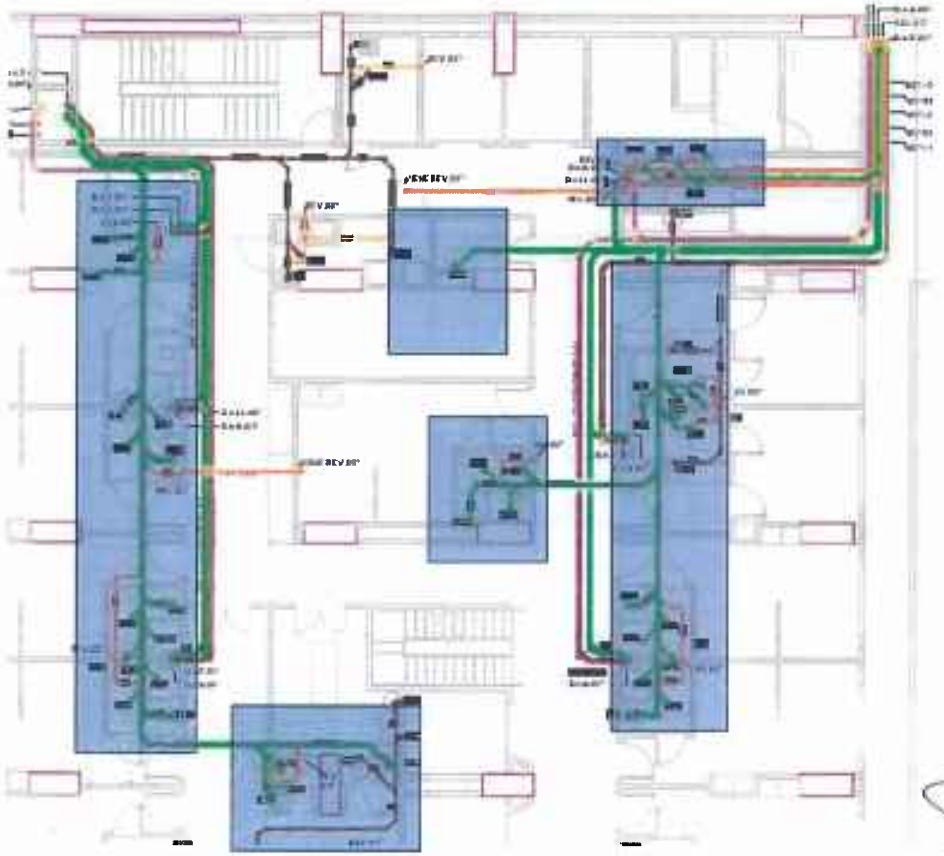

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.20	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2 A					1,00	1,00
ENTRE EJE 2 EJE E					1,00	1,00
ENTRE EJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTRE EJE 9 EJE C					1,00	1,00
PASAN						4,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.20	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

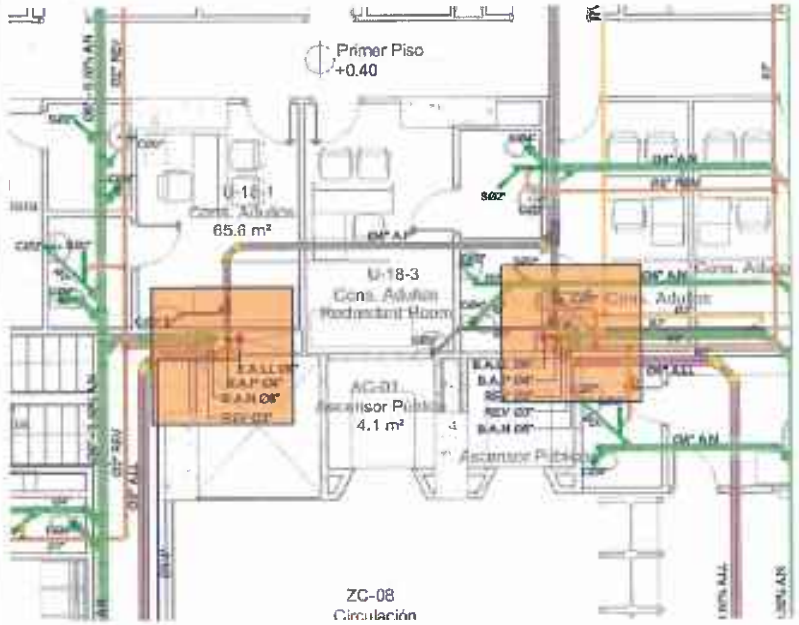

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.20	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

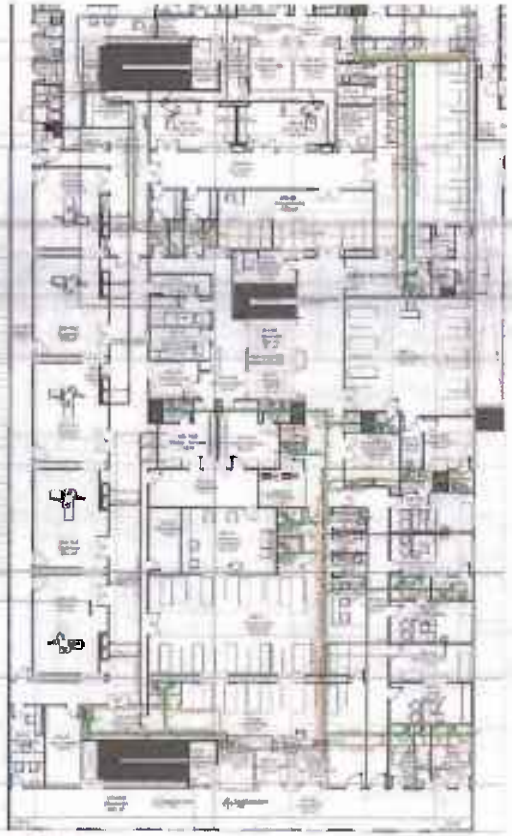

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGNDO PISO						
ENTRE EJE 2 A					1,00	1,00
ENTRE EJE EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE C					1,00	1,00
SUB TOTAL						4,00
VIENE						4,00
PASAN						8,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.20	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

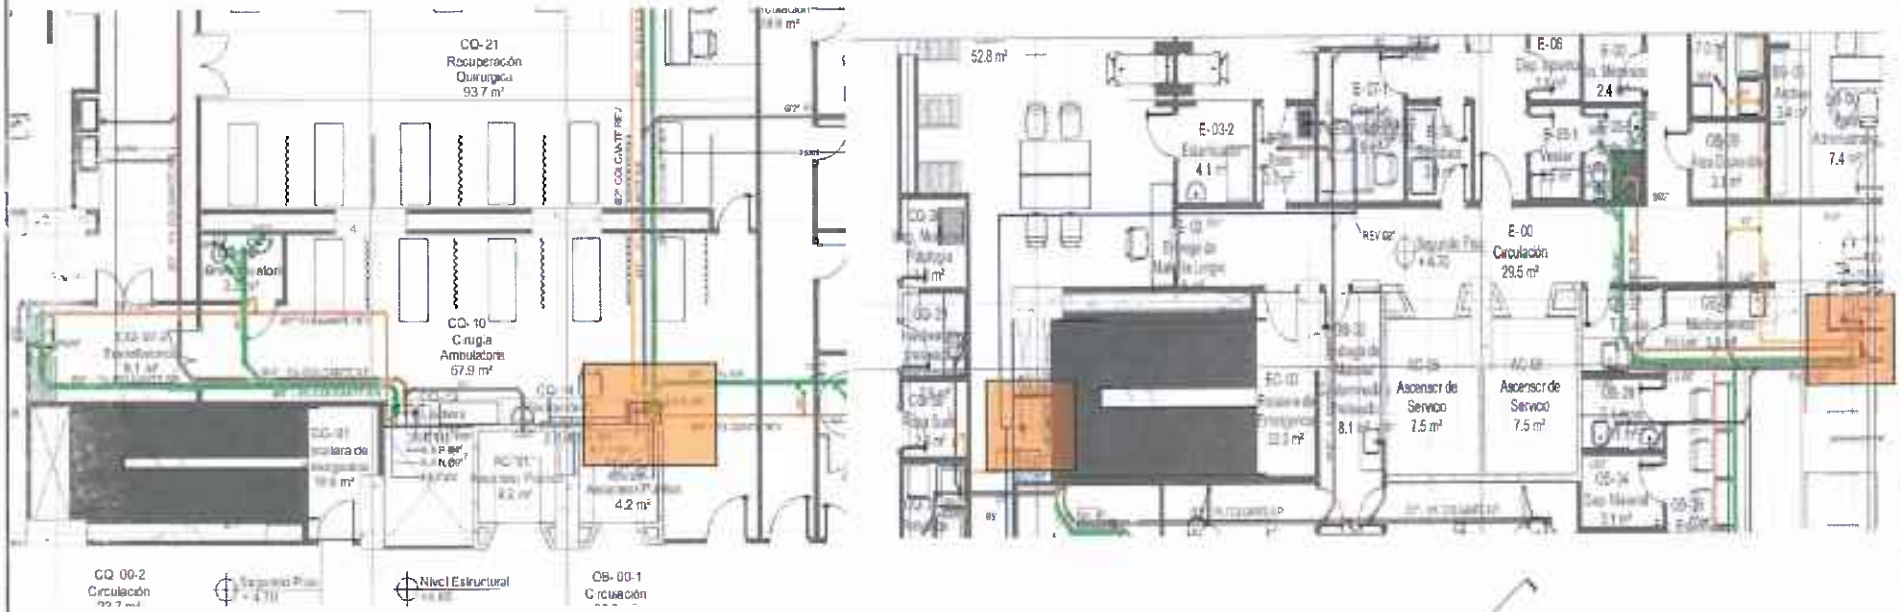

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.21	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

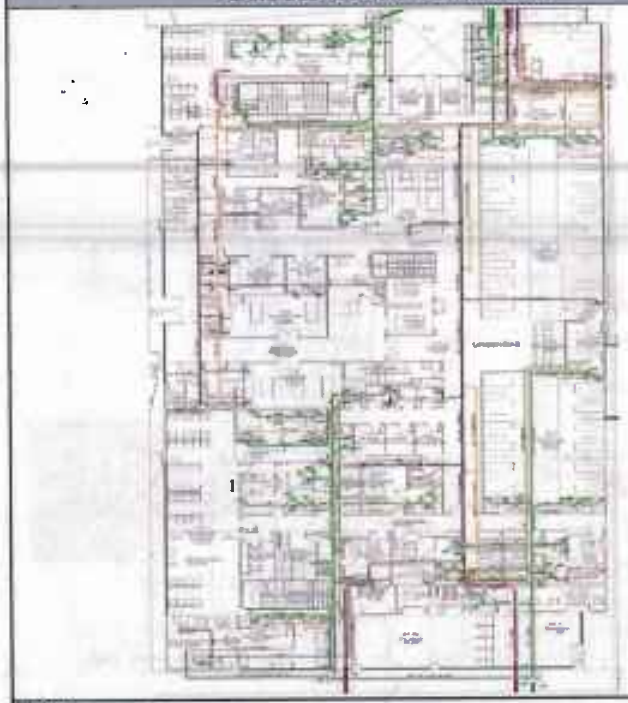

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE C					1,00	1,00
PASAN						3,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.21	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

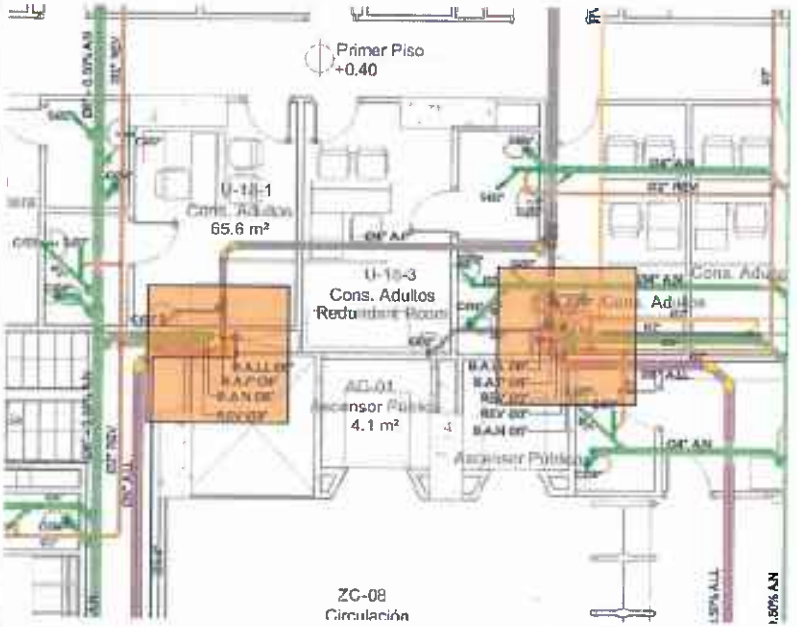

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.15.20**	**DESCRIPCION ITEM**	Abrazadera mordaza Ø6"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2 A						
ENTRE EJE E JE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE C					1,00	1,00
SUB TOTAL						3,00
VIENE						8,00
TOTAL						11,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.20	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

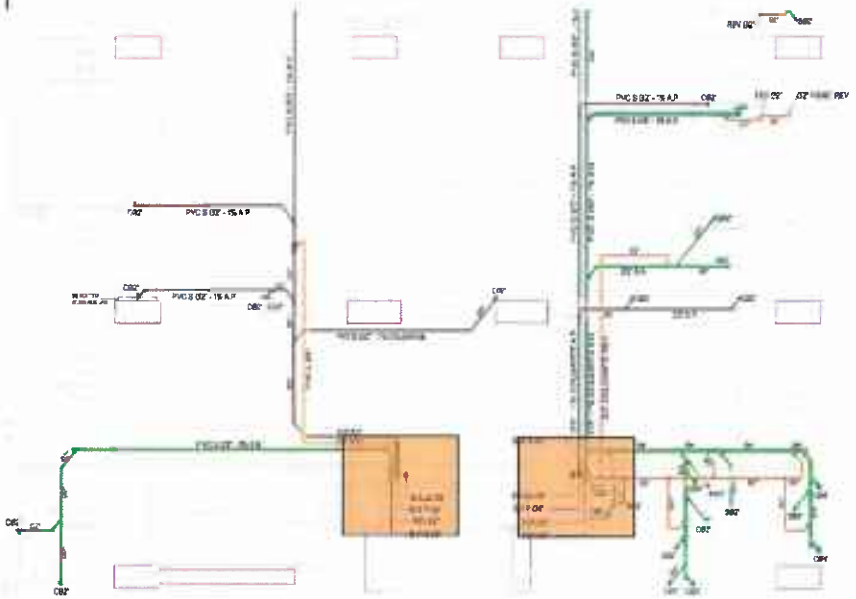

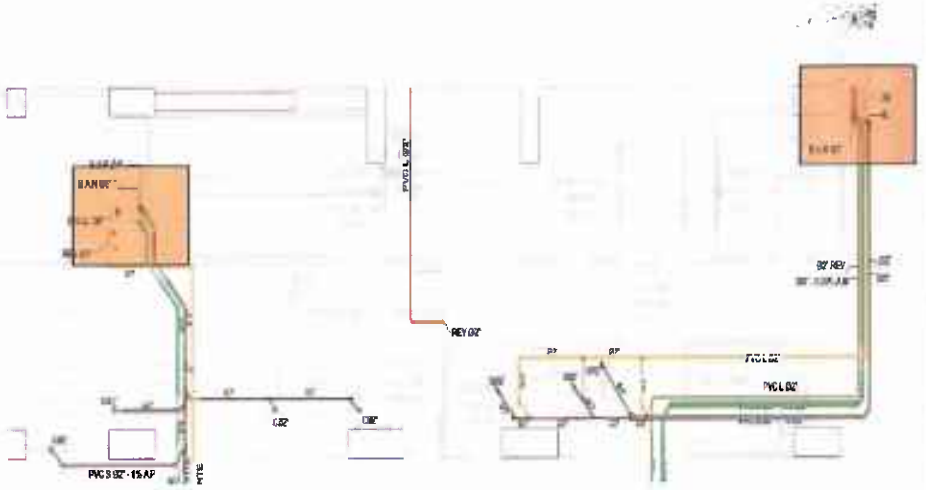

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.15.21**	**DESCRIPCION ITEM**	Abrazadera mordaza Ø4"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

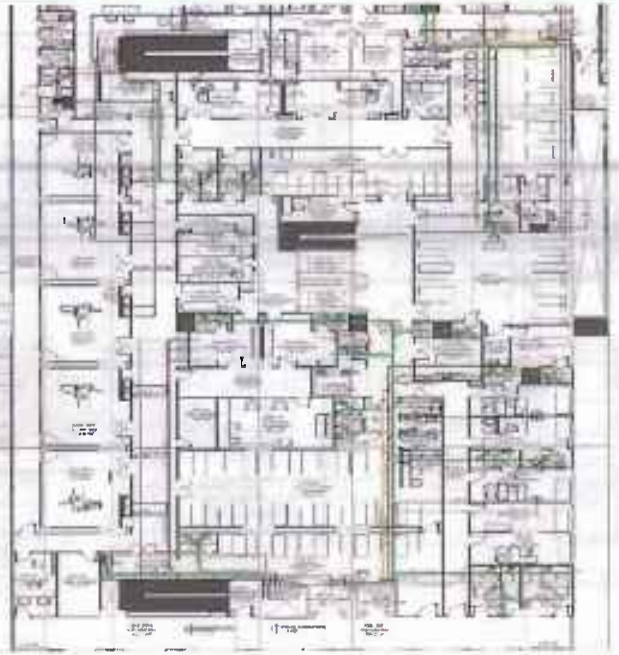

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
SEGNDO PISO						
ENTRE EJE 2 A						
ENTRE EJE EJE F					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 5 EJE C					1,00	1,00
SUB TOTAL						3,00
VIENE						3,00
PASAN						6,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.21	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

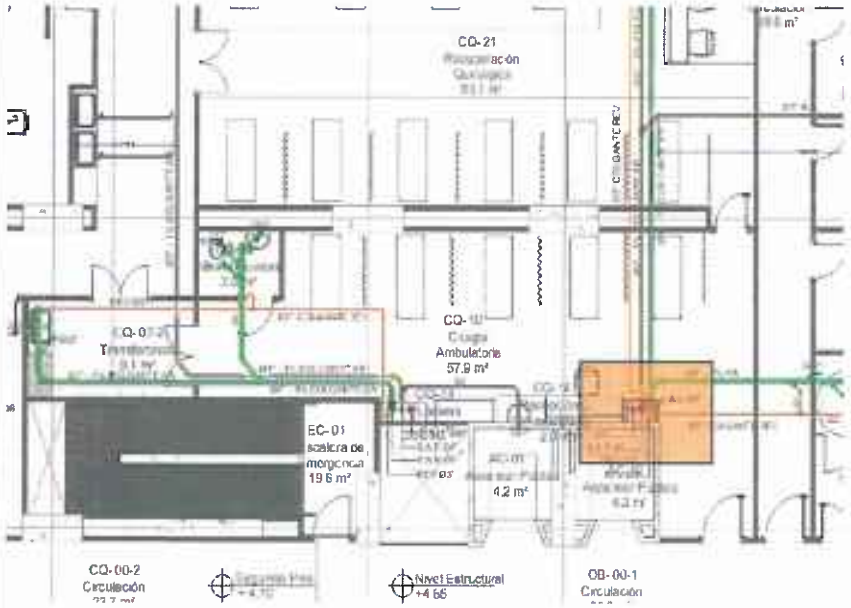

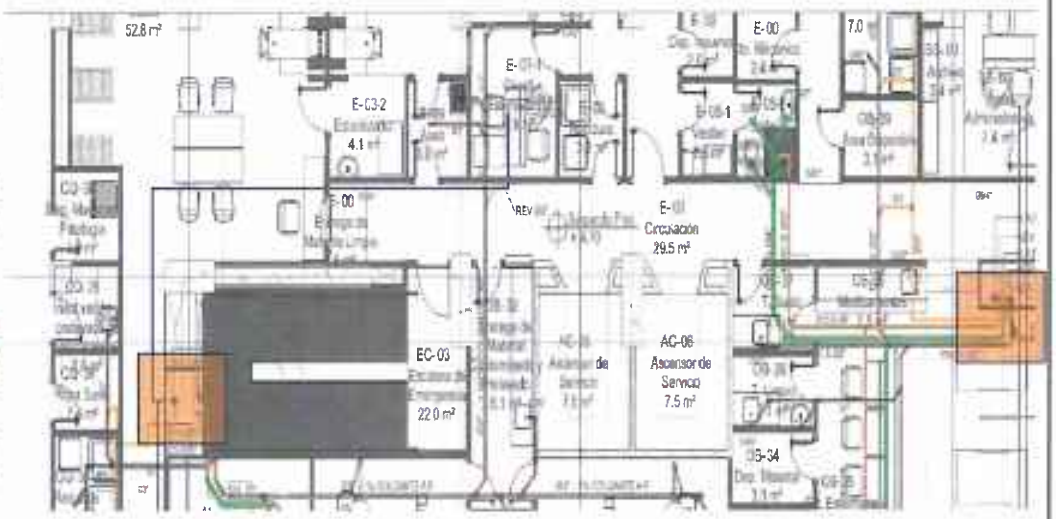

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.21	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

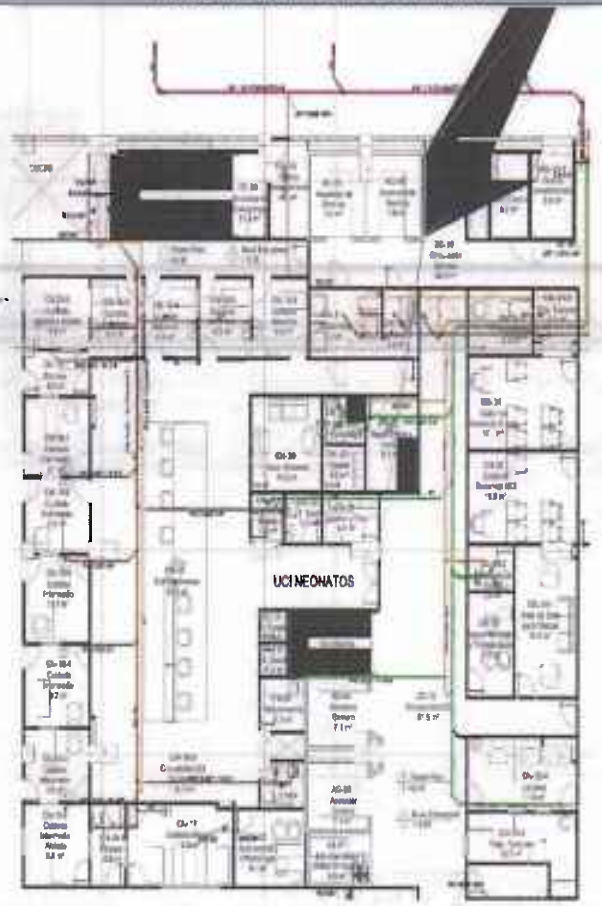

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2 A						
ENTRE 2 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE E					1,00	1,00
ENTREEJE 9 EJE C					1,00	1,00
SUB TOTAL						3,00
VIENE						6,00
TOTAL						9,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.21	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera mordaza Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

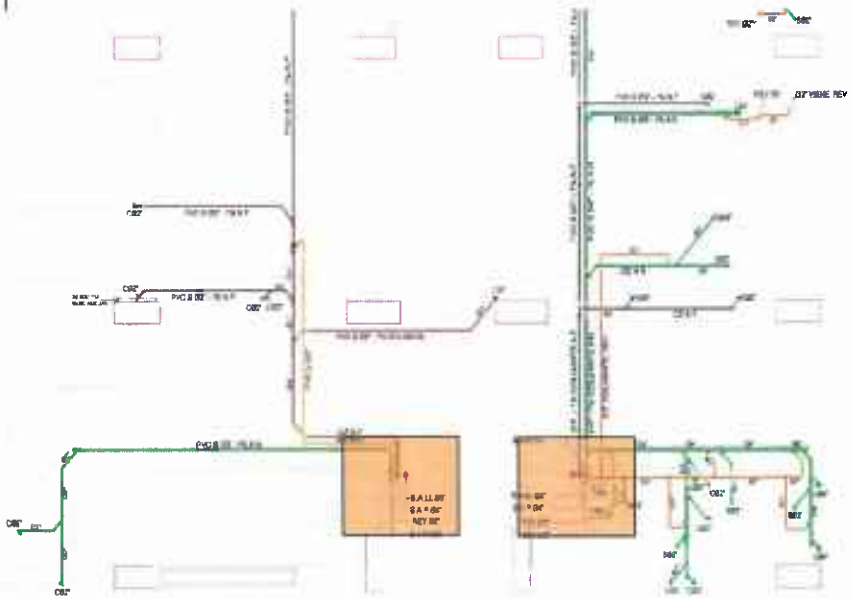

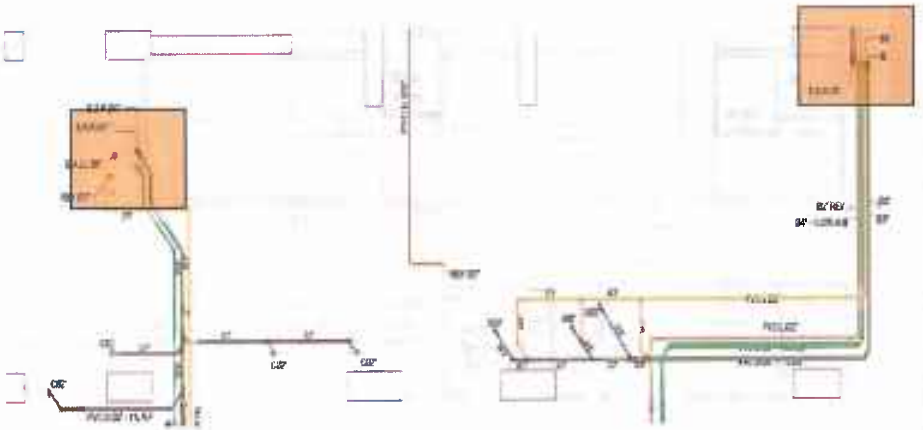

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 08	Página 1 de 2		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

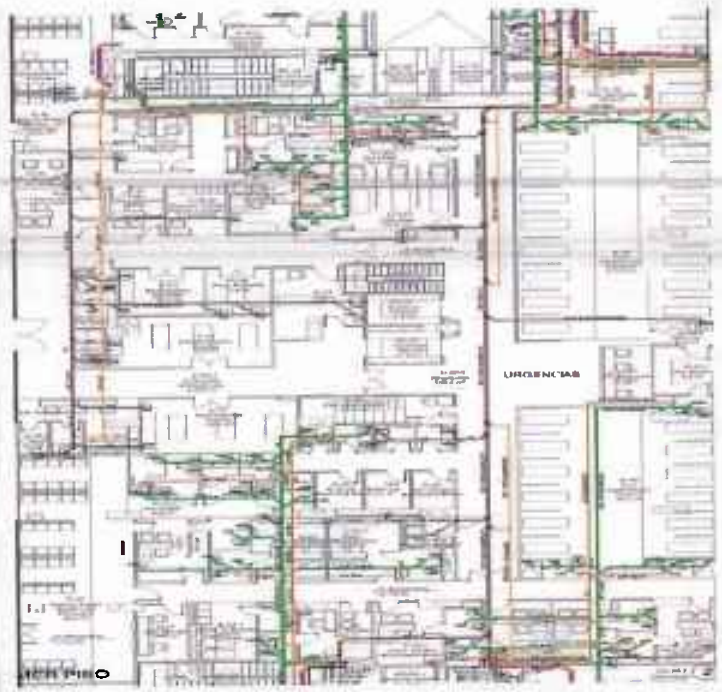

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 A-F		60,00				60,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø6"			UND:	ML

(@) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

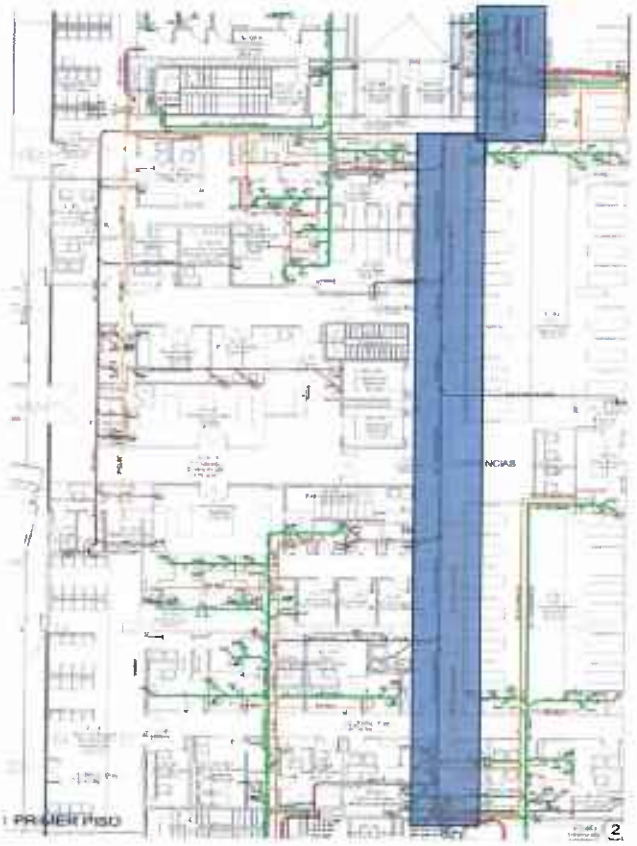

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

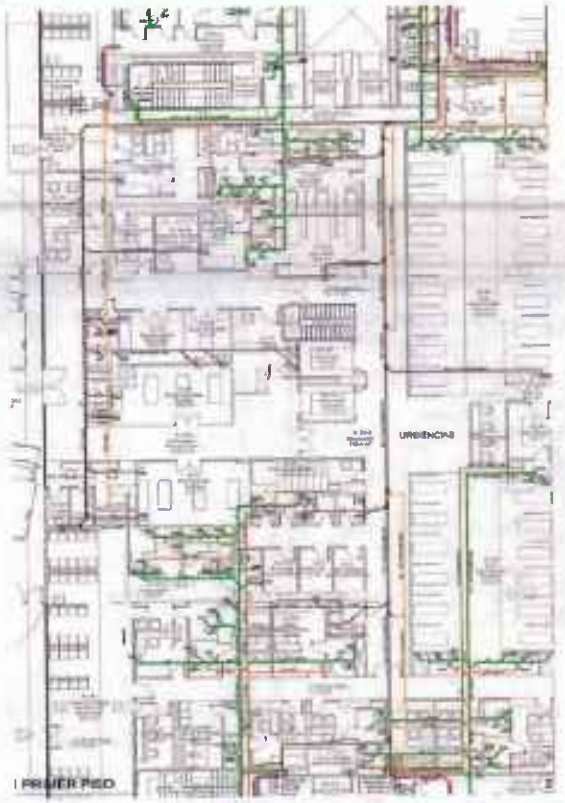

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 Y A-F		30,00				30,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO 2 EN EL 2 EJE F		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE F		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE B		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE B		6,00				6,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

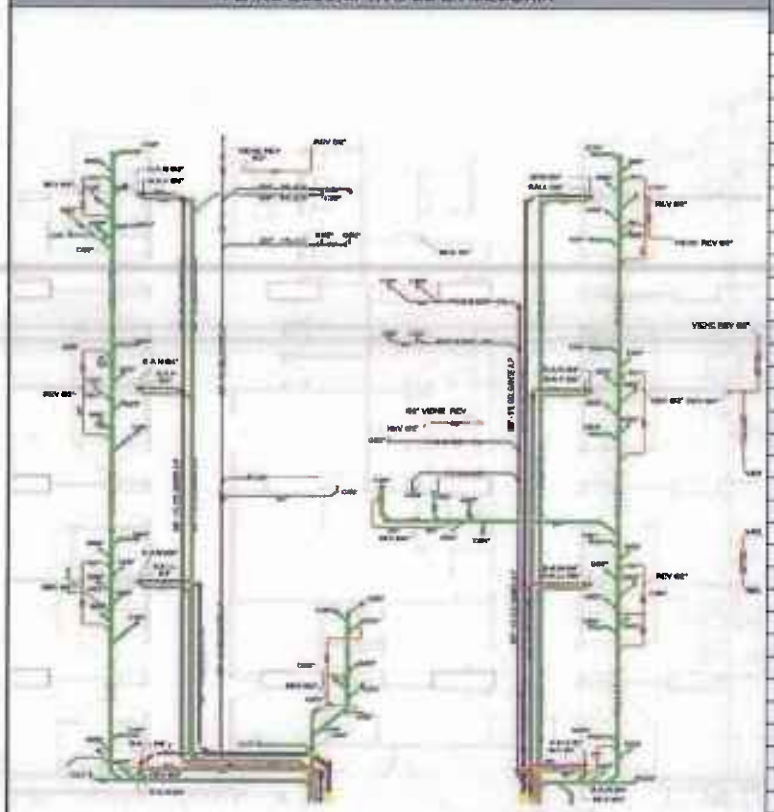

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F		45,00				45,00
SUB TOTAL						45,00
VIENE						66,00
PASAN						111,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

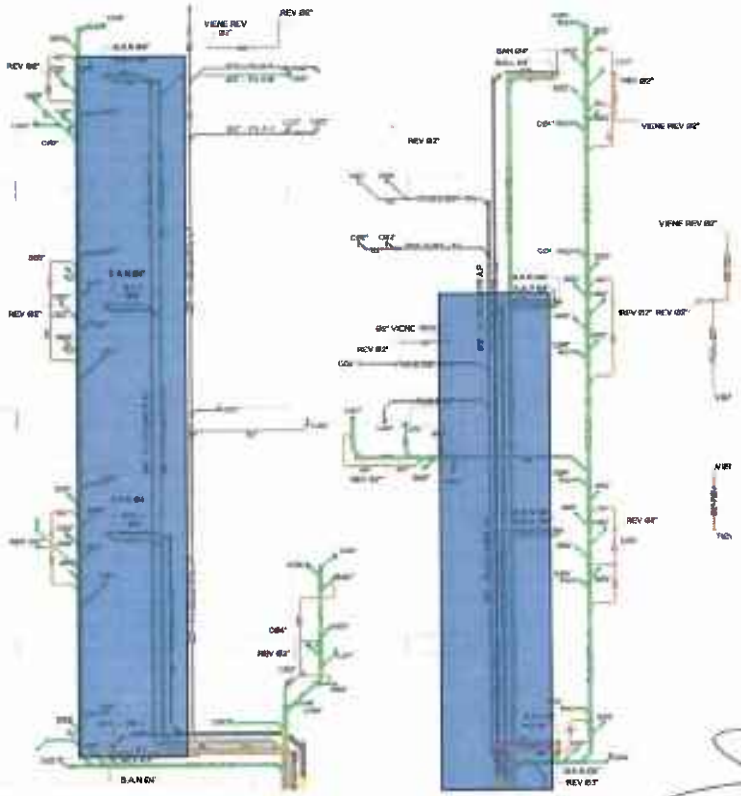

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

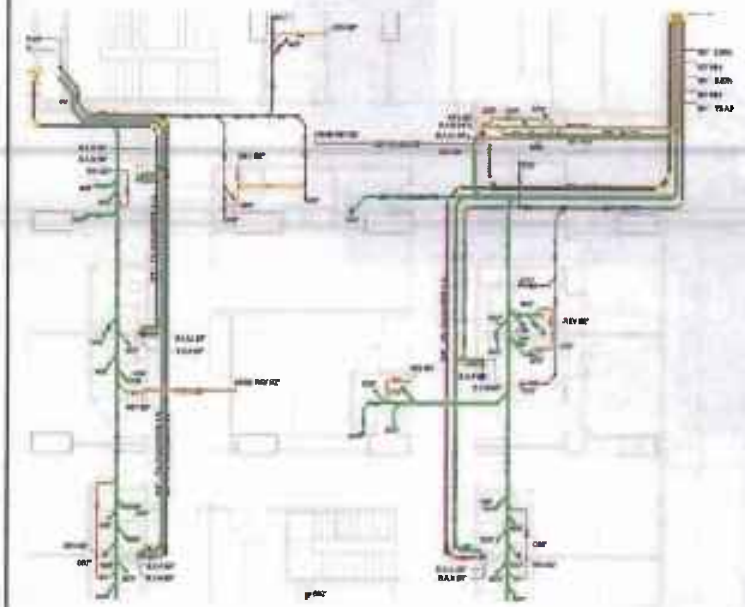

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		37,00				37,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 2 EJE F BAJANTES		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE FBAJANTES		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE FBAJANTES		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F BAJANTES		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE B - BAJANTES		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE B - BAJANTES		6,00				6,00
					SUB TOTAL	73,00
					VIENE	111,00
					TOTAL	184,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

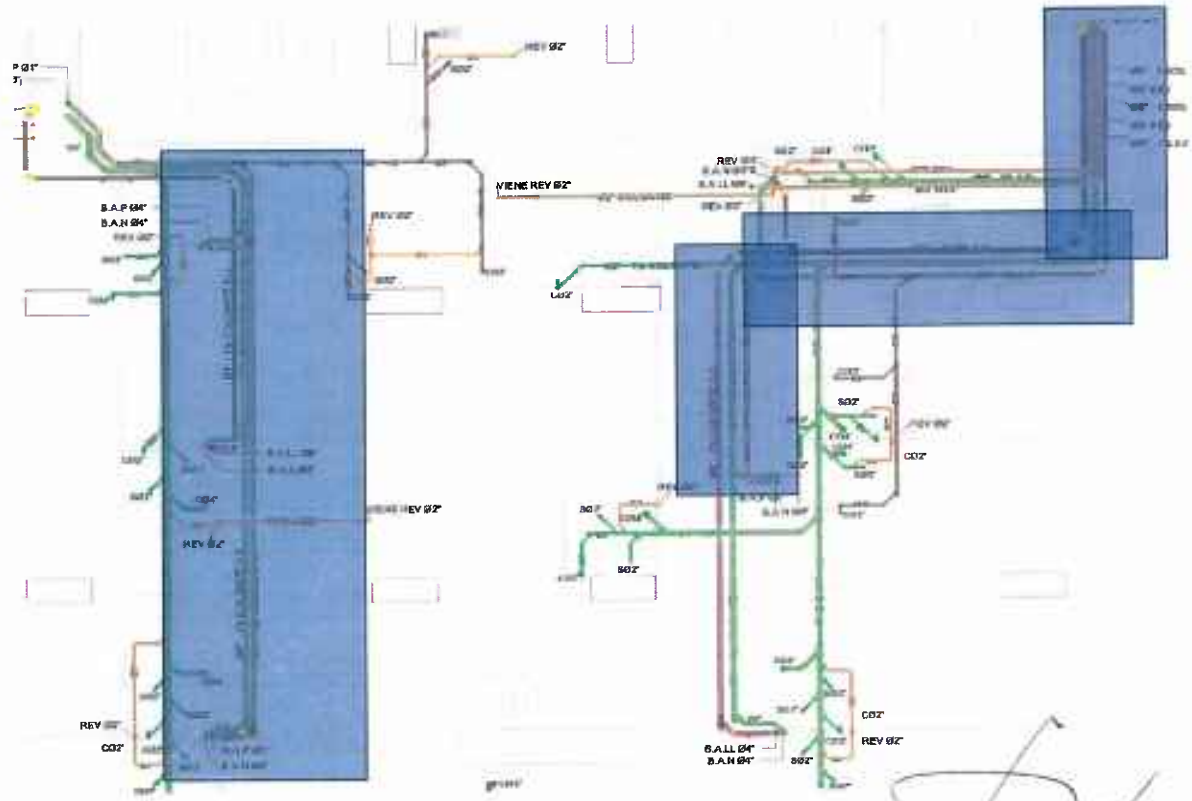

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y A-F		36,00				36,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 2 EJE F BAJANTES REVENTILACION		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE-F EJE FBAJANTES REVENTILACION		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE F BAJANTES		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F BAJANTES		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE B - BAJANTES		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE B - BAJANTES		6,00				6,00
PASAN						72,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Cantillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

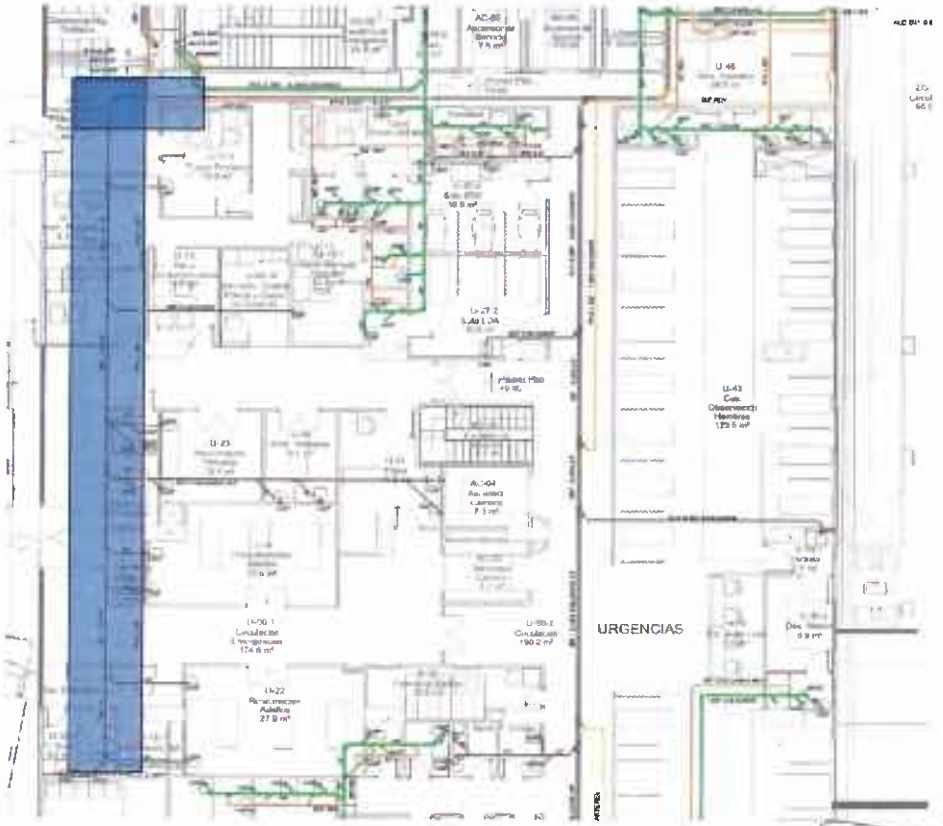

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		45,10				45,10
SUB TOTAL						45,10
VIENE						72,00
PASAN						117,10

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

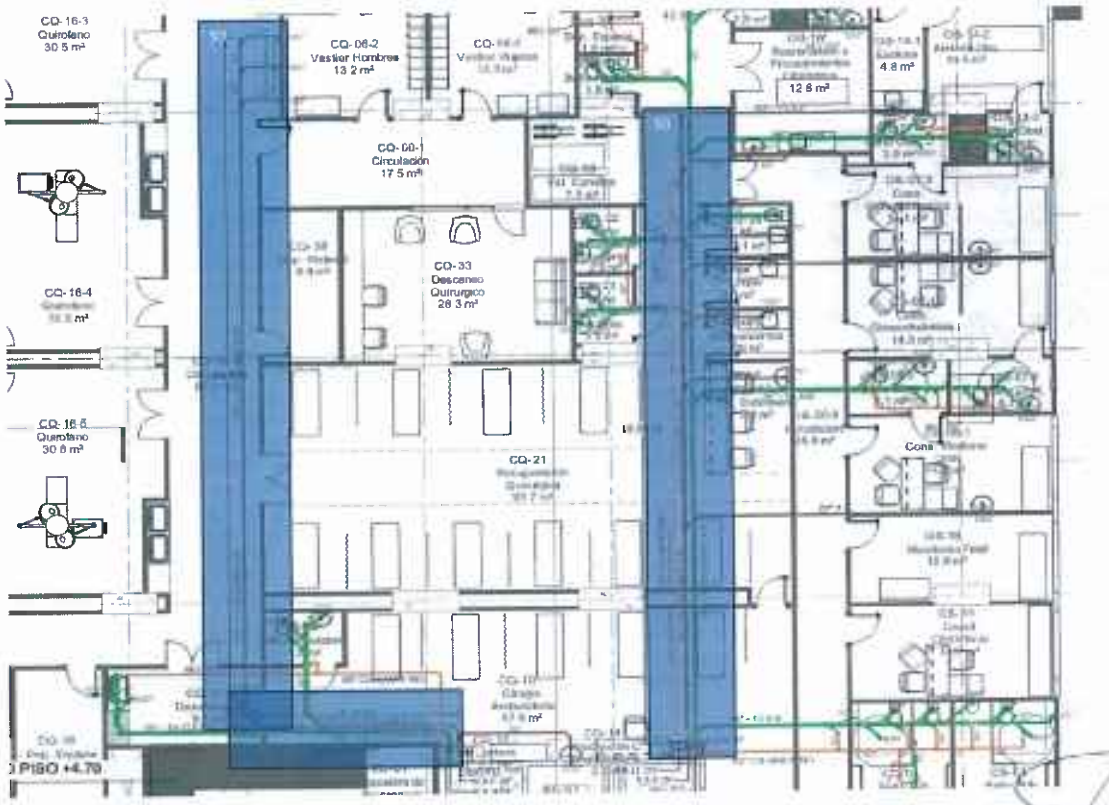

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 3 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

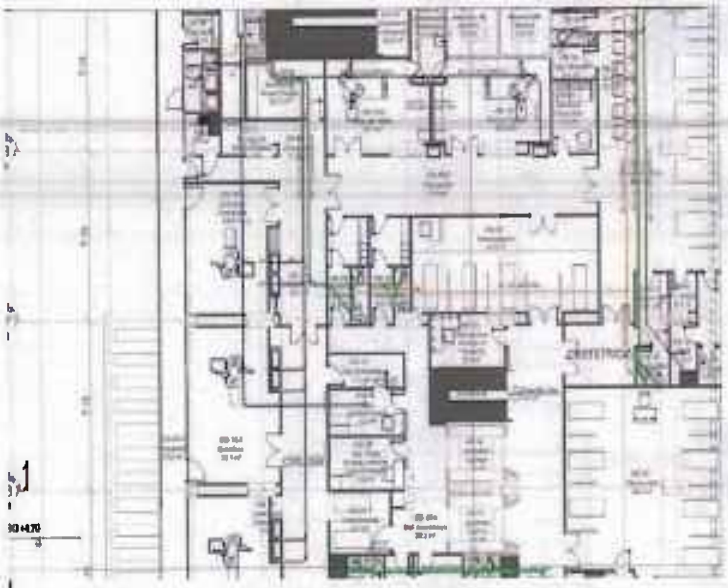

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		48,80				48,80

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø3"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

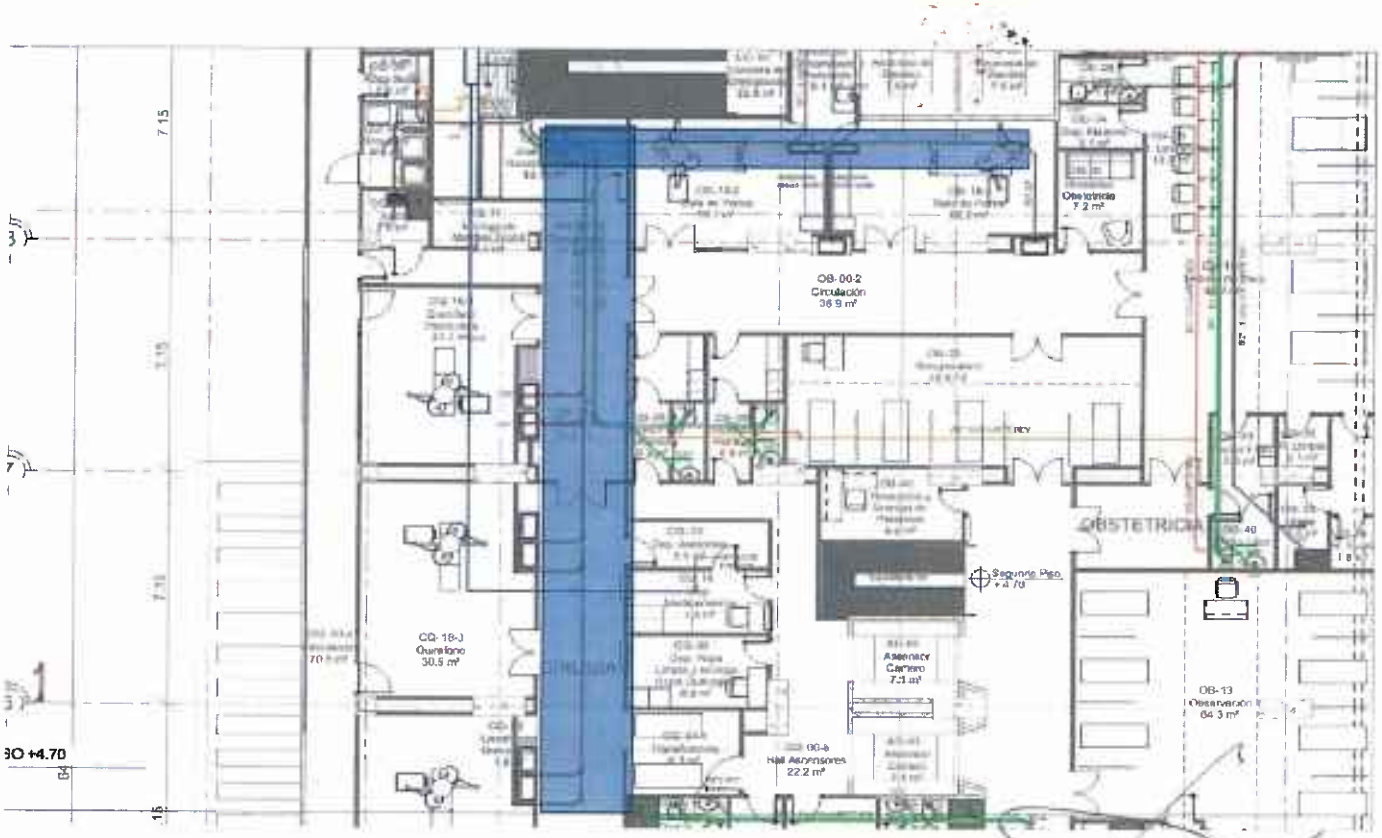

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.16.6**	**DESCRIPCION ITEM**	Tubería PVC sanitaria Ø2"			**UND:**	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y A-F		34,00				34,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

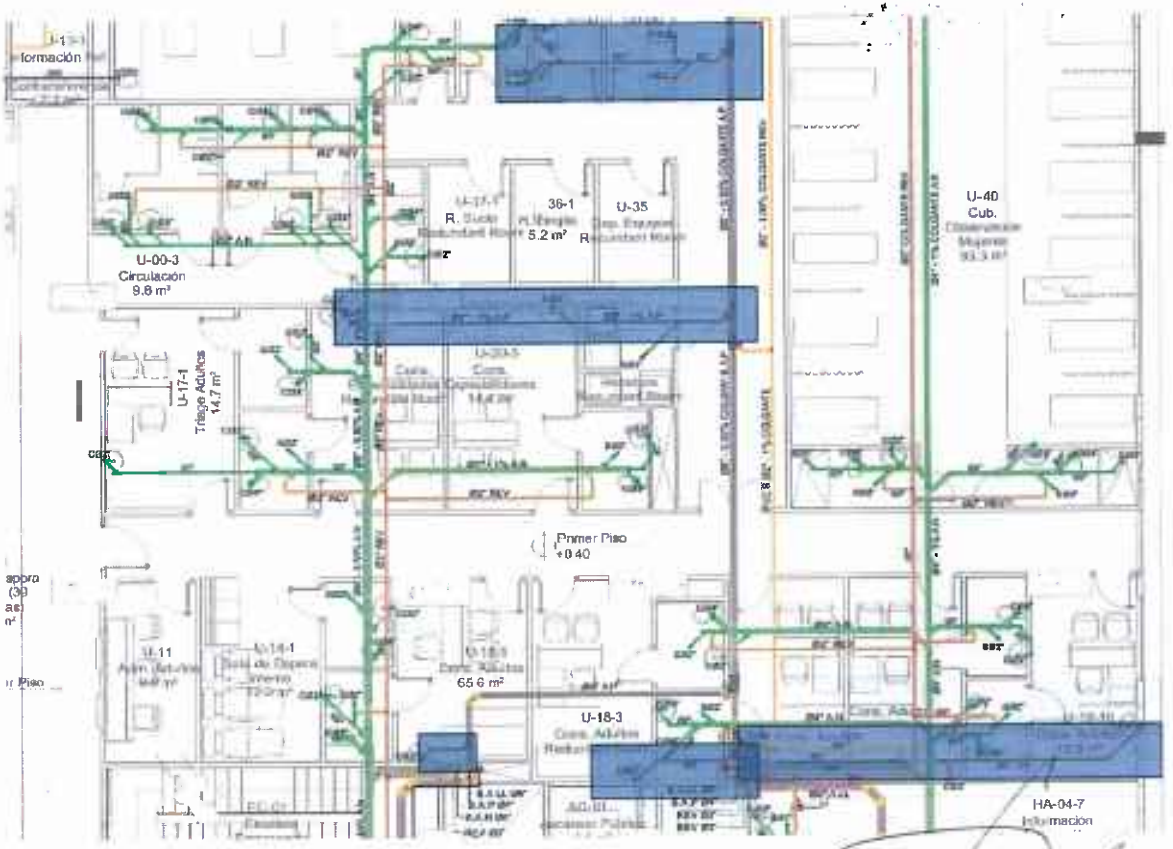

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		91,00				91,00
SUB TOTAL						91,00
VIENE						34,00
PASAN						125,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alejandro Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

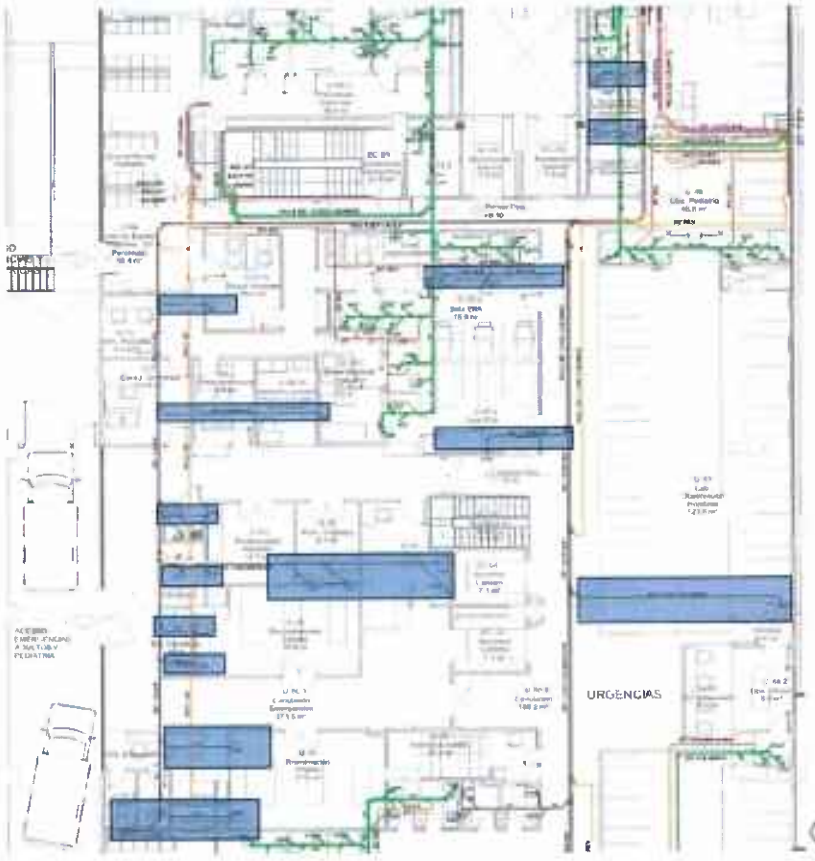

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)			
SEGUNDO PISO						
ENTREE EJE 2,5 EJE A-F		47,25				47,25
SUB TOTAL						47,25
VIENE						125,00
PASAN						172,25

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código FA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

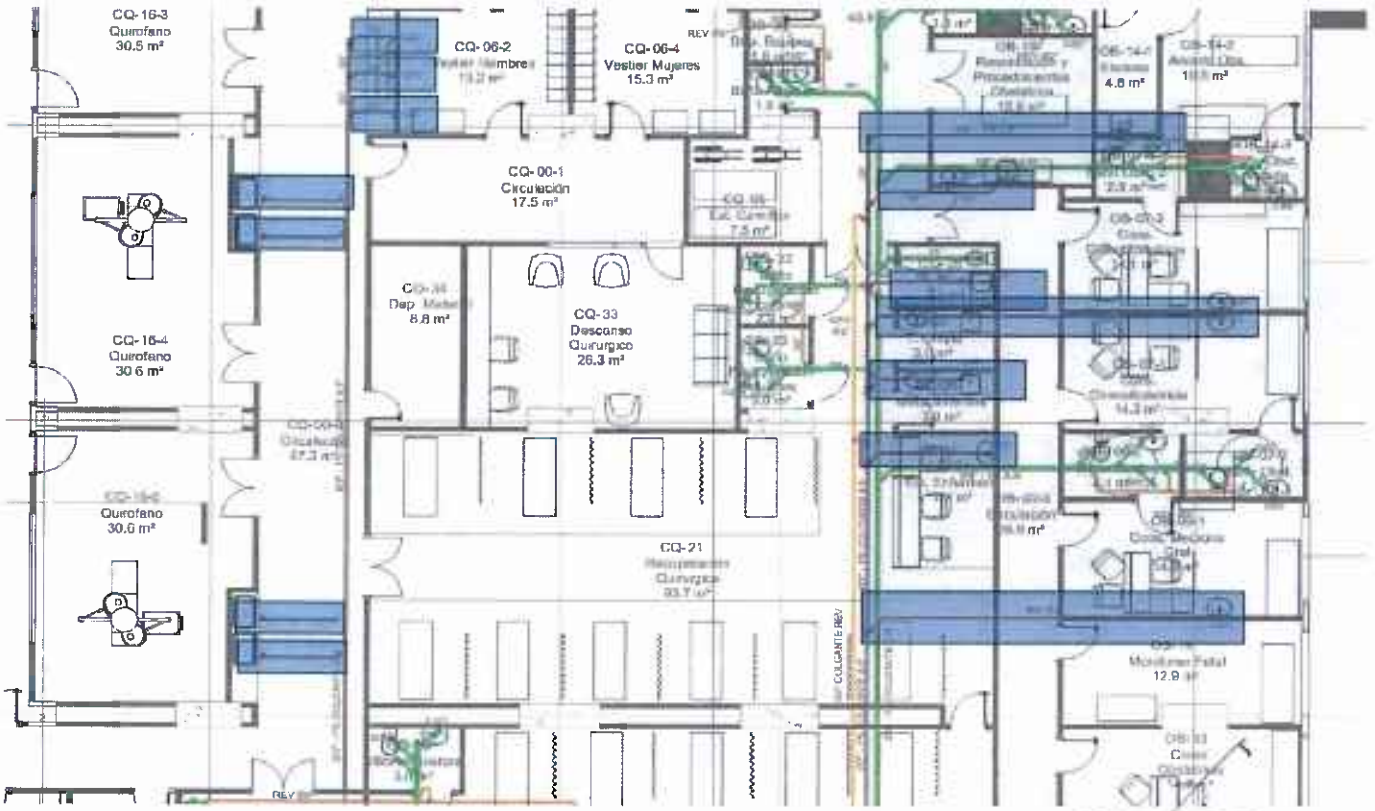

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Jhonatan Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

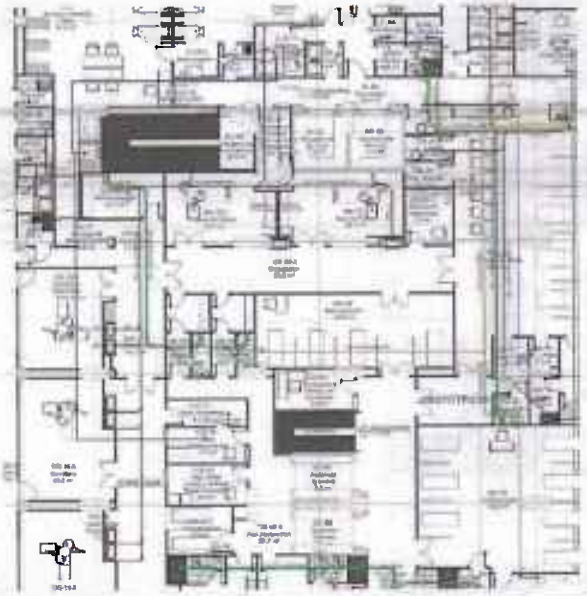

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE AF		68,10				68,10
					SUB TOTAL	68,10
					VIENE	172,25
					PASAN	240,35

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

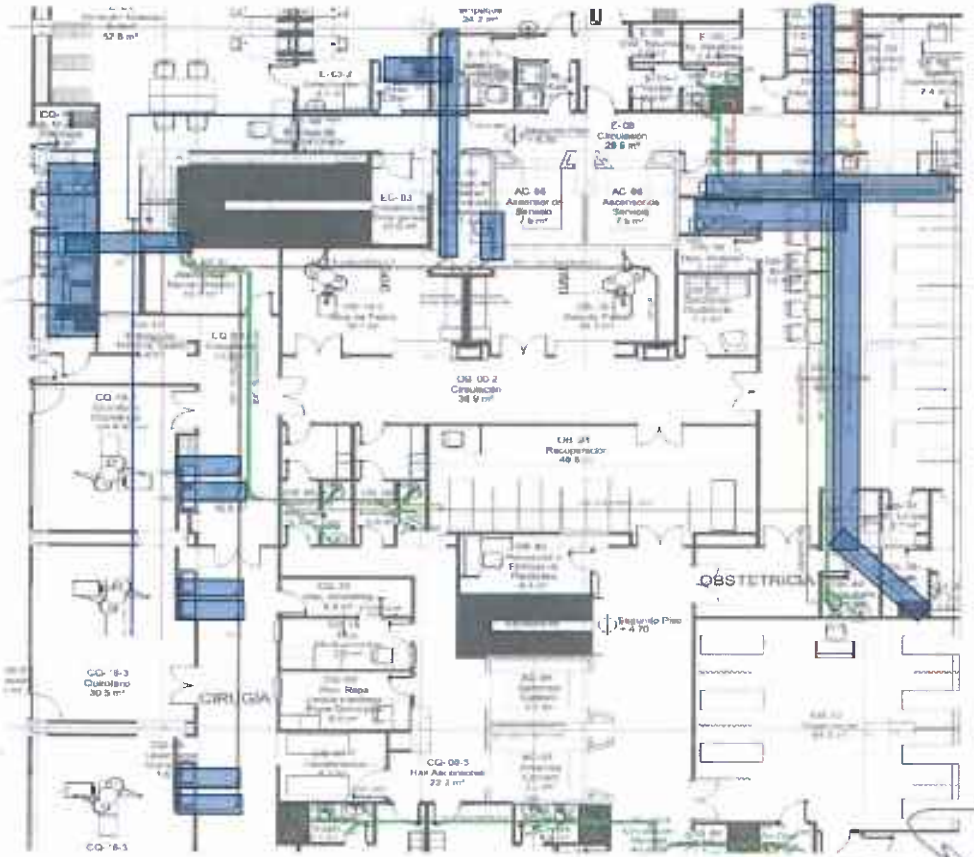

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Arq Francisco Barrios	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE AF		72,25				72,25
					SUB TOTAL	72,25
					VIENE	240,35
					PASAN	312,60

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

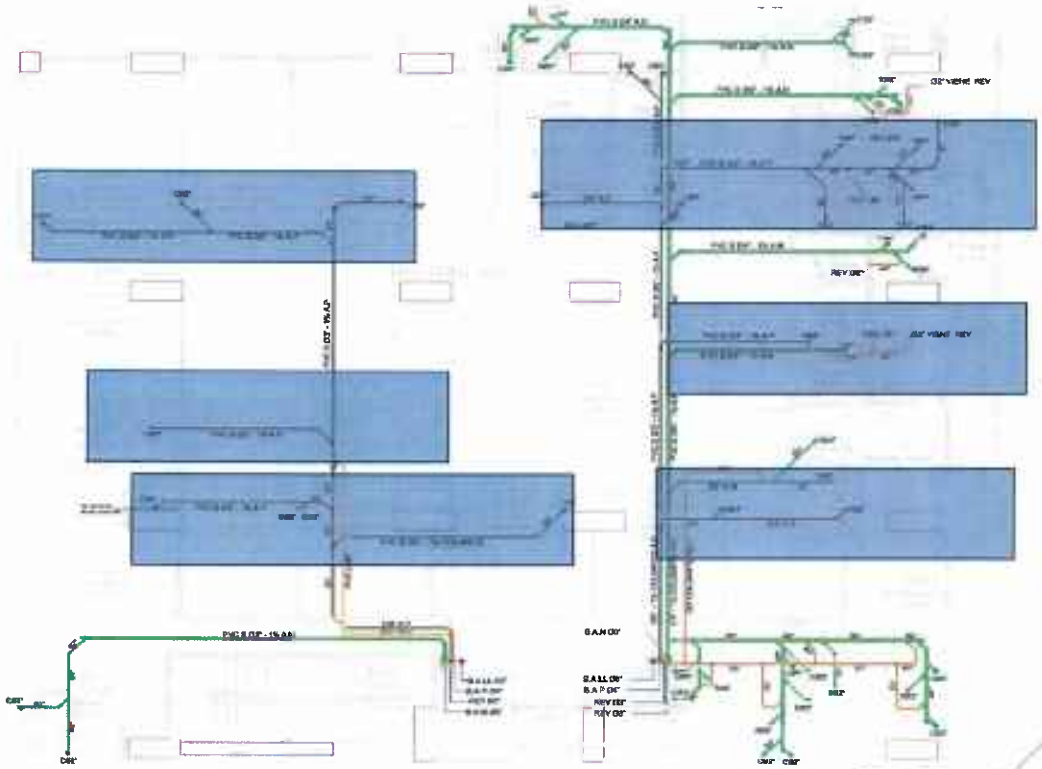

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		73,46				73,46
					SUB TOTAL	73,46
					VIENE	312,60
					PASAN	386,06

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

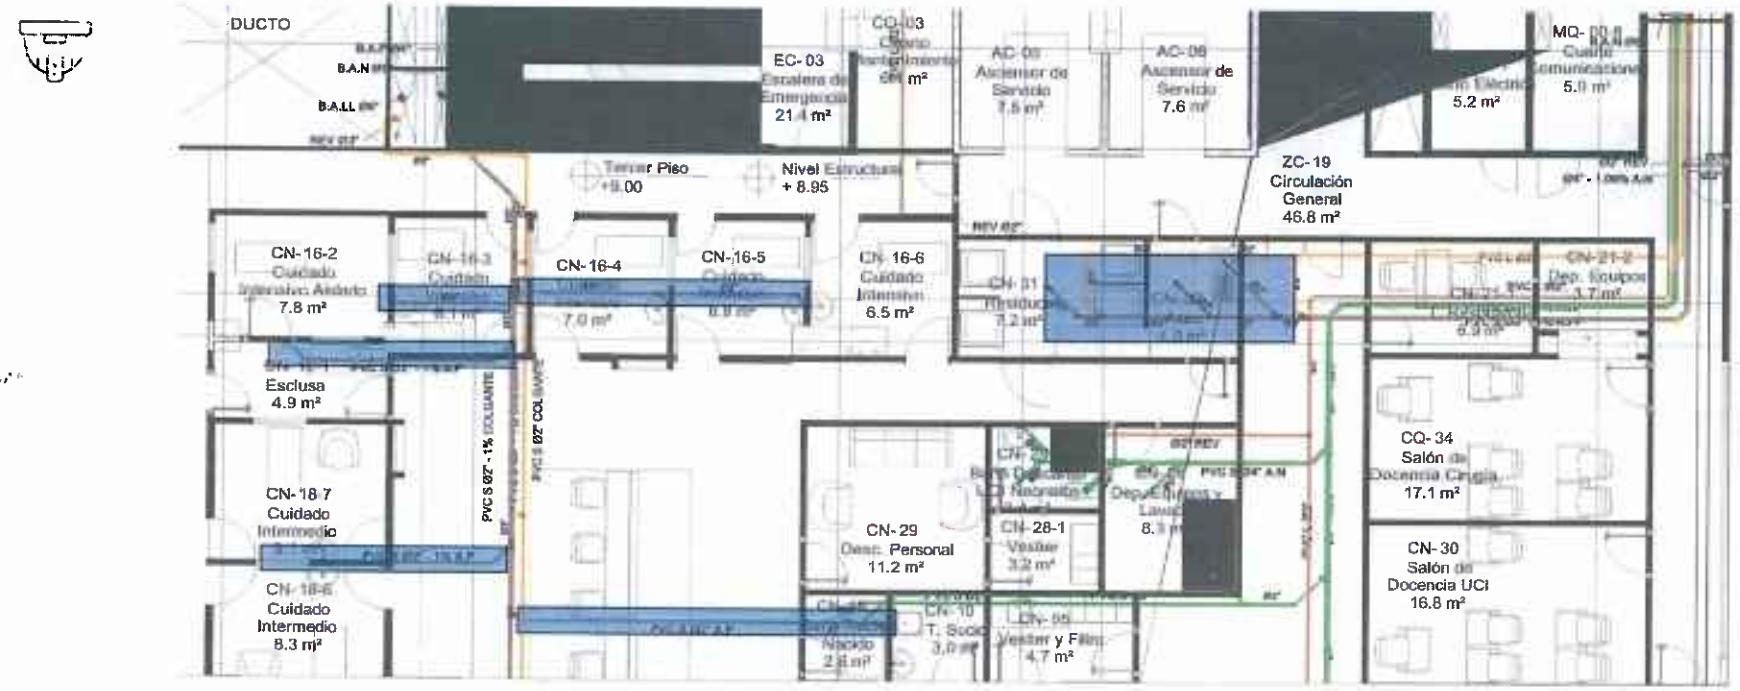

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE
CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			
Versión No. 00		Página 2 de 2	
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

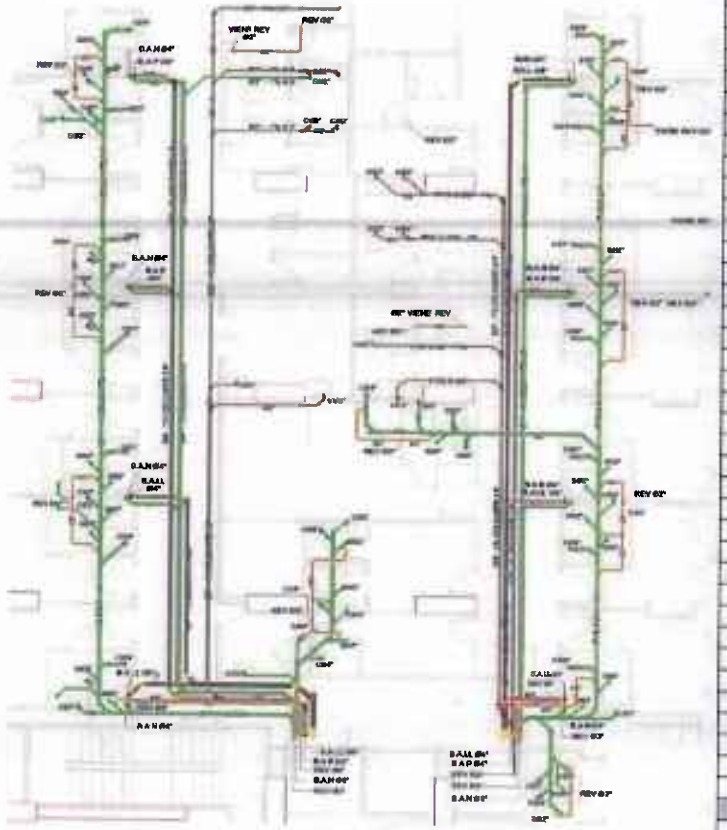

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(I) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(K) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		47,70				47 70

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

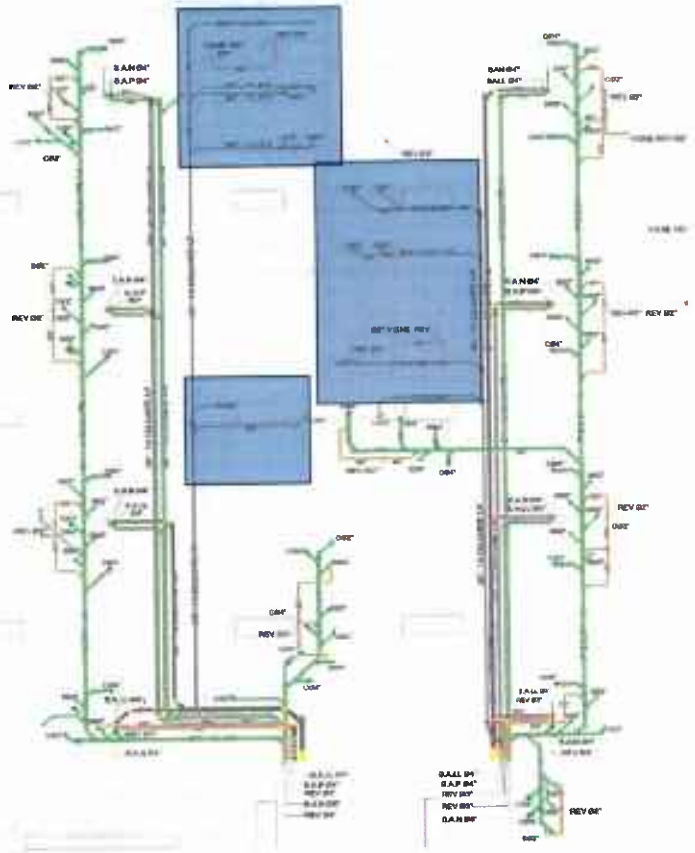

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

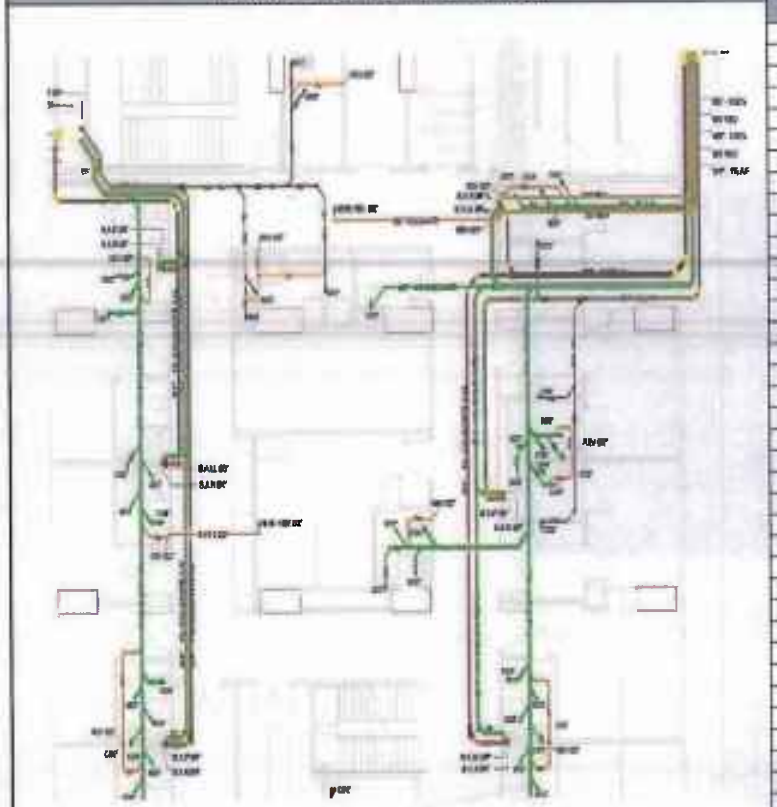

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10		22,00				22,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC sanitaria Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

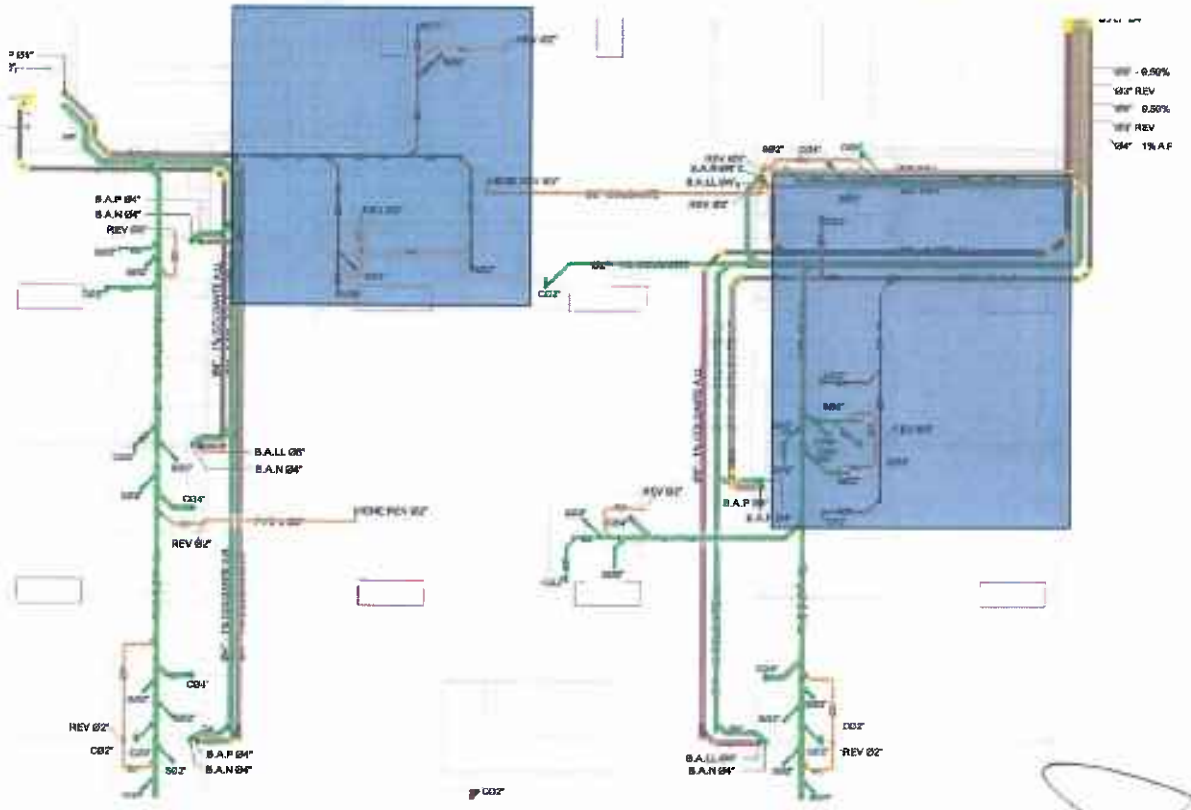

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.8	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø3"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 1-5 Y A-F						
ENTE EL PISO 1Y EL PISO 2 EN EL 2 EJE F		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE F		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE F		6,00				6,00
ENTE EL PISO 1Y EL PISO2 EN EL 9 EJE B		6,00				6,00
ENTRE PISO 2 Y PISO 3 EJE2 EJE B		6,00				6,00
TOTAL						36,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.8	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø3"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

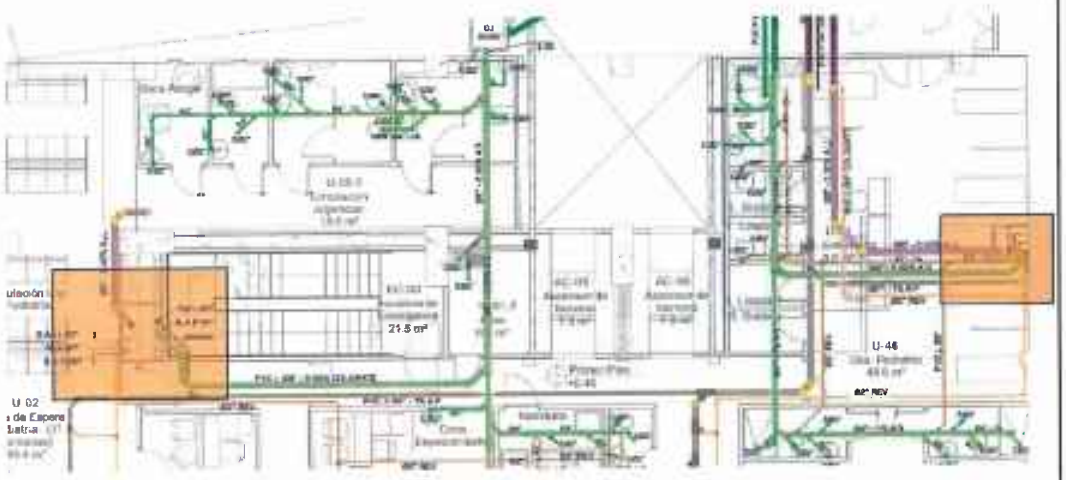

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA –
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

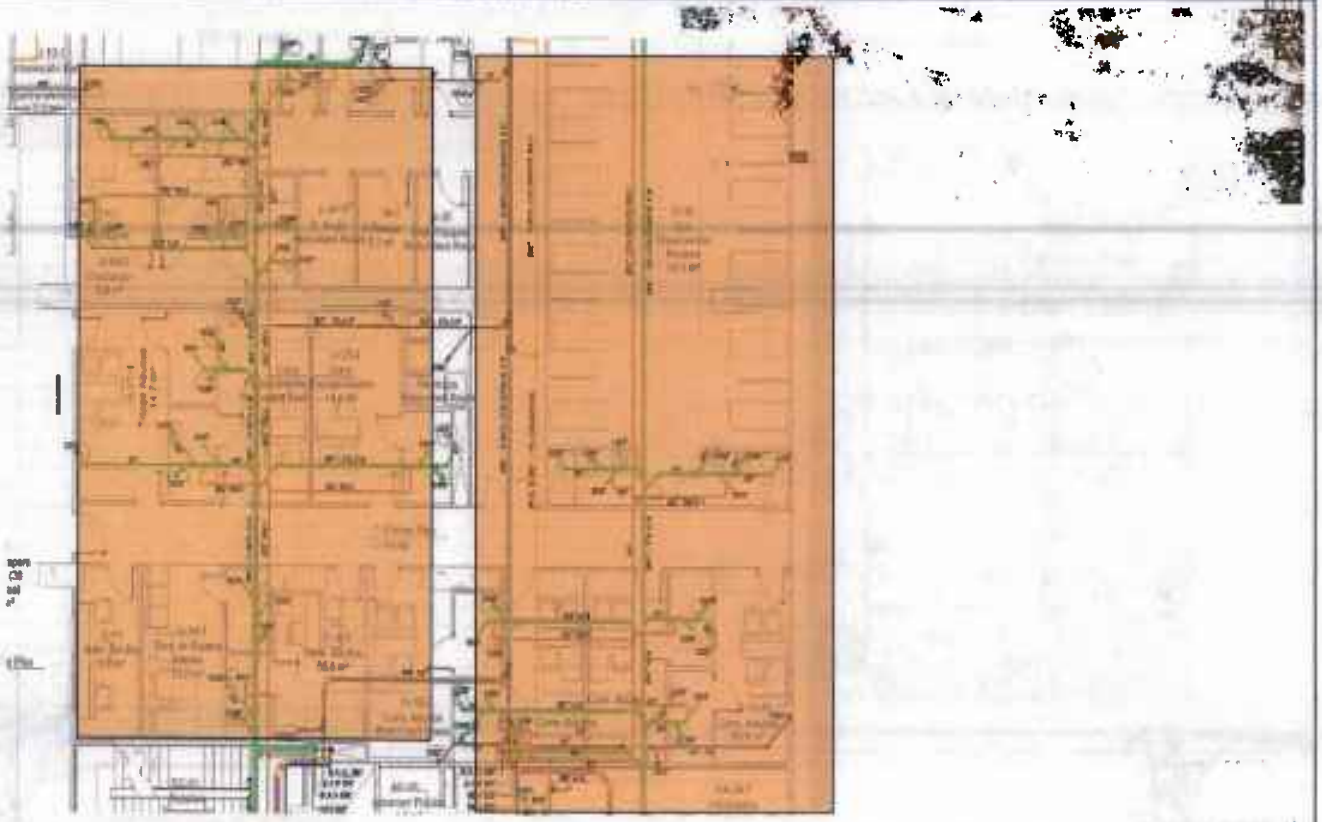

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

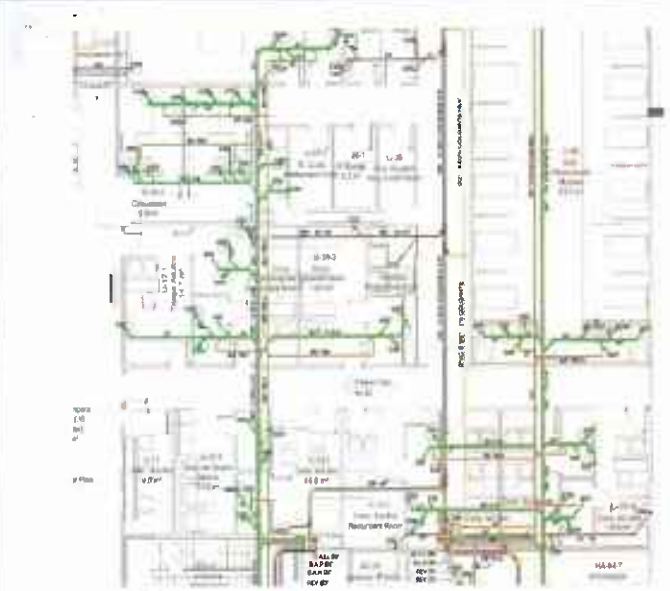

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		4,00				4,00
		18,00				18,00

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

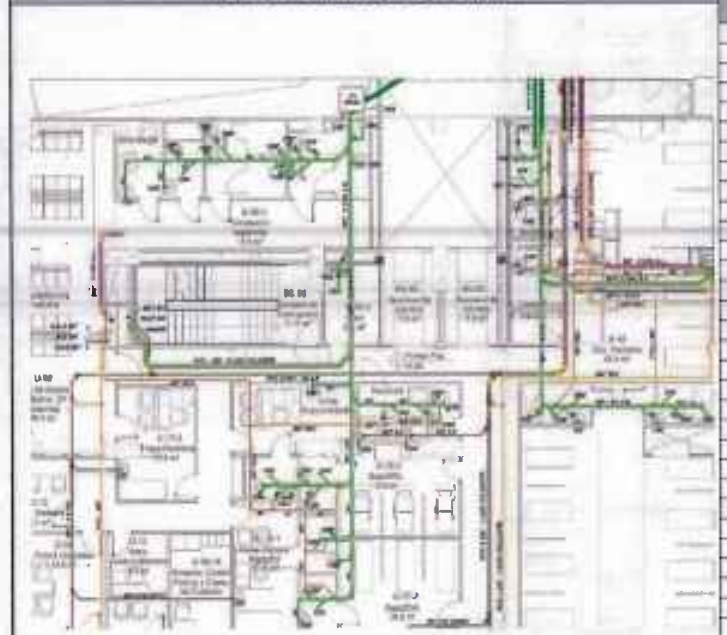

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		55,33				55,33
SUB TOTAL						55,33
VIENE						22,00
PASAN						77,33

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	8	2025

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

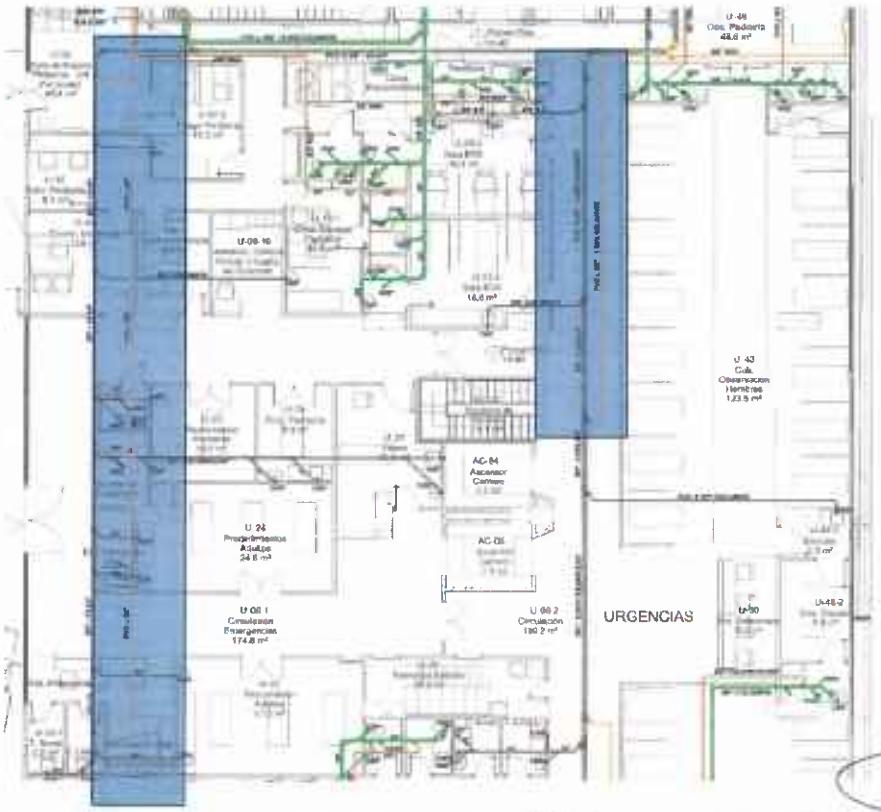

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

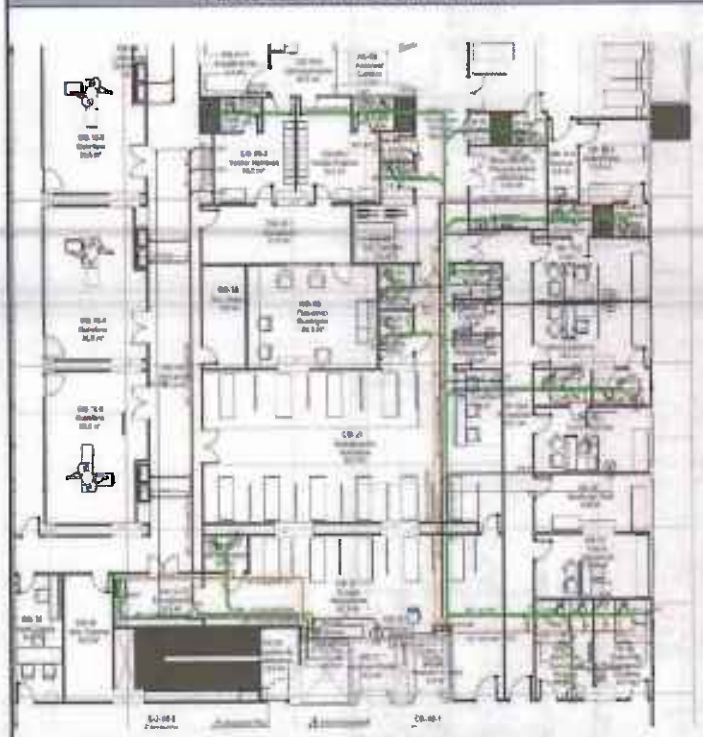

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h)cant	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		19,00				19,00
SUB TOTAL						19,00
VIENE						77,33
PASAN						96,33

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2026

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

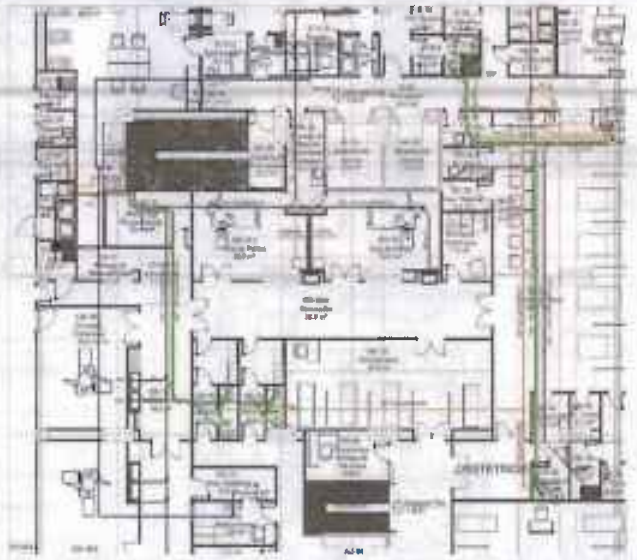

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		10,00				10,00
					SUB TOTAL	10,00
					VIENE	96,33
					PASAN	106,33

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 06	Página 1 de 1		
		Fecha:	2	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

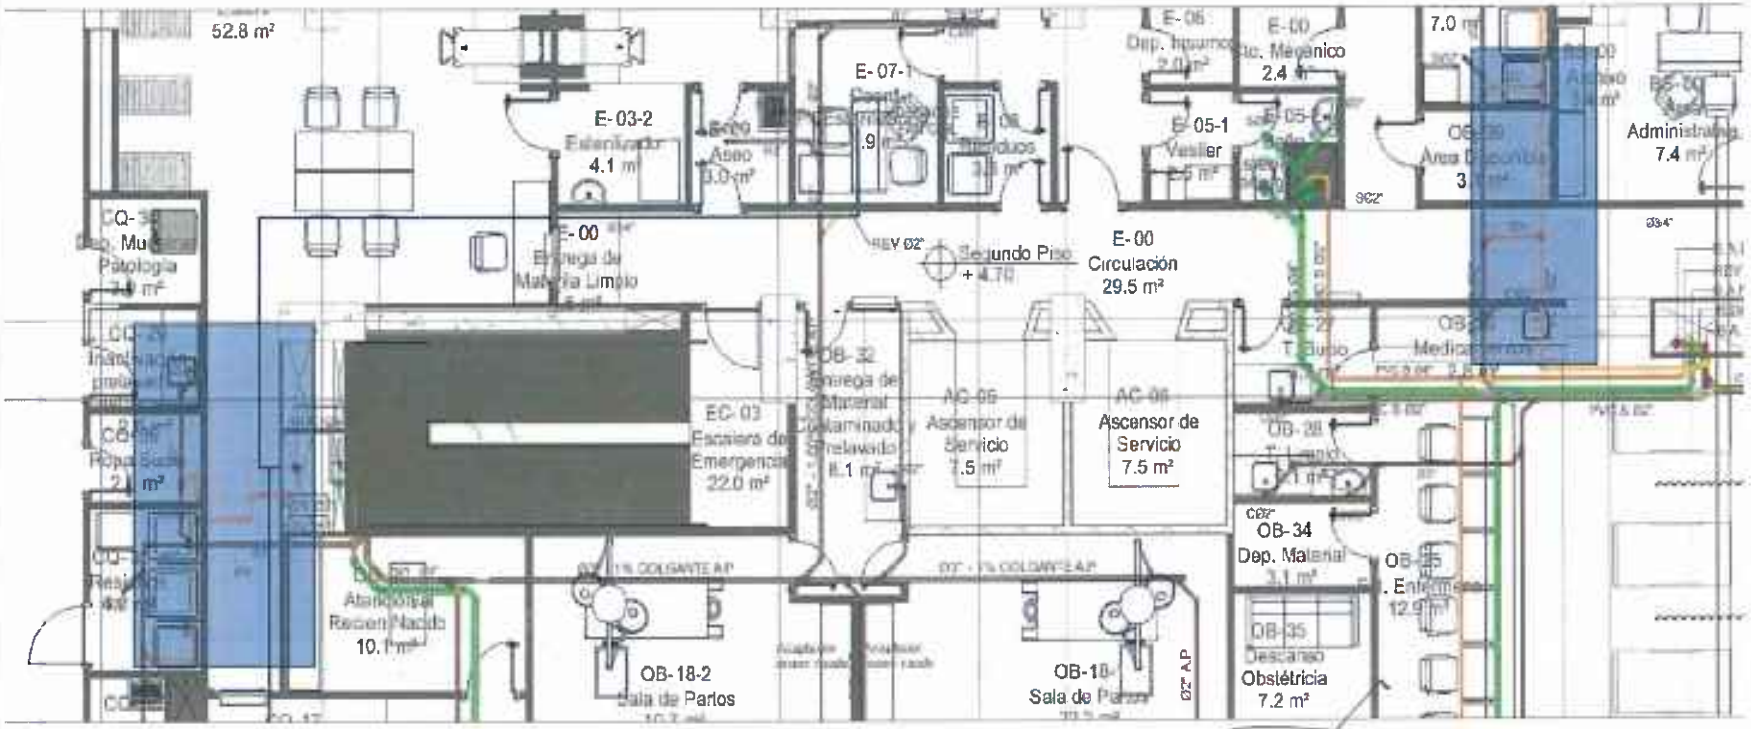

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

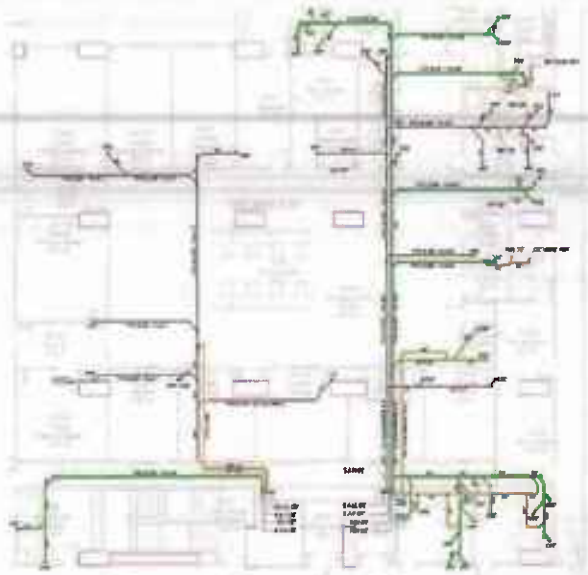

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F		6,20				6,20
		5,00				5,00
		5,90				5,90

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 04	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

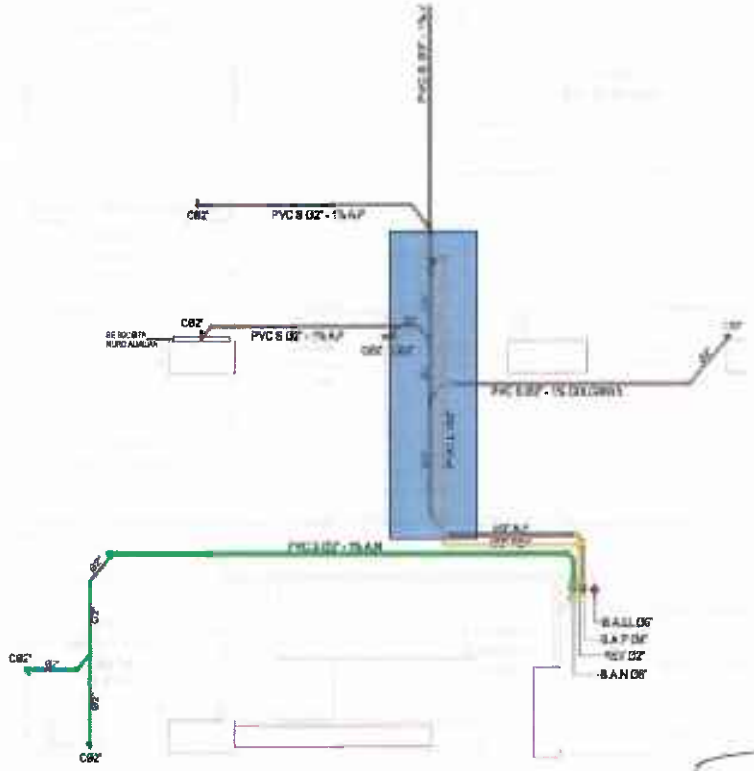
Ø2"
PVC S Ø2" - 13 A/P
Ø2"
PVC S Ø2" - 13 A/P
RECOGIDA AGUAS LLUVIAS
Ø2"
PVC S Ø2" - 13 A/P
Ø2"
Ø2"
Ø2"

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 2 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F		21,00				21,00
		13,00				13,00
		5,20				5,20
SUB TOTAL						39,20
VIENE						124,43
TOTAL						163,63

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cadena

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.9	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC ventilación Ø2"			UND:	ML

1.0 PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

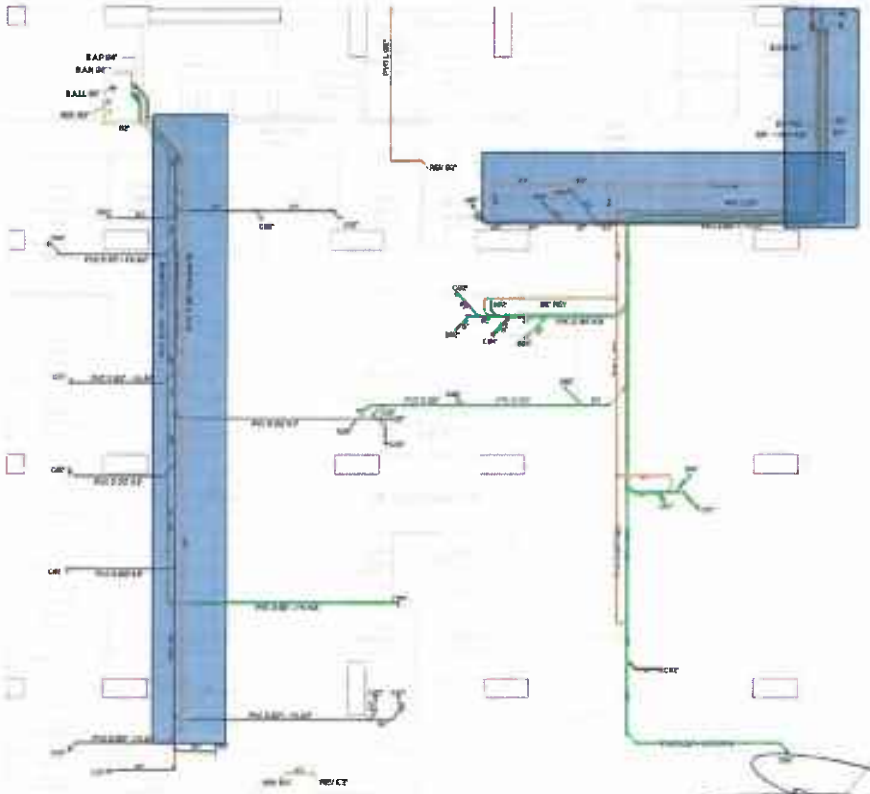

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.16.10**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

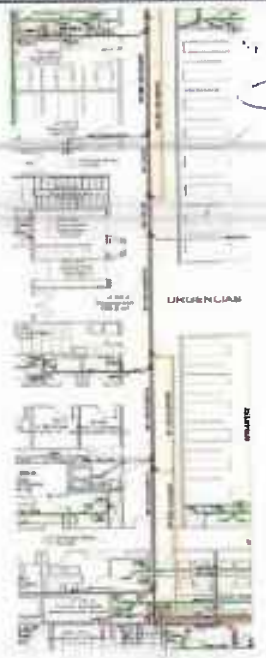

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-10 EJE AF					30,00	30,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

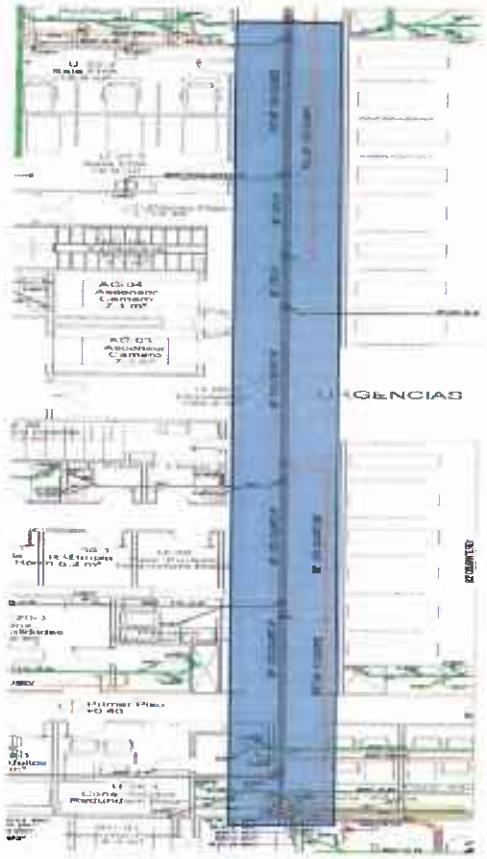

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y A-F					15,00	15,00
				PASAN		15,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

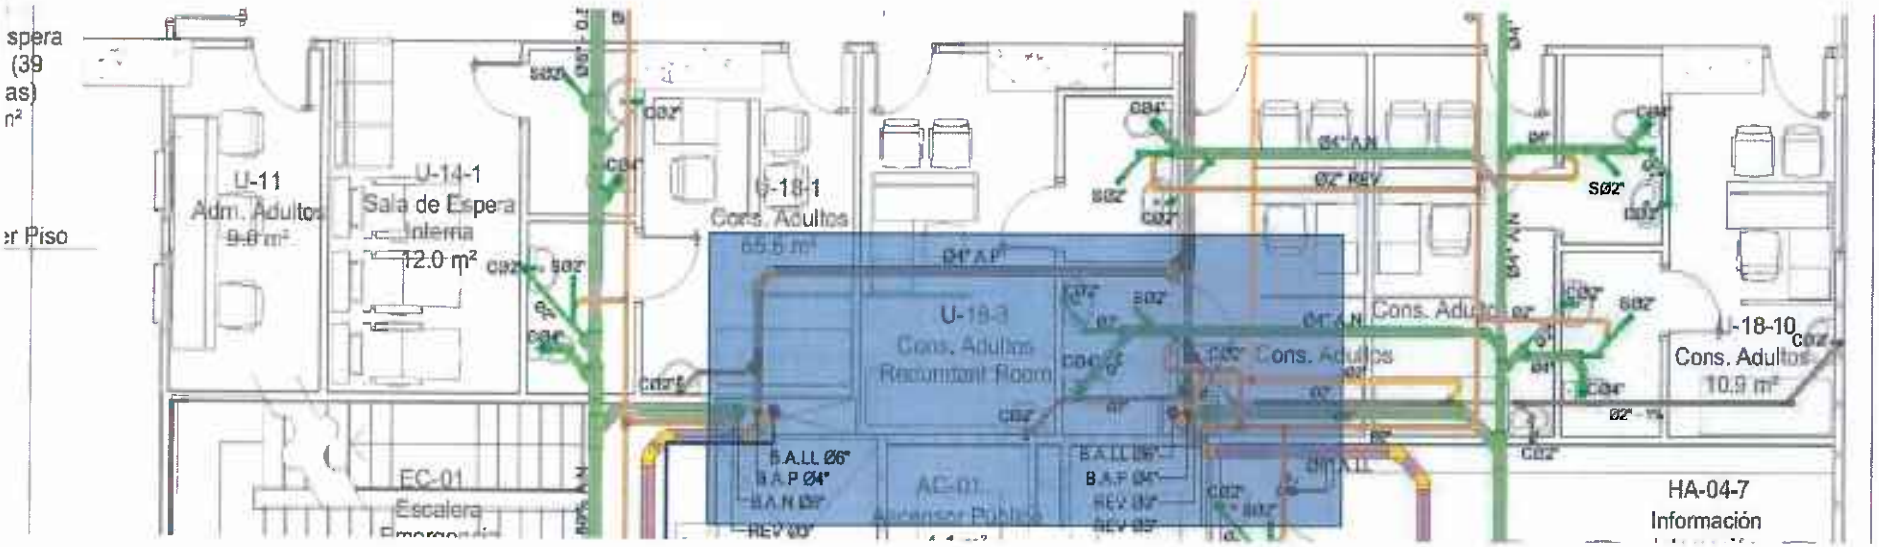

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(I) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					10,00	10,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

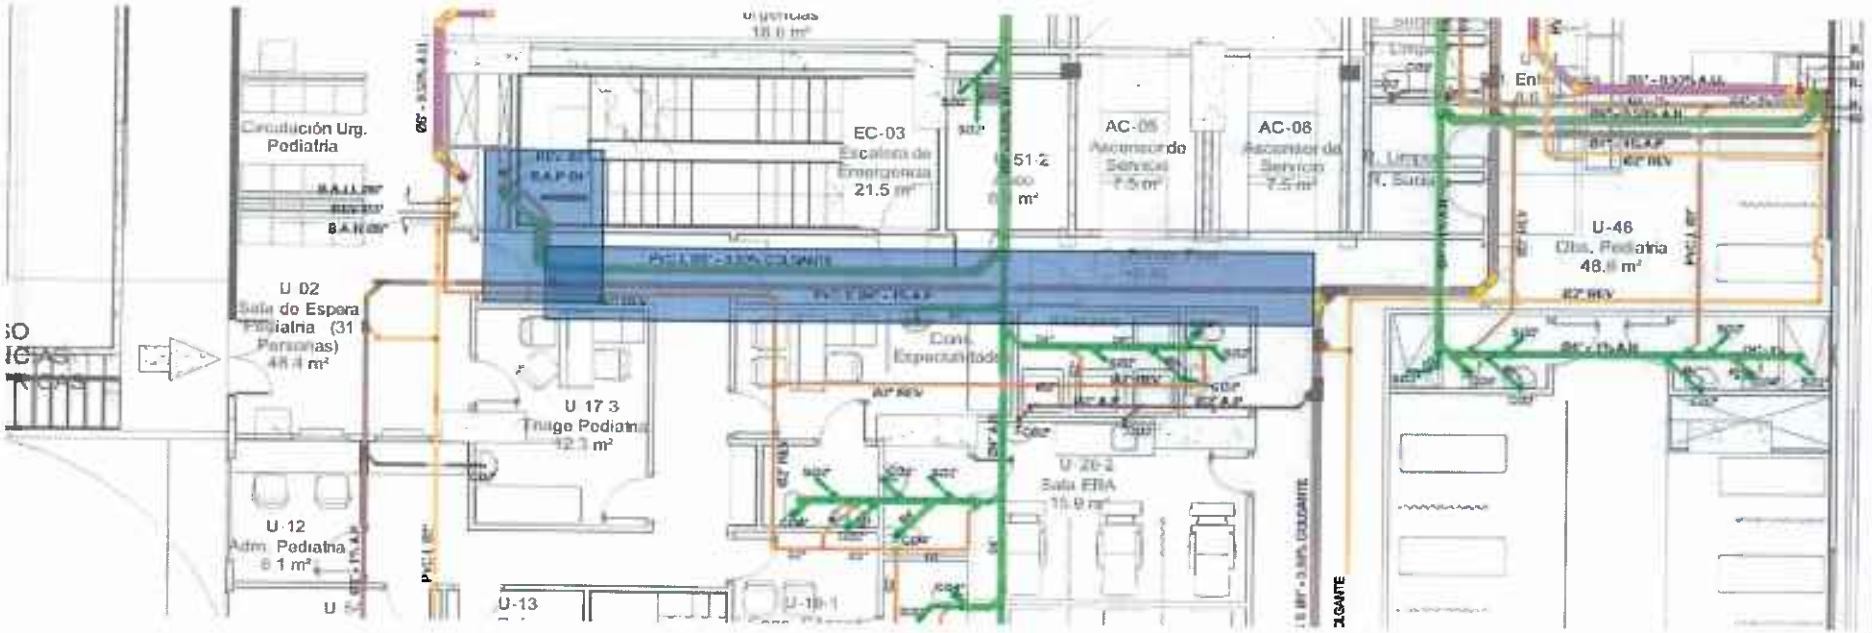

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

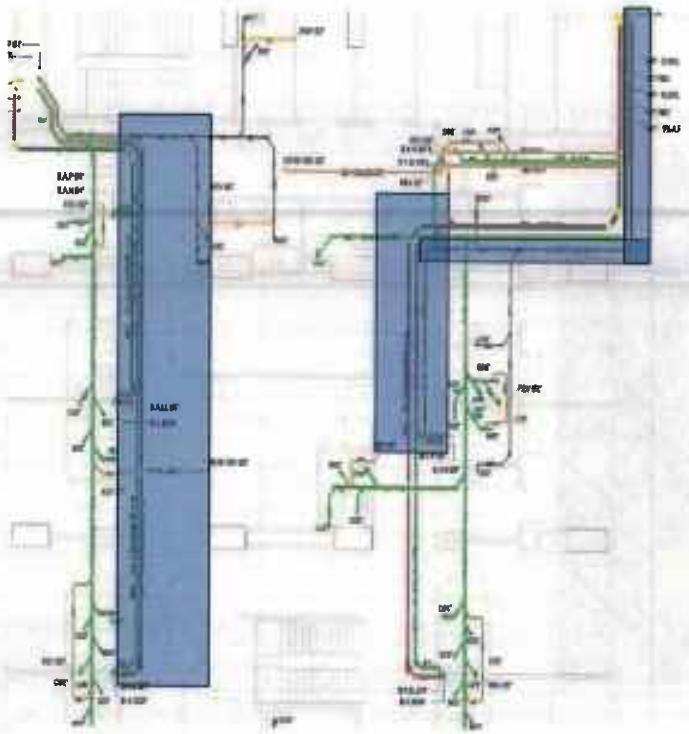

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					30,00	30,00
				SUB TOTAL		30,00
				VIENE		25,00
				TOTAL		55,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

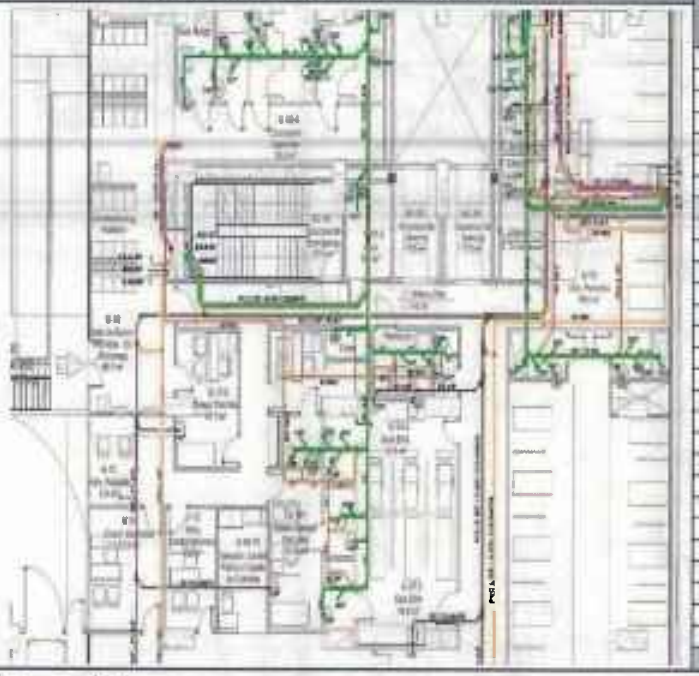

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					30,00	30,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	6	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

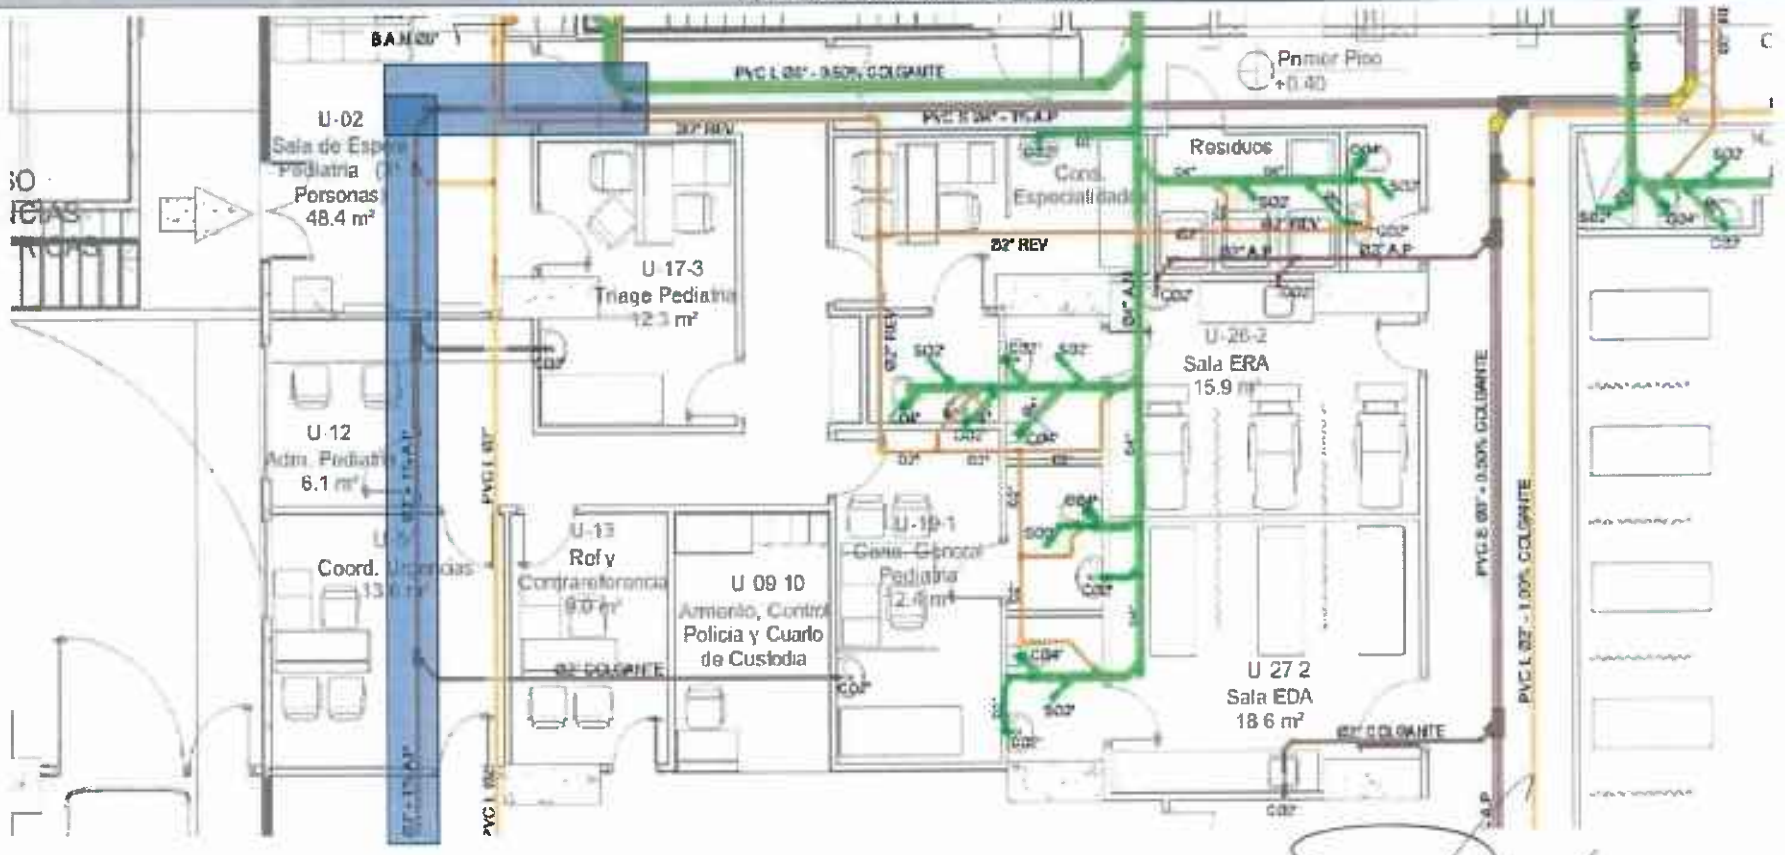

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE Nº:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	**26.16.12**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 2-8 EJE A-F					43.00	43.00
SUB TOTAL						43.00
VIENE						30.00
PASAN						73.00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

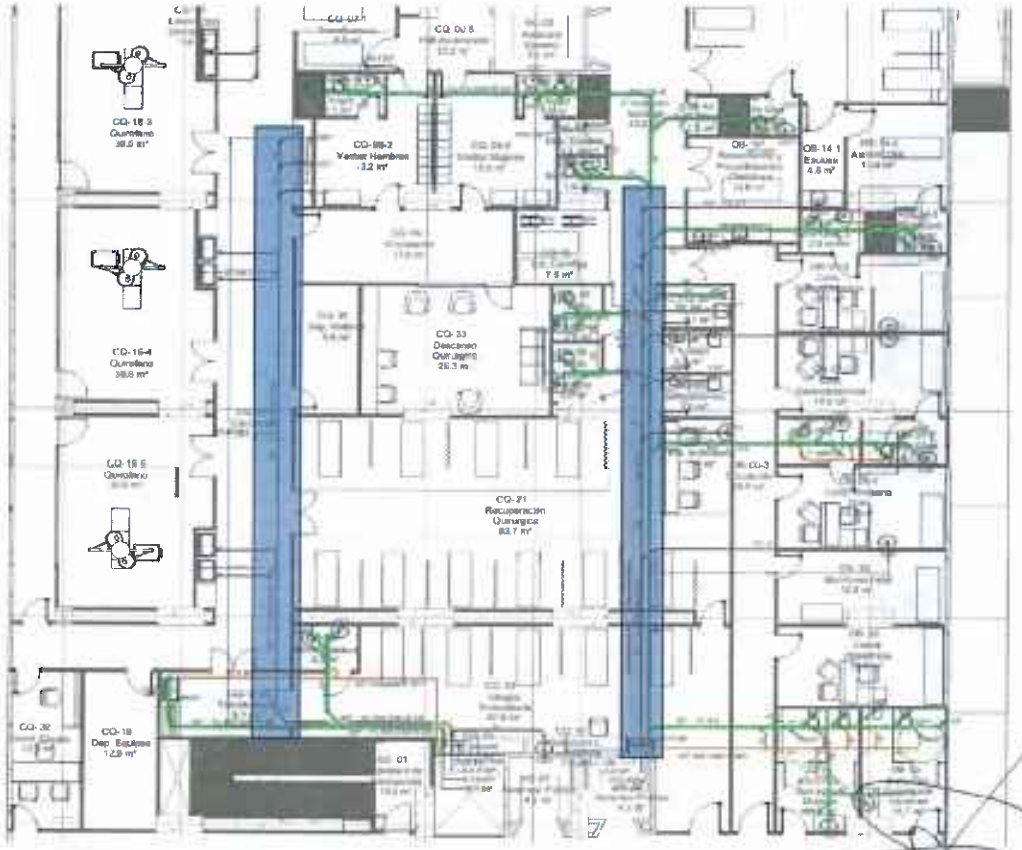

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTREE EJE 5-10 EJE A-F					30,00	30,00
				SUB TOTAL		30,00
				VIENE		73,00
				PASAN		103,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

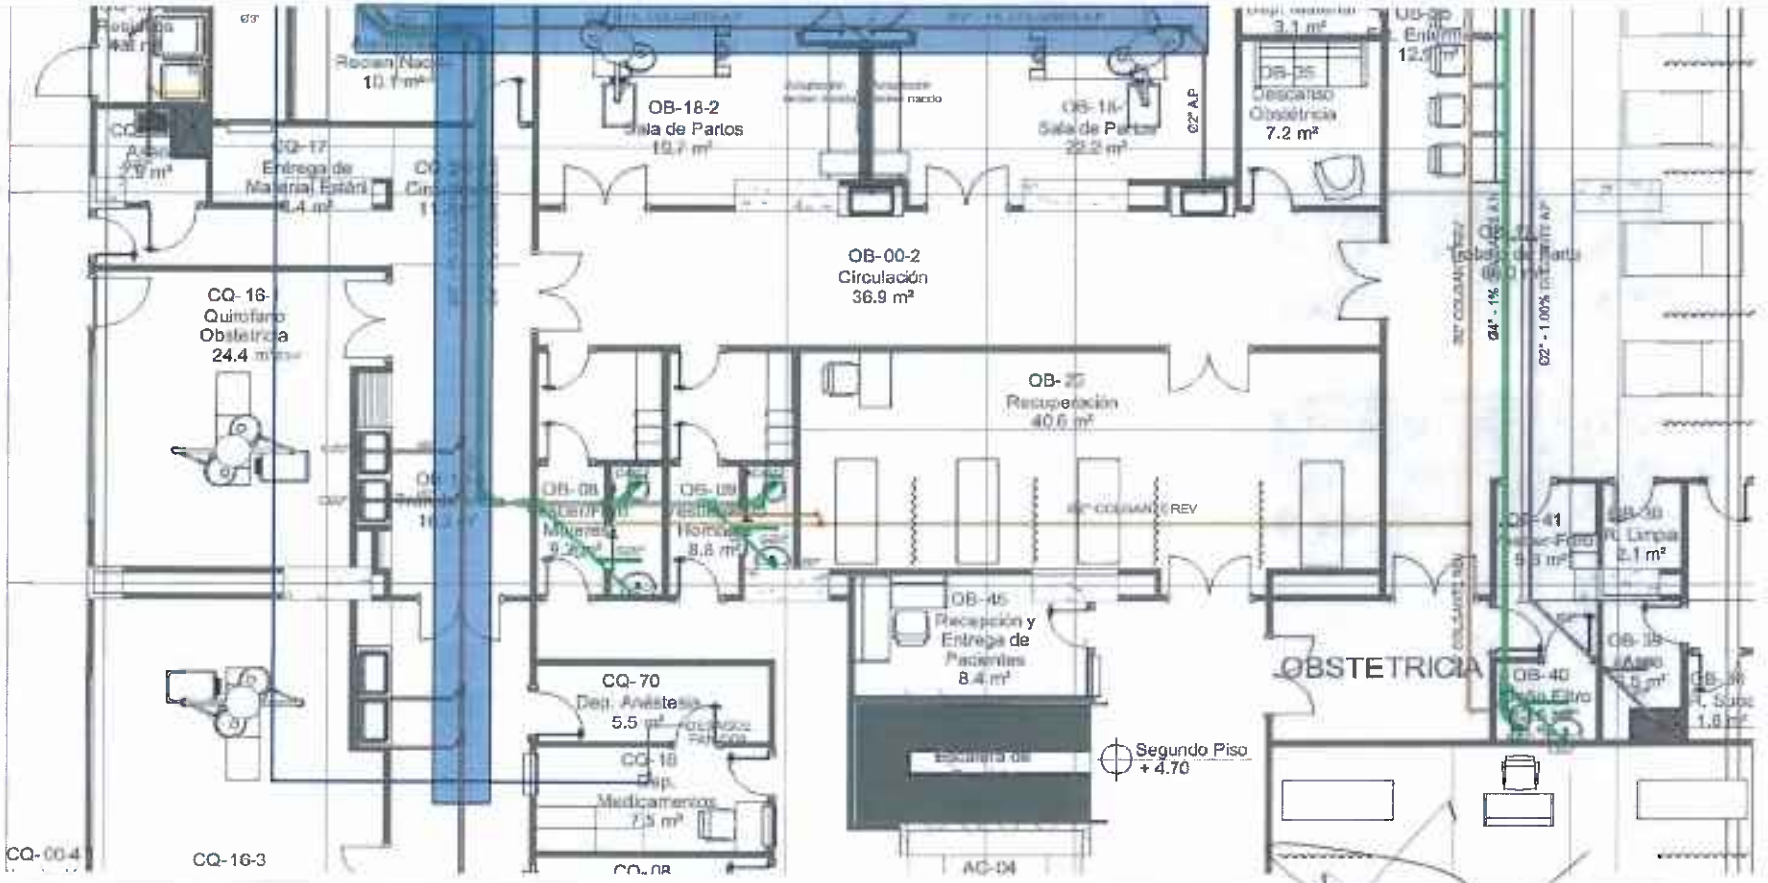

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DE:N

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					25,00	25,00
SUB TOTAL						25,00
VIENE						100,00
PASAN						125,00

Elaboró:

RESI... ...TE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Locano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

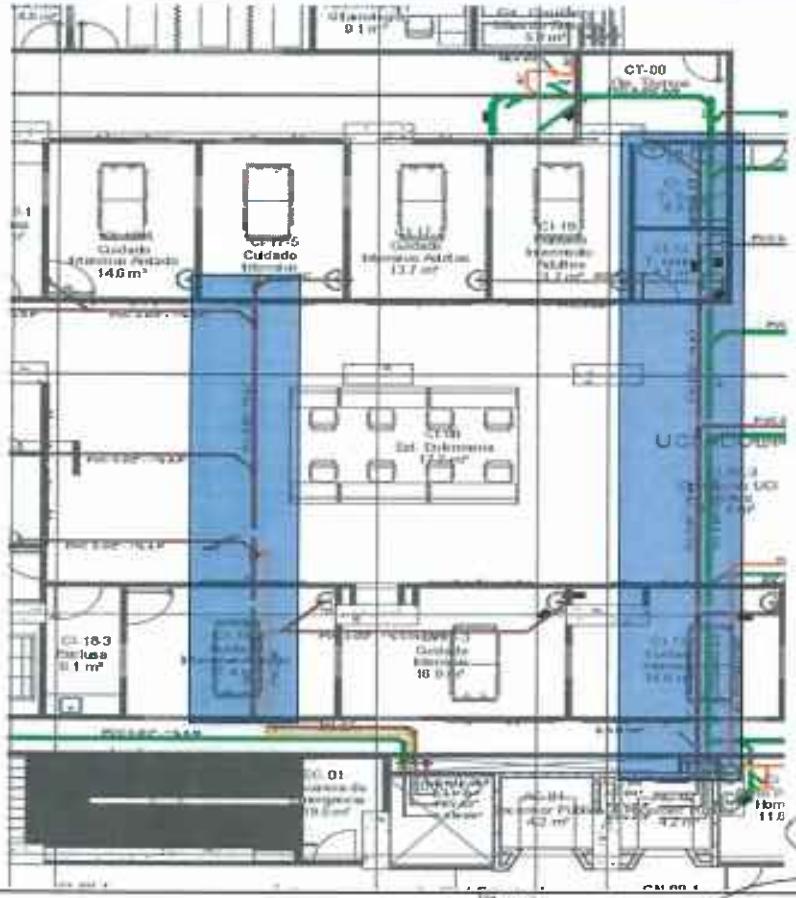

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					30,00	30,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

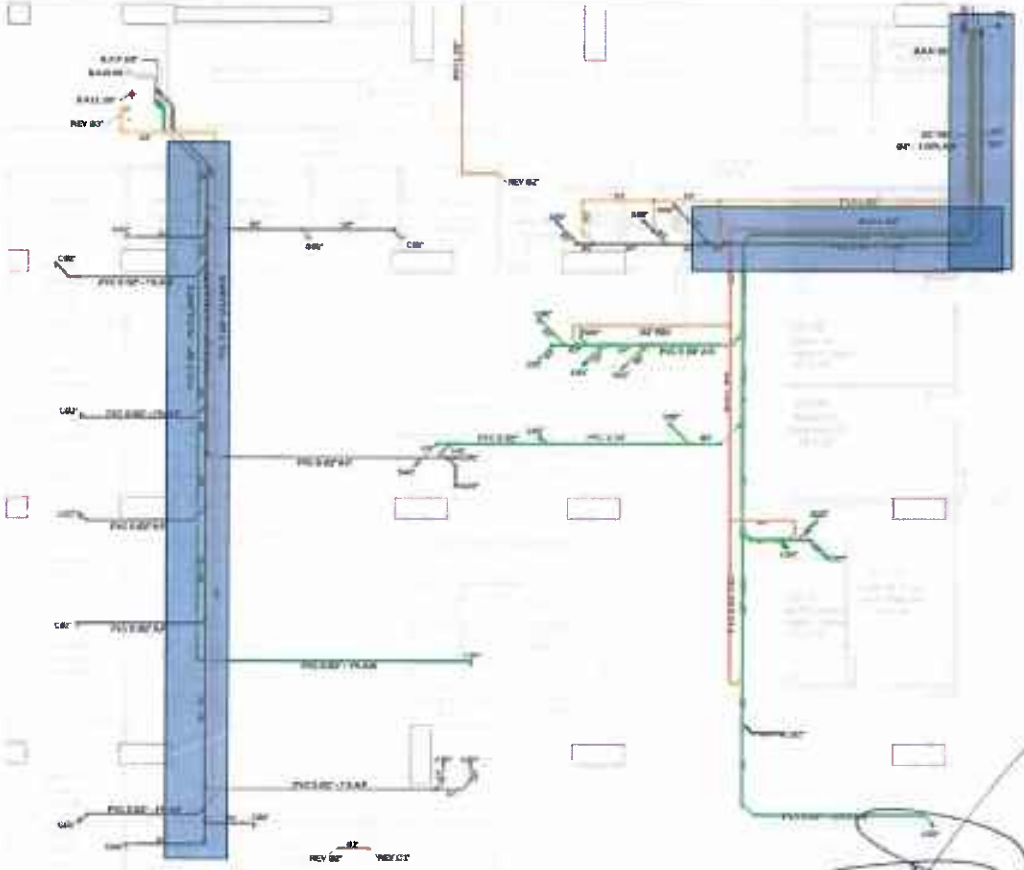

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 EJE A-F					12,00	12,00
SUB TOTAL						12,00
VIENE						158,00
PASAN						170,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

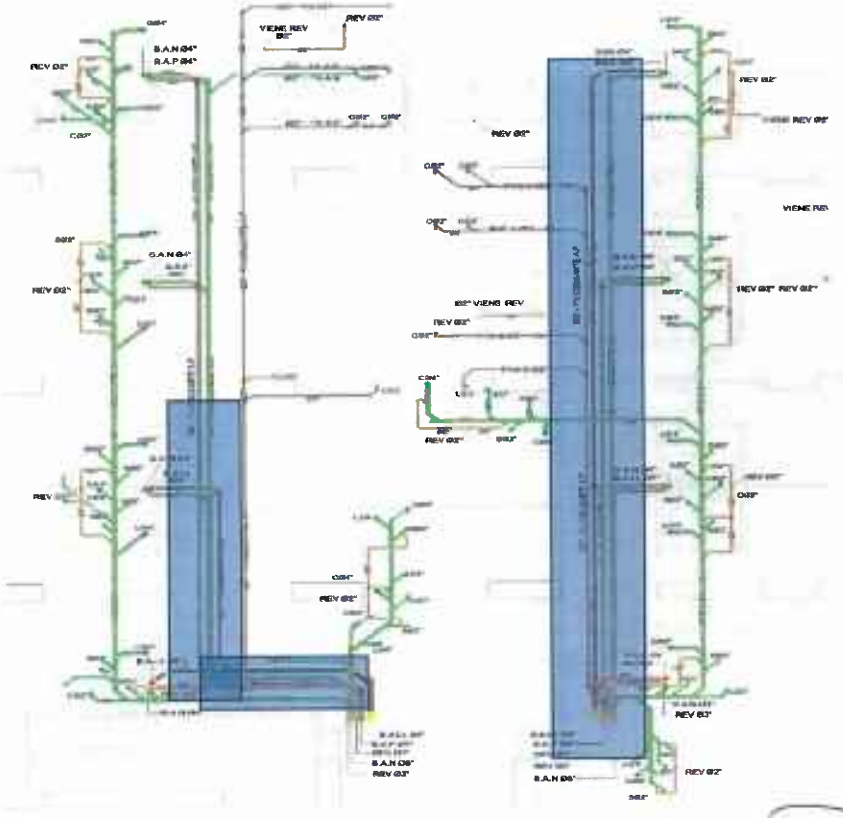

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	8	6	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

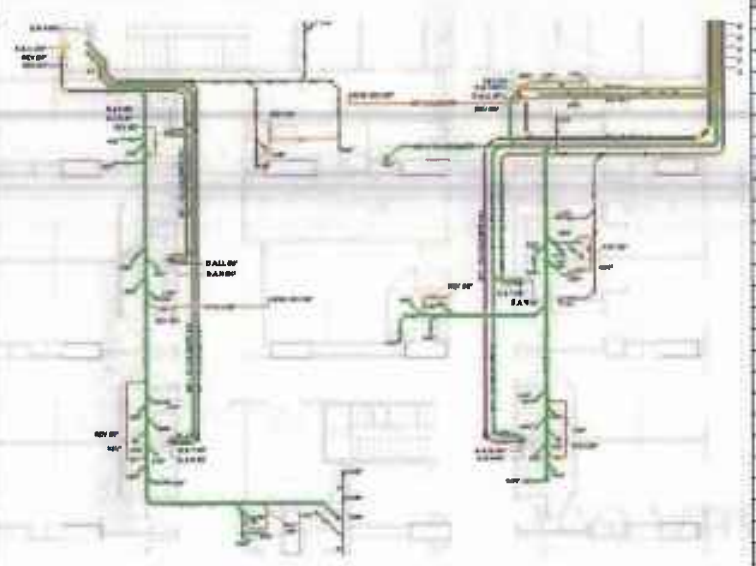

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 - EJEA-F					3,00	3,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 20	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

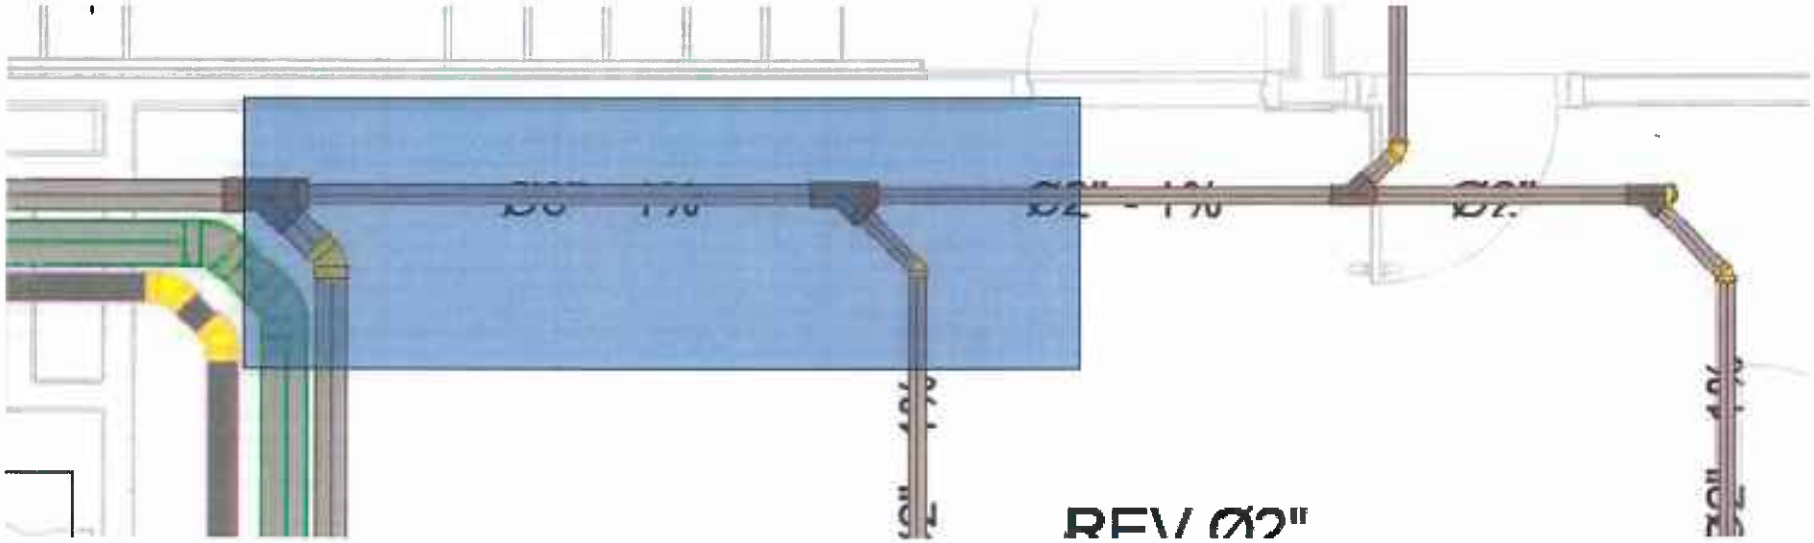

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 2		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-SEJE A-F					35,00	35,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

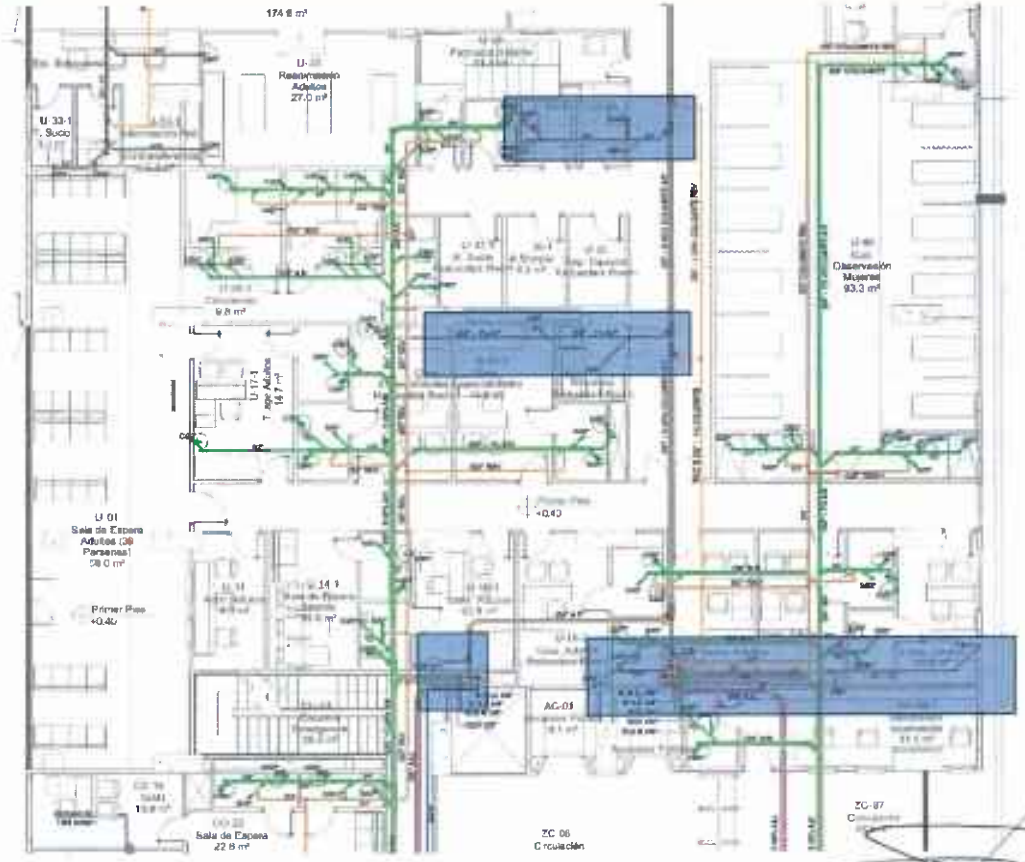

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					70,00	70,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

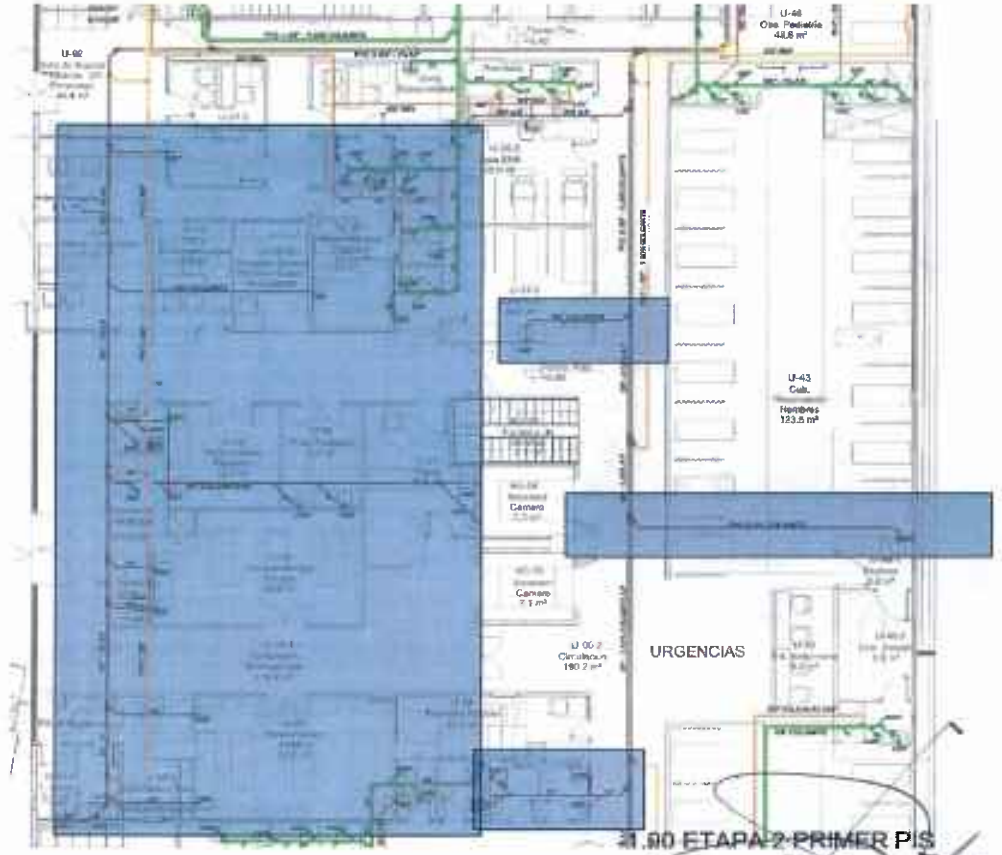

2.90 ETAPA 2 PRIMER PIS

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTREE EJE 2-5 EJE A-F					41,00	41,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo. PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

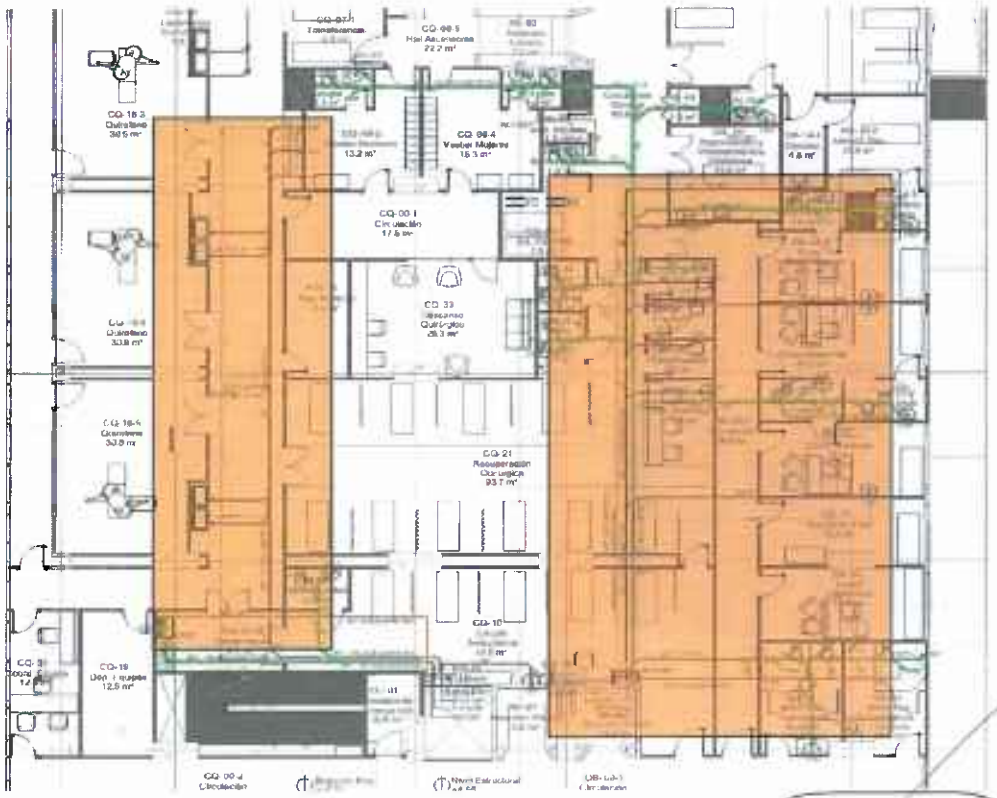

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

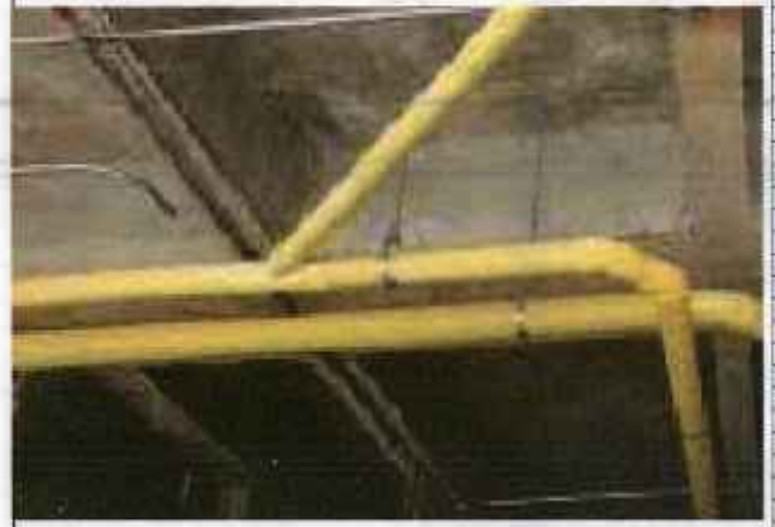

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					60,00	60,00
SUB TOTAL						60,00
VIENE						146,00
PASAN						206,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

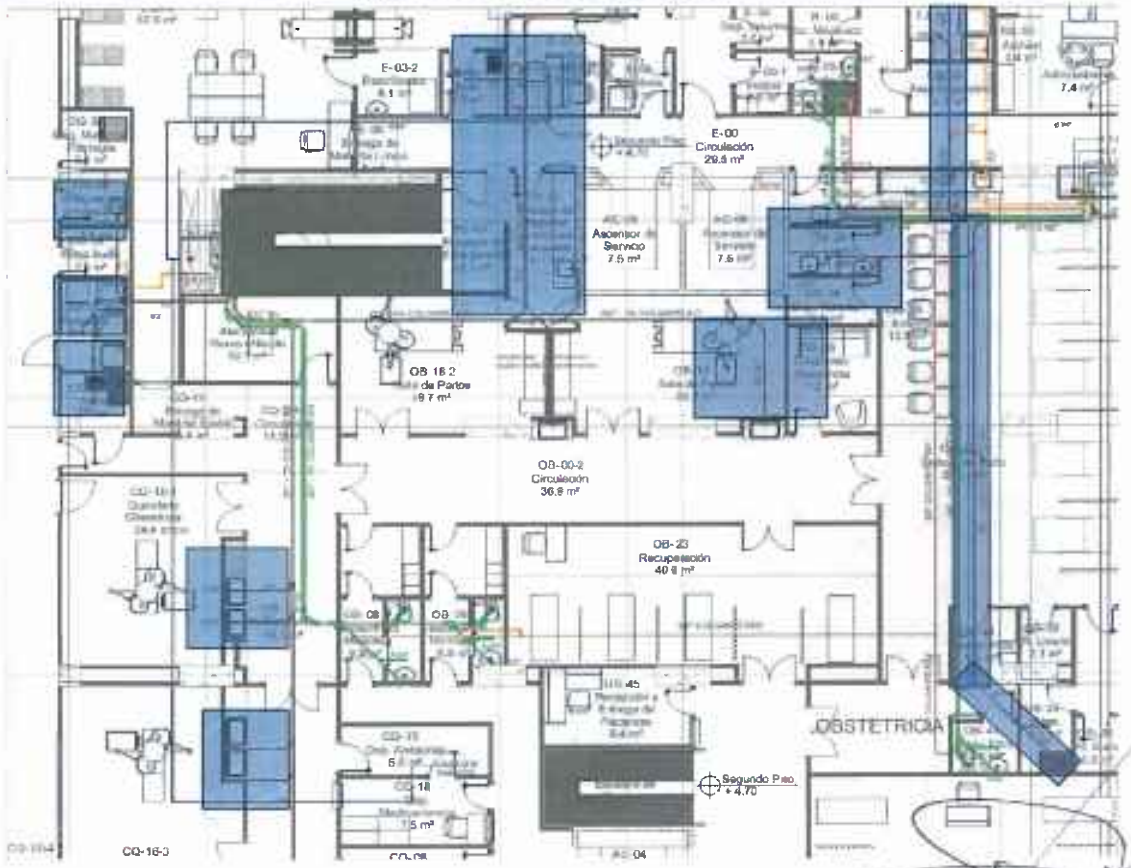

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 2 de 2	
		Fecha	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5Y EJE AF					50,00	50,00
SUB TOTAL						50,00
VIENE						206,00
PASAN						256,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. III	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

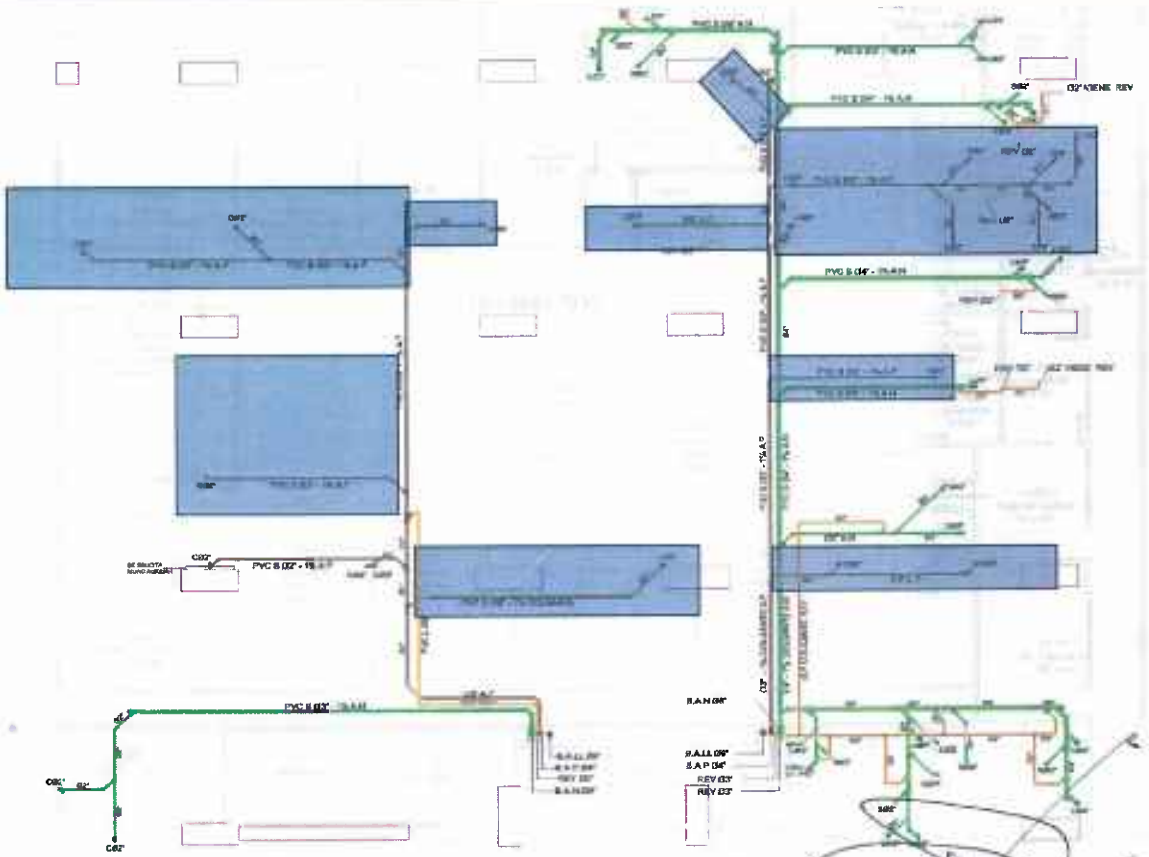

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 20		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

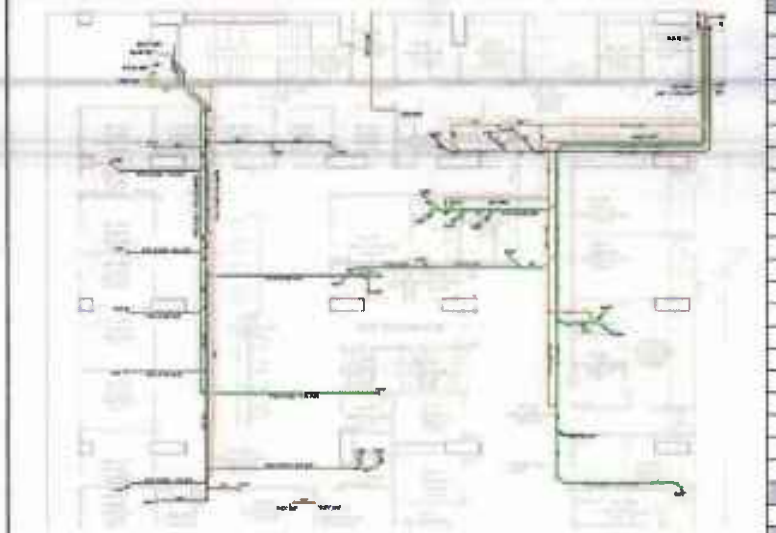

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)			
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					60,00	60,00

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

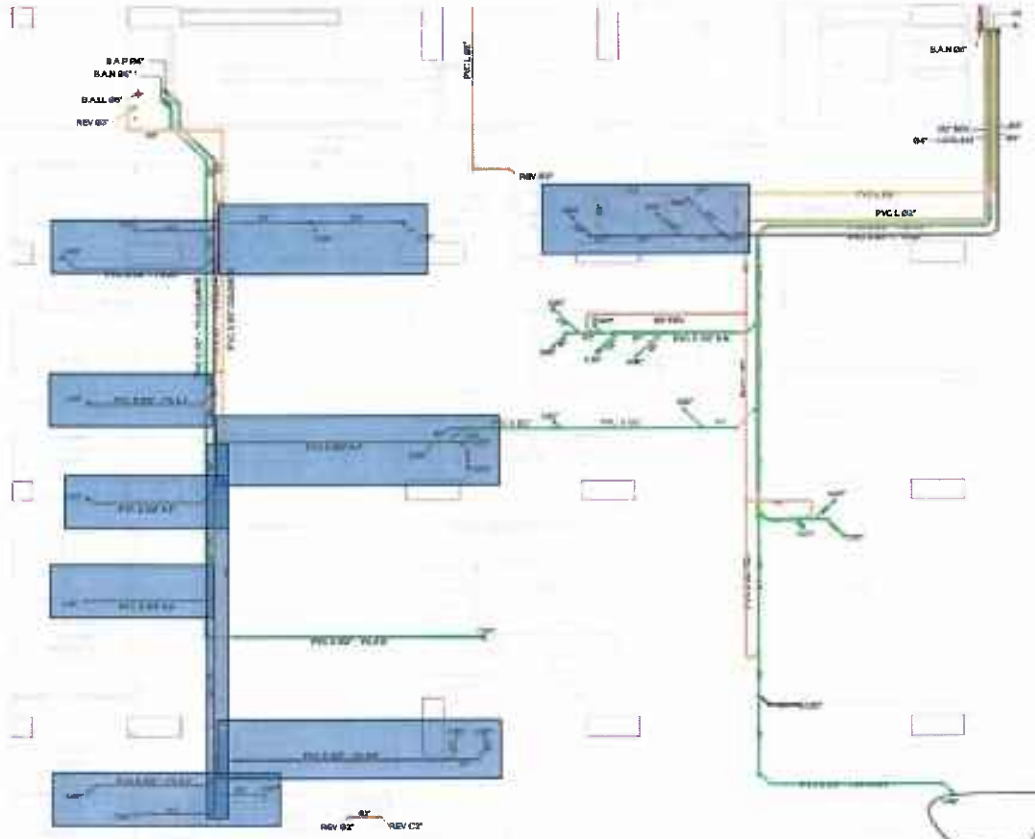

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 - EJEA-F					50,00	50,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 08	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

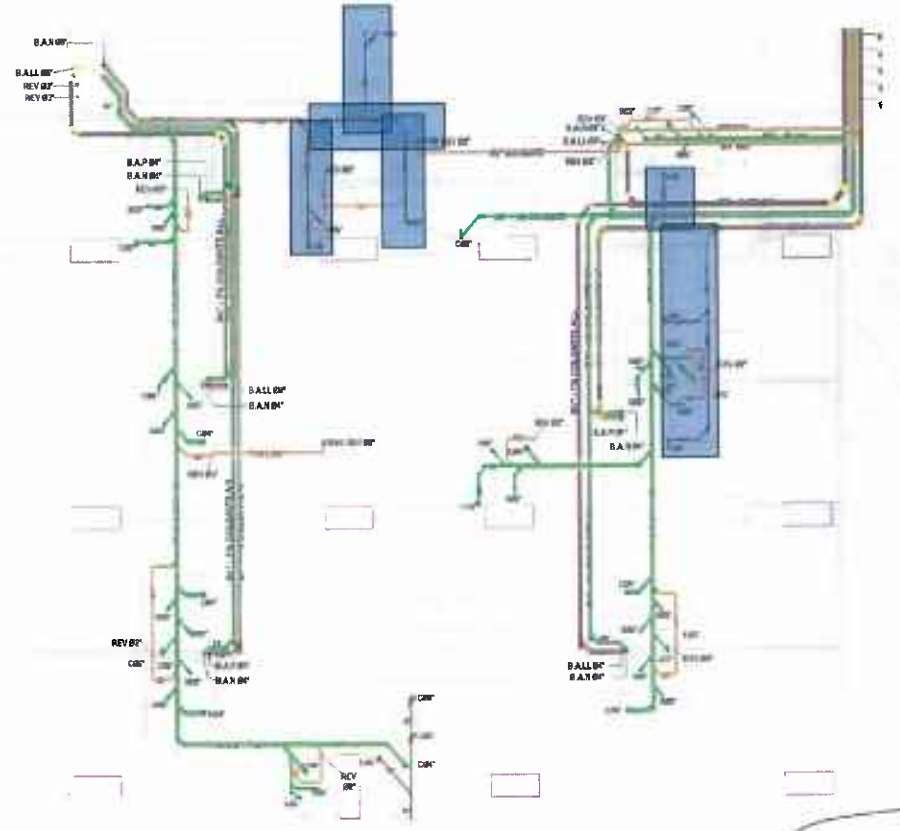

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**26.16.13**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 5-10 - EJE A-F					40,00	40,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:		FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios PVC Sanitaria Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

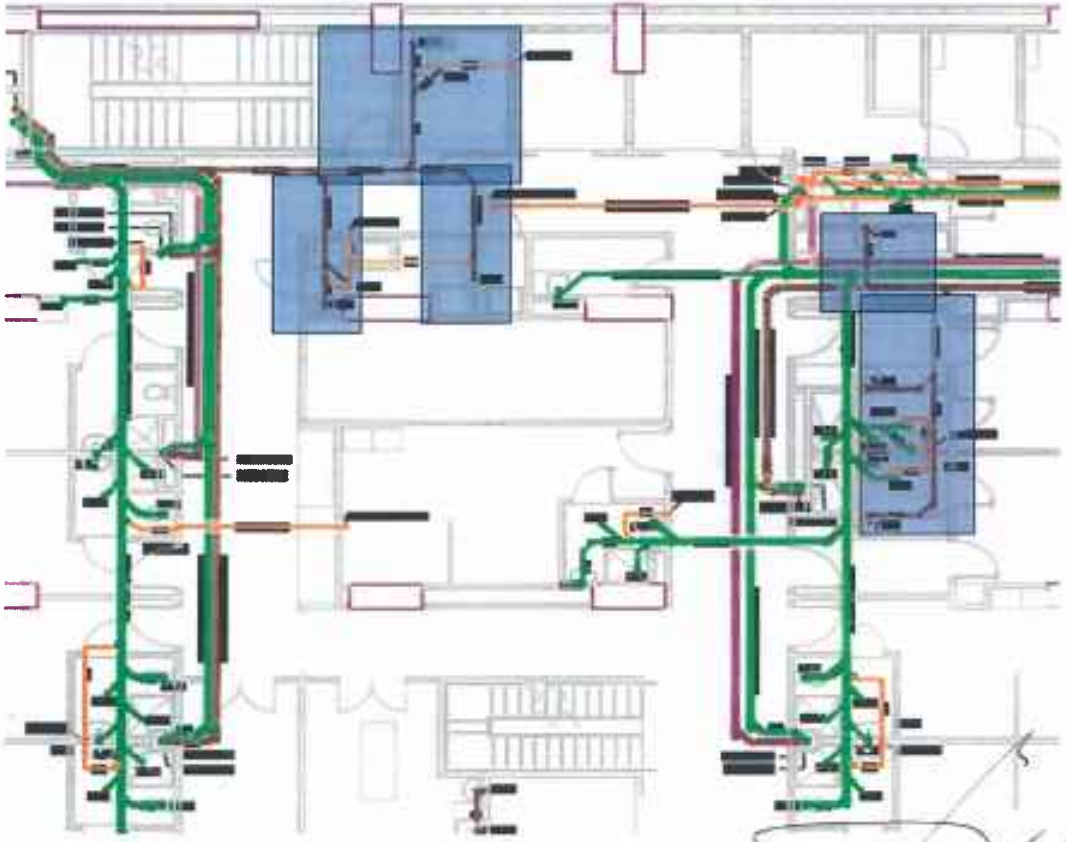

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.14	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 2-5EJE A-F					10,00	10,00
PASAN						10,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.14	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

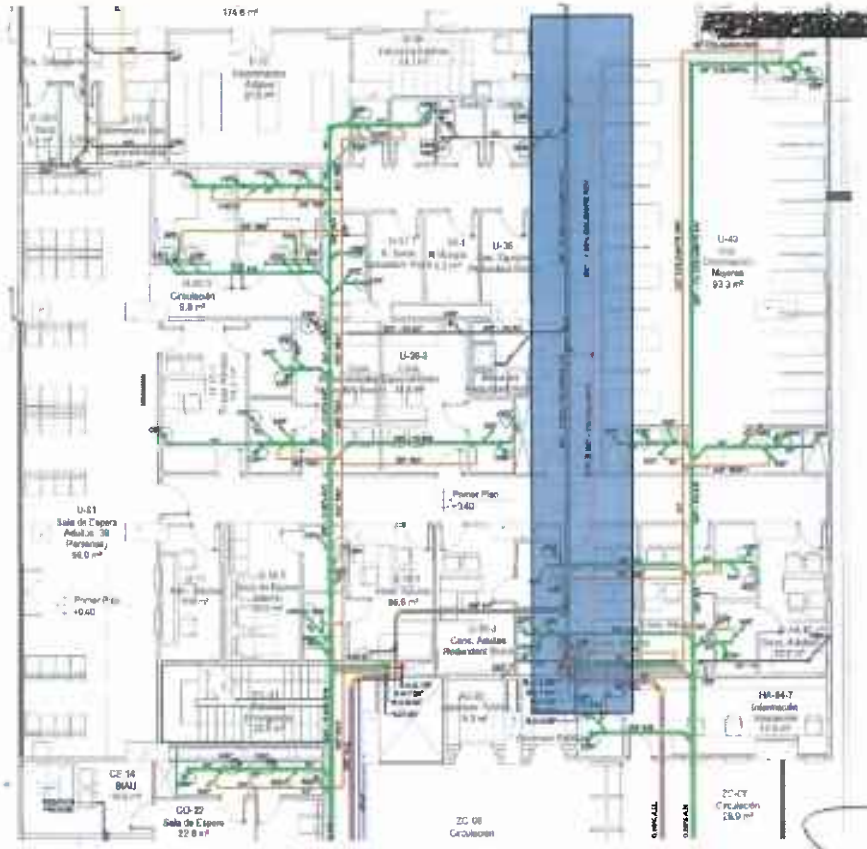

Elaboro:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.14	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
	PRIMER PISO						
	ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					13,00	13,00
	SUB TOTAL						13,00
	VIENE						10,00
	TOTAL						23,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	6	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.14	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

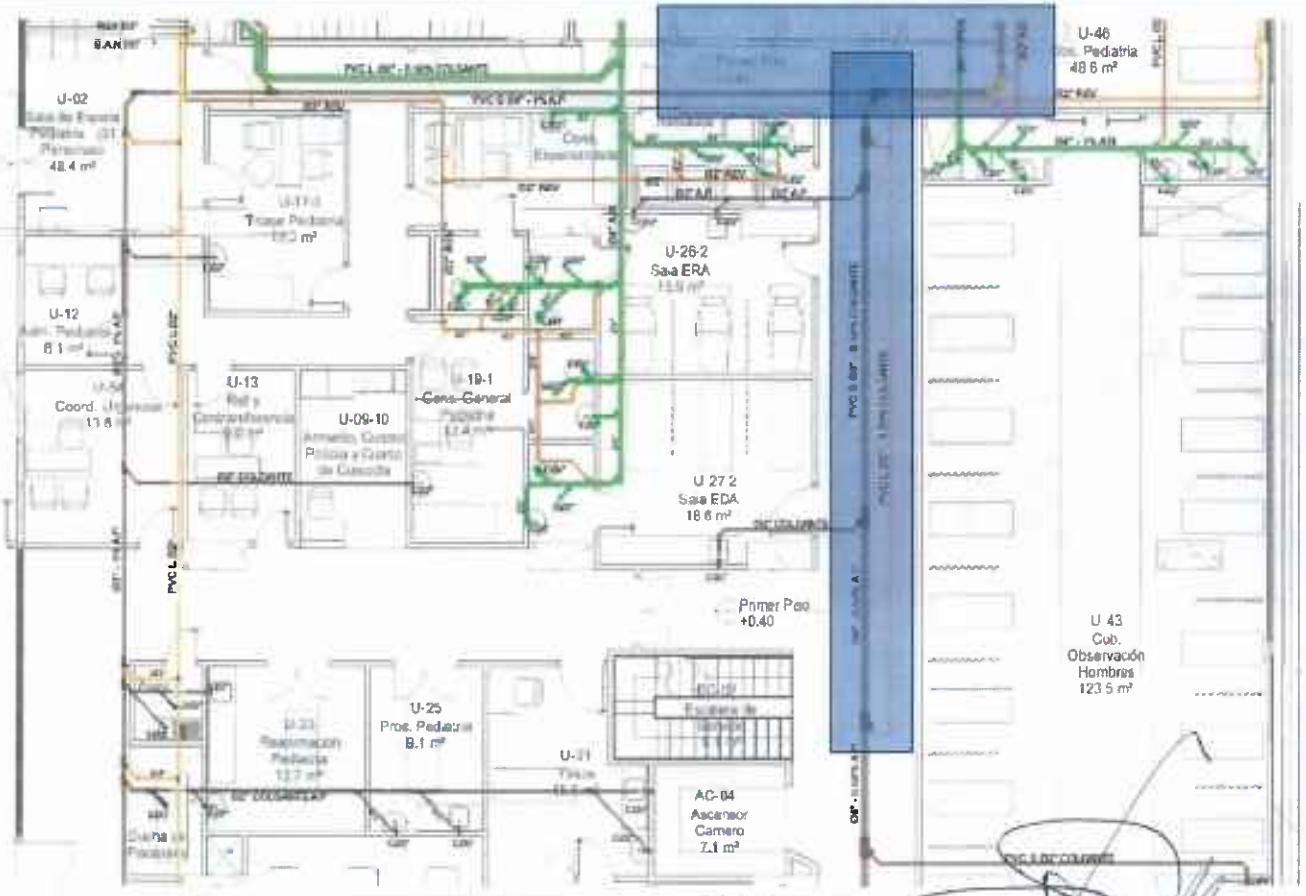

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EJE 5 -10 EJE A-F					14,00	14,00
PASAN						14,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castilla

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°.	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

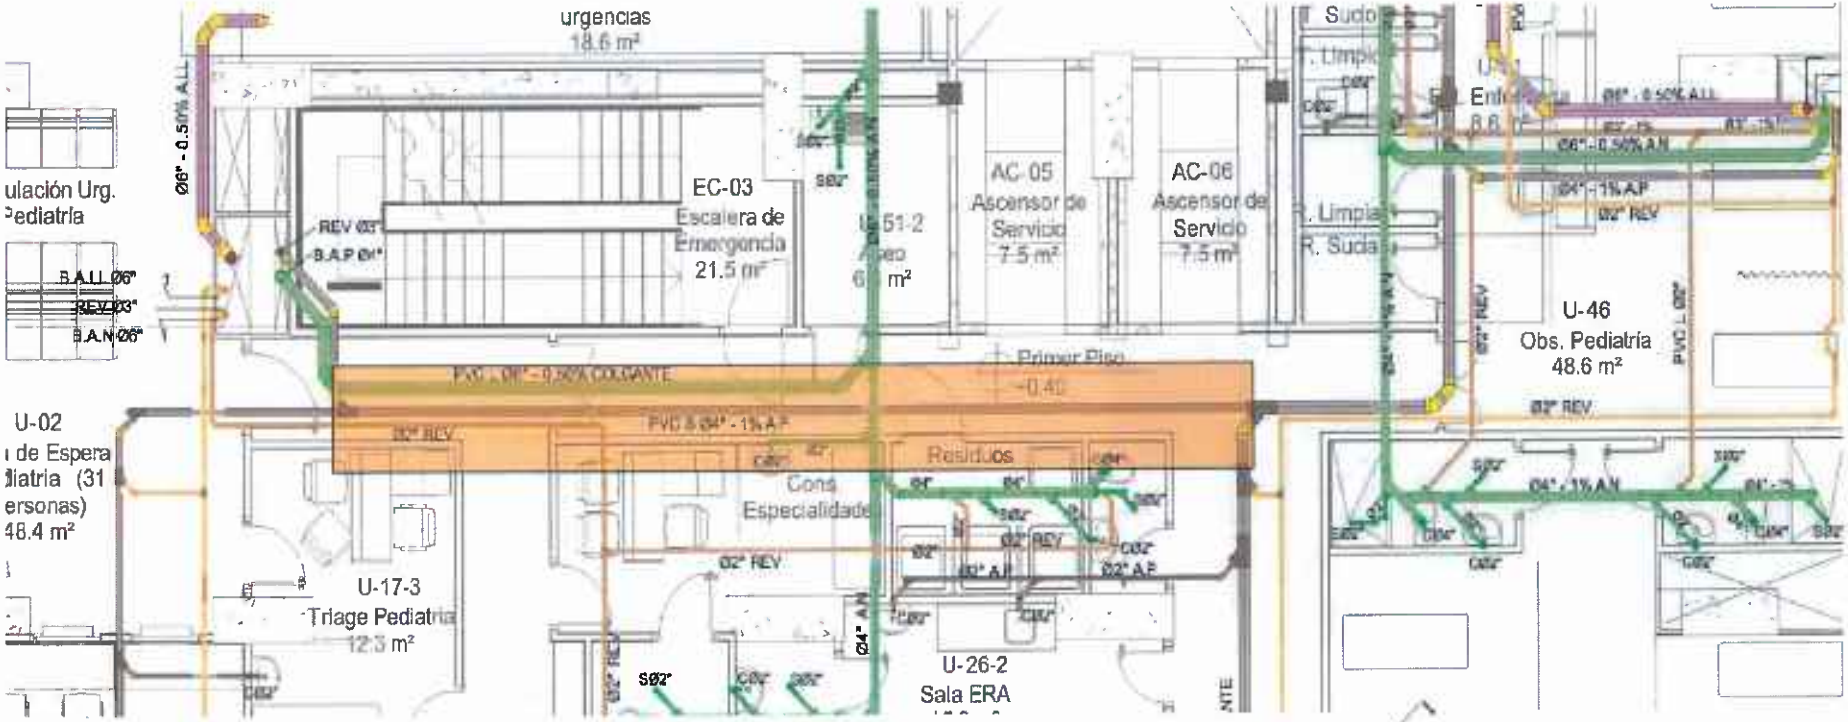

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO						
ENRE EJE 2-5 EJE F					21,00	21,00
SUB TOTAL						21,00
VIENE						14,00
PASAN						35,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

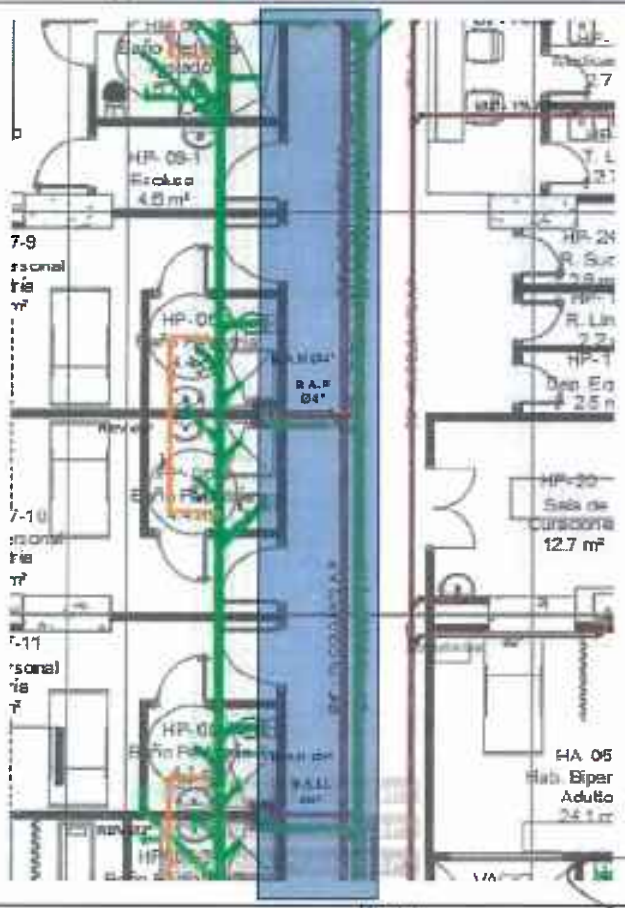

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
CUARTO PISO ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					40,00	40,00
					SUB TOTAL	40,00
					VIENE	35,00
					TOTAL	75,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.15	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

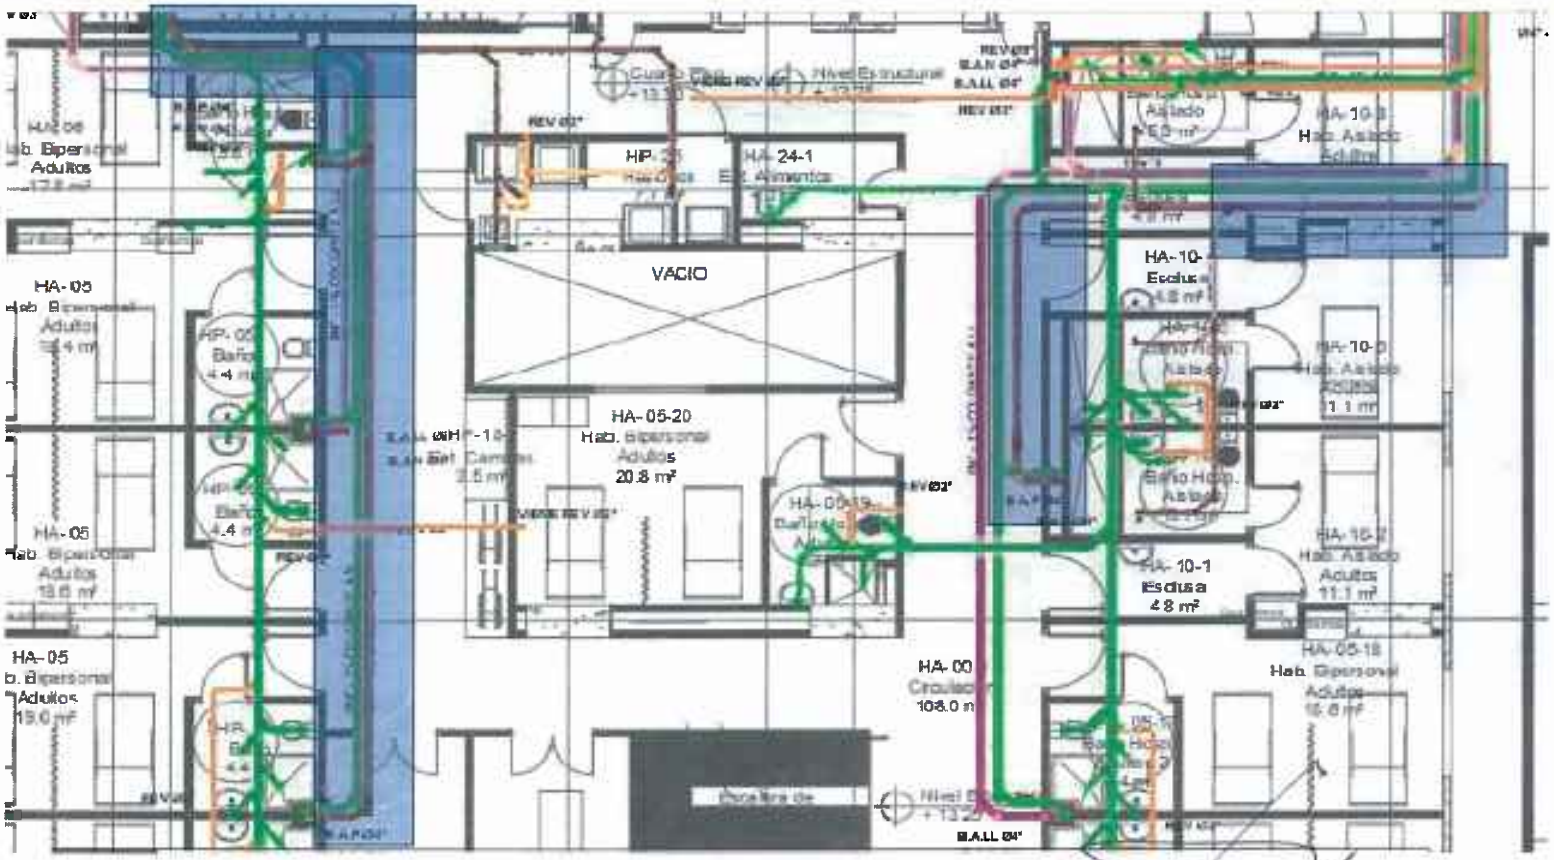

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	28.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

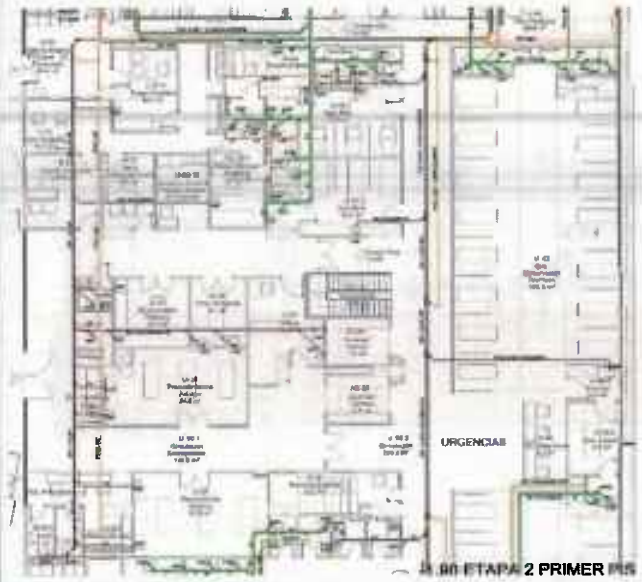

A 90 ETAPA 2 PRIMER PIS

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 6-4 Y EJE B					13,00	13,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

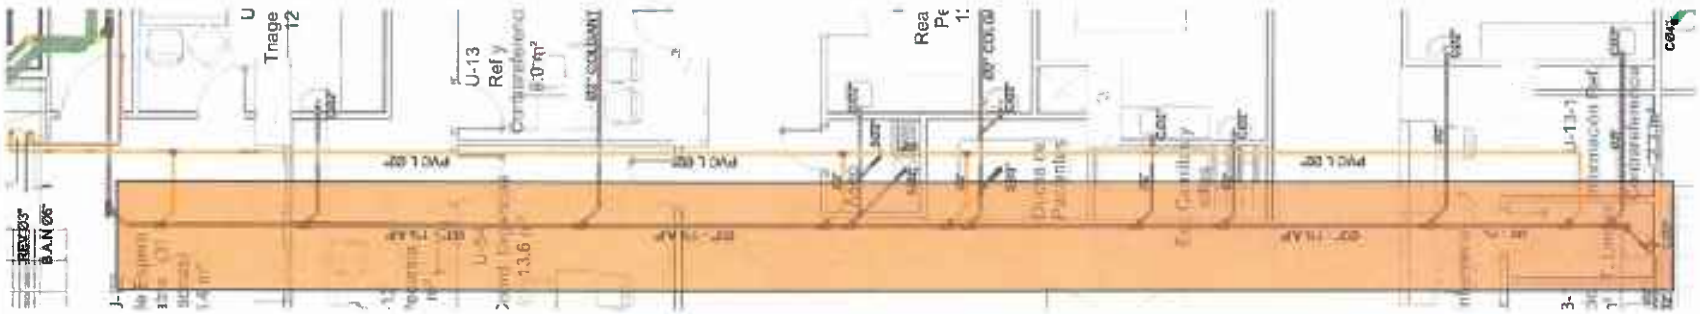

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

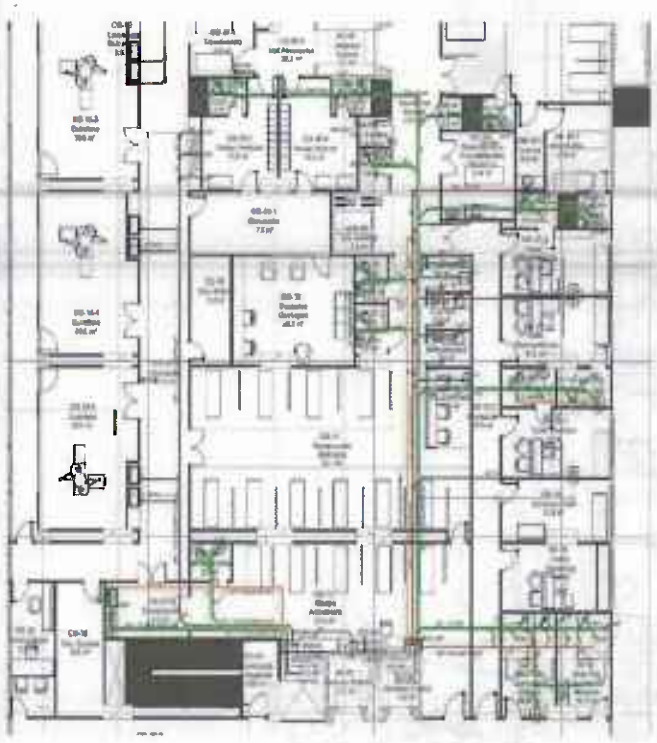

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE ELE EJE 2-5 Y EJE A-F					12,00	12,00
SUB TOTAL						12,00
VIENE						13,00
PASAN						25,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cuellar

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

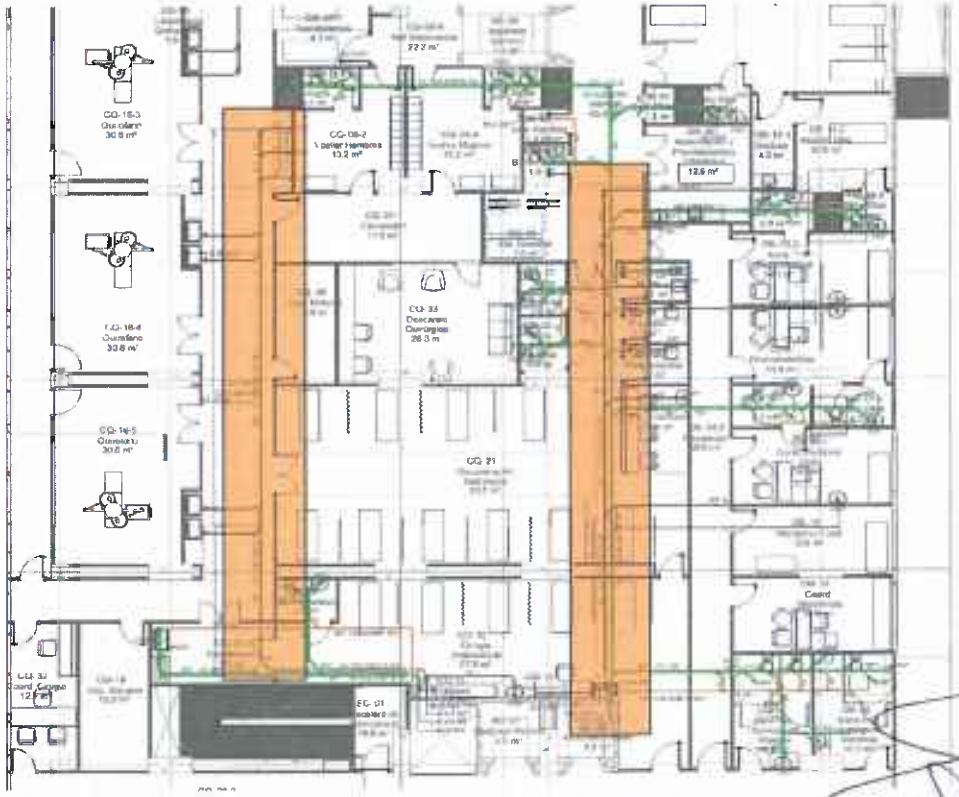

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

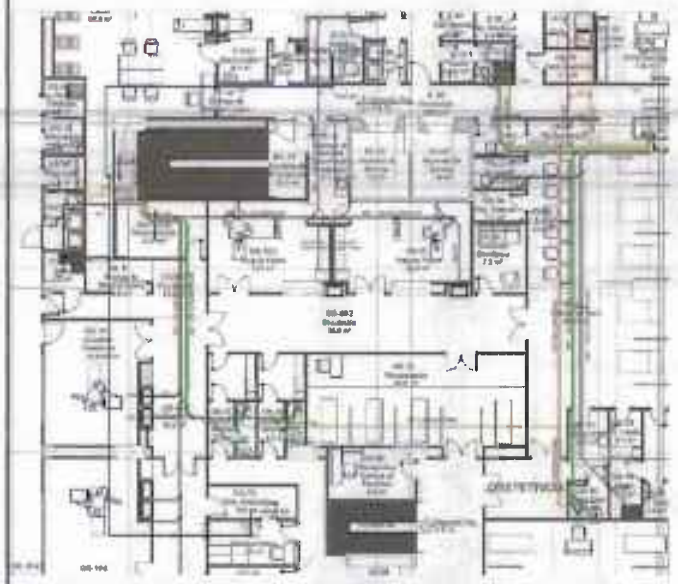

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					26,00	26,00
				SUB TOTAL		26,00
				VIENE		25,00
				PASAN		51,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha	8	4	2020

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

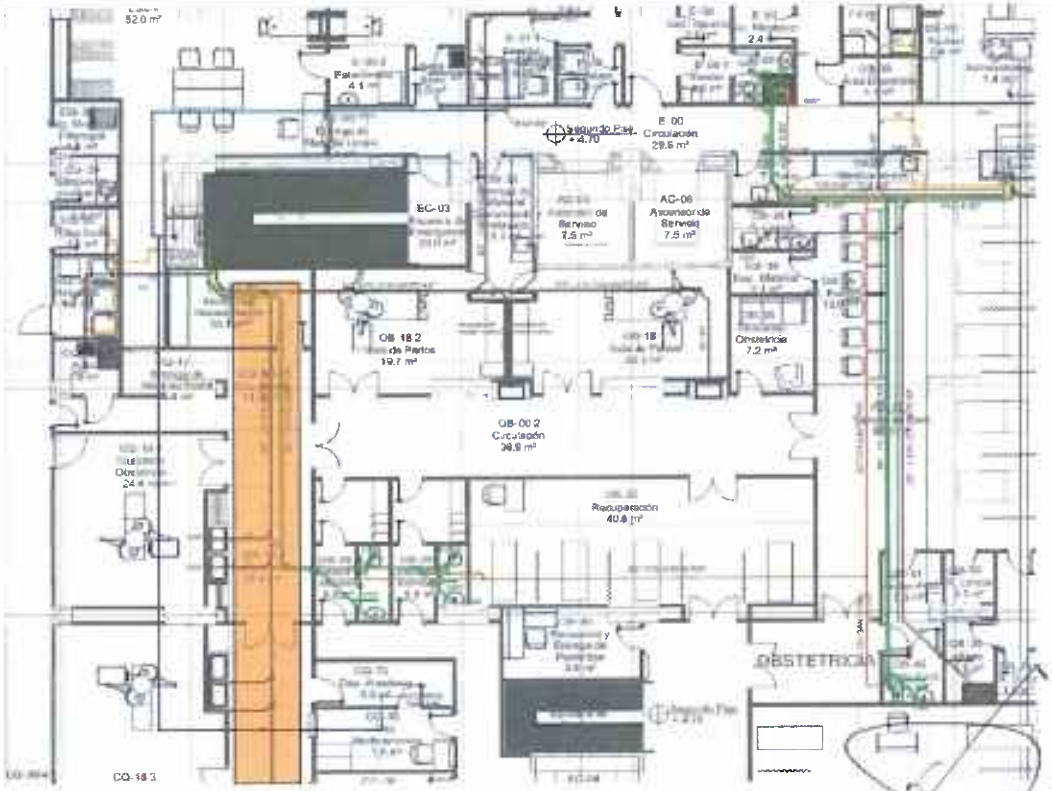

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castaño

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Iker Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 2 de 2		
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

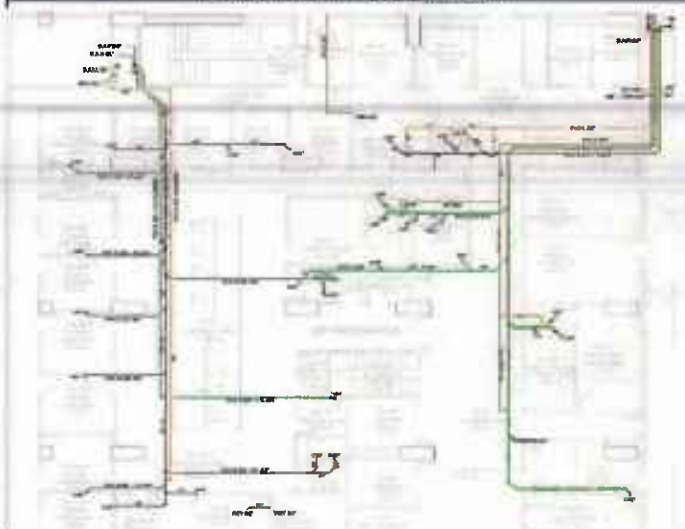

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F					11,00	11,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 05	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

(#) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

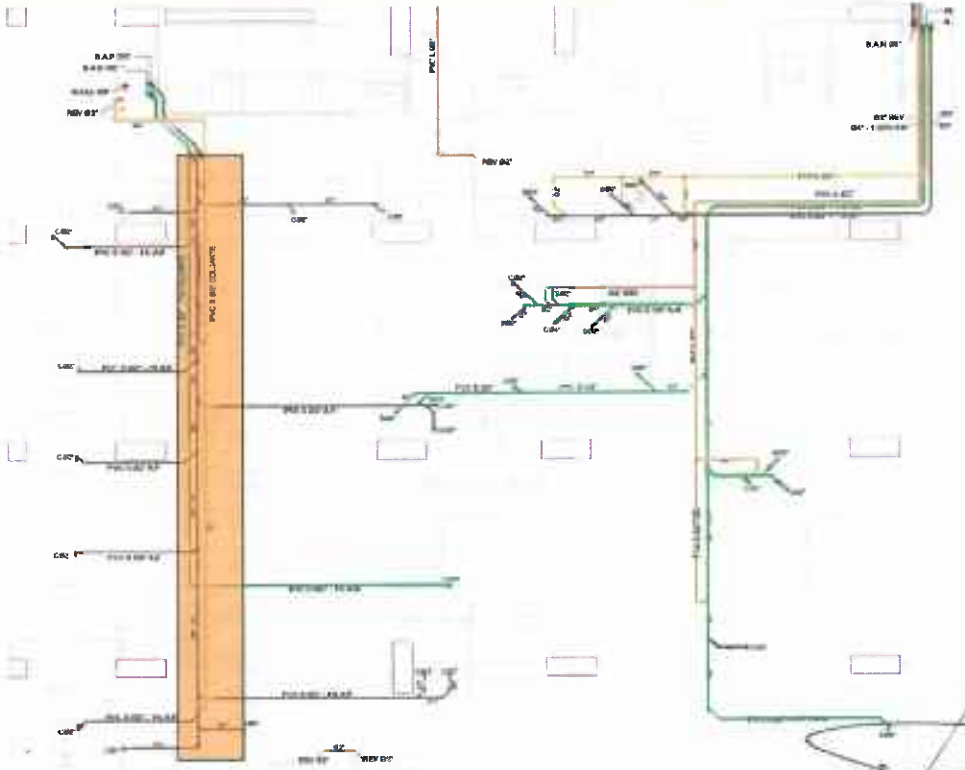

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

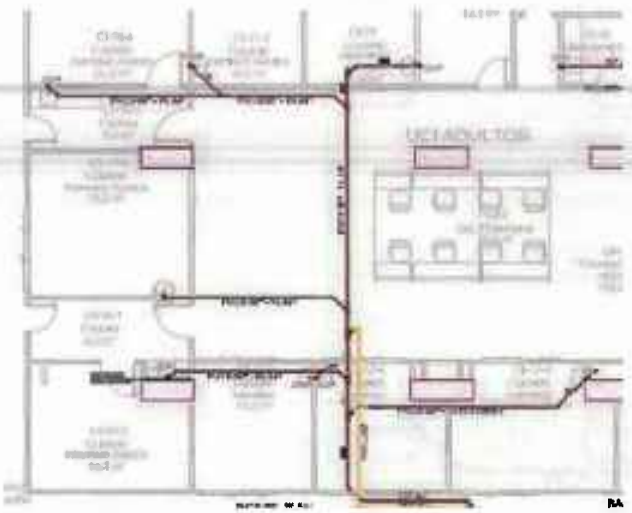

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kglm)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-5 Y EJE A-F					14,00	14,00
SUB TOTAL						14,00
VIENE						62,00
TOTAL						76,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.16	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio 03"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

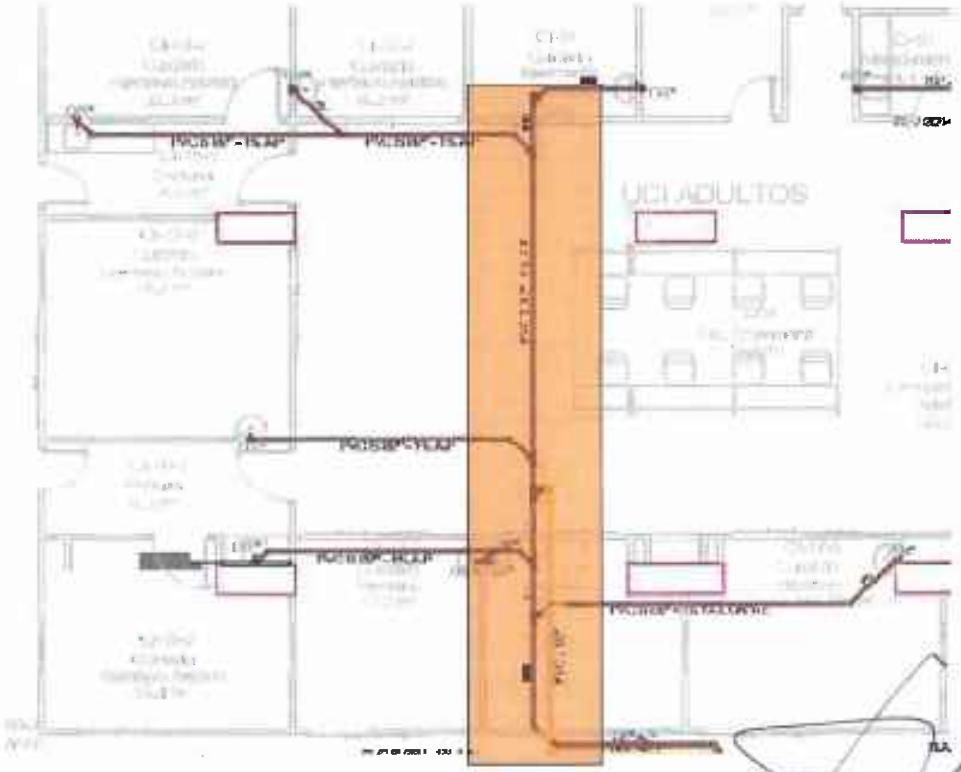

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 3		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**		**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**	
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM Nº:	**26.16.17**	**DESCRIPCION ITEM**	**Abrazadera pera/trapecio Ø2"**			**UND:**	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PRIMER PISO						
ENTRE EL EJE 2-5 Y EJE A-D (incluye abrazaderas de tuberia de ventilación)					23,00	23,00
				PASAN		23,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

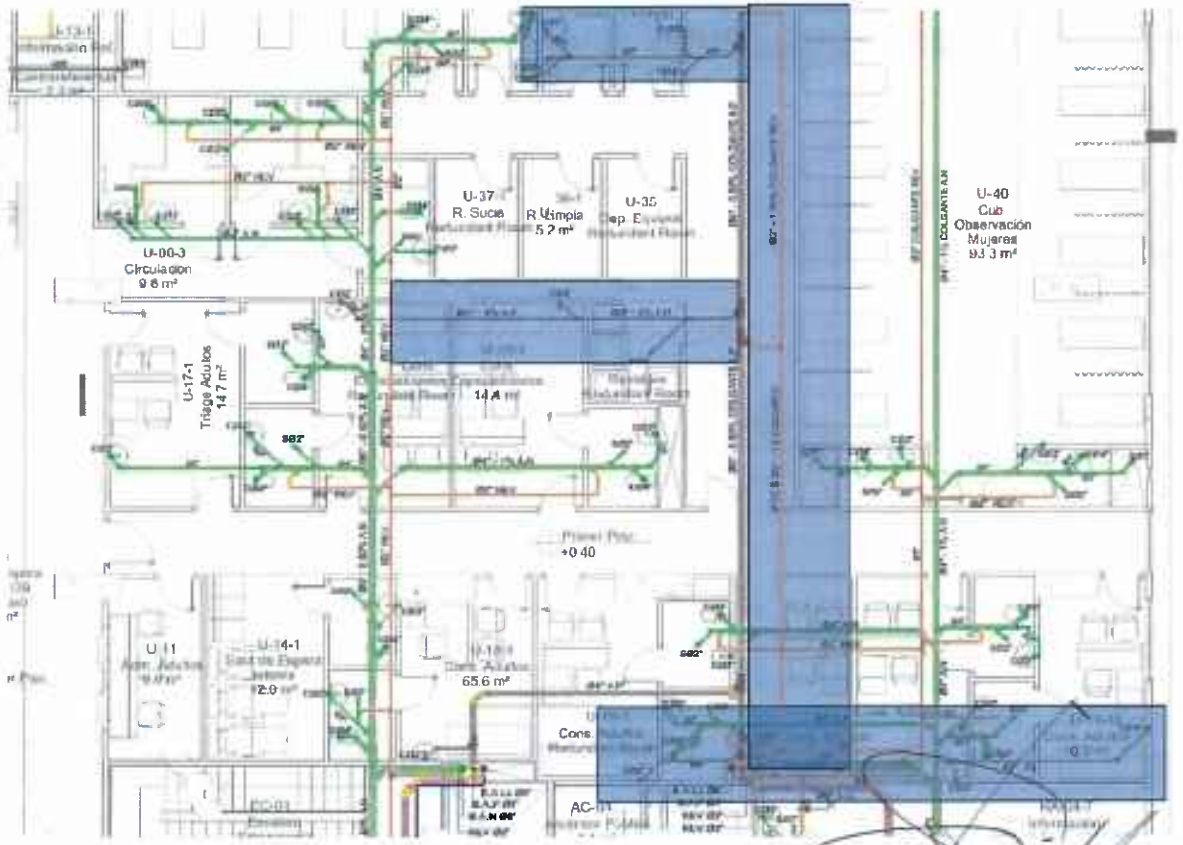

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

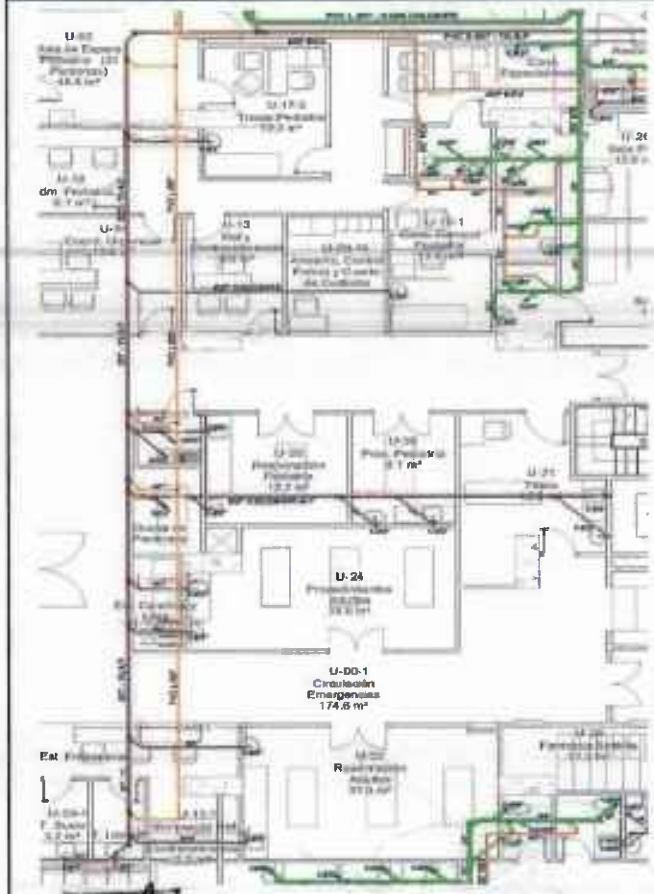

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PRIMER PISO						
ENTRE ELE EJE 5-10 Y EJE A-F (incluye abrazaderas de tuberia de ventilación)					25,00	25,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	6	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

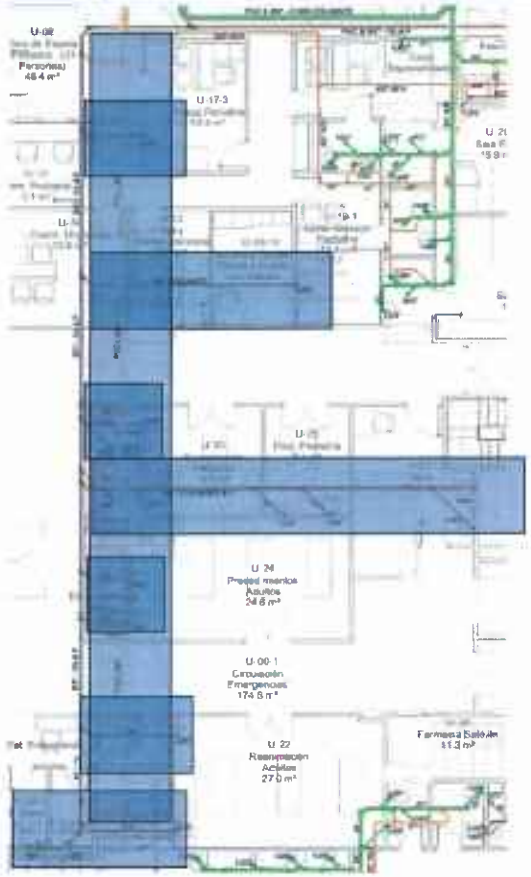

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

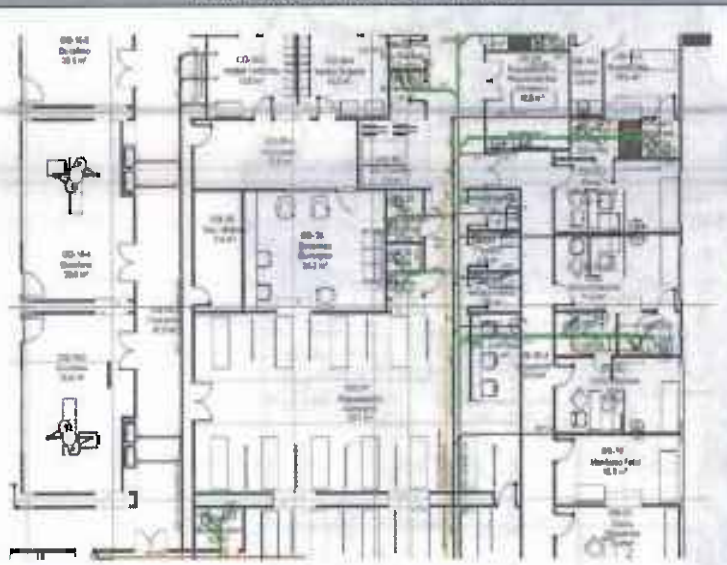

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 3-5 Y EJE A-F (Incluye abrazaderas de tuberia de ventilación)					26,00	26,00
SUB TOTAL						26,00
VIENE						48,00
PASAN						74,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

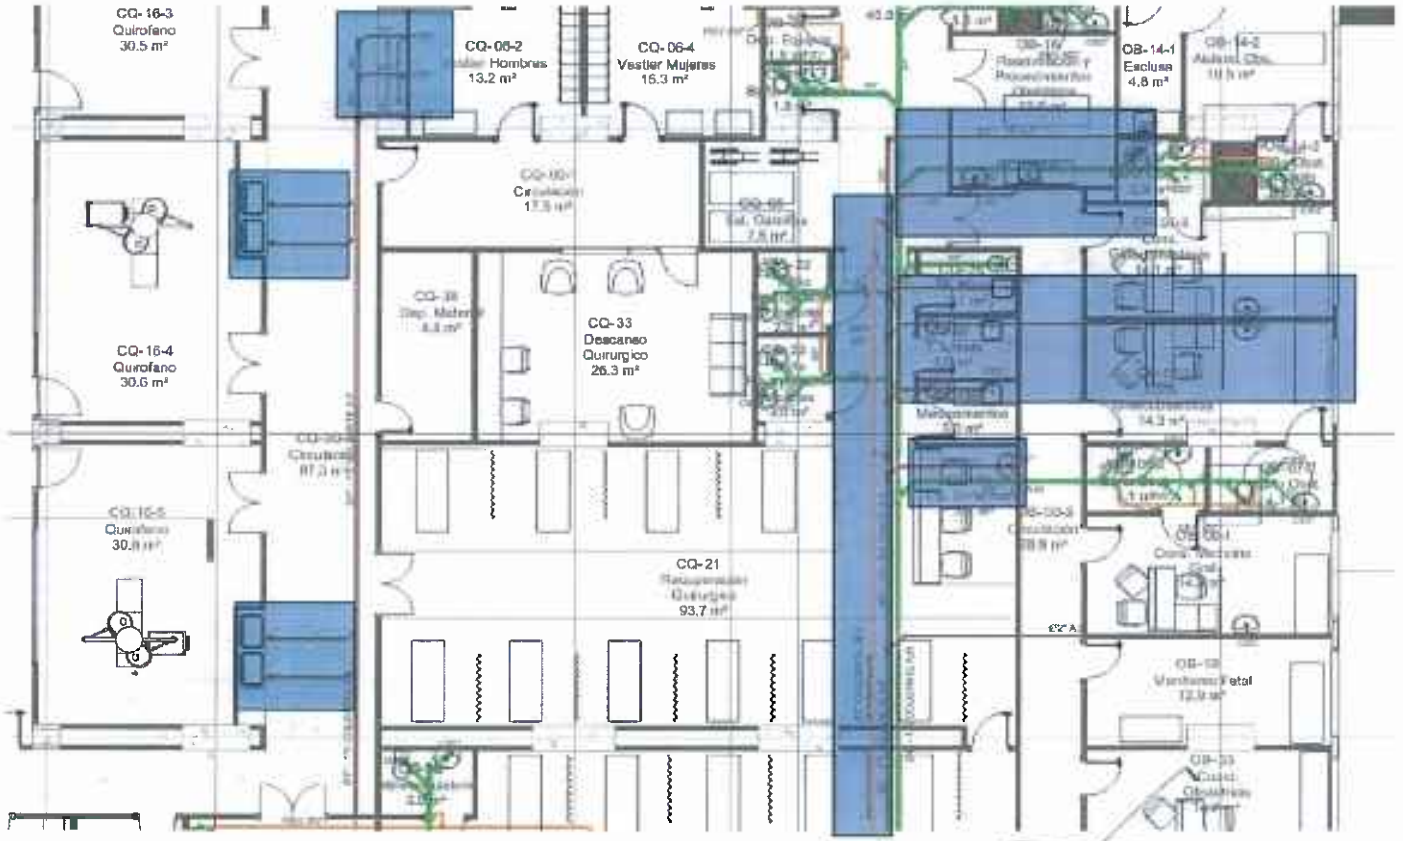

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 08	Página 2 de 2		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

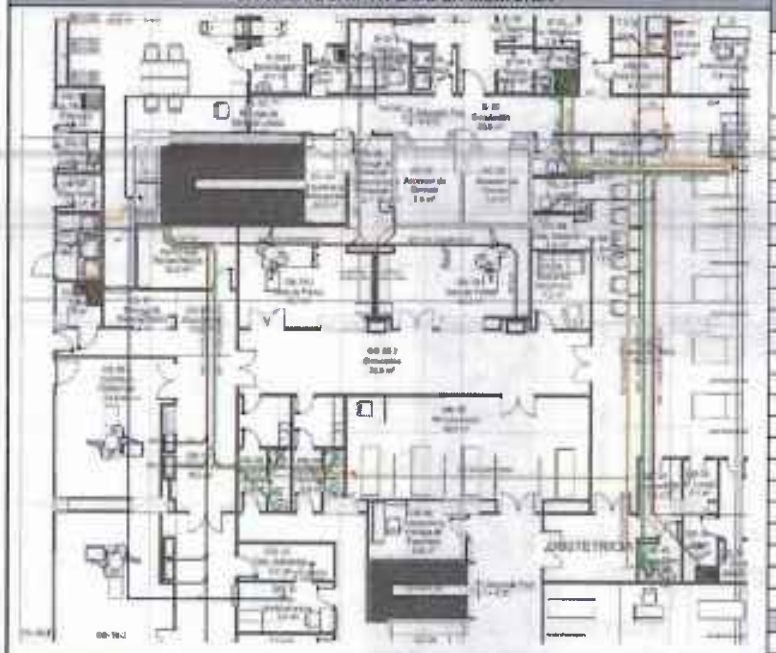

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SEGUNDO PISO						
ENTRE EJE 5-10 Y EJE A-F (incluye abrazaderas de tubería de ventilación)					35,00	35,00
				SUB TOTAL		35,00
				VIENE		74,00
				PASAN		109,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.16.17**	**DESCRIPCION ITEM**	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			**UND:**	UND

[d] PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

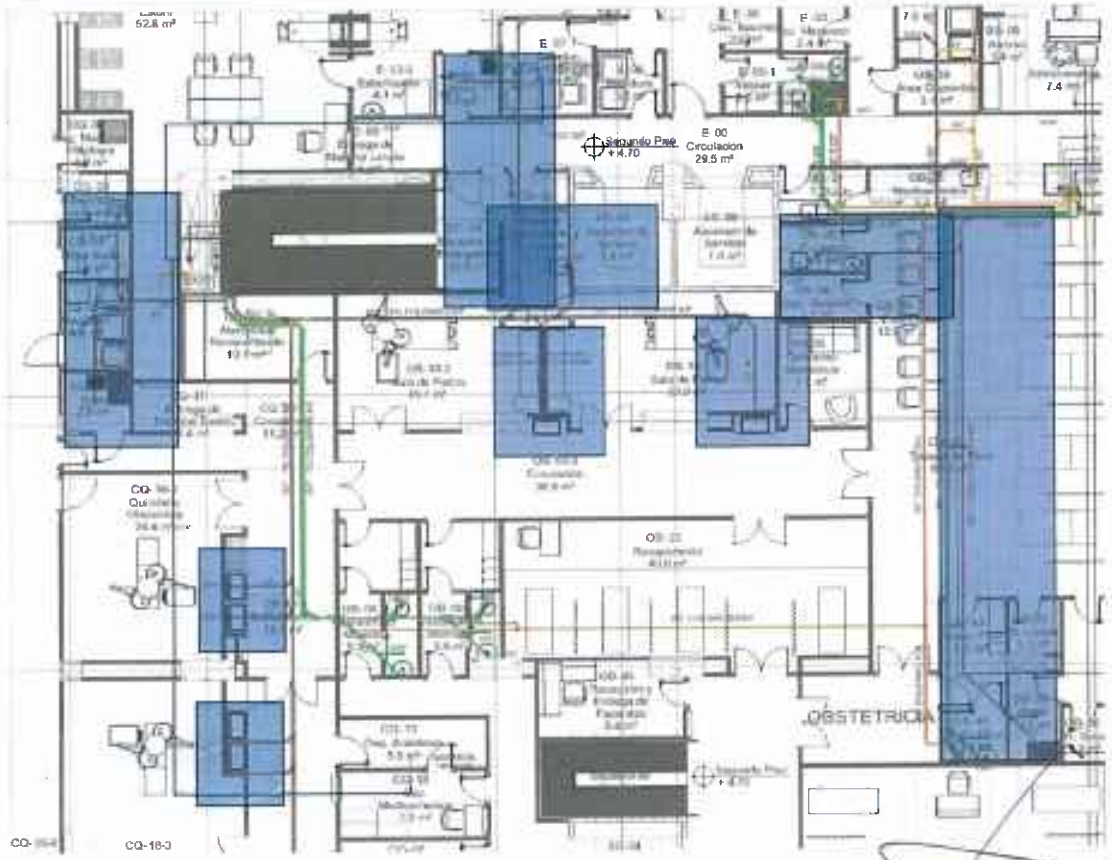

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

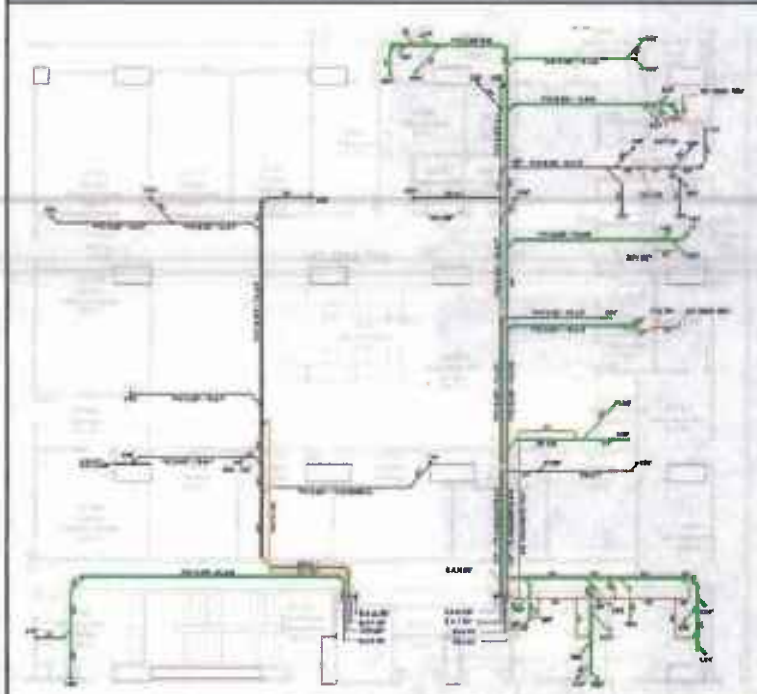

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 2-6 Y EJE A-F (incluye abrazaderas de tuberia de ventilación)					35,00	35,00
abrazaderas de la sanitaria estan incluidas en el item de patogenias					40,00	40,00
SUB-TOTAL						75,00
VIENE						109,00
PASAN						184,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Cerón

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

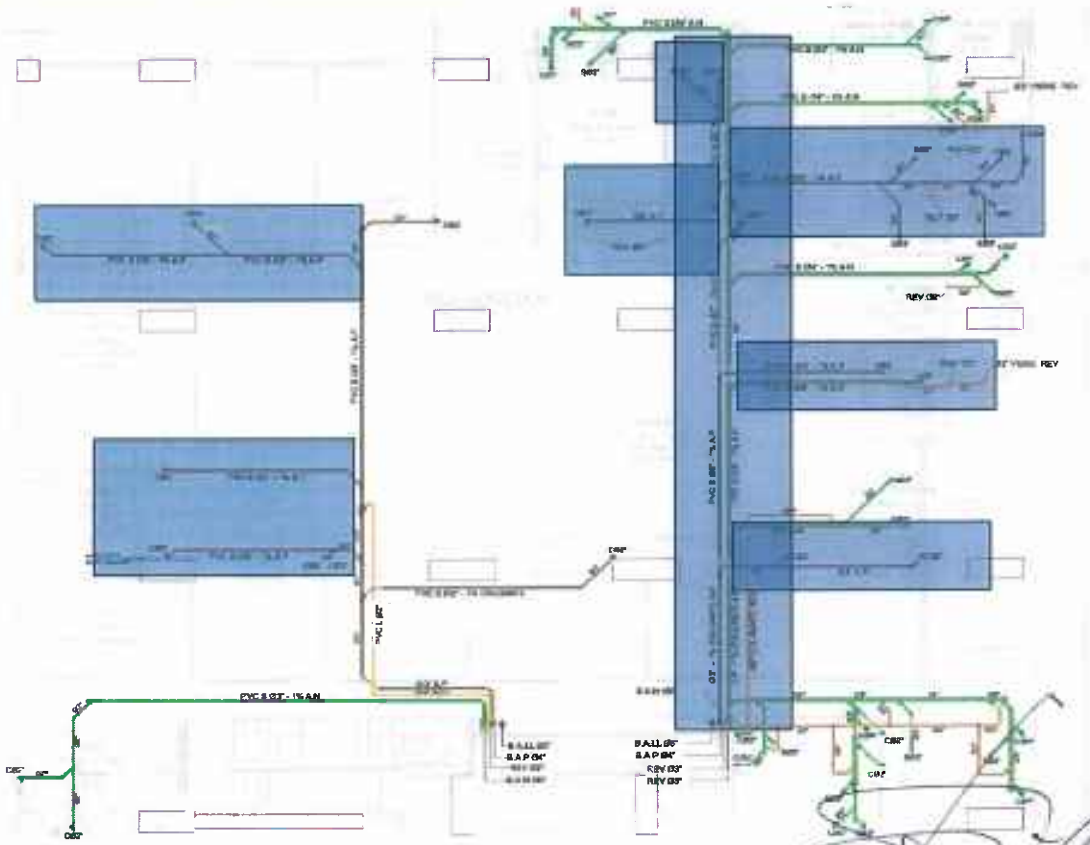

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 2 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCIÓN ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	[Kg/m]	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TERCER PISO						
ENTRE EJE 5-10 EJE A-F					30,00	30,00
Abrazaderas de la sanitaria estan incluidas en el item de patogenas					10,00	10,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

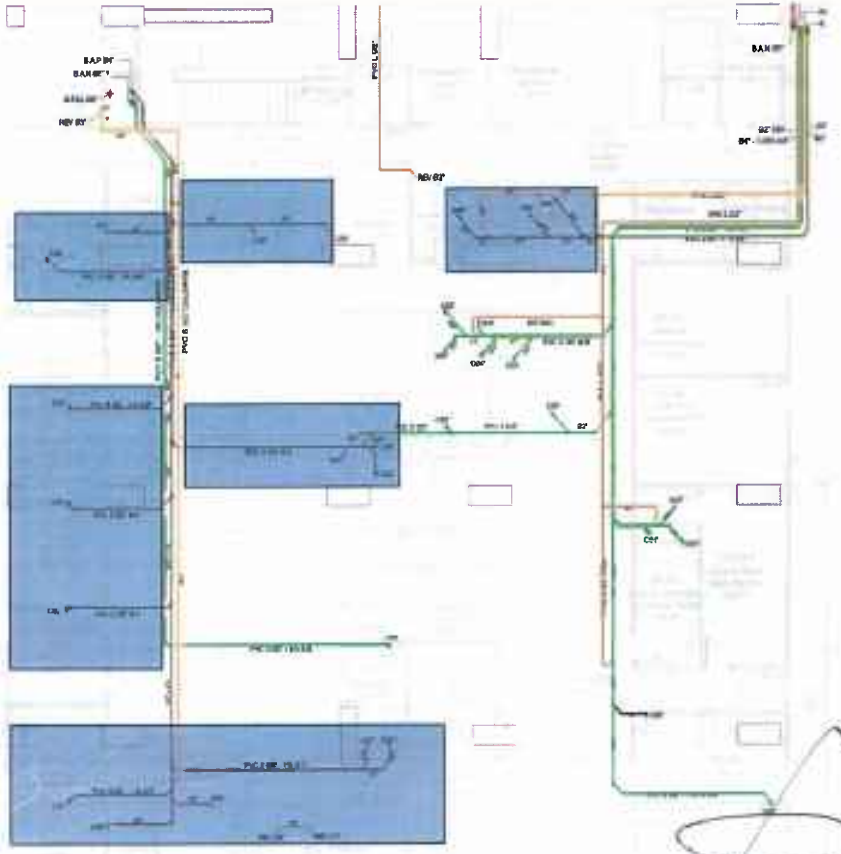

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 3 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDID° TOTAL
CUARTO PISO						
ENTRE EJE 2-5 - EJE A-F					0,00	0,00
Abrazaderas de la sanitaria estan incluidas en el item de patogenas					77,00	77,00
SUB TOTAL						77,00
VIENE						224,00
TOTAL						301,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.17	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

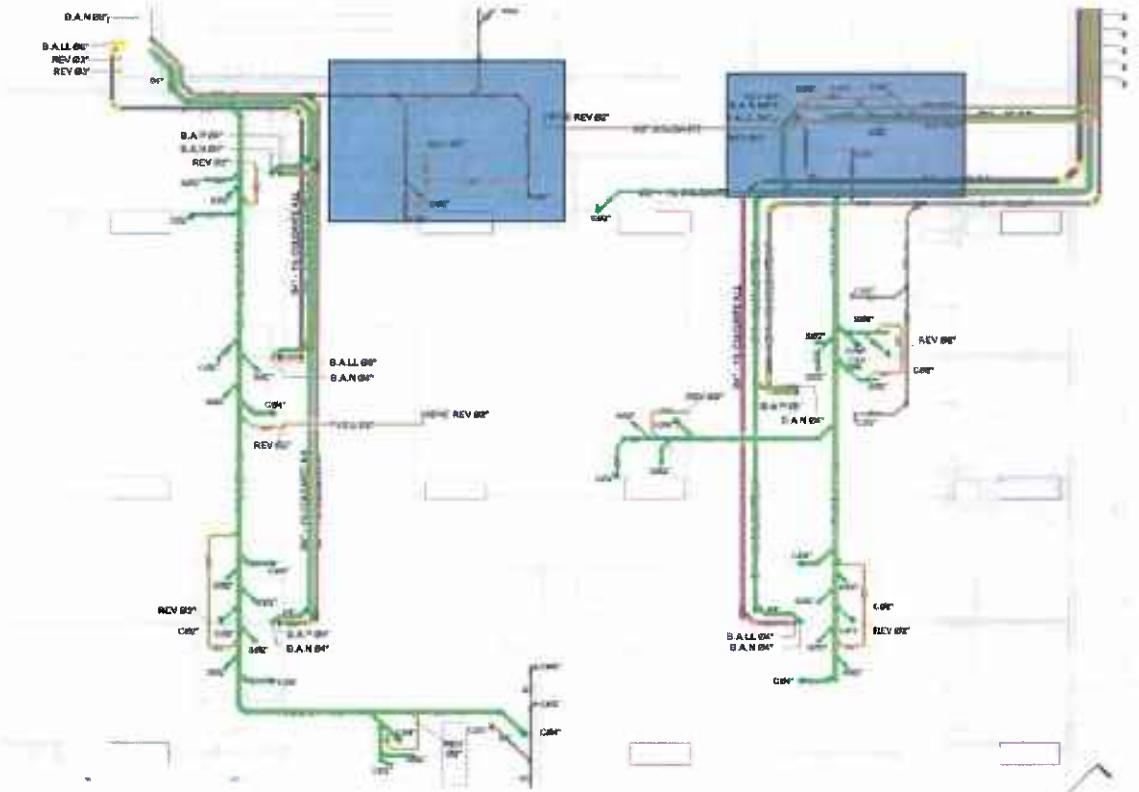

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø6"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA :

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO						
EJE 5 -10 Y EJE C-F		30,57				30,57
PISO 1 RAMALES Y VERTICALES						
EJE 2-9 Y EJE B-C		83,43				83,43
TOTAL						114,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø6"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

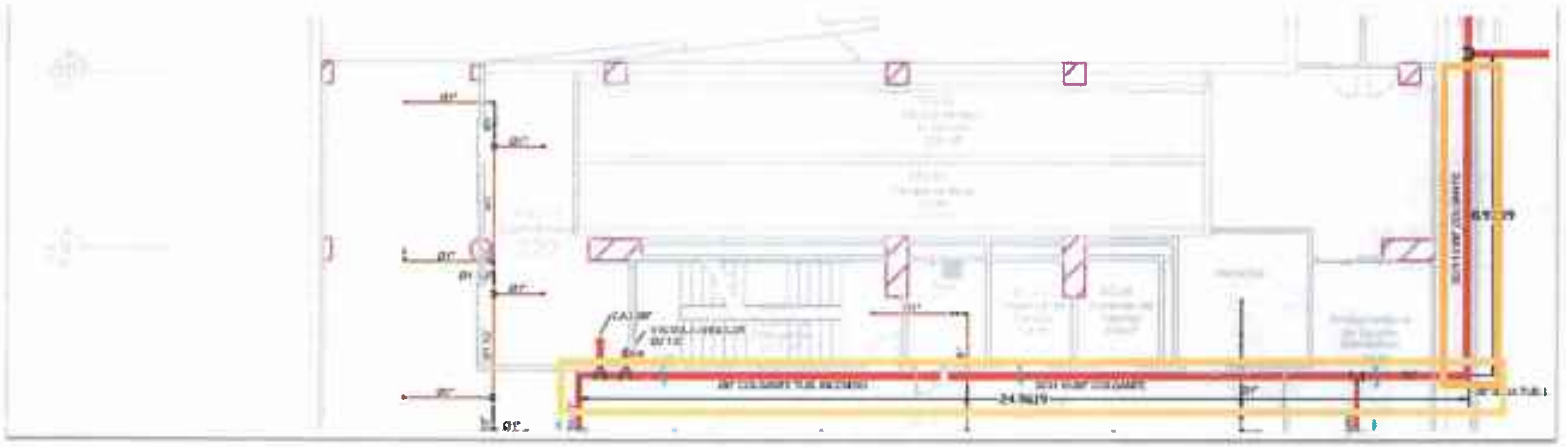

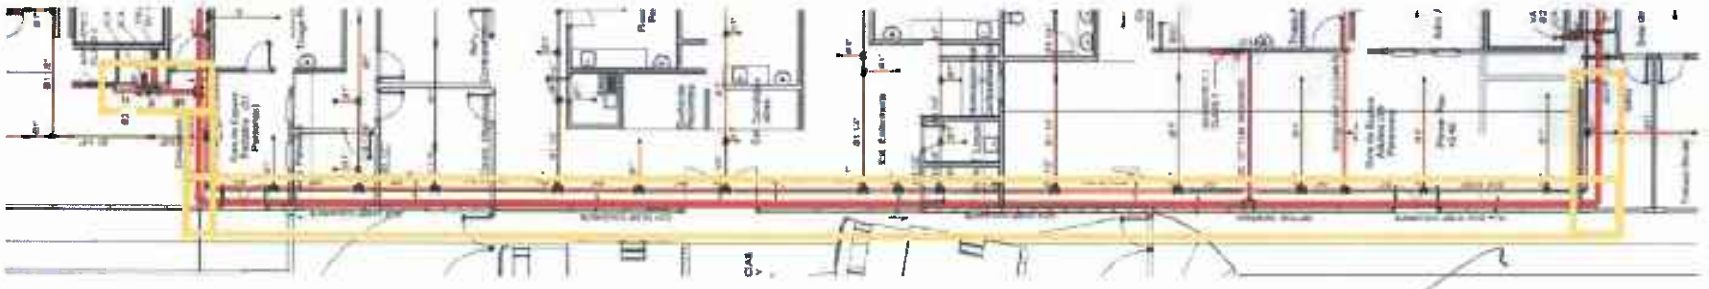

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO						
EJE B-B Y EJE C		7,00				7,00
PISO 1						
EJE 3-B Y EJE CY B		88,50				88,50
TOTAL						95,50

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tuberia acero ranurado SCH 10 Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

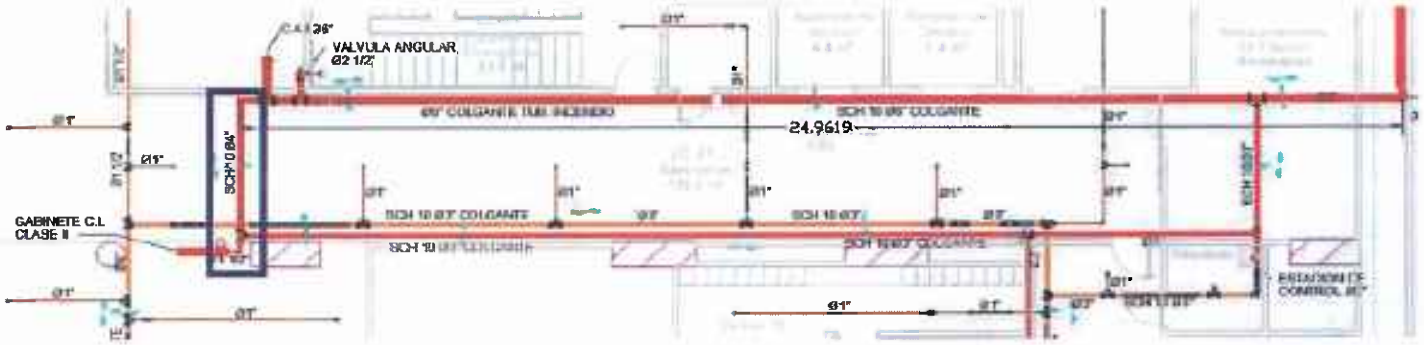

PRIMER PISO

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**27.2.3**	**DESCRIPCION ITEM**	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"			**UND:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO						
EJE 2-B Y EJE 8-E		185,00				185,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"			UND:	ML

(2) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

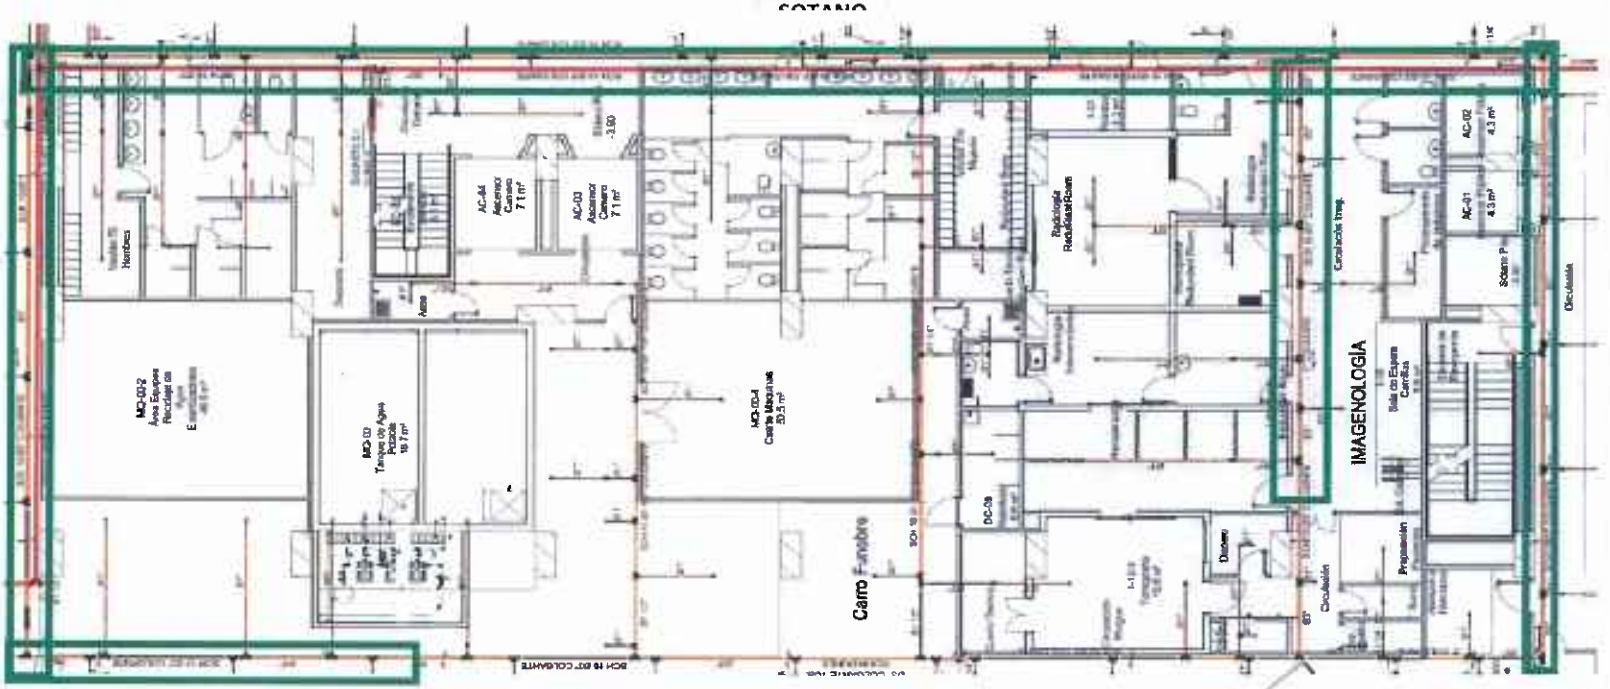

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.2.9	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 5 -10 Y EJE C-F						
CUPPLY Ø6"					20,00	20,00
TEE 6X6					1,00	1,00
CODO 90 °					6,00	6,00
TEE 6X4					1,00	1,00
TEE 6X3					1,00	1,00
PISO 1 EJE 3-5 Y EJE B-C						
CUPPLY Ø6"					19,00	19,00
TOTAL						48,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03	Página 1 de 1		
		Vigente	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**17**	**FECHA :**	**FEBRERO DE 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	**27.2.9**	**DESCRIPCION ITEM**	Accesorios ACERO Ø6"			**UND:**	UND

(II) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

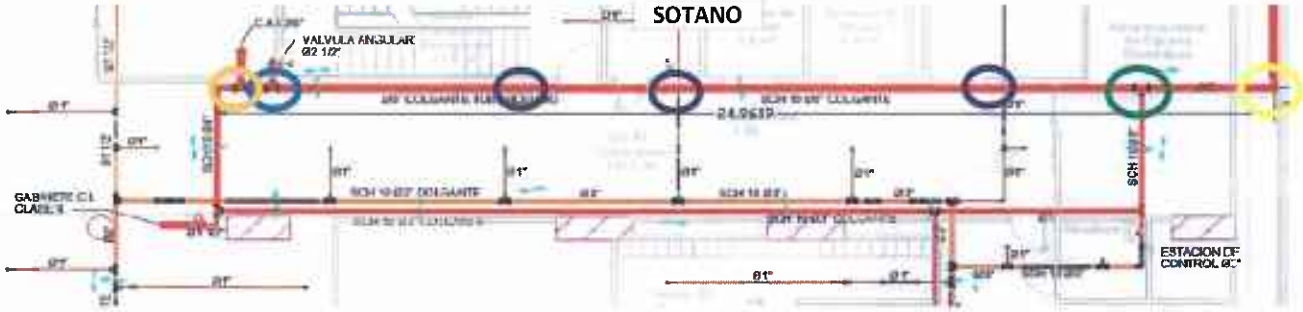

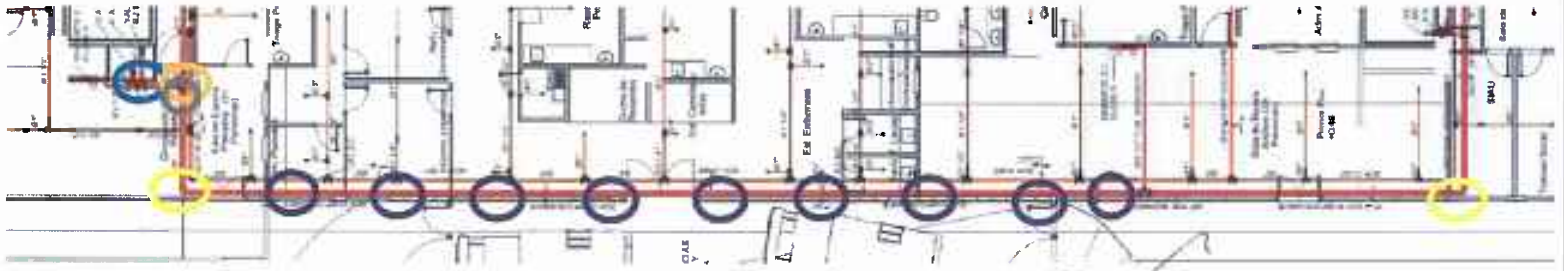

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PISO 1 EJE 3-8 Y EJE C Y E						
CUPPLY Ø4"					23,00	23,00
TEE 4X4					4,00	4,00
CODO 90 °					10,00	10,00
SEMICODO Ø4"					1,00	1,00
BOTANO EJE 8-8 Y EJE C						
CUPPLY Ø4"					4,00	4,00
REDUCCION 4 "2 1/2					1,00	1,00
TEE 4X4					1,00	1,00
TOTAL						46,00

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PM-FO-30			
		Versión No.: 06	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø4"			UND:	UND

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

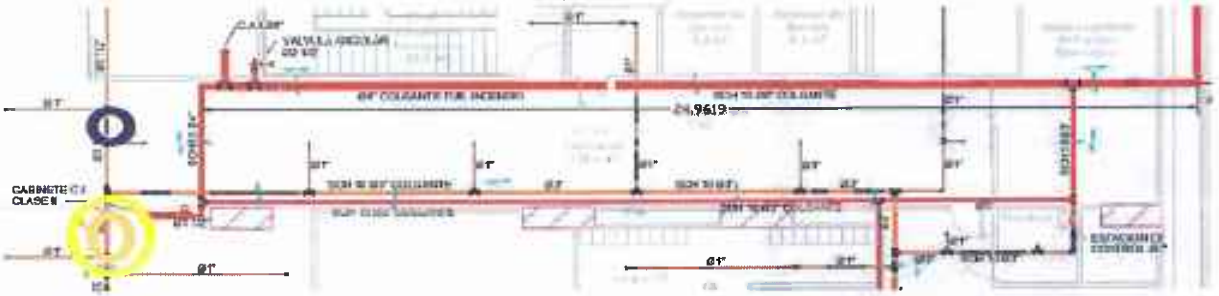

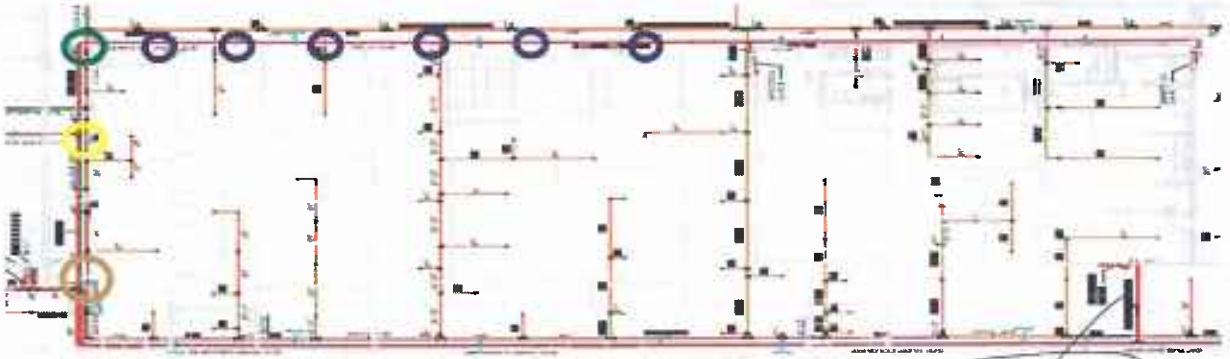

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03	Página 1 de 2		
		Fecha:	D	M	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 3-8 Y EJE B-E						
CUPPLY Ø3"					77,00	77,00
CODO 90 °					9,00	9,00
TEE 3X3					8,00	8,00
TEE 3 X 1 1/2					2,00	2,00
TEE 3 X 1 1/4					1,00	1,00
STRAP Ø3 "X1					97,00	97,00
SEMICODO Ø3"					6,00	6,00
DESNIVEL DE TUBERIA 3" EJE 8 Y EJE E						
TOTAL						200,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"			UND:	UND

(8) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

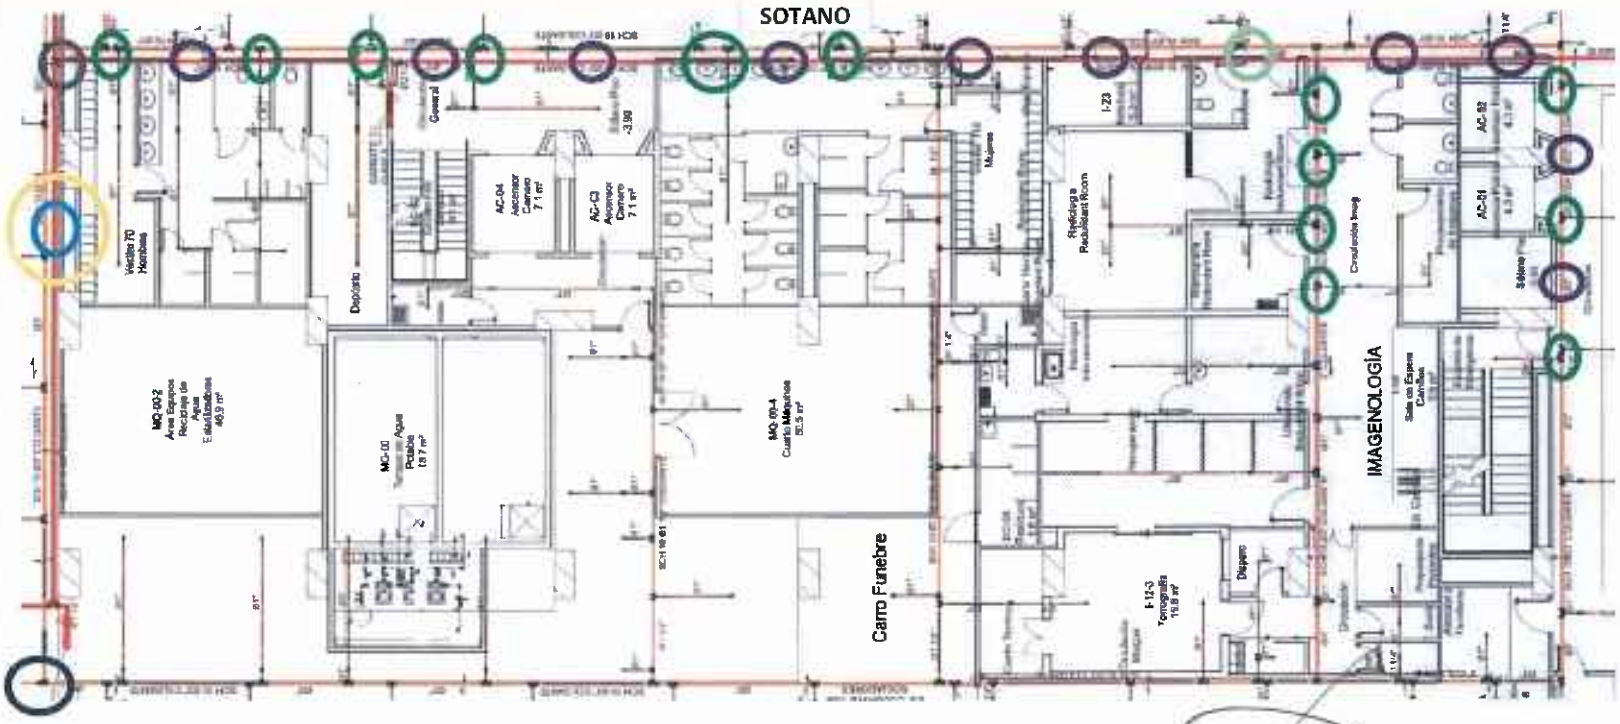

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08	Página 1 de 2		
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.25	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO					16,00	16,00
EJE 8 -10 Y EJE C-F						
PISO 1 RAMALES						
EJE 2-9 Y EJE B-C					21,00	21,00
TOTAL						37,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.25	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

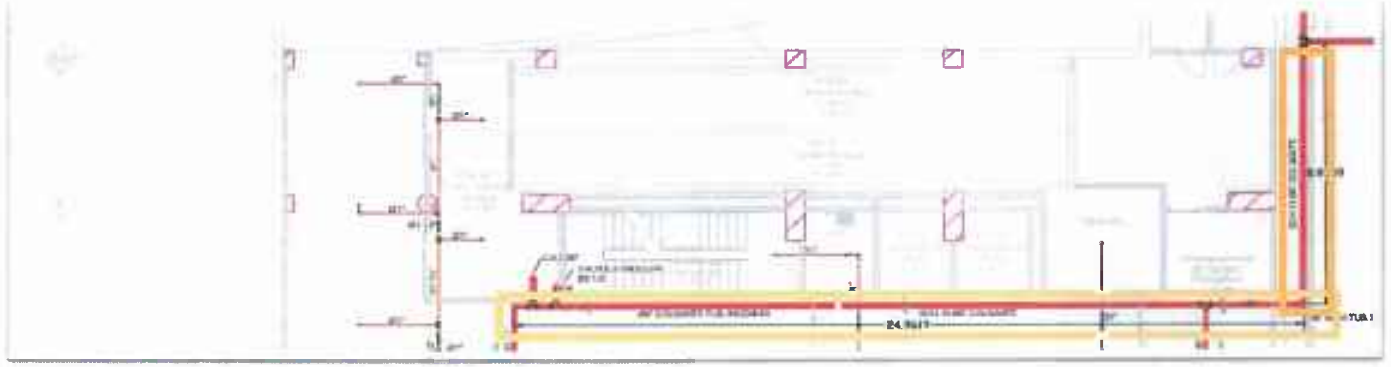

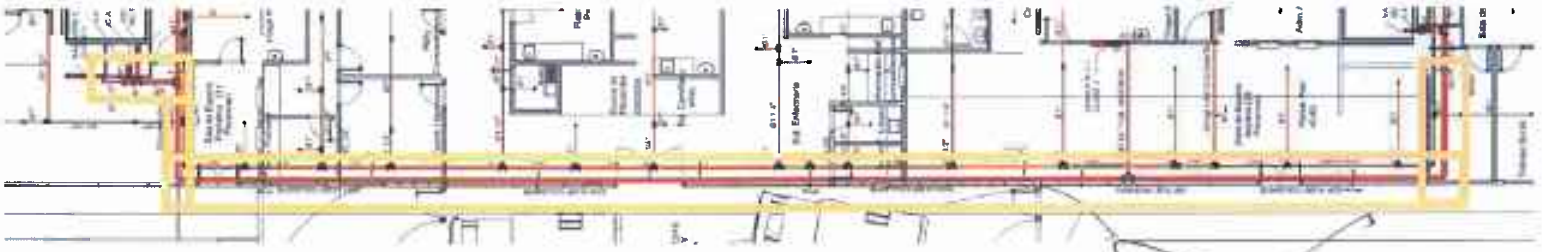

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 5-9 Y EJE C					2,00	2,00
PISO 1 EJE 3-8 Y EJE C Y E					29,00	29,00
				TOTAL		31,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

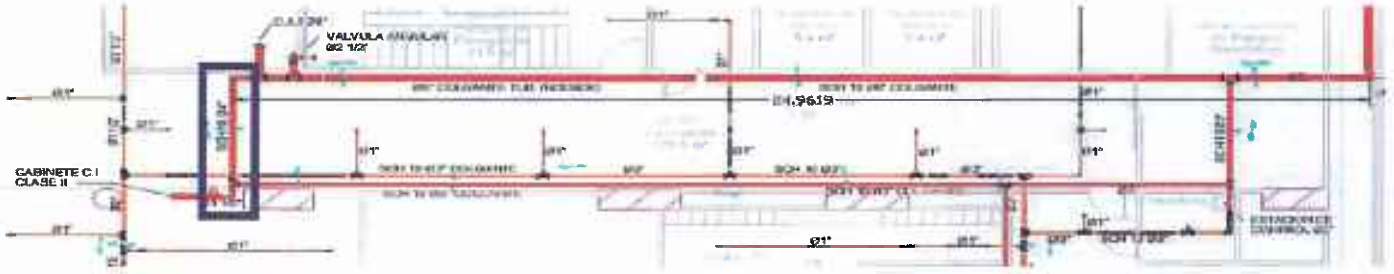

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	19	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 2-9 Y EJE B-E					70,00	70,00
TOTAL						70,00

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

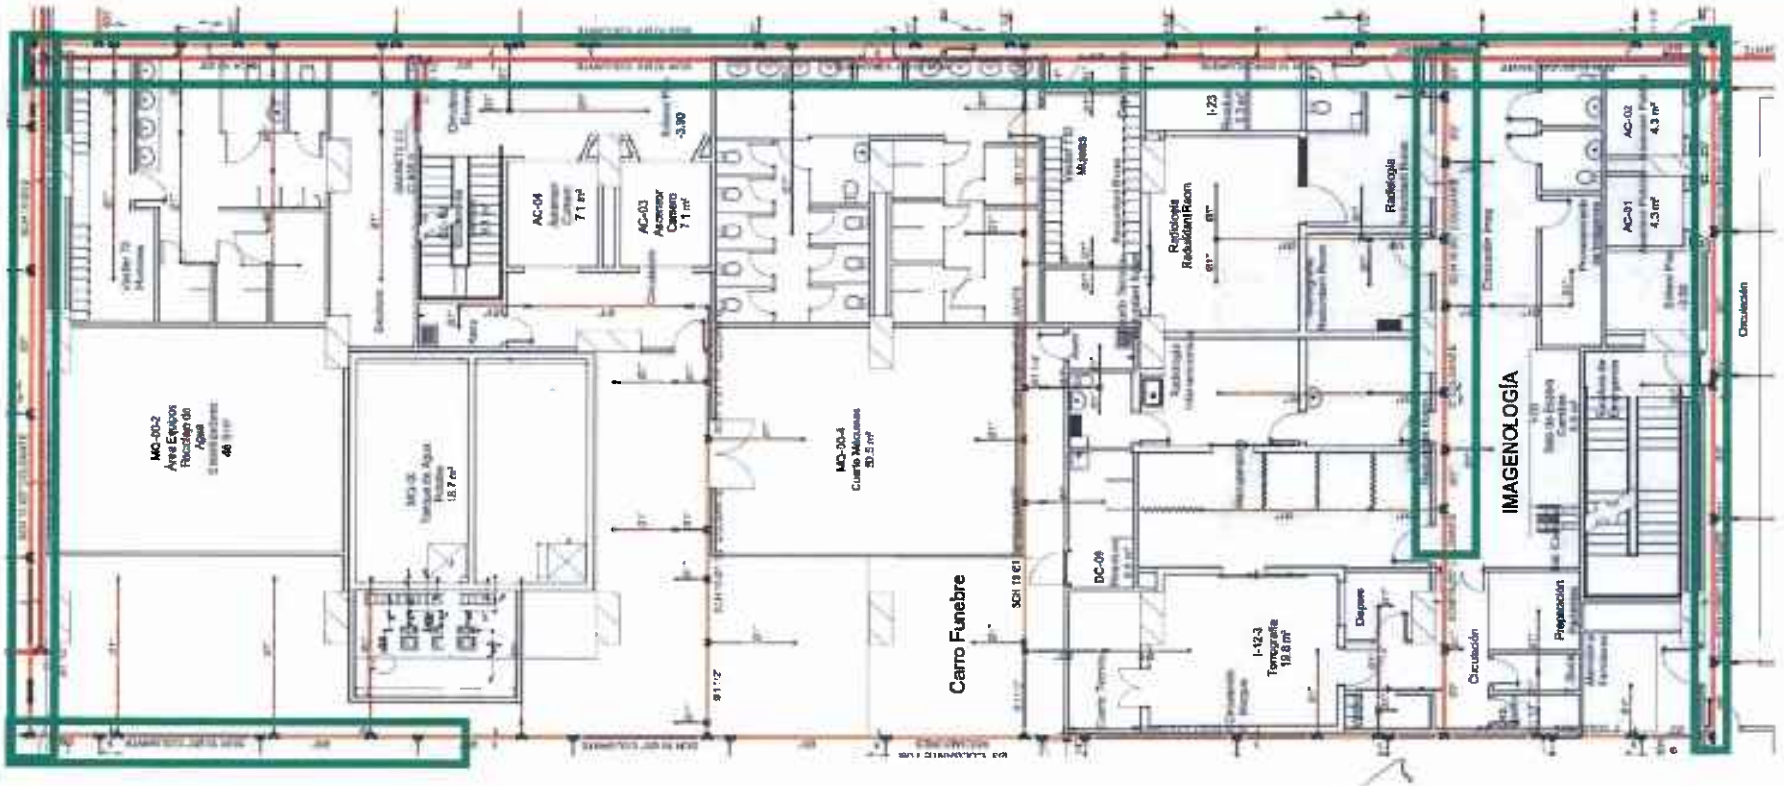

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.2.33	DESCRIPCION ITEM	Soporte sismorresistente longitudinal Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

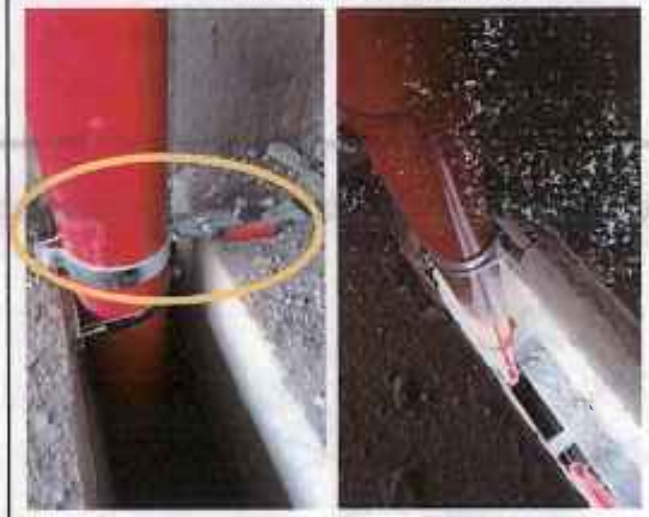

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 8-9 Y EJE C					2,00	2,00
PISO 1 EJE 8-9 Y EJE C					2,00	2,00
				TOTAL		4,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.2.33	DESCRIPCION ITEM	Soporte sismorresistente longitudinal Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

2 PRIMER PISO - ETAPA 1

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.37	DESCRIPCION ITEM	Soporte sismorresistente lateral Ø6"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE 8-9 Y EJE C					2,00	2,00
PISO 1 EJE 8-9 Y EJE C					2,00	2,00
				TOTAL		4,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.37	DESCRIPCION ITEM	Soporte sismorresistente lateral Ø6"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

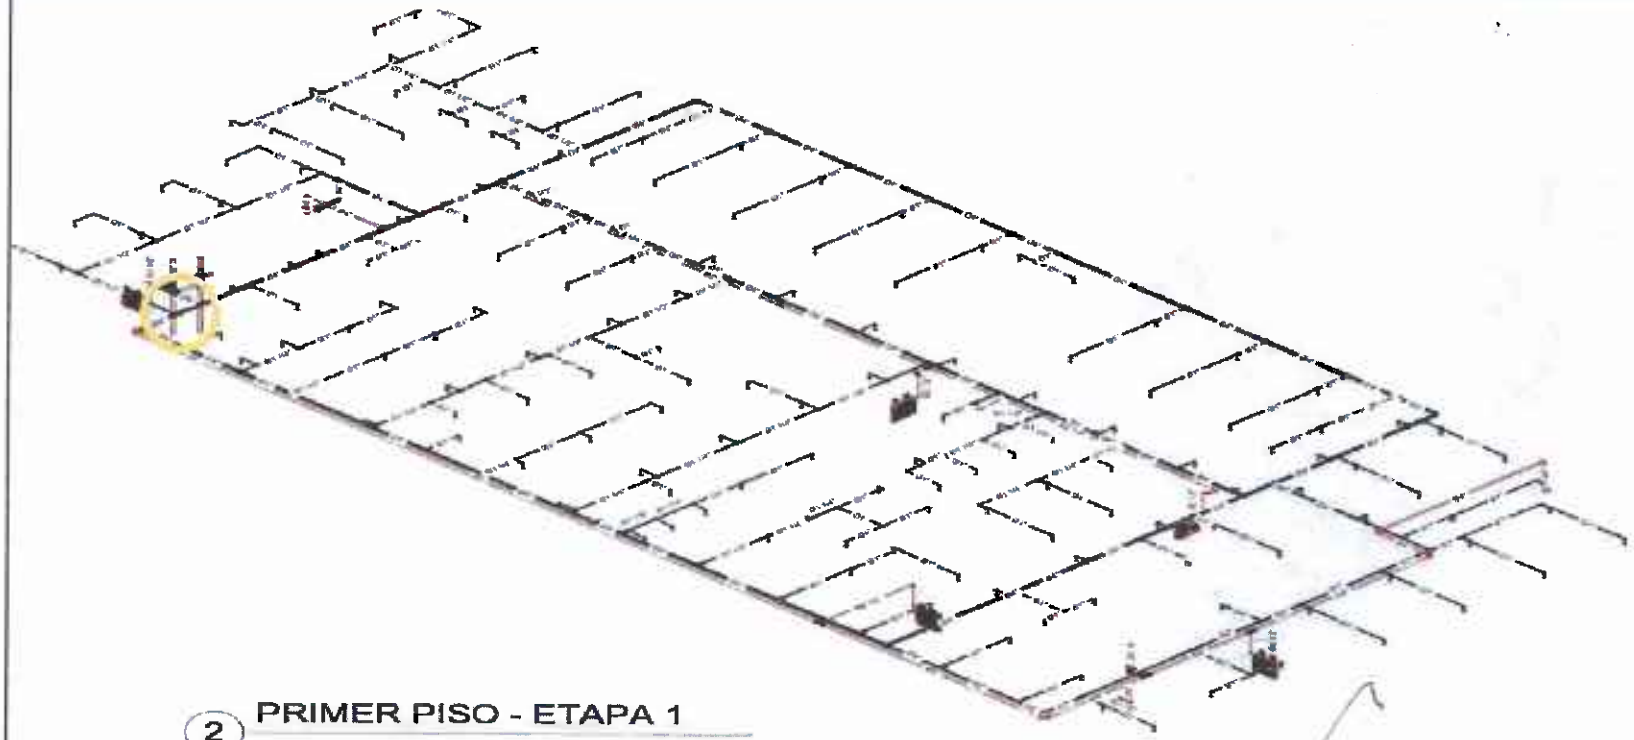

2 PRIMER PISO - ETAPA 1

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha.	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.1	DESCRIPCION ITEM	Válvula Mariposa ranurada con switch Indicador certificada UL/FM Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m2)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PISO 1 EJE 9 Y EJE D					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.1	DESCRIPCION ITEM	Válvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM Ø4"			UND:	UND

(#) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.2	DESCRIPCION ITEM	Válvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE E-F Y EJE 8					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.2	DESCRIPCION ITEM	Válvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM Ø3"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

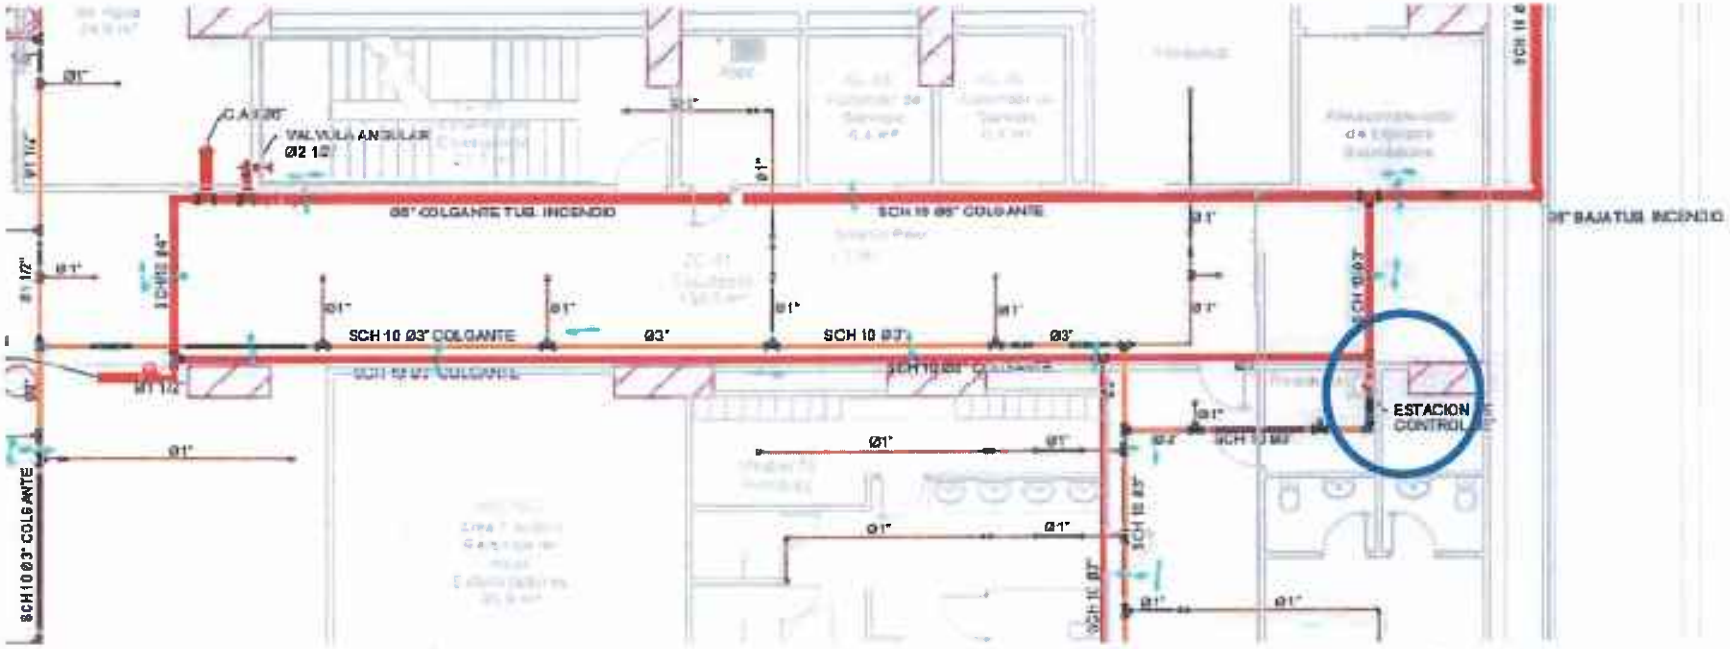

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	1	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.3.10	DESCRIPCION ITEM	Cheque amortiguado extremo ranurado Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PISO 1 EJE 9 Y EJE D					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.10	DESCRIPCION ITEM	Cheque amortiguado extremo ranurado Ø4"			UND:	UND

(II) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	8	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	27.3.11	DESCRIPCION ITEM	Cheque amortiguado extremo ranurado Ø3"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
SOTANO EJE E-F Y EJE II					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No.: 04		3 Agina 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2022

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA :	FEBRERO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.3.11	DESCRIPCION ITEM	Cheque amortiguado extremo ranurado Ø3"			UND:	UND

(ø) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

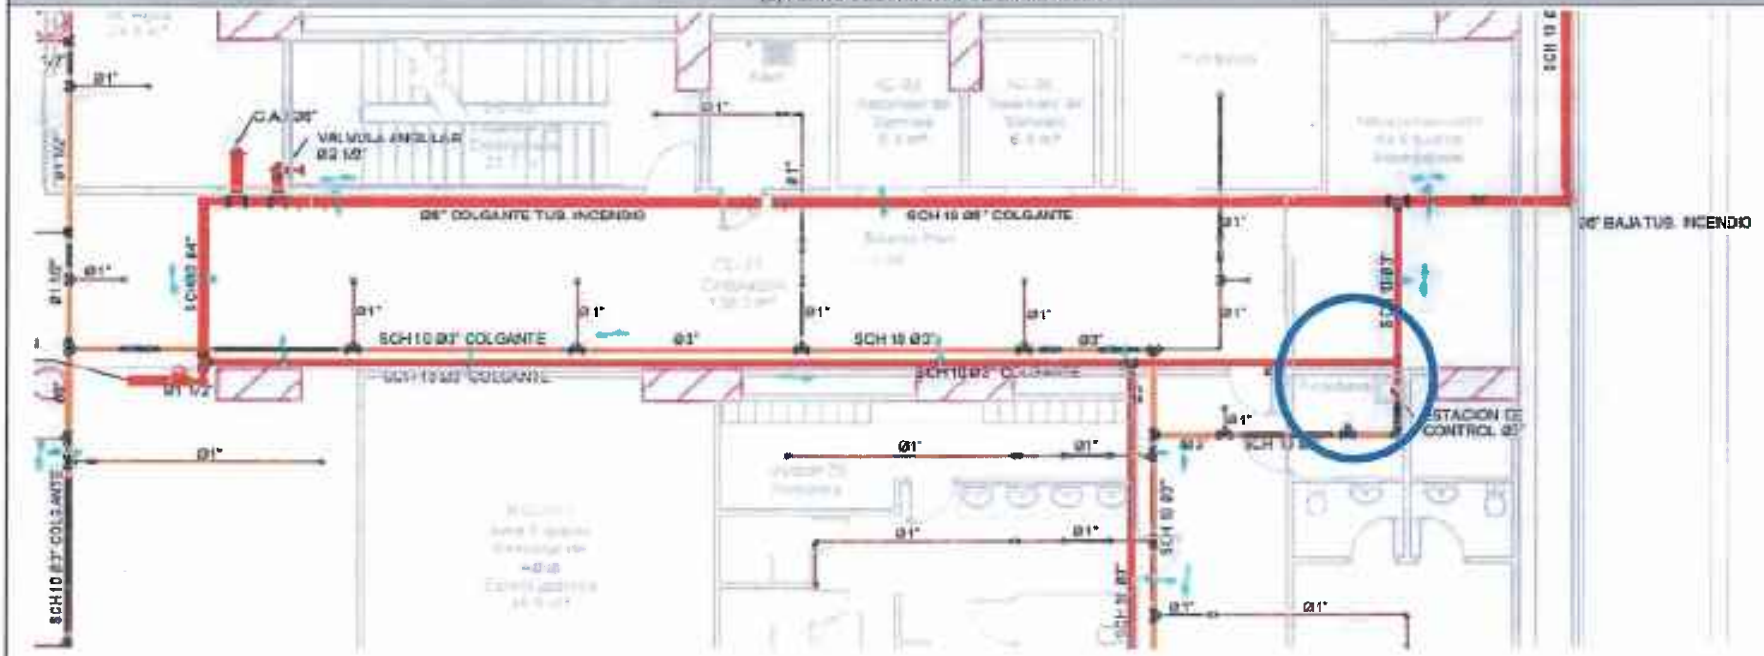

Elaboro	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN	Pieza	No.	Dimensiones								Long [m]	Rem. [m]	Cant.	Cal.	Área [M2]
			Ancho [m]	Alto [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Ancho [m]	Alto [m]					
	SOTANO UNO														
	EQUIPOS OMEGA 25														
	SUMINISTRO														
	DUCTO	1	[redacted]	10,00	0,78	0,41					1,13		37	24	71,30
	CODO	2	[redacted]	10,00	0,78	0,41						0,30	3	24	12,08
	UNIONES	3	[redacted]	10,00	0,78	0,41					0,30		30	24	14,96
	RETORNO														
	DUCTO	1	*	10,00	10,00	0,96	0,41				1,13		37	24	67,67
	CODO	2	*	10,00	10,00	0,96	0,41					0,30	3	24	4,96
	UNIONES	3	*	10,00	10,00	0,96	0,41				0,30		30	24	12,14

ESAVI		Revisó	
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. [illegible]	

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2025	
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

01 PLANO DESCRIPTIVO DE LA VENTANA

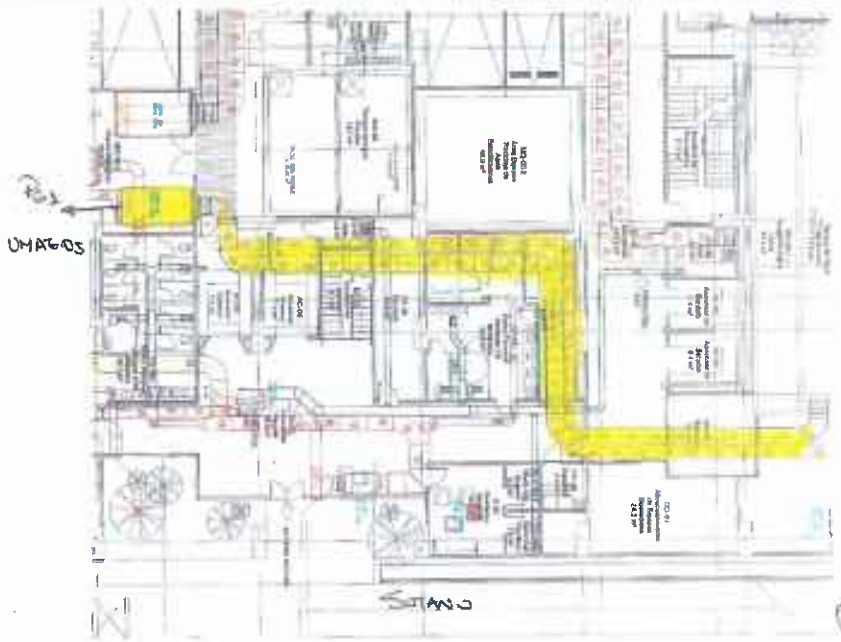

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		

CONTRATO Nº:	099 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24

FECHA: ENERO DE 2025

UNIDAD: M2

Tipo	Nº	Dimensiones											Cant.	Cif	Área M2
		Abcisa (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area (m)	Abcisa (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Altojes	Long (m)	Radio (m)				
SOTANO UNO															
EQUIPOS (PALET)															
SUMINISTRO															
DUCTO	1	[redacted]	14.00	0.60	0.36					1.13			11	24	25.36
REDUCCION	2	[redacted]	14.00	0.60	0.36	94.00	0.60	0.06	0.12	0.60			1	24	0.72
CODO	3	[redacted]	16.00	0.30	0.15							0.30	1	24	0.60
DUCTO	4	[redacted]	14.00	0.30	0.15					1.20			2	24	3.60
REDUCCION	5	[redacted]	14.00	0.30	0.15	93.00	0.30	0.20	0.10	0.60			1	24	0.48
DUCTO	6	*	93.00	0.30	0.15					1.20			1	24	5.63
CODO	7	*	93.00	0.30	0.15							0.15	1	24	0.30
TAPA	8	*	93.00	0.30	0.15								1	24	0.04
LINDEROS		[redacted]	28.00	0.60	0.36					0.20			12	24	4.64
LINDEROS		[redacted]	14.00	0.30	0.15					0.20			3	24	1.01
LINDEROS		*	93.00	0.30	0.15					0.20			8	24	5.46
RETORNO															
DUCTO	1	[redacted]	27.00	14.00	0.60	0.36					1.13		6	24	16.33
REDUCCION	2	[redacted]	27.00	14.00	0.60	0.36	22.00	10.00	0.60	0.24	0.60		1	24	0.86
DUCTO	3	[redacted]	27.00	10.00	0.60	0.24					1.13		12	24	19.77
CODO	4	[redacted]	27.00	10.00	0.60	0.24						0.30	1	24	1.56
TAPA	5	[redacted]	27.00	10.00	0.60	0.24							1	24	0.14
LINDEROS	1	[redacted]	27.00	14.00	0.60	0.36					0.20		5	24	3.24
LINDEROS	1	[redacted]	27.00	0.00	0.60	0.00					0.20		12	24	0.00
														SUB TOTAL	[redacted]
														UNIDAD	[redacted]
														TOTAL	[redacted]

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

III PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN

SOTANO

PAG 2 UNIDAD 01

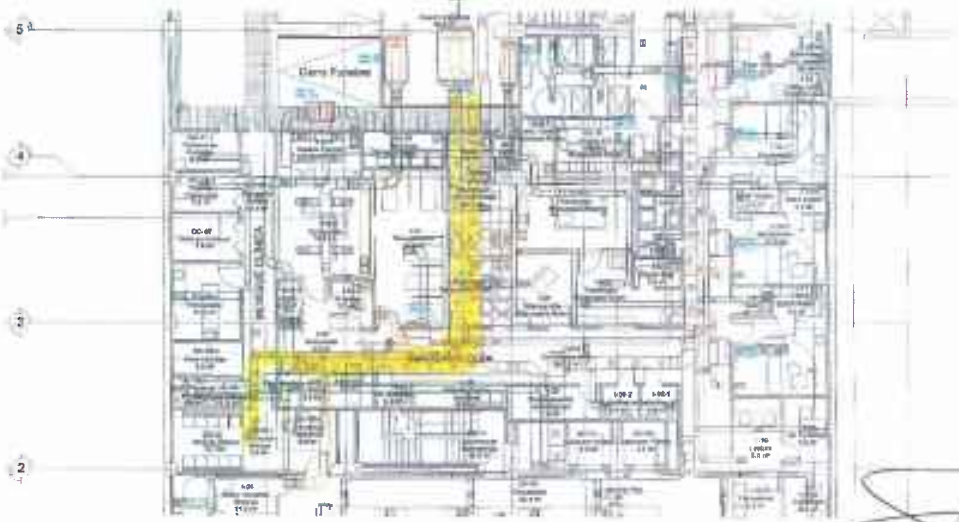

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17
INTERVENTORIA	CONSORCIO SITER CONSTRUCTORES	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24
			UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

Plano	Un	Dimensiones								Long (m)	Rep. #	Cant	Cal	Area m2
		Area (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area (m)	Area (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS VIEJO														
EXTRACCION														
DUCTO	1	[redacted]	16.00	0.70	0.41					1.13		6	24	12.20
ZAPATO	2	[redacted]	16.00	0.70	0.56	38.00	10.00	0.80	0.20	0.56		1	24	1.51
DUCTO	3	[redacted]	16.00	0.46	0.00					1.20		17	24	37.37
REDUCCION	4	[redacted]	16.00	0.46	0.20	16.00	10.00	0.40	0.20	0.60		1	24	1.61
DUCTO	5	16.00	12.00	0.46	0.30					1.20		5	24	5.16
UNIONES		[redacted]	10.00	0.70	0.41					0.41		6	24	2.60
UNIONES		[redacted]	16.00	0.46	0.20					0.20		38	24	5.09
UNIONES		16.00	12.00	0.46	0.30					0.30		5	24	1.50

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

29. PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

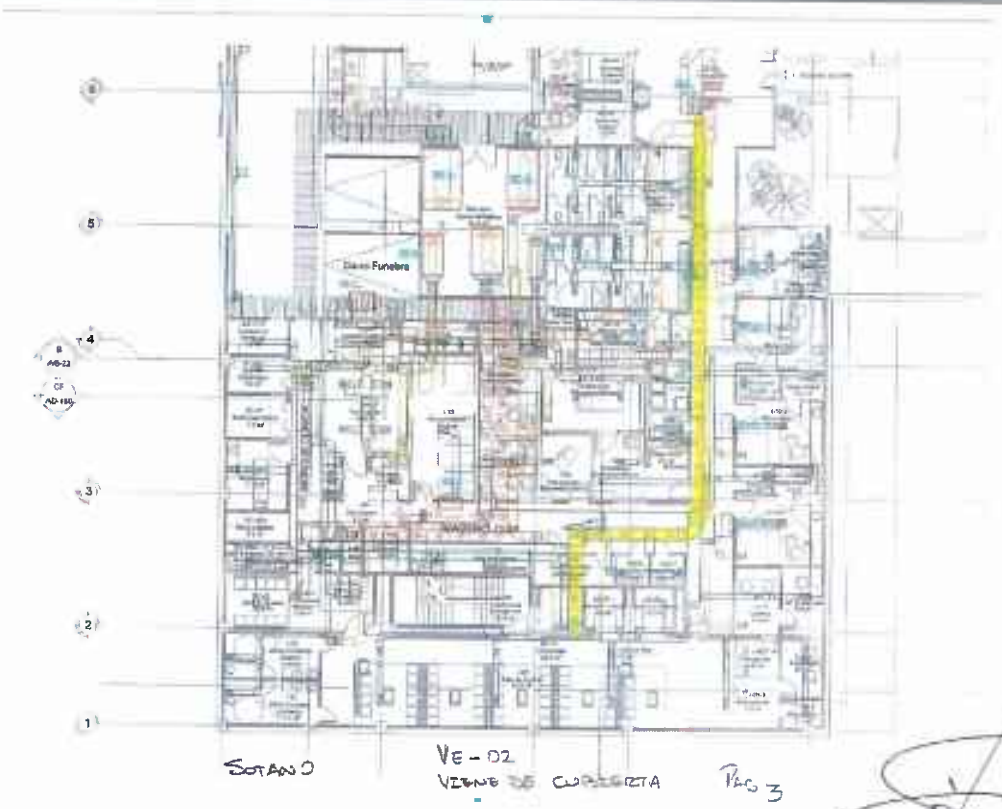

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº: 17	FECHA ENERO DE 2026
ITEM Nº:	20.3.1.1	DESCRIPCION ITEM: Cal 24	UNIDAD: M2

Plano	No.	Elementos								Longitud (m)	Ancho (m)	Cant.	Cal.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UVS-01														
SUMINISTRO AF														
DUCTO	3	[redacted]	10.00	0.71	0.25					1.12		4	24	6.72
APLICACION	4	[redacted]	10.00	0.71	0.25	24.00	10.00	0.91	0.25	0.60		1	24	1.10
DUCTO	5	[redacted]	10.00	0.91	0.25					1.11		3	24	5.99
CODO	6	* 12.00	10.00	0.30	0.25						0.40	1	24	1.16
UNIONES		[redacted]	10.00	0.71	0.25					0.20		5	24	1.50
UNIONES		[redacted]	10.00	0.91	0.25					0.20		3	24	1.04
UNIONES		* 12.00	10.00	0.30	0.25					0.20		1	24	0.20
													SUB TOTAL	[redacted]
													VIENE	[redacted]
													CASAN	[redacted]

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alejandro Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	PA-FO-36			2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

LOS PLANOS HACEN PARTE DE LA MEMORIA

SOTANO VS-01

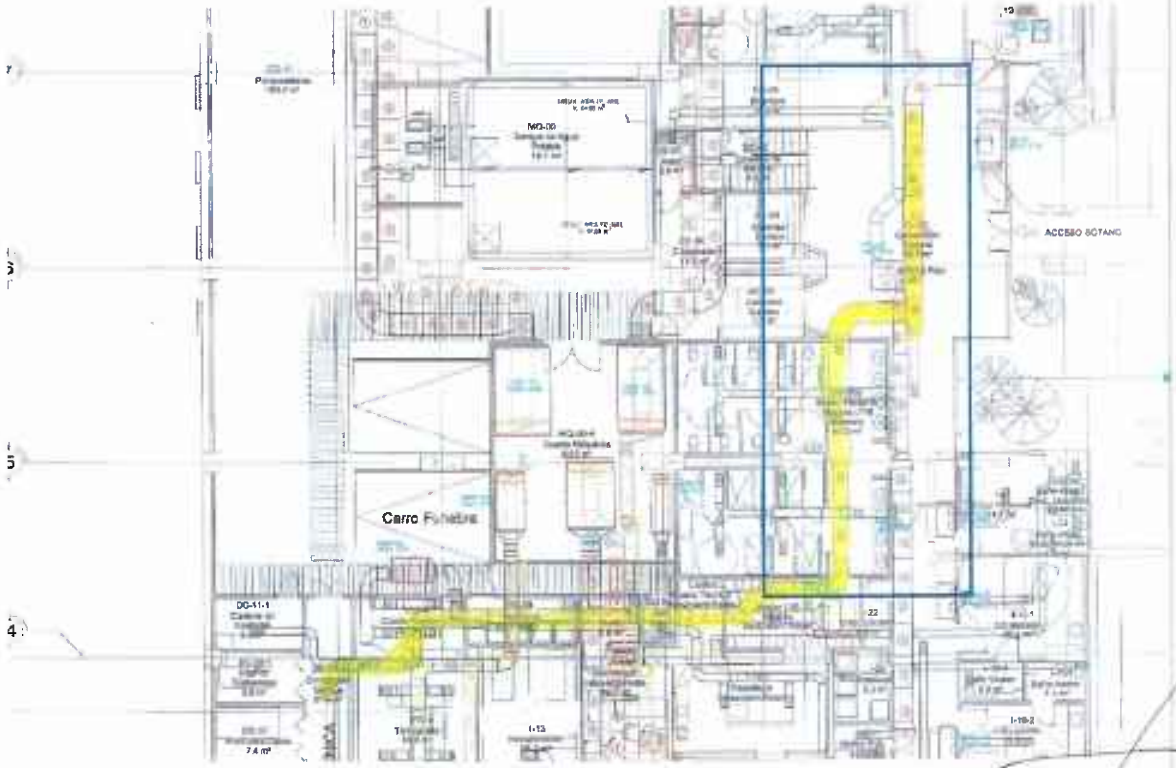

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FA-FR-06 Versión No. 00 Fecha:	Página 1 de 1

CONTRATO Nº:	690 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

BOARD DESCRIPTION OF MEASURING

Piezas	No.	Dimensiones												Parcial M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant.	Cal.	
SOTANO UNO														
EQUIPOS VS-01														
SUMINISTRO AIRE EXTERIOR														
ZAPATO	1	0.00	8.00	0.76	0.30					0.25		1	24	0.46
CODO	2	0.00	8.00	0.76	0.30						0.60	1	24	1.96
DUCTO	3	0.00	8.00	0.76	0.30					1.13		8	24	10.97
REDUCCION	4	0.00	8.00	0.76	0.30	34.00	12.00	0.61	0.30	0.60		1	24	5.50
DUCTO	5	34.00	12.00	0.61	0.30					1.13		1	24	6.20
REDUCCION	6	24.00	12.00	0.61	0.30					0.60		1	24	3.73
DUCTO	7	24.00	12.00	0.61	0.30					1.00		1	24	1.83
CODO	8	24.00	12.00	0.61	0.30						0.30	1	24	1.83
DUCTO	9	24.00	12.00	0.61	0.30					1.13		17	24	35.13
CODO	10	24.00	12.00	0.61	0.30						0.30	1	24	3.17
UNION	11	0.00	8.00	0.76	0.30					0.25		8	24	3.66
UNION	12	24.00	12.00	0.61	0.30					0.25		17	24	12.14
													SUB TOTAL	97.30
													VIENE	473.94
													PASA	565.81

Firma

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Firma

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión: No. 03				Página 1 de 1
		Fecha:				2021

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			M2

SOTANO

VS-01

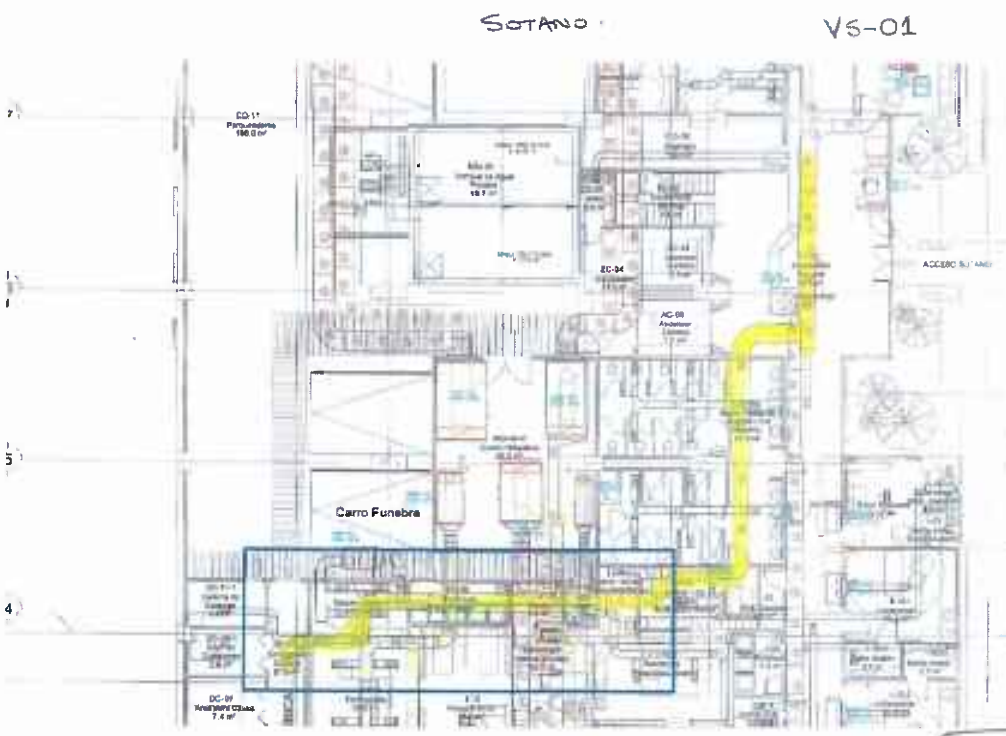

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE Nº:** 17	**FECHA** ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM Nº:	29.3.1.1	**DESCRIPCION ITEM**	Cal 24 **UNIDAD:** M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA PARTIDA

Pisos	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio (r)	Cant.	Cal.	Area M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UMAE-02														
RETORNO														
DUCTO	1	[redacted]	12.50	0.67	0.80					1.13		10	24	75.37
CODO	2	[redacted]	12.50	0.67	0.80						0.90	2	24	3.02
TAPA	3	[redacted]	12.00	0.67	0.80							1	24	1.15
UNION	4	[redacted]	12.00	0.67	0.80					0.25		10	24	4.20
SUMINISTRO													24	5.00
DUCTO	1	[redacted]	13.50	0.67	0.80					1.13		9	24	72.88
CODO	2	[redacted]	14.00	0.67	0.80						0.90	2	24	3.02
REDUCCION	3	[redacted]	13.00	0.67	0.80	18.00	10.00	0.67	0.25	0.80		1	24	1.15
DUCTO	4	[redacted]	13.00	0.67	0.80					1.13		2	24	2.89
REDUCCION	5	[redacted]	13.00	0.67	0.80	18.00	6.00	0.80	0.15	0.80		1	24	1.08
CODO	6	[redacted]	6.00	0.30	0.15						0.90	2	24	1.72
DUCTO	7	[redacted]	6.00	0.30	0.15					1.13		2	24	1.30
TAPA	8	[redacted]	6.00	0.30	0.15							1	24	1.03
UNION		[redacted]	12.00	0.67	0.80					0.25		10	24	4.05
UNION		[redacted]	13.00	0.67	0.25					0.25		3	24	1.09
UNION		[redacted]	6.00	0.30	0.15					0.25		3	24	1.27
													SUB TOTAL	197.34
													IVA 19	37.51
													TOTAL	234.85

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

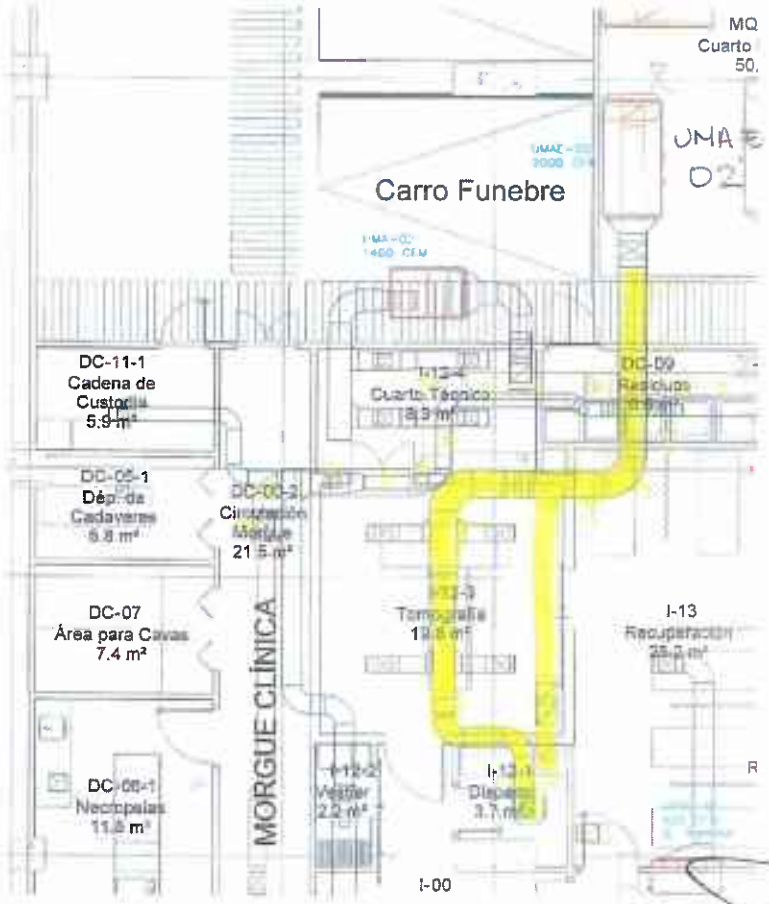

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO TIPO DE LA REGION:

Plano	No.	Dimensiones								Long (m)	Pedm m	Cant	Cal	Area m2
		Ancho (m)	Alto (m)	Parcial (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UMAZ-01														
TOMA EXTERIOR														
DUCTO	1	16.00	10.00	0.46	0.20					1.13		1/	24	97.30
SEMICODO	2	16.00	10.00	0.46	0.20						0.30	8	24	7.68
CODO	3	16.00	10.00	0.46	0.20						0.30	2	24	2.88
DUCTO	4	16.00	10.00	0.46	0.20					0.80		4	24	4.60
UNION	5	16.00	10.00	0.46	0.20					0.25		29	24	103.1
													SUB TOTAL	
													IVA 19	
													TOTAL	

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Ricardo Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. [illegible]

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

05 PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

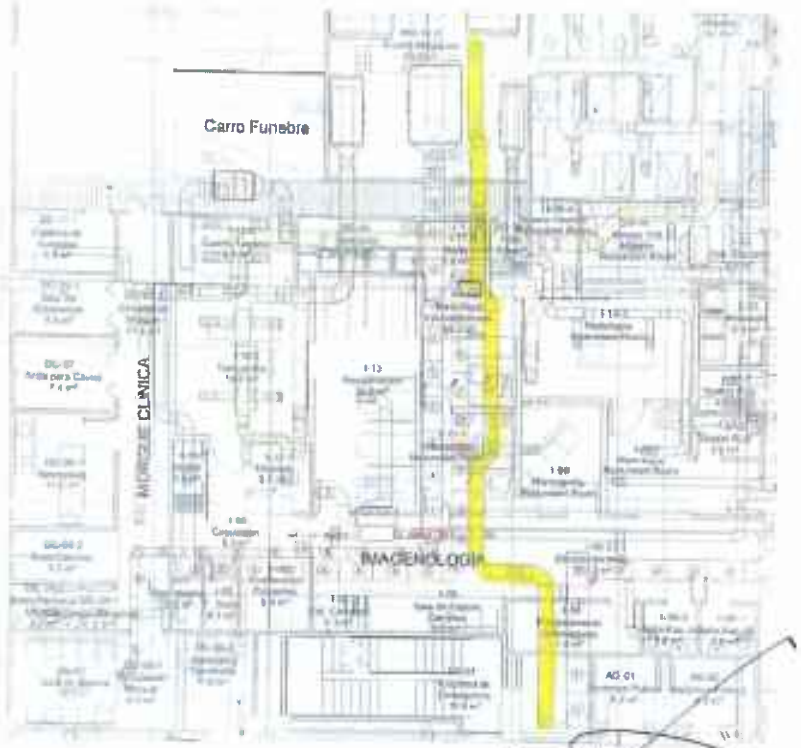

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PS-FO-02 Versión No. 06	Página 1 de 2
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Piezas	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Sub	Area M2
		Abscisa	Ancho (m)	Alto (m)	Abscisa	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO 1														
EQUIPOS UMAE-65														
SUMINISTRO DE AIRE														
DUCTO	1	[redacted]	10.00	0.76	0.41					1.13		31	24	61.69
CODO	2	[redacted]	10.00	0.76	0.41						0.50	3	24	10.52
REDUCCION	2a	[redacted]	10.00	0.76	0.41	22.00	16.00	0.36	0.41	0.85		1	24	1.71
DUCTO	3	[redacted]	10.00	0.56	0.41					1.13		0	24	10.01
REDUCCION	4	[redacted]	10.00	0.56	0.41	353.00	14.00	0.31	0.36	0.83		1	24	1.40
DUCTO	6	[redacted]	10.00	0.51	0.36					1.13		8	24	10.01
TAPA	5	[redacted]	10.00	0.51	0.36							1	24	0.13
UNION		[redacted]	10.00	0.76	0.41					0.85		33	24	30.46
UNION		[redacted]	10.00	0.56	0.41					0.85		6	24	3.91
UNION		[redacted]	10.00	0.51	0.41					0.85		9	24	4.11
RETORNO														
DUCTO	1	[redacted]	10.00	0.56	0.41					1.13		42	24	51.02
CODO	2	[redacted]	10.00	0.56	0.41						0.50	3	24	5.56
DUCTO	3	[redacted]	8.00	0.41	0.31					1.13		8	24	11.02
REDUCCION	4	[redacted]	10.00	0.56	0.41	16.00	9.00	0.41	0.31	0.80		1	24	1.26
UNION		[redacted]	10.00	0.56	0.41					0.85		46	24	29.30
UNION		[redacted]	10.00	0.56	0.41					0.85		4	24	3.90
													SUB TOTAL	355.51
													VIENE	653.81
													PASAN	999.32

Elaboro

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº.	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

DESARROLLO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN

Plano	No.	Dimensiones								Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Cal.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO EQUIPOS UMAE-04 SUMINISTRO DE AIRE														
CUATO	3	0.00	10.00	0.71	0.41					5.13		30	24	75.77
CODO	4	0.00	34.00	0.71	0.41						0.70	1	24	2.40
CODO	5	0.00	10.00	0.71	0.41						0.30	2	24	4.80
UNION	3	0.00	16.00	0.71	0.41					5.13		33	24	83.05
													SUB TOTAL	166.01
													IVA 19	31.54
													TOTAL	197.55

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Jair Losada

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 06			Página 1 de 1
				Fecha	2	4	2025

CONTRATO N°:	006 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

III PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN

Piso 1

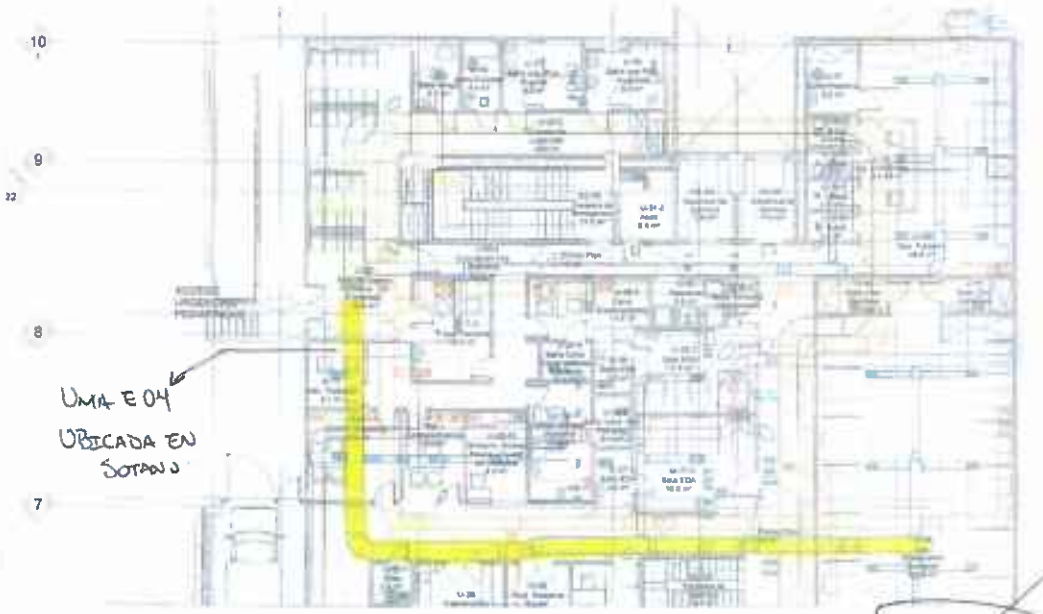

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE Construye

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº: 17	FECHA: ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM: Cal 24	UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDICIÓN

Piso	No.	Dimensiones								Long. (m)	Rotación	Cant.	Cal.	Área m2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO UNO														
EQUIPOS UMAE-04														
RETORNO														
DUCTO	3	[illegible]	14,00	0,61	0,36					1,17		4	24	8,73
REDUCCION	4	[illegible]	14,00	0,61	0,36	10,00	14,00	0,61	0,36	0,60		1	24	1,70
DUCTO	5	[illegible]	14,00	0,61	0,36					1,17		8	24	13,61
REDUCCION	6	[illegible]	14,00	0,61	0,36	10,00	10,00	0,61	0,25	0,60		1	24	0,99
DUCTO	7	[illegible]	10,00	0,61	0,25					1,17		20	24	34,44
CODO	8	[illegible]	10,00	0,61	0,25						0,30	1	24	1,42
TAPA	9	[illegible]	10,00	0,61	0,25							1	24	0,13
UNIONES		[illegible]	14,00	0,61	0,36					0,05		8	24	3,41
UNIONES		[illegible]	14,00	0,61	0,36					0,05		8	24	3,80
UNIONES		[illegible]	10,00	0,61	0,25					0,05		20	24	6,36
**********														
ZAPATO	10	* 10,00	4,00	0,25	0,10					0,25		1	24	0,76
DUCTO	11	* 10,00	4,00	0,25	0,10					1,17		1	24	0,881
TAPA	12	* 10,00	4,00	0,25	0,10							1	24	0,00
UNIONES	12	* 10,00	4,00	0,25	0,10					0,25		1	24	0,63
**********														
ZAPATO	13	[illegible]	8,00	0,41	0,20					0,25		1	24	0,35
DUCTO	14	[illegible]	8,00	0,41	0,20					1,17		8	24	6,83
CODO	15	[illegible]	8,00	0,41	0,20						0,30	1	24	0,83
REDUCCION	16	[illegible]	8,00	0,41	0,20	10,00	4,00	0,25	0,10	0,60		1	24	0,58
DUCTO	17	* 10,00	4,00	0,25	0,10					1,17		3	24	5,63
TAPA	18	* 10,00	4,00	0,25	0,10							1	24	0,00
DUCTO	19	* 10,00	4,00	0,25	0,10					1,17		1	24	0,80
UNIONES		[illegible]	8,00	0,41	0,20					0,05		8	24	2,44
UNIONES		* 10,00	4,00	0,25	0,10					0,05		4	24	1,11
**********														
ZAPATO	21	* 10,00	4,00	0,25	0,10					0,25		1	24	0,70
DUCTO	22	* 10,00	4,00	0,25	0,10					1,17		8	24	4,82
TAPA	23	* 10,00	4,00	0,25	0,10							1	24	0,00
												SUBTOTAL		140,83
												IVA 19		1914,84
												PASAN		2155,67

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

III PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

Piso 1

UNA E-04 Viene de Sotano

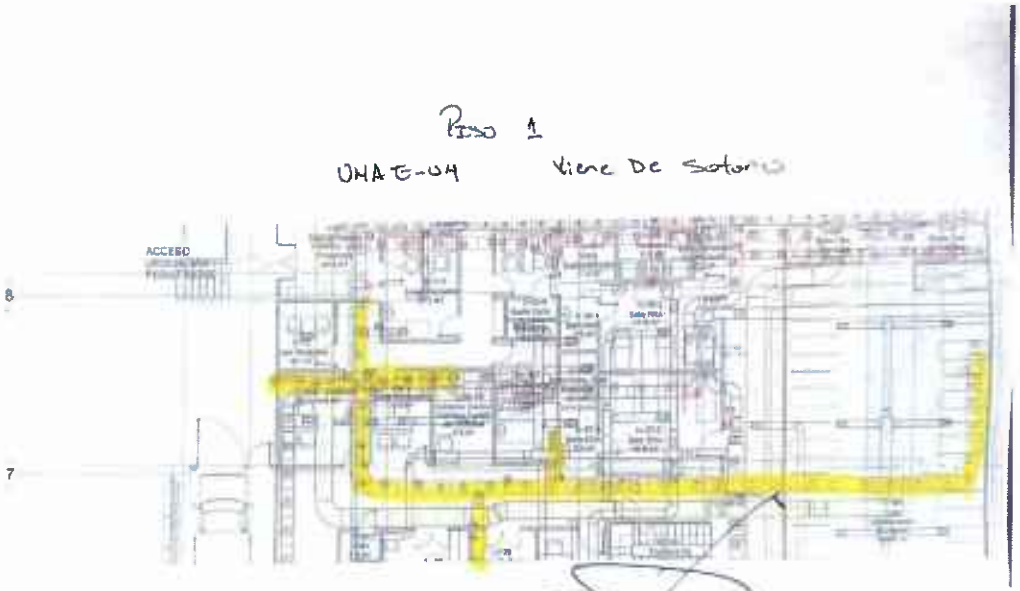

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE Nº:**	17
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
FECHA	ENERO DE 2026		
ITEM Nº:	29.3.1.1	**DESCRIPCION ITEM**	Cal 24
UNIDAD:	M2		

Piso	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO 0P2O														
EQUIPOS UNIDAD														
RETORNO														
UNIDADES		0.00	4.00	0.30	0.10					0.25		12	24	2.11
ZAPATO	24	0.00	4.00	0.51	0.20					0.30		1	24	0.98
DUCTO	25	0.00	6.00	0.51	0.20					1.13		8	24	9.64
REDUCCION	26	0.00	6.00	0.51	0.20	36.00	6.00	0.67	0.15	0.60		1	24	0.76
DUCTO	27	0.00	6.00	0.41	0.15					1.13		16	24	20.71
TAPA	28	0.00	6.00	0.41	0.15							1	24	1.06
SEMICODO	24	0.00	6.00	0.41	0.15						0.01	1	24	0.00
UNIDADES		0.00	4.00	0.31	0.20					0.25		8	24	1.93
UNIDADES		0.00	6.00	0.47	0.15					0.25		16	24	3.31
													SUBTOTAL	40.83
													40%	112.77
													TOTAL	153.60

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Iver Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

UTILIZADO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

UMA E 04 PISO 1

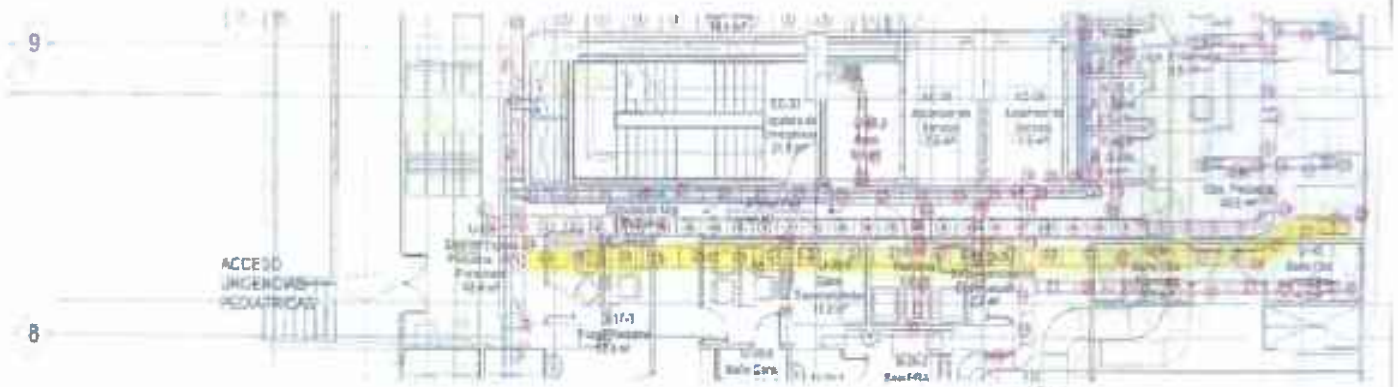

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

| SAN VICENTE | MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL | | |

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

UMA E-04 Piso 1

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Ricardo Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Cuellar

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24	UNIDAD:	M2

Plano	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio (m)	Cant.	Cal.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO UNO														
EQUIPOS UMAE-25														
RETORNO														
DUCTO	1	16.00	10.00	0.45	0.25					1.12		28	24	33.22
CODO	2	16.00	10.00	0.45	0.25						0.30	4	24	5.11
UNION		16.00	10.00	0.45	0.25					0.25		63	24	22.05
													SUB TOTAL	120.38
													10%	12.04
													TOTAL	132.42

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Ani Lizcano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00				Página 1 de 1
		Fecha	1	4	4	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

UN PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

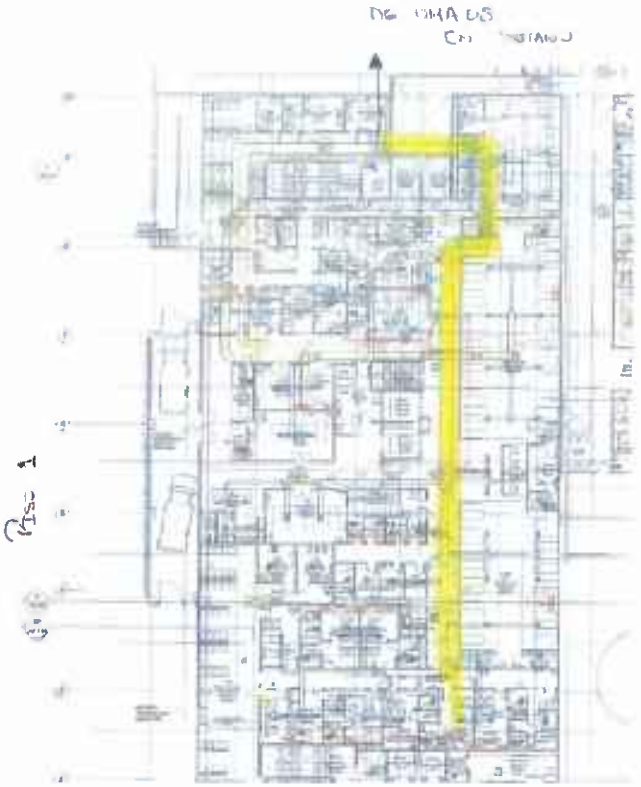

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Pieza	Un	Dimensiones								Long (m)	Radio (r)	Cant	Tot	Area M2
		Ancho (a)	Alto (a)	Ancho (b)	Alto (b)	Ancho (c)	Alto (c)	Ancho (d)	Alto (d)					
PISO 1ND														
EQUIPOS VE 10														
RETORNO														
DUCTO	4		14.00	0.61	0.36					1.13		3	24	10.87
REDUCCION	5		14.00	0.61	0.36	10.00	4.00	0.25	0.10	0.60		1	24	0.79
DUCTO	6	10.00	4.00	0.25	0.10					1.13		3	24	6.43
CODO	7	10.00	4.00	0.25	0.10						0.20	2	24	0.81
TAPA	8	10.00	4.00	0.25	0.10							1	24	0.03
ZAPATO	9	10.00	4.00	0.25	0.10					0.35		1	24	0.15
DUCTO	10	10.00	4.00	0.25	0.10					1.13		3	24	6.43
CODO	11	10.00	4.00	0.25	0.10						0.20	1	24	0.41
TAPA	12	10.00	4.00	0.25	0.10							1	24	0.03
ZAPATO	13		12.00	0.68	0.30					0.26		1	24	0.49
DUCTO	14		12.00	0.68	0.30					1.13		9	24	19.83
REDUCCION	15		12.00	0.68	0.30	24.00	10.00	0.61	0.25	0.80		1	24	1.10
DUCTO	16		10.00	0.61	0.25					1.13		16	24	31.33
REDUCCION	17		10.00	0.61	0.25	16.00	10.00	0.41	0.25	0.60		1	24	0.91
DUCTO	18		10.00	0.41	0.25					1.13		3	24	11.04
TAPA	19		10.00	0.41	0.25							1	24	0.10
UNIONES			14.00	0.61	0.36					0.26		3	24	2.41
UNIONES			12.00	0.68	0.30					0.26		11	24	5.71
UNIONES			10.00	0.61	0.25					0.26		17	24	7.34
UNIONES			10.00	0.41	0.25					0.26		9	24	3.87
ZAPATO	20	10.00	4.00	0.25	0.10					0.26		1	24	0.19
DUCTO	21	10.00	4.00	0.25	0.10					1.13		6	24	6.43
TAPA	22	10.00	4.00	0.25	0.10							1	24	0.03
CODO	23	10.00	4.00	0.25	0.10							1	24	0.14
ZAPATO	24	10.00	8.00	0.41	0.20					0.26		1	24	0.36
DUCTO	25	10.00	8.00	0.41	0.20					1.12		5	24	9.83
REDUCCION	26	10.00	8.00	0.41	0.20	14.00	8.00	0.36	0.15	0.60		1	24	0.67
DUCTO	27	14.00	8.00	0.36	0.15					1.13		16	24	19.31
CODO		14.00	8.00	0.36	0.15						0.20	1	24	0.66

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUILA	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

III PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

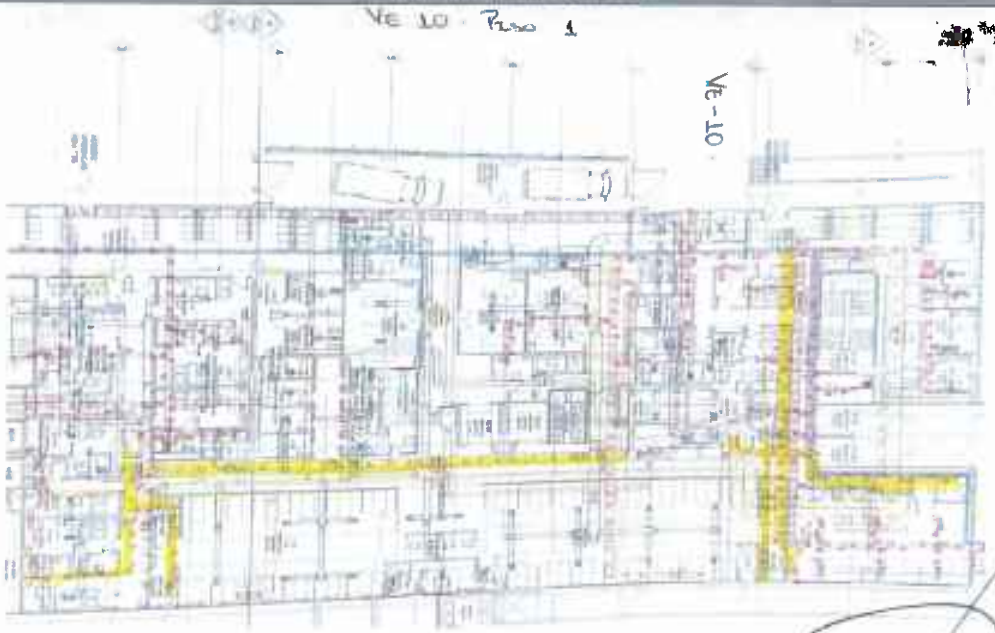

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					

| | | | | | |

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	28.5.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

VE PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

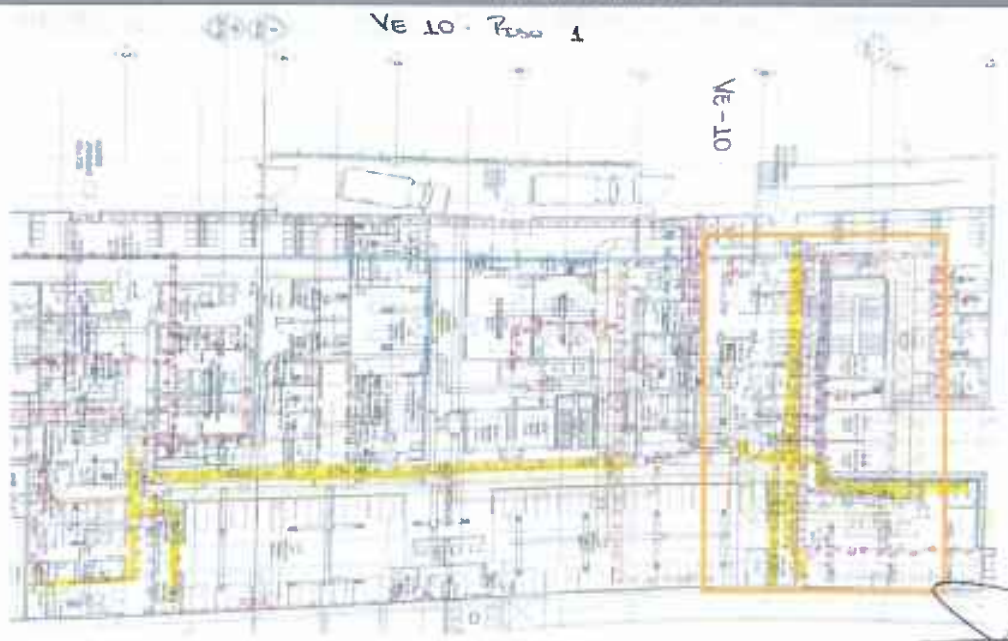

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA	Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

Parte	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Nombre	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO UNO														
EQUIPOS UCI N-06														
TORA EXTERIOR														
MURO	1	[redacted]	10.00	0.40	2.20					1.10		83	24	36.44
DOBO	2	[redacted]	10.00	0.40	2.20						0.20		24	0.00
UNION		[redacted]	10.00	0.40	2.20					0.20		83	24	22.08
													SUB TOTAL	58.52
													VENT	1043.04
													TOTAL	1101.56

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 / Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

10 PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

Piso 1

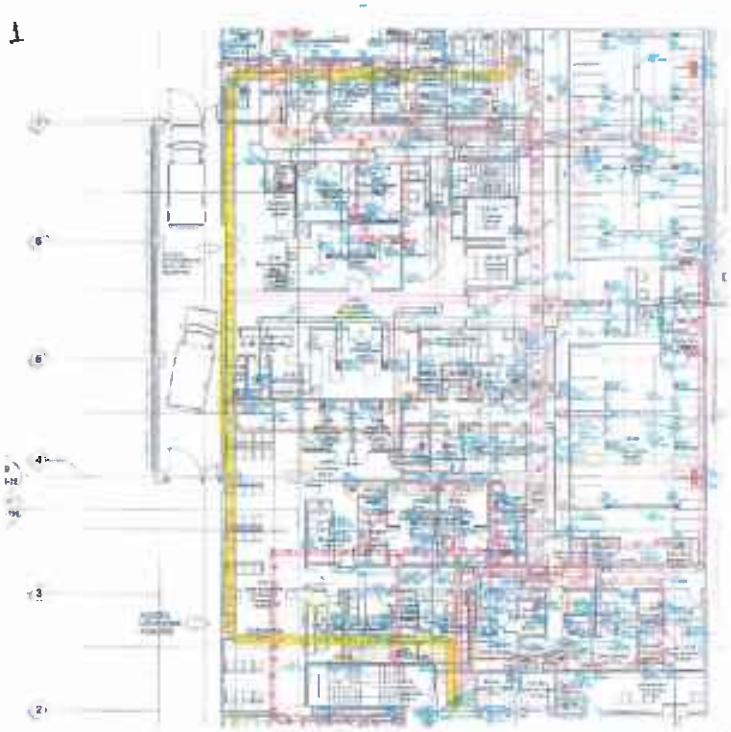

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. [illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22
UNIDAD:	M2		

PLANO ESQUEMATICO DE LA UBICACIÓN

Plano	Nº	Dimensiones								Long (m)	Nº veces	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UMAE-04														
SUMINISTRO														
DUCTO	1	50.00	19.00	0.81	0.46					1.11		20	22	91.80
CODO	2	50.00	19.00	0.81	0.46						0.20	3	22	6.74
LINEALES		50.00	19.00	0.81	0.46					0.20		21	22	17.19
RETORNO														
DUCTO	1	50.00	19.00	0.81	0.46					1.11		20	22	91.11
CODO	2	50.00	19.00	0.81	0.46						0.20	4	22	11.23
LINEALES		50.00	19.00	0.81	0.46					0.20		24	22	17.27
													TOTAL	335.41

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Luis Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

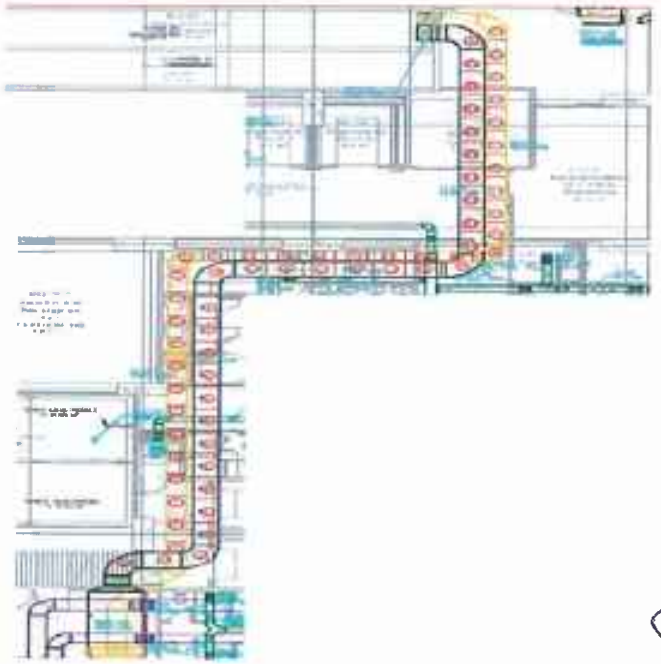

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTIORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: [illegible]			
		Versión No. 00			Página 1 de 1
		Fecha	6	8	2026

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Piezas	No.	Dimensiones								Longitud (m)	Rendimiento	Cant.	Cal.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
sp T extra EF														
EQUIPOS UVS-01														
SUMINISTRO AE														
DUCTO	1	0.00	10.00	0.61	0.25					1.15		1	22	3.54
CODO	2	0.00	10.00	0.61	0.25						0.43	1	22	3.31
UNIONES		0.00	10.00	0.61	0.25					0.20		2	22	3.69

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-38			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

EN PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

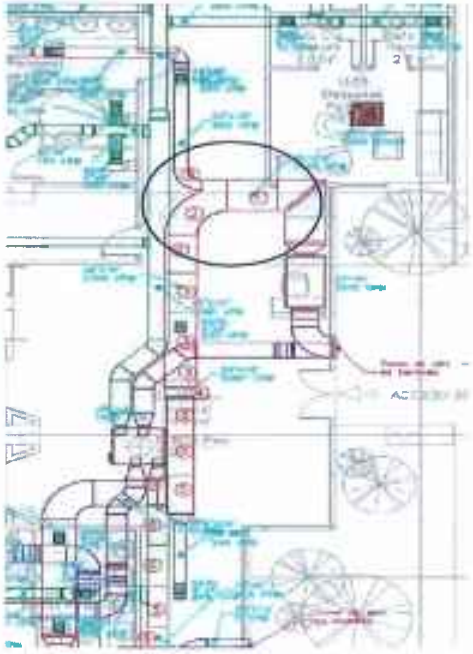

Nombre:	Nombre:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Cabrera

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FR-PO-33	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Plano	No	Dimensiones								Long (m)	No de ej	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO 1														
EQUIPOS UMAE-04														
SUMINISTRO DE AIRE														
DUCTO	1	60.00	16.00	0.61	0.66					1.13		14	22	40.10
REDUCCION	2	60.00	16.50	0.61	0.46	28.00	16.50	0.71	0.61	0.60		1	22	1.81
LINEA	3	60.00	16.50	0.61	0.46					0.70		11	22	8.53
													SUMATORIA	50.44
													VIDRIO	240.10
													TOTAL	290.54

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Cuellar

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 06			Página 1 de 2
				Fecha:	3	4	2025
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA:	ENERO DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

DETALLE DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

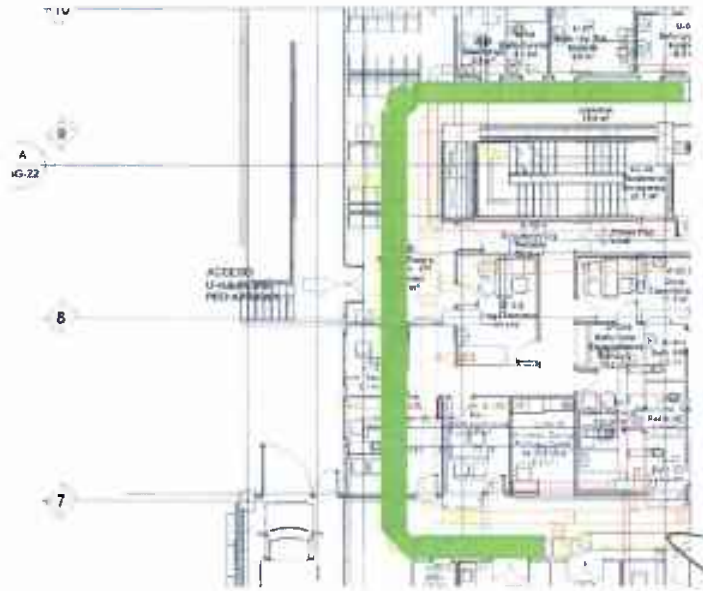

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FR-PO-06 Versión No. 02 Fecha: 1	5	4	Página 1 de 2 2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22	UNIDAD:	M2	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEDIDA

Pisos	No.	Dimensiones											Cal	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Ancho Fr	Cant		
PISO UNO														
EQUIPOS UMAE 64														
RETORNO														
DUCTO	1	30.00	18.00	0.81	0.46					1.33		14	22	40.18
CODO		30.00	18.00	0.81	0.46						0.00	1	22	3.89
REDUCCION	2	30.00	18.00	0.76	0.46	24.00	18.00	0.81	0.36	0.00		1	22	1.31
UNIONES		30.00	18.00	0.76	0.46					0.25		56	22	8.04

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

10

9

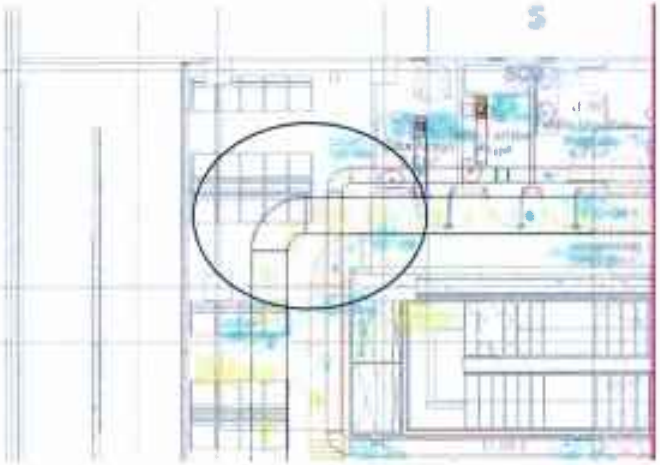

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				
		Código: FR-PO-04			
		Versión No. 08			Página 1 de 2
		Fecha	3	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

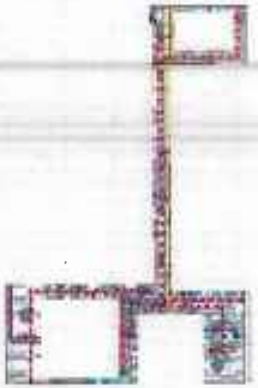

Plano	No.	Dimensiones										Cant.	Cal.	Área m2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Ancho (m)			
PISO 1/50														
EQUIPOS VE-10														
RETORNO														
CUARTO	1	28.00	14.00	0.71	0.30					0.10		2	22	16.80
CUARTO	2	28.00	14.00	0.71	0.30						0.30	1	22	3.29
RECEPCION	3	28.00	14.00	0.71	0.30	24.00	14.00	0.61	0.30	0.60		1	22	1.20
UNIDADES		28.00	14.00	0.71	0.30					0.25		8	22	4.40
													SUBTOTAL	25.70
													15%	3.86
													TOTAL	29.56

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	17
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap
		UNIDAD:	M2

PLANO ESQUEMA PARA MEDICIÓN

Pieza	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio (m)	Cant.	Sal.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SISTEMA UNO														
EQUIPOS UNIFILAR														
SUMINISTRO														
DUCTO	1	DUCTO	15.20	0.76	0.47					5.70		27	24	7128
CODO	2	CODO	15.20	0.76	0.47						0.30	5	24	42.67
VALVULA	3	VALVULA	15.20	0.76	0.47					0.20		10	24	14.06
													PASAN	85.8

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	17
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap

FECHA: ENERO DE 2026

UNIDAD: M2

Piezas	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio (m)	Cant	Cal	Área M2
		Medida (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Medida (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UMAC-01														
SUMINISTRO														
DUCTO	1	20.00	14.00	0.90	0.35					1.13		11	24	28.36
REDUCCION	2	20.00	14.00	0.90	0.35	14.00	6.00	0.30	0.15	0.53		1	24	0.79
CODO	3	14.00	6.00	0.30	0.15						0.60	1	24	0.63
DUCTO	4	14.00	6.00	0.30	0.15					1.20		3	24	2.66
REDUCCION	5	14.00	6.00	0.30	0.15	10.00	6.00	0.25	0.15	0.53		1	24	0.40
DUCTO	6	10.00	6.00	0.25	0.15					1.20		1	24	0.83
CODO	7	10.00	6.00	0.25	0.15						0.10	1	24	0.31
TAPA	8	10.00	6.00	0.25	0.15							1	24	0.04
UNIONES		20.00	14.00	0.90	0.35					0.30		12	24	4.89
UNIONES		14.00	6.00	0.30	0.15					0.30		5	24	1.00
UNIONES		10.00	6.00	0.25	0.15					0.30		4	24	1.48
													SUB TOTAL	45.26
													10%	45.21
													TOTAL	49.73

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alejandro Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

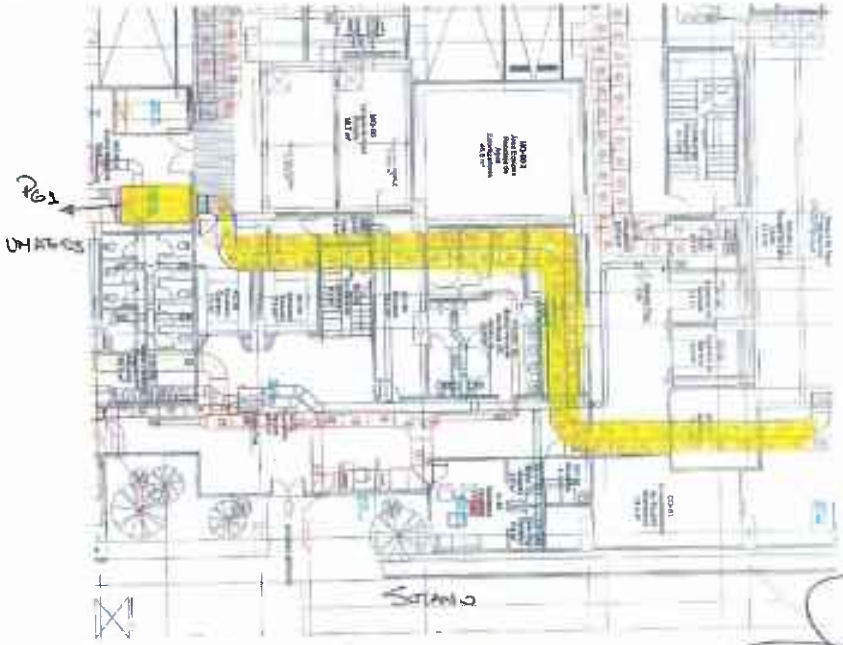

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO CASO TIPICO DE LA REGIONAL

Plano	No.	Dimensiones												Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Aislante (m)	Cara (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Aislante (m)	Adicional	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	
SOTANO UMA EQUIPOS UMA-01 SUMINISTRO AE														
DUCTO	3	[illegible]	10.00	0.71	0.25					1.10		4	24	0.72
REDUCCION	4	[illegible]	10.00	0.71	0.25	24.00	10.00	0.61	0.25	0.60		1	24	1.10
DUCTO	5	[illegible]	10.00	0.61	0.25					1.10		3	24	0.66
CODO	6	12.00	10.00	0.30	0.25						0.60	1	24	1.14
UNIONES		[illegible]	10.00	0.71	0.25					0.20		8	24	1.01
UNIONES		[illegible]	10.00	0.61	0.25					0.20		3	24	1.04
UNIONES		12.00	10.00	0.30	0.25					0.20		1	24	0.22
													SUB TOTAL	[illegible]
													15%	141.23
													PARCIAL	164.54

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Adrián Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

SOTANO

PAG2 UMAE01

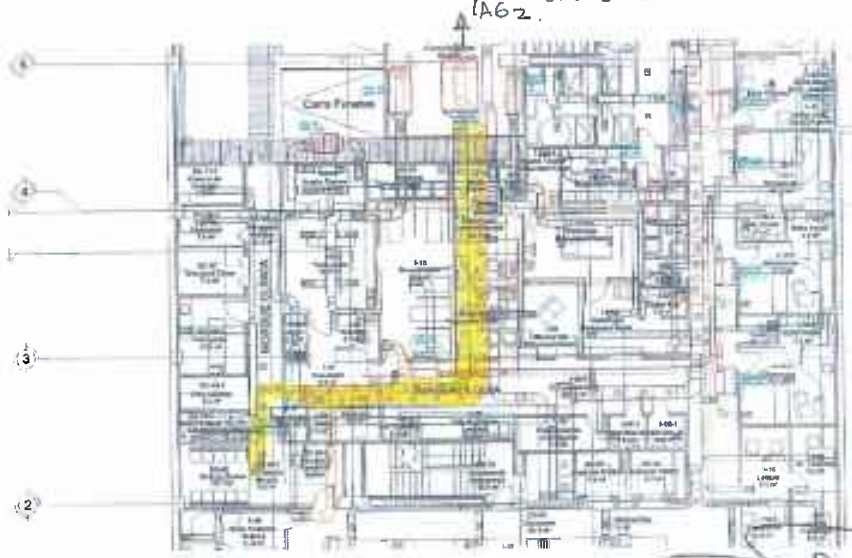

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Abel Lozada

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HDI-II
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº: 17	FECHA: ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM: ATE 3 Duct Wrap	UNIDAD: M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEDICION

Plano	No.	Dimensiones								Long (m)	Ramas #	Cant.	Cal.	Area m2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS VS-01														
SUMINISTRO AIRE EXTERIOR														
ZAPATO	1	24.00	8.00	0.76	0.20					0.20		1	24	0.48
CODO	2	24.00	8.00	0.76	0.20						0.60	1	24	3.26
DUCTO	3	24.00	8.00	0.76	0.20					1.53		9	24	10.91
REDUCCION	4	24.00	8.00	0.76	0.20	24.00	12.00	0.61	0.30	0.60		1	24	1.52
DUCTO	5	24.00	12.00	0.61	0.30					1.53		9	24	8.05
REDUCCION	6	24.00	12.00	0.61	0.30					0.60		1	24	1.73
DUCTO	7	24.00	12.00	0.61	0.30					1.00		1	24	1.83
CODO	8	24.00	12.00	0.61	0.30						0.90	1	24	1.83
DUCTO	9	24.00	12.00	0.61	0.30					1.53		17	24	26.73
CODO	10	24.00	12.00	0.61	0.30						0.90	9	24	9.17
UNION	11	24.00	8.00	0.76	0.20					0.25		9	24	3.80
UNION	12	24.00	12.00	0.61	0.30					0.30		27	24	12.94
													SUB TOTAL	87.05
													15%	13.06
													PARIAL	100.11

Elaboro

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA & INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

SOTANO VS-01

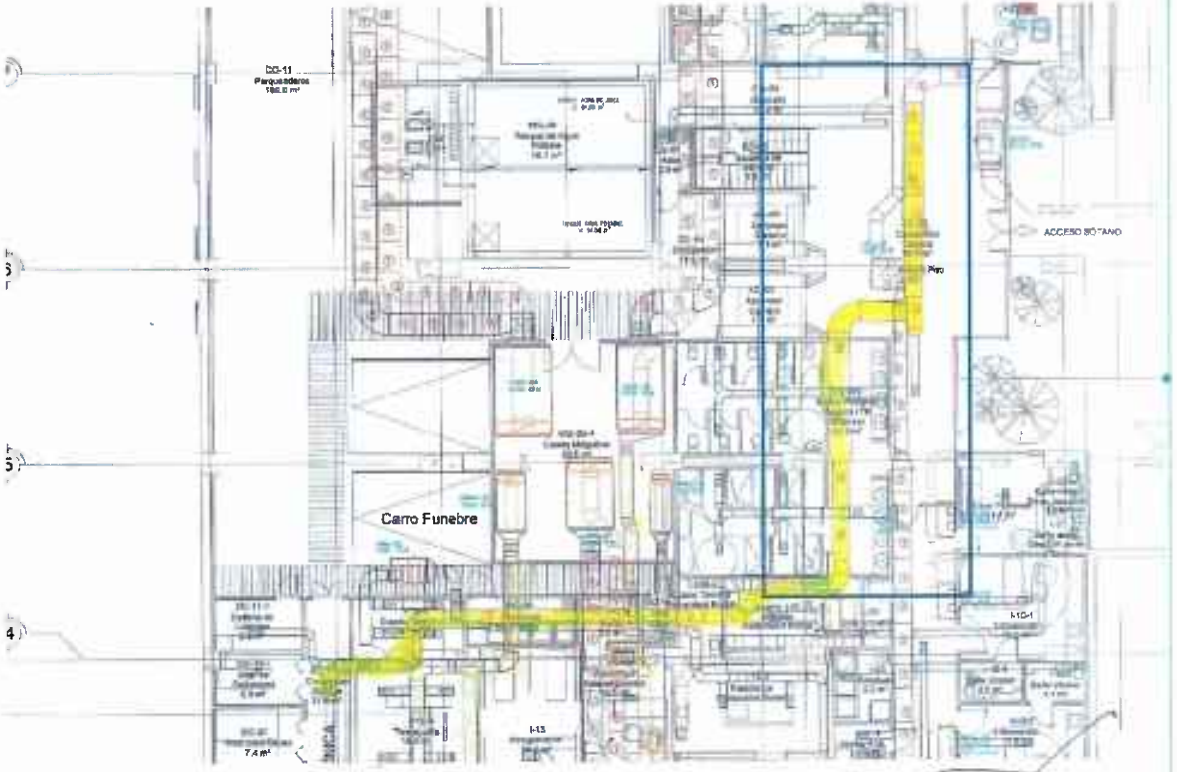

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

Piso	No.	Dimensiones								Long (m)	Ramp (m)	Cant	Cal	Área (m2)
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UNAE-02														
DUCTO	1	[redacted]	12.00	0.51	0.30					5.13		1	24	12.80
CODO	1	[redacted]	12.00	0.51	0.30						0.90	1	24	3.92
REDUCCION	1	[redacted]	12.00	0.51	0.30	10.00	10.00	0.41	0.25	0.90		1	24	3.18
DUCTO	4	10.00	10.00	0.41	0.25					5.13		2	24	9.68
REDUCCION	5	10.00	10.00	0.41	0.25	14.00	8.00	0.36	0.15	0.90		1	24	4.65
CODO	4	14.00	8.00	0.36	0.15						0.90	2	24	3.72
DUCTO	1	14.00	8.00	0.36	0.15					5.13		2	24	7.30
TAPA	1	14.00	8.00	0.36	0.15							1	24	3.05
UNION		[redacted]	12.00	0.51	0.30					0.25		10	24	4.08
UNION		10.00	10.00	0.41	0.25					0.25		3	24	3.08
UNION		14.00	8.00	0.36	0.15					0.25		4	24	1.27
													SUB TOTAL	61.00
													VIENE	217.83
													PASAN	278.83

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap				M2

SOTANO VS-01

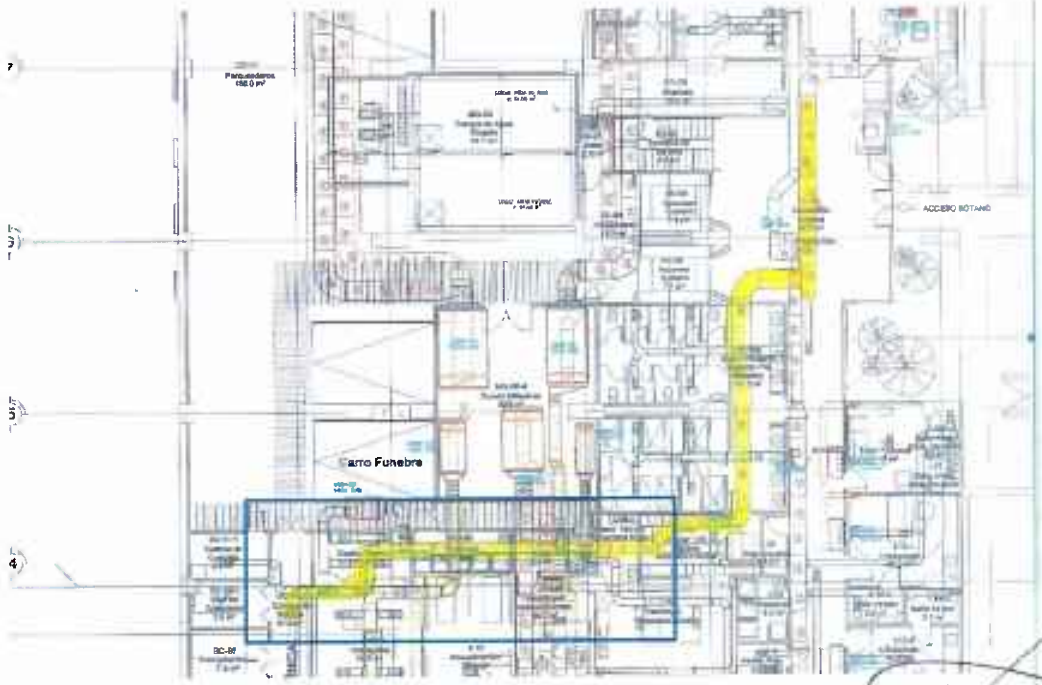

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: FR-R-044	Versión: No. 06	Página 1 de 2	
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	17	FECHA		ENERO DE 2026	
ITEM N°:	20.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DONDE SE UBICA LA MEDICIÓN

Plano	No.	Dimensiones								Long (m)	Radio (m)	Cant.	Cat.	Área M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Radio (m)	Área (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Radio (m)	Área (m)					
PISO 1														
EQUIPOS UMAFAR														
SUMINISTRO DE AIRE														
DUCTO	1	[redacted]	18.00	0.76	0.41					1.13		24	24	61.88
CODO	2	[redacted]	36.00	0.76	0.41						0.50	3	24	10.02
REDUCCION	24	[redacted]	36.00	0.76	0.41	22.00	16.00	0.56	0.41	0.80		1	24	1.71
DUCTO	3	[redacted]	22.00	0.56	0.41					1.13		3	24	10.01
REDUCCION	4	[redacted]	22.00	0.56	0.41	20.00	14.00	0.51	0.36	0.80		1	24	1.46
DUCTO	5	[redacted]	20.00	14.00	0.51	0.36				1.13		8	24	15.91
TAPA	6	[redacted]	22.00	14.00	0.51	0.36						1	24	0.78
CODO		[redacted]	36.00	0.76	0.41					0.24		35	24	20.45
CODO		[redacted]	22.00	36.00	0.56	0.41				0.24		8	24	2.90
CODO		[redacted]	20.00	36.00	0.51	0.41				0.24		8	24	4.11
													SUB TOTAL	[redacted]
													15%	[redacted]
													TOTAL	[redacted]

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alejandro Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

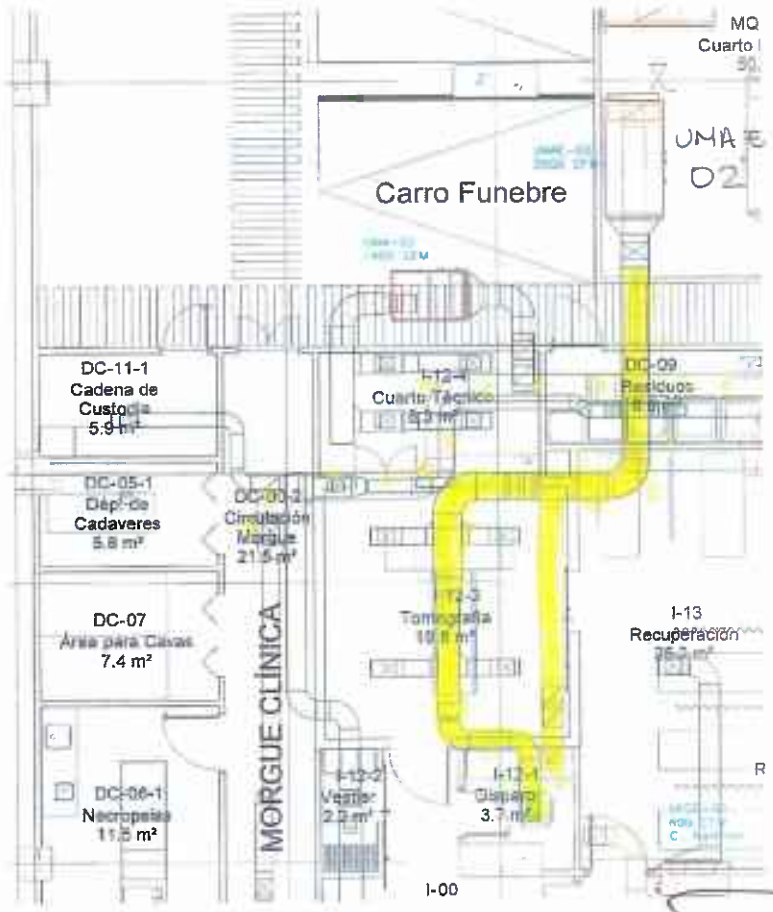

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: TA-FO-03 Versión No. 00 Fecha:	1	4	Página 1 de 2 2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	17	FECHA	ENERO DE 2026
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD: M2

Plano	No	Dimensiones				Operaciones				Long (m)	Ancho m	Cant	Cal	Área m2
		Nombre	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Nombre	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
EQUIPOS UMA # 2A														
SUMINISTRO DE AIRE														
FONDO	1		18.00	0.61	0.46					1.13		14	32	40.19
REDUCCION	2		18.00	0.61	0.46					0.80		1	32	1.00
DUCTO	3		18.00	0.71	0.61					1.13		31	24	25.77
CODO	4		18.00	0.71	0.61						0.30	1	24	2.40
CODO	5		18.00	0.71	0.61						0.30	2	24	4.80
UNION	6		18	0.61	0.46					0.80		16	32	8.00
UNION	7		18.00	0.71	0.61					1.13		31	24	21.70
													SUB TOTAL	127.86
													10%	12.79
													TOTAL	140.65

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

DETALLE DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

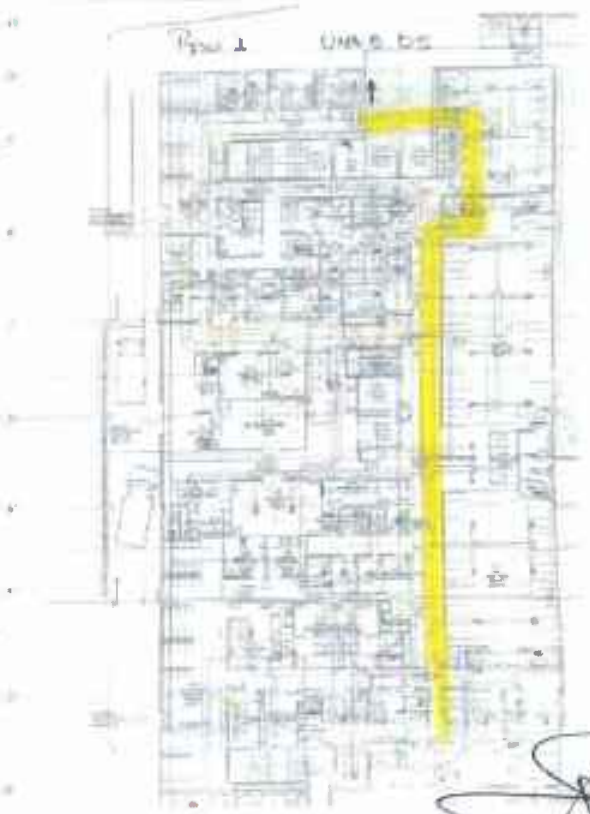

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Folio	6	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE Nº: 17	FECHA: ENERO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM: ATE 3 Duct Wrap	UNIDAD: M2

PLANO DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Piso	No	Dimensiones								Long (m)	Radio (r)	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
PISO UNO														
EQUIPOS UMA E-04														
SUMINISTRO														
ZAPATO	1	0.00	0.00	0.61	0.25					0.25		1	24	0.08
DUCTO	2	0.00	0.00	0.61	0.25					1.13		1	24	0.87
REDUCCION	3	0.00	0.00	0.61	0.25	18.00	10.00	0.46	0.25	0.50		1	24	0.69
UNIONES		0.00	0.00	0.61	0.25					0.25		1	24	0.07
DUCTO	4	0.00	0.00	0.46	0.25					1.13		20	24	23.76
REDUCCION	5	0.00	0.00	0.46	0.25	16.00	10.00	0.41	0.25	0.50		1	24	0.62
UNIONES		0.00	0.00	0.46	0.25					0.25		21	24	1.47
DUCTO	6	0.00	0.00	0.41	0.25					1.13		4	24	5.97
CODO	7	0.00	0.00	0.41	0.25						0.30	1	24	1.14
DUCTO	8	0.00	0.00	0.41	0.25					1.13		2	24	2.99
REDUCCION	9	0.00	0.00	0.41	0.25	14.00	8.00	0.36	0.20	0.50		1	24	0.72
UNIONES		0.00	0.00	0.41	0.25					0.25		8	24	2.64
DUCTO	10	0.00	0.00	0.36	0.20					1.13		2	24	2.53
REDUCCION	11	0.00	0.00	0.36	0.20	12.00	8.00	0.25	0.15	0.50		1	24	0.58
UNIONES		0.00	0.00	0.36	0.20					0.25		3	24	0.68
DUCTO	12	0.00	0.00	0.30	0.15					1.13		3	24	3.10
TAPA	13	0.00	0.00	0.30	0.15							1	24	0.09
UNIONES		0.00	0.00	0.30	0.15					0.25		4	24	0.97
ZAPATO	14	0.00	0.00	0.25	0.10					0.25		6	24	1.42
DUCTO	15	0.00	0.00	0.25	0.10					1.13		12	24	8.64
TAPA	16	0.00	0.00	0.25	0.10							10	24	0.30
DUCTO		0.00	0.00	0.25	0.10					0.25		30	24	6.33
SUBTOTAL														81.51
IVCM														638.84
PARIAL														720.35

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 1
		Fecha	9	9	2025

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

1. PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Piso 1

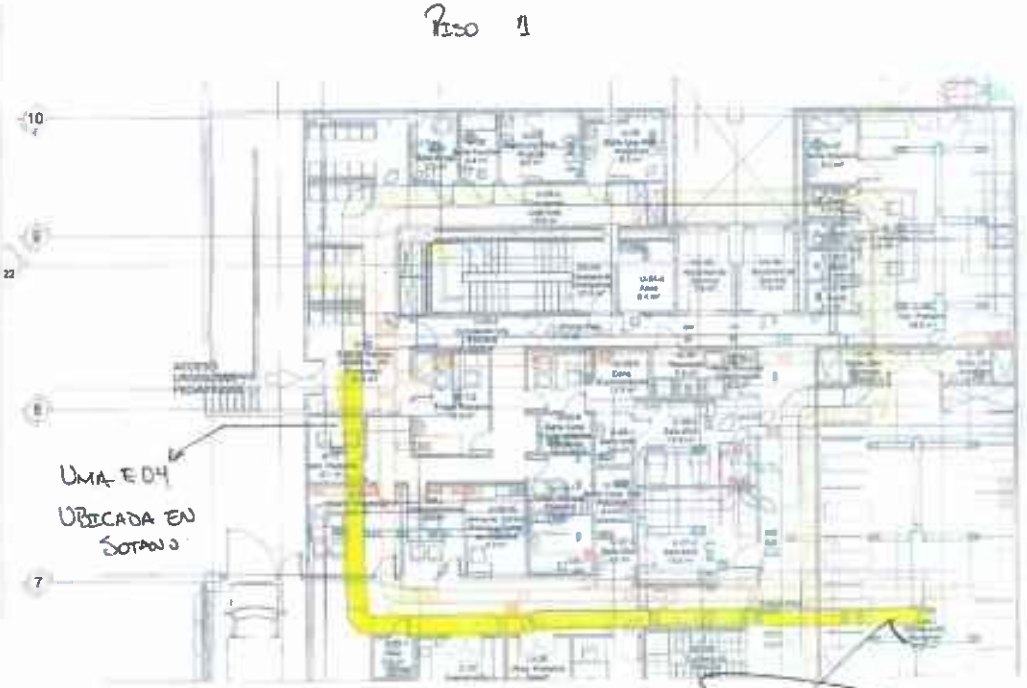

Elaboró		Revisó	
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Ing. Alexander Castillo		Arq. Jair Lozano	

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL						
CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	17	FECHA	ENERO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

UNA E-04 Piso 1

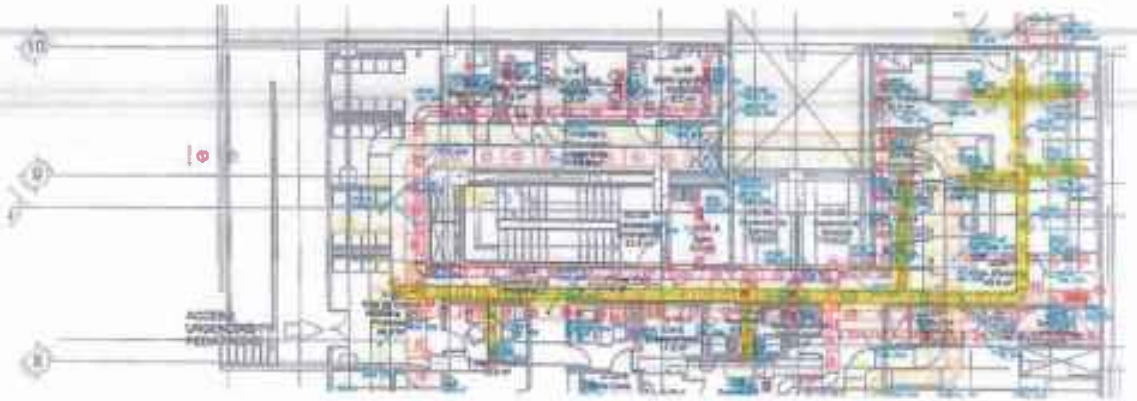

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

30-04-26 11:04 AM
