
SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.2.13	(b) DESCRIPCION ITEM	Construcción de muro divisorio en sistema liviano dos caras en lamina de fibrocemento 8mm, con estructura calibre 20 con disposición de parales cada 0.407 m, con refuerzo de arriostramiento conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye frescasa, tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura. <50CM			(c) UND:	ML

MEMORIA GRAFICA

PISO 4 - MUROS EN SUPERBOARD DOS CARAS

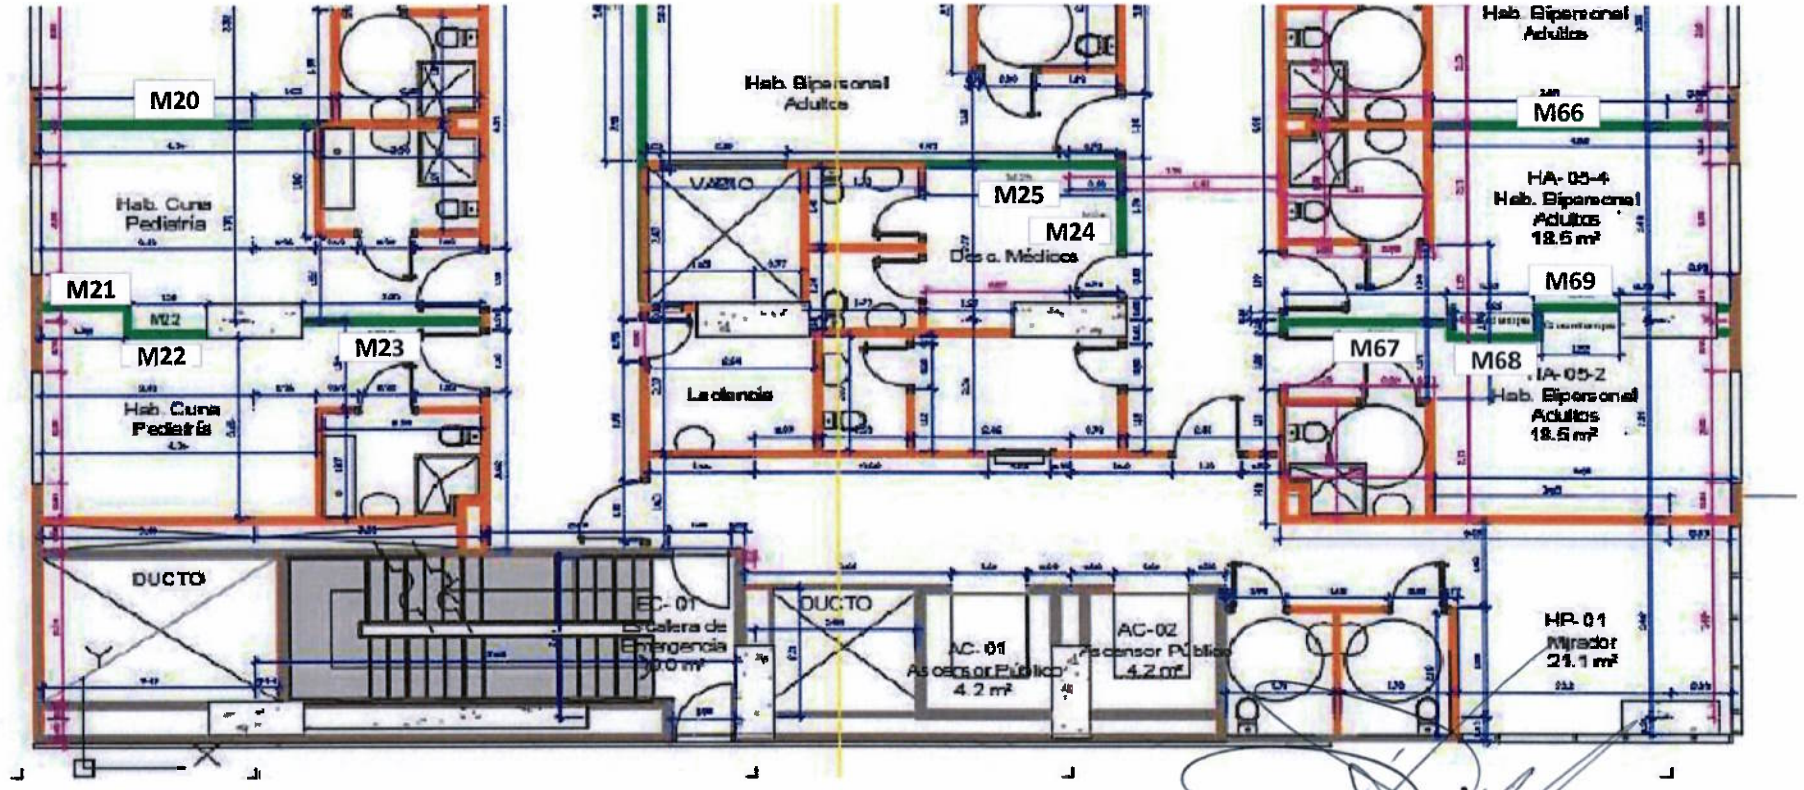

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	CANTIDAD POR TIPO DE VIGA	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M44	viga intermedia	0,25			0,25	1,00	0,25
	Viga cierre	1,05			1,05	1,00	1,05
M43	viga intermedia	1,59			1,59	1,00	1,59
M42	viga intermedia	1,61			1,61	1,00	1,61
M43-M42	Viga de cierre	6,20			6,20	1,00	6,20
M41	viga intermedia	1,66			1,66	1,00	1,66
	Viga de cierre	1,66			1,66	1,00	1,66
M54a	Viga de cierre	1,05			1,05	1,00	1,05
M137	viga intermedia	1,05			1,05	1,00	1,05
	Viga de cierre	1,05			1,05	1,00	1,05
M138	Viga de cierre	1,07			1,07	1,00	1,07
M122a	viga intermedia	0,86			0,86	1,00	0,86
	Viga de cierre	2,36			2,36	1,00	2,36
M143b	viga intermedia	1,66			1,66	1,00	1,66
	Viga de cierre	1,66			1,66	1,00	1,66
M143a	viga intermedia	0,40			0,40	1,00	0,40
	Viga de cierre	1,39			1,39	1,00	1,39
M42c	viga intermedia	3,15			3,15	1,00	3,15
M42b	viga intermedia	8,80			8,80	1,00	8,80
M42a	viga intermedia	4,40			4,40	1,00	4,40
M8a	viga intermedia	4,40			4,40	1,00	4,40
M221	viga intermedia	4,70			4,70	1,00	4,70
	Viga de cierre	4,70			4,70	1,00	4,70
M219a	viga intermedia	3,07			3,07	1,00	3,07
	Viga de cierre	3,07			3,07	1,00	3,07
M219b	Viga de cierre	1,36			1,36	1,00	1,36
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
M122g Ec-02 escalera de servicio	Viga intermedia	4,08			4,08	1,00	4,08
NOTA ACLARATORIA: CONTRATISTA E INTERVENTORIA ACUERDAN QUE EL COBRO DE LA VIGA INTERMEDIA DE LOS ASCENSORES SEA DE 1,5 RESPECTO DE VIGA INTERMEDIA ITEM 7,8,2 , Ya que este elemento tiene una seccion de 0,15m x 0,30m							
	PASAN						121,34


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1

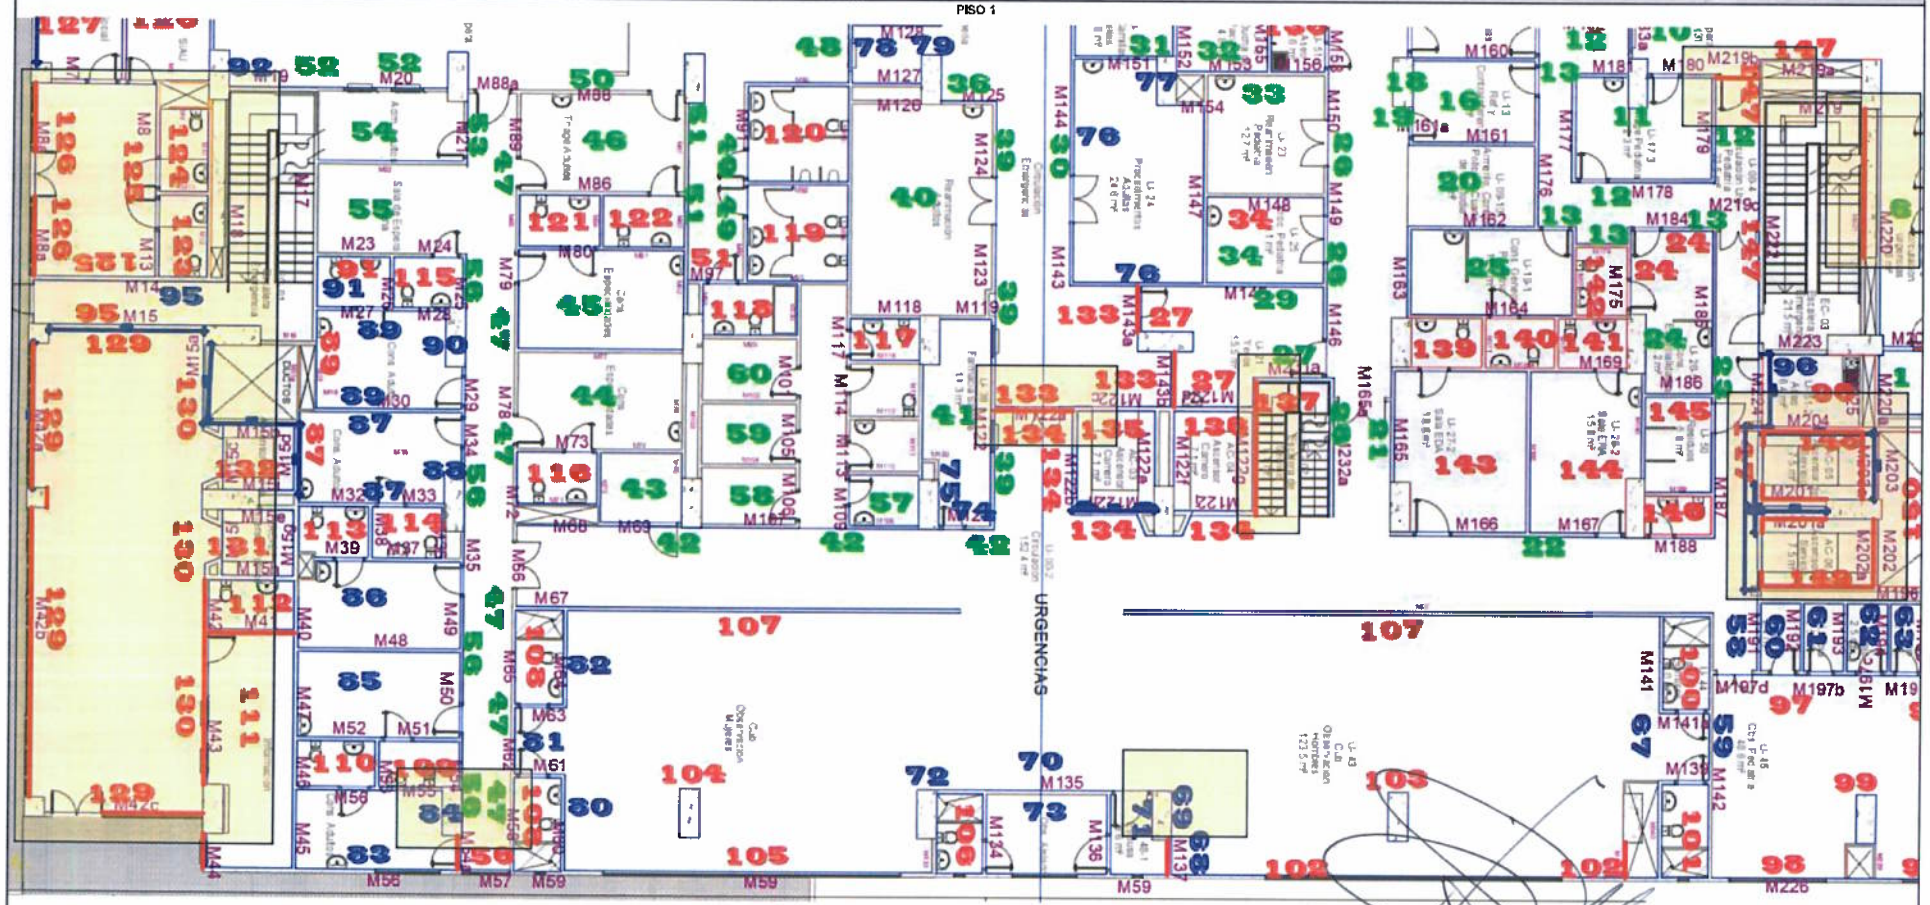

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Descripción	LARGO	ALTO	CANTIDAD POR TIPO DE VIGA			
PISO 1							
Ascensor camero -AC-04	Viga intermedia	8,67			8,67	6,00	52,02
Ascensor camero -AC-03	Viga intermedia	7,25			7,25	6,00	43,50
M165a	Viga de cierre	1,72			1,72	1,00	1,72
M151	Viga de cierre	2,51			2,51	1,00	2,51
M183a	Viga intermedia	1,67			1,67	1,00	1,67
	Viga de cierre	3,66			3,66	1,00	3,66
M220a	Viga intermedia	2,20			2,20	1,00	2,20
	Viga de cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M207a	Viga intermedia	0,91			0,91	1,00	0,91
	Viga de cierre	1,83			1,83	1,00	1,83
M218a	Viga intermedia	10,90			10,90	1,00	10,90
M88a	Viga de cierre	1,51			1,51	1,00	1,51
M18	Viga intermedia	4,74			4,74	1,00	4,74
	Viga de cierre	4,74			4,74	1,00	4,74
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No.: 00 | Página 1 de 4 Fecha: 5 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1

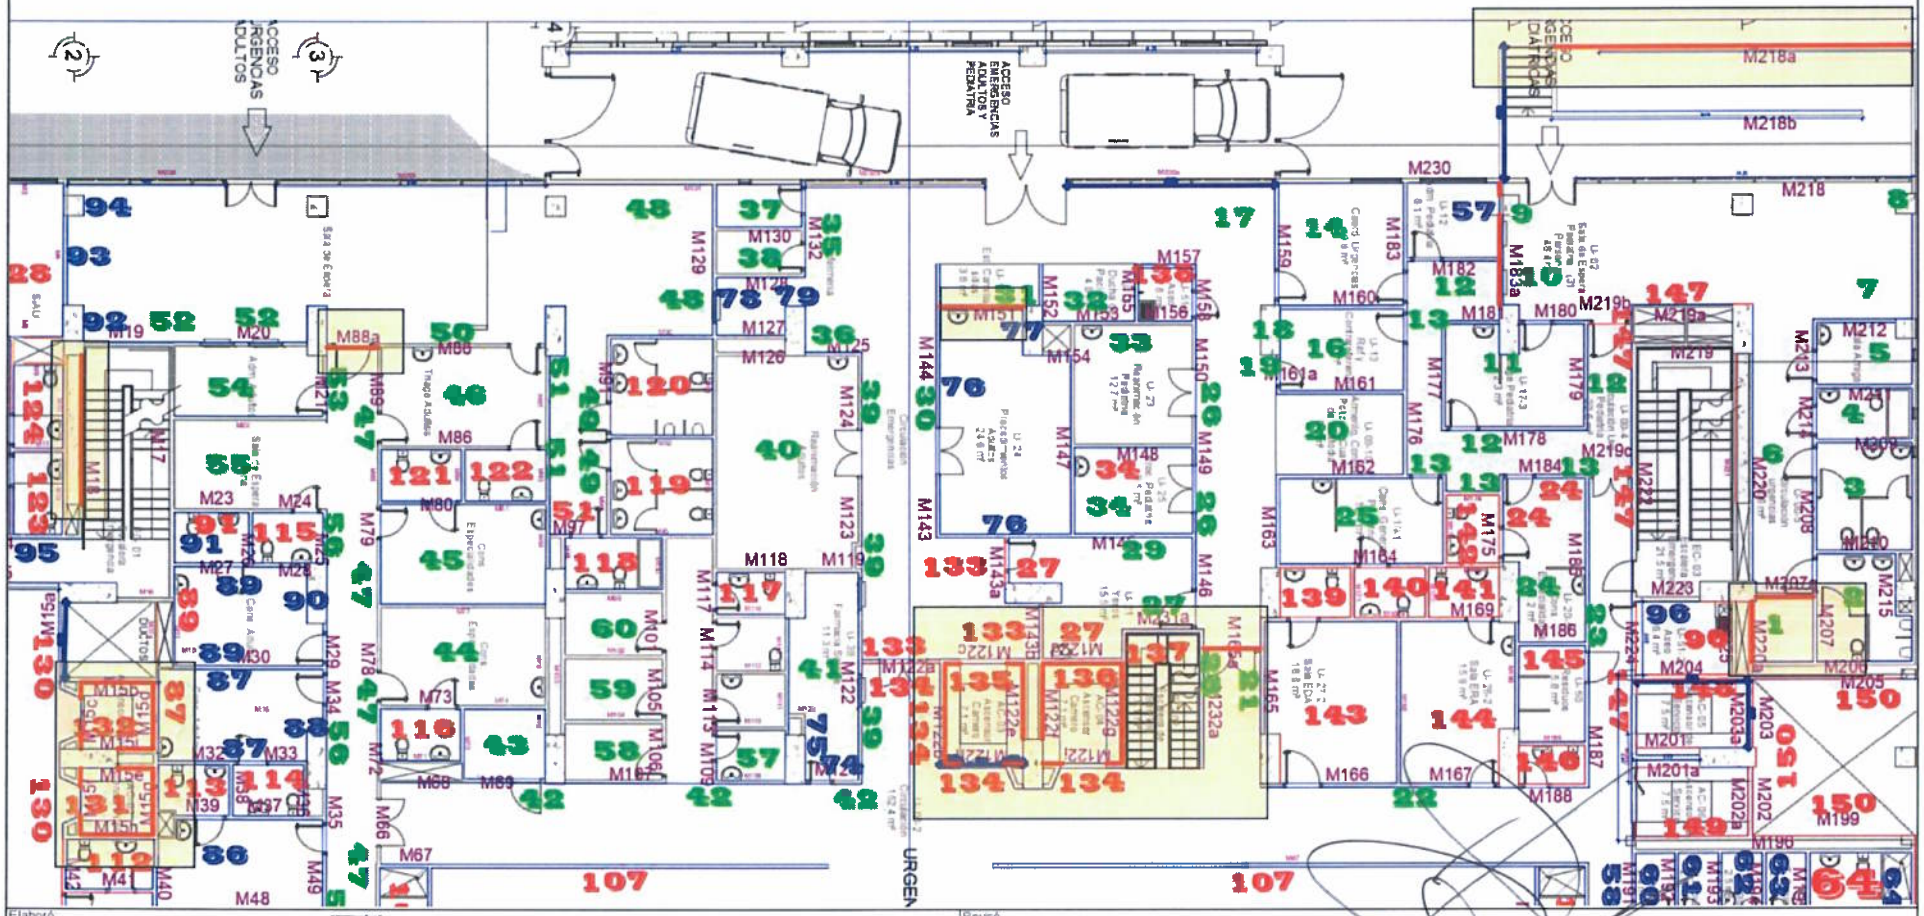

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	CANTIDAD POR TIPO DE VIGA	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M28	viga intermedia	0,60			0,60	1,00	0,60
	Viga cierre	1,69			1,69	1,00	1,69
M27	viga intermedia	1,38			1,38	1,00	1,38
	Viga cierre	2,35			2,35	1,00	2,35
M26	Viga cierre	4,42			4,42	1,00	4,42
M29	Viga cierre	3,72			3,72	1,00	3,72
M31	Viga cierre	5,44			5,44	1,00	5,44
M44	viga intermedia	1,77			1,77	1,00	1,77
	Viga cierre	1,77			1,77	1,00	1,77
M45	viga intermedia	2,24			2,24	1,00	2,24
	Viga cierre	2,24			2,24	1,00	2,24
M39	viga intermedia	1,63			1,63	1,00	1,63
M40	viga intermedia	2,90			2,90	1,00	2,90
M39-M40	Viga cierre	5,43			5,43	1,00	5,43
M46	viga intermedia	0,80			0,80	1,00	0,80
	Viga cierre	1,69			1,69	1,00	1,69
M50	viga intermedia	1,12			1,12	1,00	1,12
M52	viga intermedia	2,80			2,80	1,00	2,80
M50-M52	Viga cierre	4,82			4,82	1,00	4,82
M58	viga intermedia	1,42			1,42	1,00	1,42
	Viga cierre	1,42			1,42	1,00	1,42
M57	Viga cierre	1,61			1,61	1,00	1,61
M56	viga intermedia	1,40			1,40	1,00	1,40
	Viga cierre	1,40			1,40	1,00	1,40
M55	viga intermedia	0,80			0,80	1,00	0,80
	Viga cierre	1,68			1,68	1,00	1,68
M142	viga intermedia	1,47			1,47	1,00	1,47
	Viga cierre	2,47			2,47	1,00	2,47
	SUB TOTAL						62,48
	VIENEN						291,87
	PASAN						354,35


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE DESARROLLO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 03 | Página 1 de 4 Fecha: 5 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1

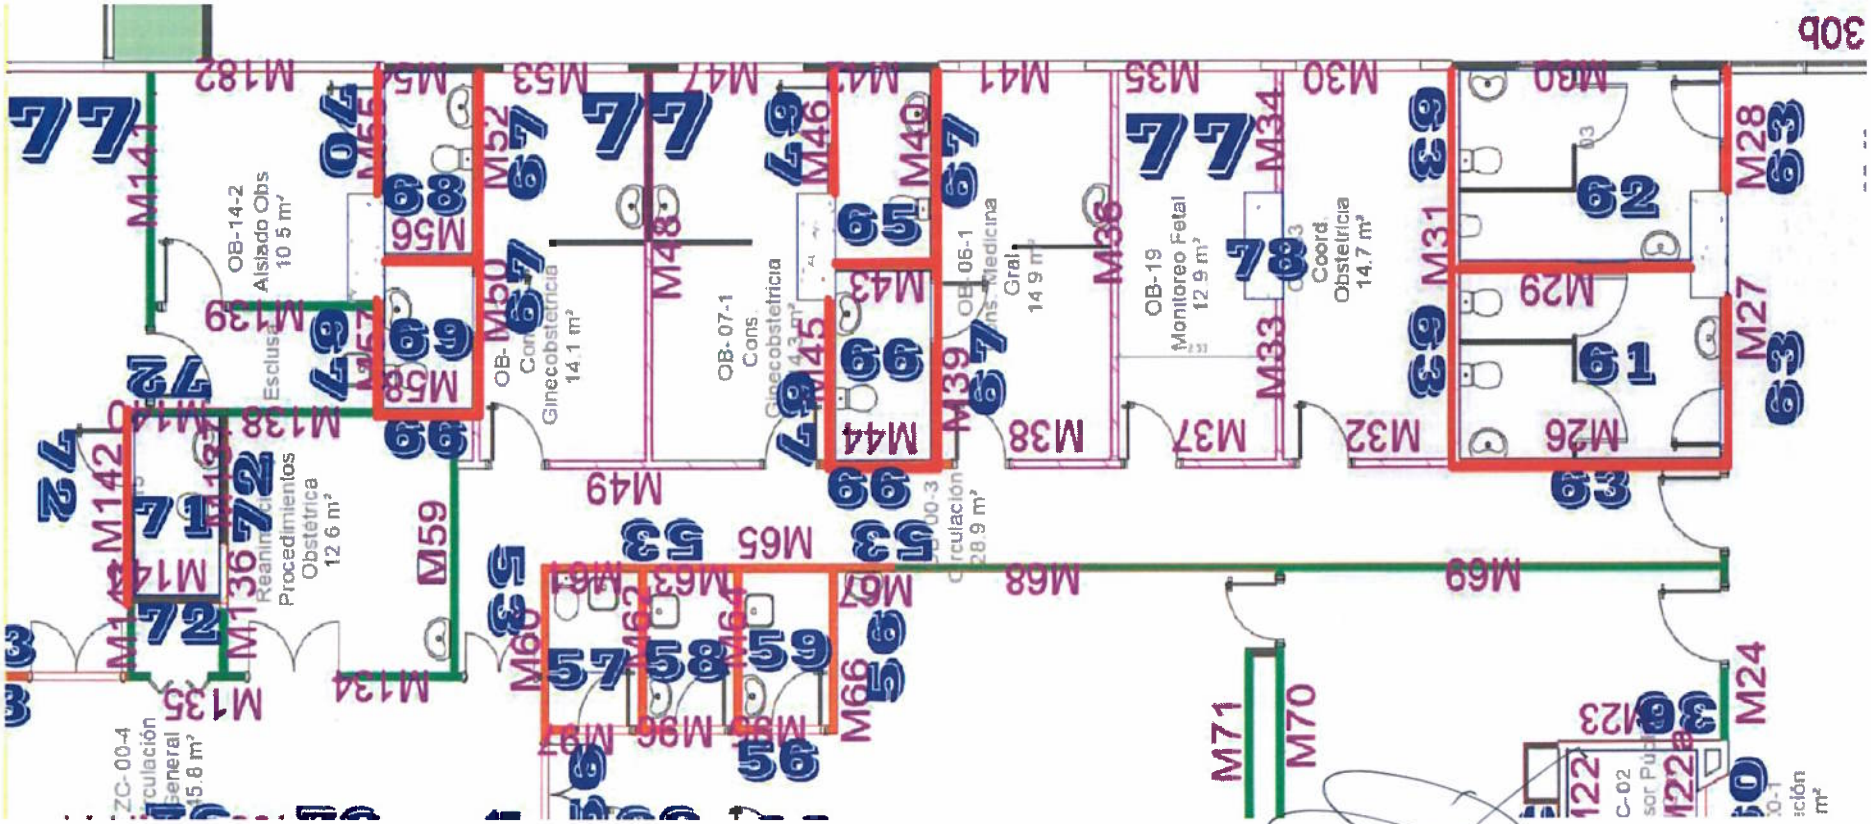


Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 08		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

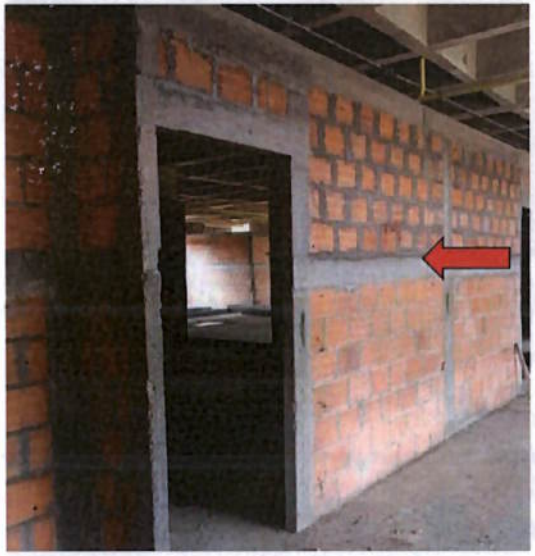

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M144	viga intermedia	1,55			1,55	1,00	1,55
	Viga cierre	1,55			1,55	1,00	1,55
M137	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M140	viga intermedia	1,55			1,55	1,00	1,55
	Viga cierre	1,55			1,55	1,00	1,55
M174	viga intermedia	7,23			7,23	1,00	7,23
	Viga cierre	8,73			8,73	1,00	8,73
M180	viga intermedia	1,67			1,67	1,00	1,67
	Viga cierre	2,55			2,55	1,00	2,55
	viga intermedia	0,50			0,50	1,00	0,50
	Viga cierre	0,50			0,50	1,00	0,50
M177-M179	Viga cierre	3,47			3,47	1,00	3,47
M176	Viga cierre	1,53			1,53	1,00	1,53
M176a	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
M178	Viga cierre	2,55			2,55	1,00	2,55
M243-M239	Viga cierre	5,77			5,77	1,00	5,77
M241	viga intermedia	2,40			2,40	1,00	2,40
	Viga cierre	3,37			3,37	1,00	3,37
M242	Viga cierre	2,43			2,43	1,00	2,43
M288-M290	Viga cierre	4,77			4,77	1,00	4,77
M289	viga intermedia	2,20			2,20	1,00	2,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M291	viga intermedia	3,03			3,03	1,00	3,03
	Viga cierre	4,87			4,87	1,00	4,87
M67	viga intermedia	0,91			0,91	1,00	0,91
M61-M63-M65-M67	Viga cierre	5,65			5,65	1,00	5,65
M60	viga intermedia	2,15			2,15	1,00	2,15
	Viga cierre	2,15			2,15	1,00	2,15
	SUB TOTAL						80,93
	VIENEN						354,35
	PASAN						435,28


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

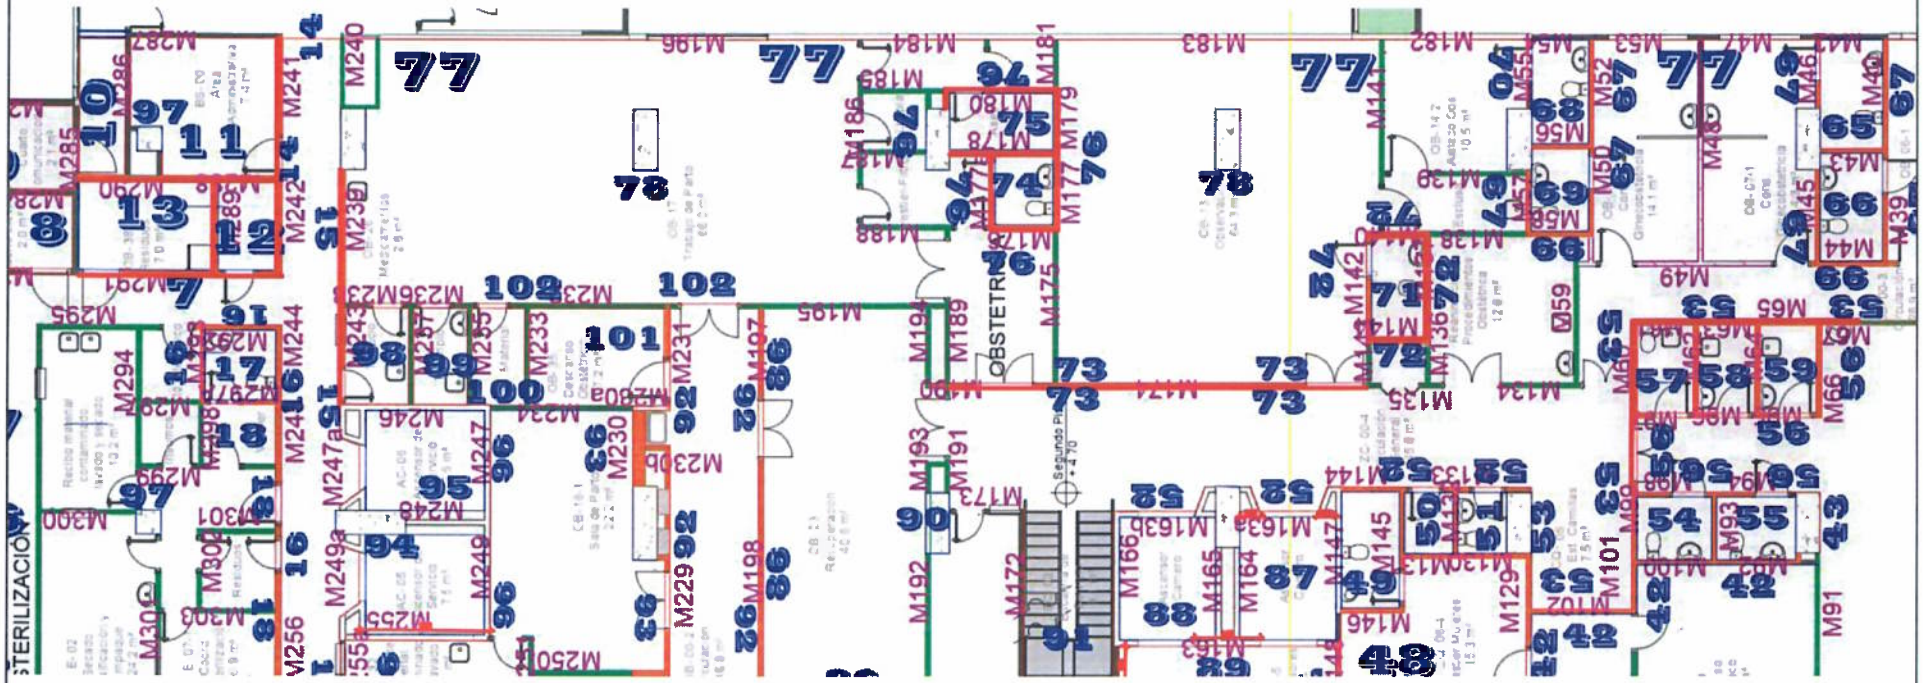

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viguetas placa - vanos puerta dintel	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M62	viga intermedia	2,15			2,15	1,00	2,15
	Viga cierre	2,15			2,15	1,00	2,15
M64	viga intermedia	2,15			2,15	1,00	2,15
	Viga cierre	2,15			2,15	1,00	2,15
M66	viga intermedia	2,15			2,15	1,00	2,15
	Viga cierre	2,15			2,15	1,00	2,15
M95-M96-M97	viga intermedia	1,50			1,50	1,00	1,50
M95-M96-M97	Viga cierre	4,70			4,70	1,00	4,70
M101-M99	viga intermedia	3,21			3,21	1,00	3,21
	Viga cierre	4,59			4,59	1,00	4,59
M92-M100	viga intermedia	4,07			4,07	1,00	4,07
	Viga cierre	4,07			4,07	1,00	4,07
M93	viga intermedia	1,55			1,55	1,00	1,55
	Viga cierre	1,55			1,55	1,00	1,55
M94	viga intermedia	0,85			0,85	1,00	0,85
M98	viga intermedia	1,15			1,15	1,00	1,15
M94-M98	Viga cierre	3,95			3,95	1,00	3,95
M102	viga intermedia	2,49			2,49	1,00	2,49
	Viga cierre	2,49			2,49	1,00	2,49
M129	viga intermedia	2,49			2,49	1,00	2,49
	Viga cierre	3,49			3,49	1,00	3,49
M130-M131	viga intermedia	2,99			2,99	1,00	2,99
	Viga cierre	2,99			2,99	1,00	2,99
M132	viga intermedia	1,50			1,50	1,00	1,50
	Viga cierre	1,50			1,50	1,00	1,50
M145	viga intermedia	1,89			1,89	1,00	1,89
	Viga cierre	2,85			2,85	1,00	2,85
M146	viga intermedia	1,53			1,53	1,00	1,53
	Viga cierre	1,53			1,53	1,00	1,53
	SUB TOTAL						71,83
	VIENEN						435,28
	PASAN						507,11


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

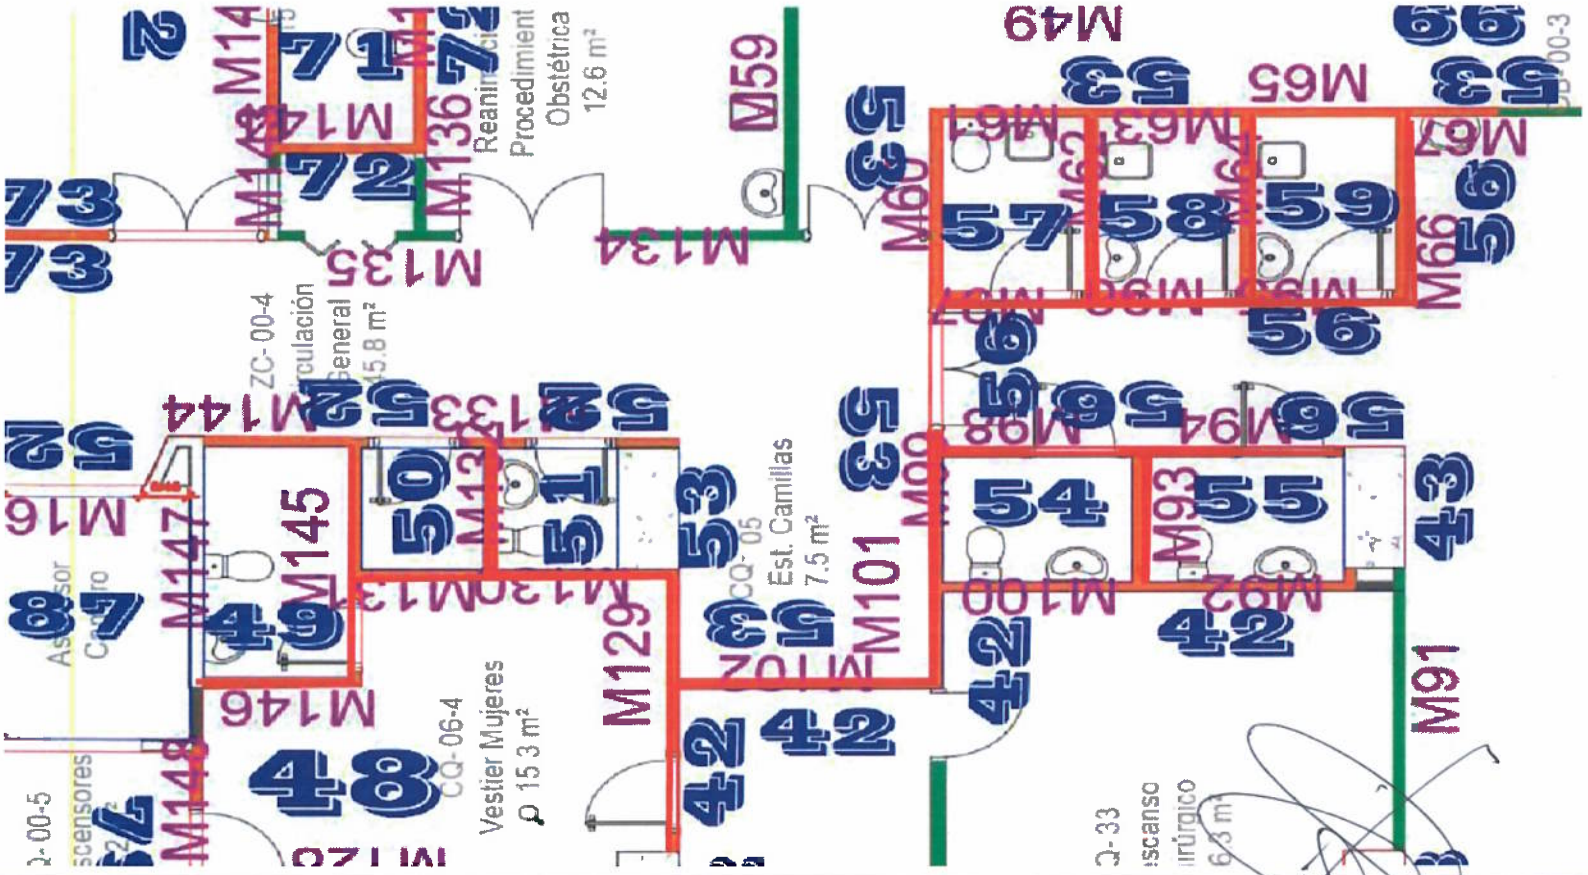

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M133-M144a	viga intermedia	3,07			3,07	1,00	3,07
	Viga cierre	4,64			4,64	1,00	4,64
M121	viga intermedia	2,59			2,59	1,00	2,59
	Viga cierre	3,63			3,63	1,00	3,63
M122	viga intermedia	2,99			2,99	1,00	2,99
	Viga cierre	2,99			2,99	1,00	2,99
M123	viga intermedia	1,87			1,87	1,00	1,87
	Viga cierre	2,83			2,83	1,00	2,83
M124-M125-M152-M160-M212-M211-M210-M227-M252	viga intermedia	18,43			18,43	1,00	18,43
	Viga cierre	22,41			22,41	1,00	22,41
M126	viga intermedia	3,35			3,35	1,00	3,35
M148	viga intermedia	1,00			1,00	1,00	1,00
M126-M148	Viga cierre	6,25			6,25	1,00	6,25
M126	viga intermedia	4,06			4,06	1,00	4,06
	Viga cierre	4,06			4,06	1,00	4,06
M127	viga intermedia	1,55			1,55	1,00	1,55
	Viga cierre	1,55			1,55	1,00	1,55
M204	viga intermedia	1,92			1,92	1,00	1,92
	Viga cierre	3,52			3,52	1,00	3,52
M206	viga intermedia	1,56			1,56	1,00	1,56
	Viga cierre	2,36			2,36	1,00	2,36
M209-M199-M198-M197	viga intermedia	11,45			11,45	1,00	11,45
	Viga cierre	14,55			14,55	1,00	14,55
M207-M202	viga intermedia	2,68			2,68	1,00	2,68
	Viga cierre	4,38			4,38	1,00	4,38
M205-M208	viga intermedia	4,45			4,45	1,00	4,45
	Viga cierre	4,45			4,45	1,00	4,45
M201-M200	viga intermedia	3,97			3,97	1,00	3,97
	Viga cierre	3,97			3,97	1,00	3,97
	SUB TOTAL						146,53
	VIENEN						507,11
	PASAN						653,64

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

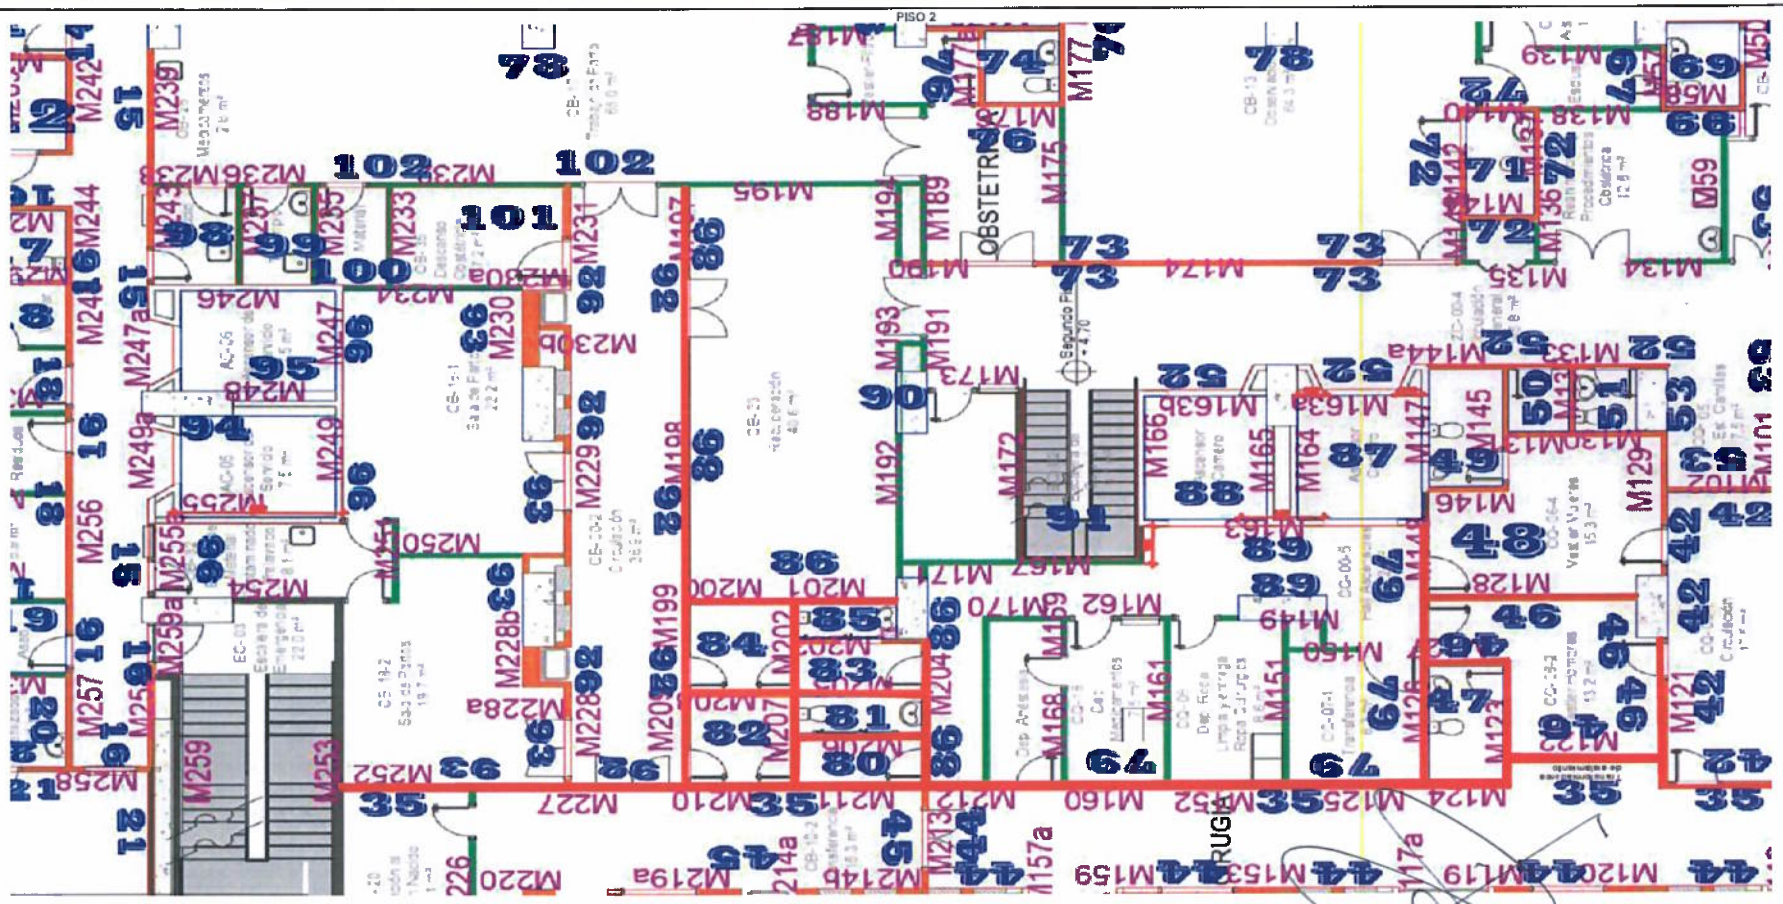

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viguetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M228-M229-M230-M231	viga intermedia	16,29			16,29	1,00	16,29
	Viga cierre	20,29			20,29	1,00	20,29
M166	viga intermedia	4,10			4,10	1,00	4,10
M236-M238	viga intermedia	1,92			1,92	1,00	1,92
	Viga cierre	4,40			4,40	1,00	4,40
M233	viga intermedia	2,37			2,37	1,00	2,37
	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M235	viga intermedia	2,37			2,37	1,00	2,37
	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M237	viga intermedia	2,37			2,37	1,00	2,37
	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M243	viga intermedia	2,37			2,37	1,00	2,37
	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M234	viga intermedia	0,95			0,95	1,00	0,95
	Viga cierre	0,95			0,95	1,00	0,95
M258	viga intermedia	2,60			2,60	1,00	2,60
	Viga cierre	3,63			3,63	1,00	3,63
M59	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
	Viga cierre	4,50			4,50	1,00	4,50
M13	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
	Viga cierre	4,50			4,50	1,00	4,50
M257-M256-M245-M244	viga intermedia	11,04			11,04	1,00	11,04
	Viga cierre	13,64			13,64	1,00	13,64
M292	viga intermedia	1,82			1,82	1,00	1,82
	Viga cierre	1,82			1,82	1,00	1,82
M293	viga intermedia	1,82			1,82	1,00	1,82
	Viga cierre	1,82			1,82	1,00	1,82
	SUB TOTAL						124,05
	VIENEN						653,64
	PASAN						777,69


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

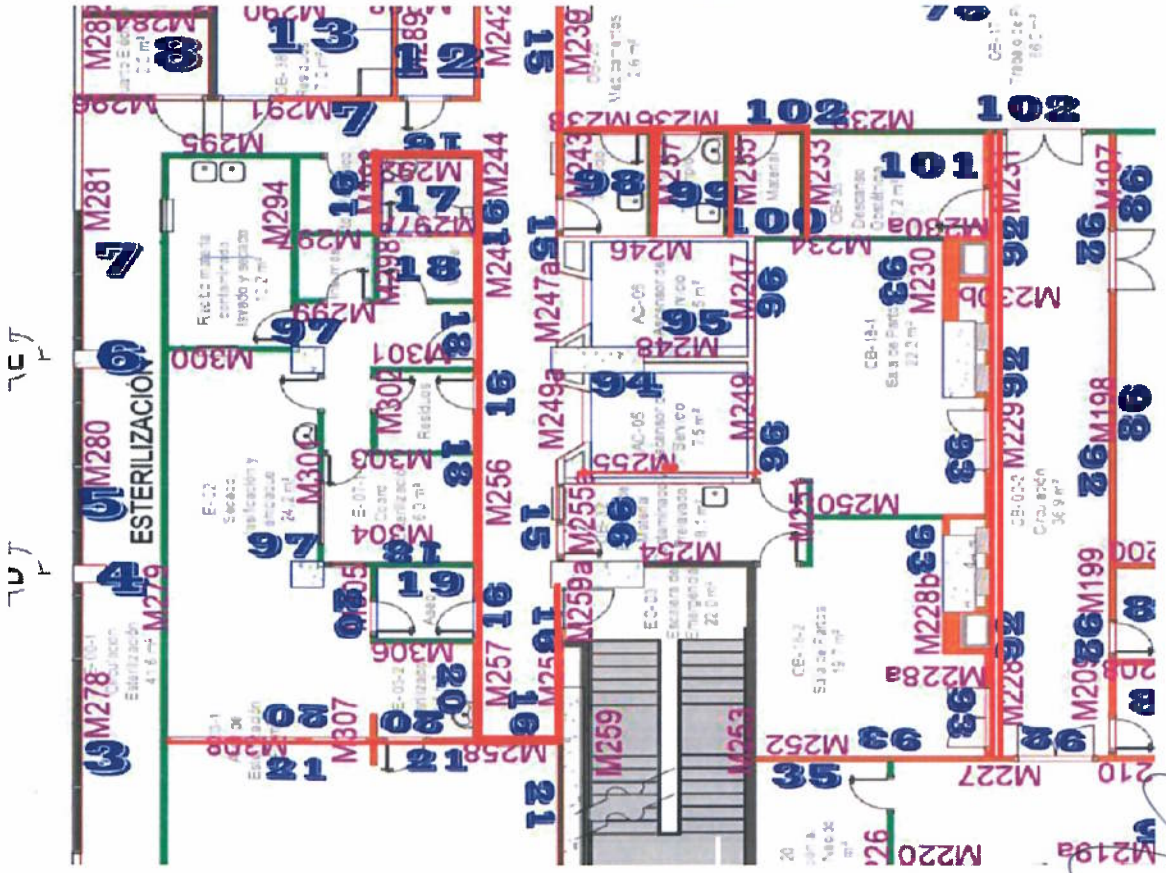

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2								
	M207a	viga intermedia	0,83			0,83	1,00	0,83
		Viga cierre	1,82			1,82	1,00	1,82
	M304	viga intermedia	2,76			2,76	1,00	2,76
		Viga cierre	2,76			2,76	1,00	2,76
	M305	viga intermedia	1,68			1,68	1,00	1,68
		Viga cierre	1,68			1,68	1,00	1,68
	M306	viga intermedia	1,90			1,90	1,00	1,90
		Viga cierre	1,90			1,90	1,00	1,90
	M83	viga intermedia	0,73			0,73	1,00	0,73
		Viga cierre	1,38			1,38	1,00	1,38
	M82	viga intermedia	2,70			2,70	1,00	2,70
		Viga cierre	2,70			2,70	1,00	2,70
	M81-M86-M86a-M87-M88-M108-M110-M111-M112a-M112	viga intermedia	15,65			15,65	1,00	15,65
		Viga cierre	21,65			21,65	1,00	21,65
	M120-M119-M118-M117-M117a	viga intermedia	7,64			7,64	1,00	7,64
		Viga cierre	10,40			10,40	1,00	10,40
	M153-M159-M158-M157a-M157-	viga intermedia	7,64			7,64	1,00	7,64
		Viga cierre	10,40			10,40	1,00	10,40
	M213	viga intermedia	1,27			1,27	1,00	1,27
		Viga cierre	2,75			2,75	1,00	2,75
	M214b-M214-M214a-M219-M219a	viga intermedia	7,13			7,13	1,00	7,13
		Viga cierre	9,89			9,89	1,00	9,89
	M218	viga intermedia	4,92			4,92	1,00	4,92
		Viga cierre	4,92			4,92	1,00	4,92
	M220	viga intermedia	1,30			1,30	1,00	1,30
		Viga cierre	1,30			1,30	1,00	1,30
	M221	viga intermedia	1,80			1,80	1,00	1,80
		Viga cierre	2,70			2,70	1,00	2,70
		SUB TOTAL						134,20
		VIENEN						777,69
		PASAN						911,89


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

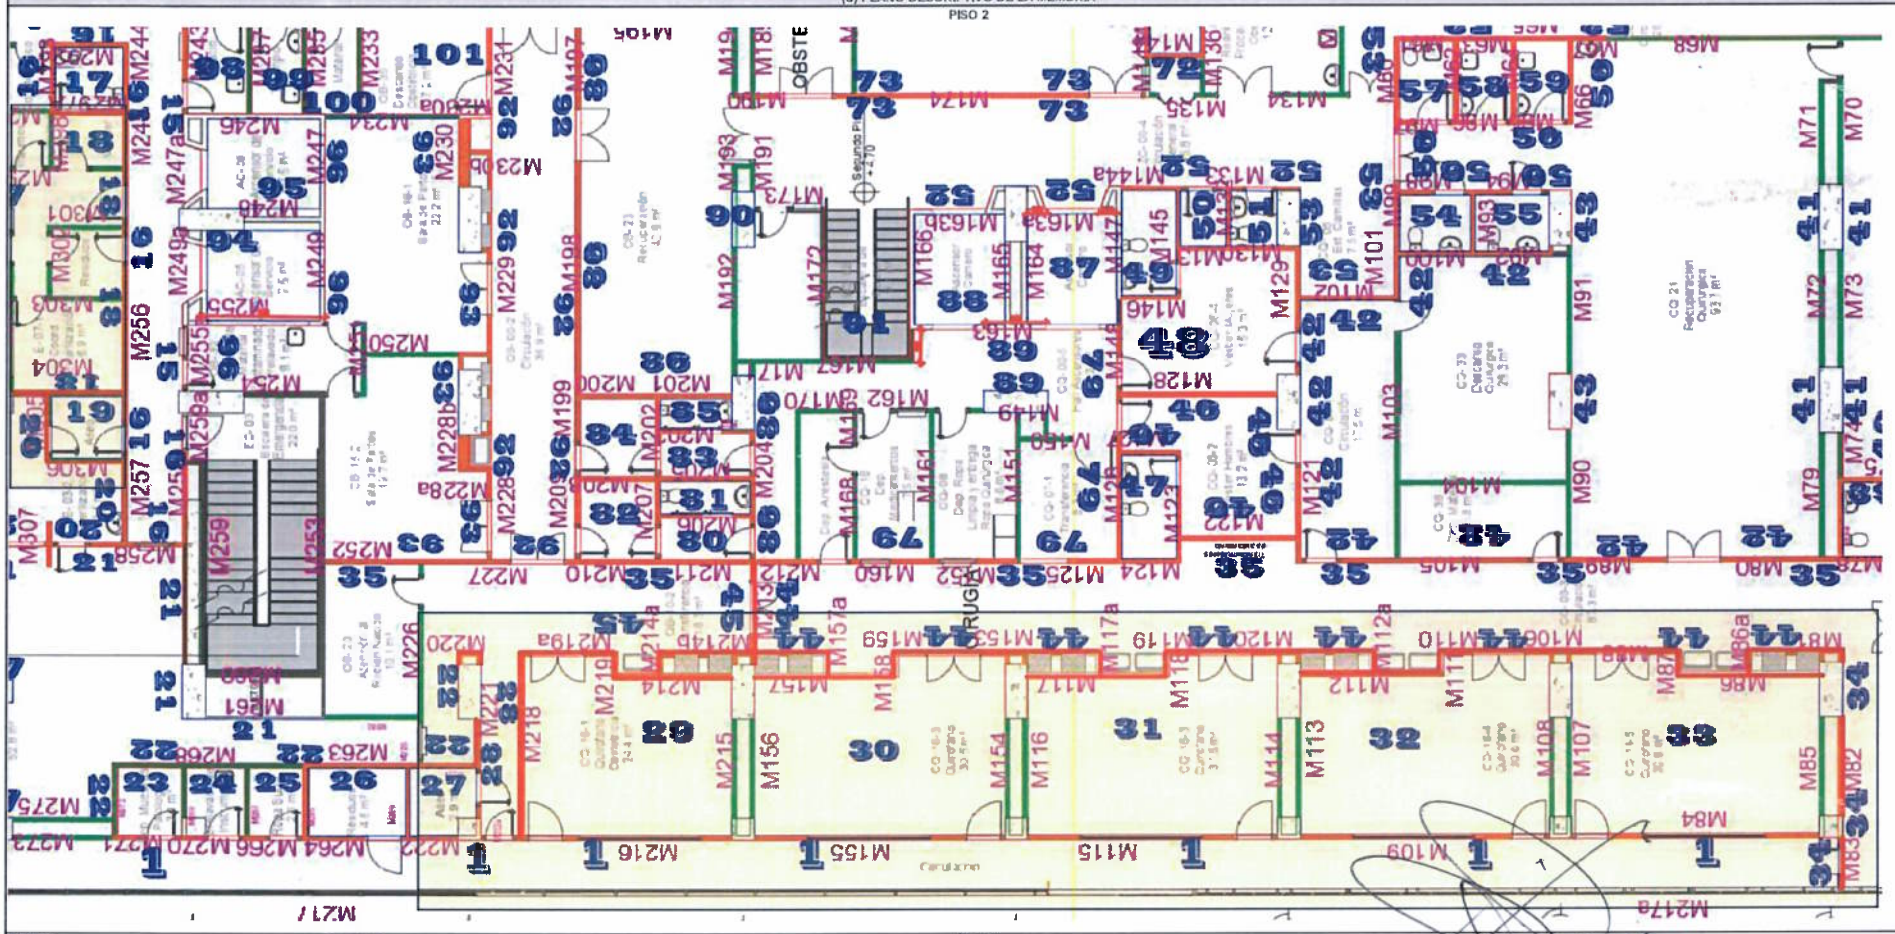

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	Descripción	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANTIDAD POR TIPO DE VIGA	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M224-M263-M268	Viga intermedia	9,36			9,36	1,00	9,36
	Viga cierre	9,36			9,36	1,00	9,36
M223-M265-M267-M269-M272	viga intermedia	1,85			1,85	5,00	9,25
	Viga cierre	1,85			1,85	5,00	9,25
M84-M109-M115-M155-M216-M222a-M222-M264-M266-M270-M271	viga intermedia	44,64			44,64	1,00	44,64
descuento ventanas		3,20			3,20	-5,00	-16,00
descuento puertas		0,90			0,90	-10,00	-9,00
descuento columnas		0,60			0,60	-7,00	-4,20
M84-M109-M115-M155-M216-M222a-M222-M264-M266-M270-M271	Viga cierre	44,64			44,64	1,00	44,64
descuento columnas		0,60			0,60	-7,00	-4,20
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor camero -AC-04	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor camero -AC-03	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21

NOTA ACLARATORIA: CONTRATISTA E INTERVENTORIA ACUERDAN QUE EL COBRO DE LA VIDA INTERMEDIA DE LOS ASCENSORES SEA DE 1,5 RESPECTO DE VIGA INTERMEDIA ITEM 7,8,2 , Ya que este elemento tiene una seccion de 0,15m x 0,30m

SUB TOTAL	247,36
VIENEN	911,89
PASAN	1159,25


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE DE CHUCURÍ	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

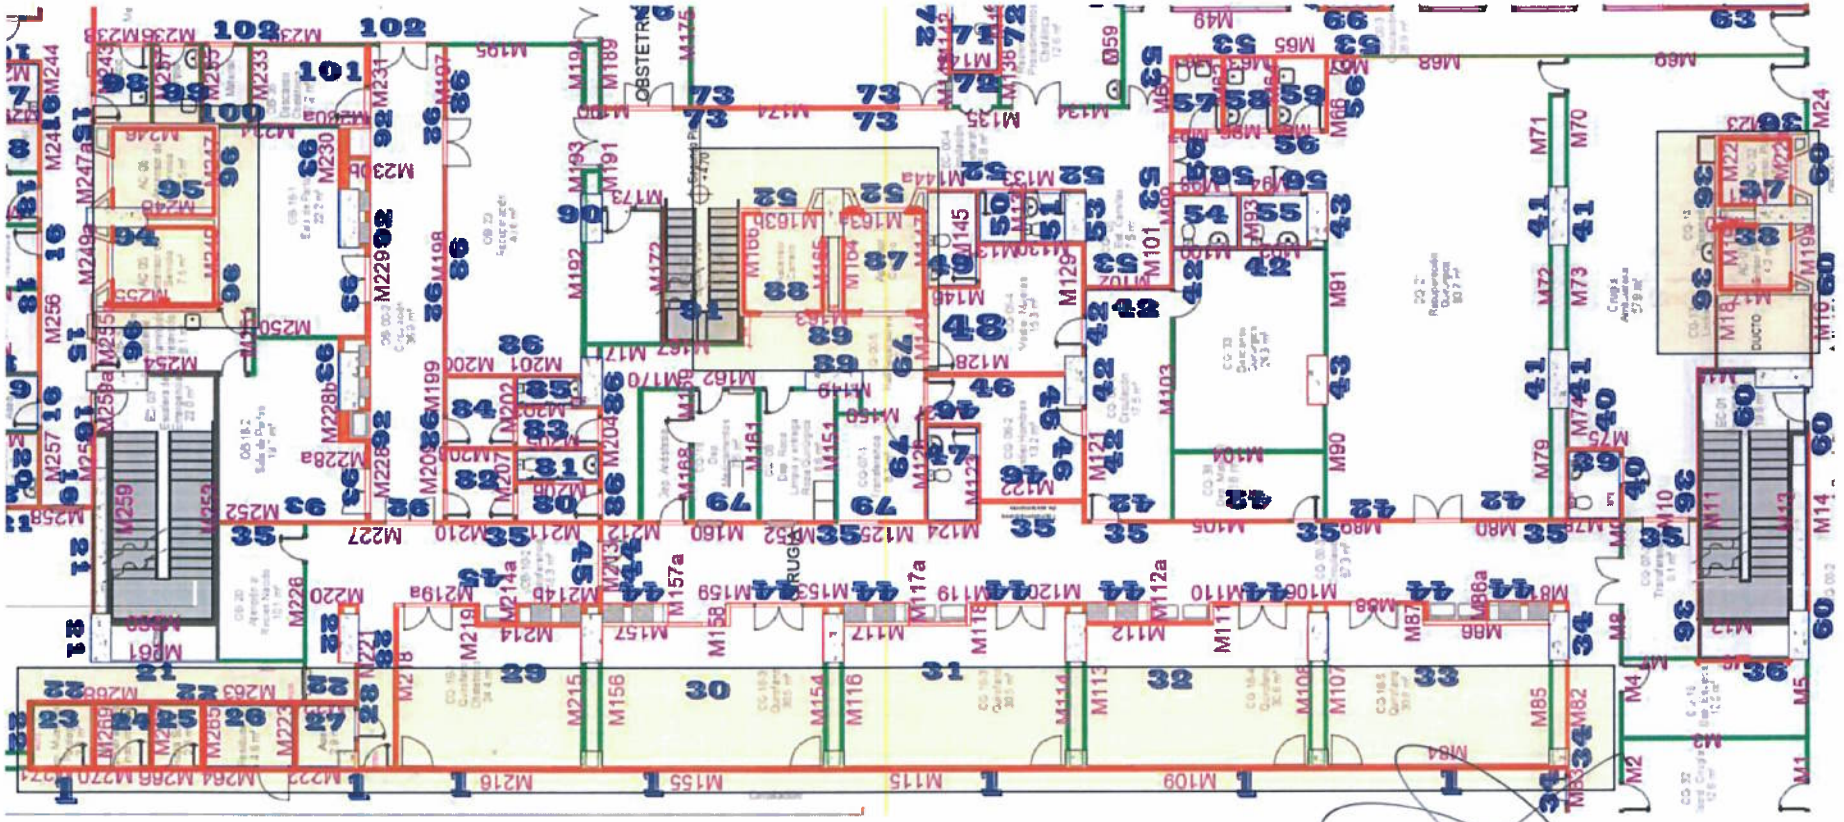

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Descripción	LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 3							
M15	viga intermedia	0,65			0,65	1,00	0,65
	Viga cierre	1,64			1,64	1,00	1,64
M11-M12a	Viga cierre	8,10			8,10	1,00	8,10
M12	Viga cierre	3,13			3,13	1,00	3,13
M13-M14	Viga cierre	6,20			6,20	1,00	6,20
M16	Viga cierre	3,34			3,34	1,00	3,34
M23	viga intermedia	1,29			1,29	1,00	1,29
M19-M23	Viga cierre	4,88			4,88	1,00	4,88
M18	Viga cierre	1,48			1,48	1,00	1,48
M17	Viga cierre	2,83			2,83	1,00	2,83
M20	Viga cierre	1,72			1,72	1,00	1,72
M21	viga intermedia	1,92			1,92	1,00	1,92
	Viga cierre	1,92			1,92	1,00	1,92
M22	viga intermedia	2,17			2,17	1,00	2,17
	Viga cierre	2,17			2,17	1,00	2,17
M23a	viga intermedia	0,59			0,59	1,00	0,59
	Viga cierre	0,59			0,59	1,00	0,59
M24	viga intermedia	1,47			1,47	1,00	1,47
	Viga cierre	1,47			1,47	1,00	1,47
M26-M27	viga intermedia	4,59			4,59	1,00	4,59
	Viga cierre	4,59			4,59	1,00	4,59
M25	viga intermedia	1,24			1,24	1,00	1,24
	Viga cierre	1,24			1,24	1,00	1,24
M30	viga intermedia	0,77			0,77	1,00	0,77
M31	viga intermedia	1,05			1,05	1,00	1,05
M30-M31	Viga cierre	3,74			3,74	1,00	3,74
M33	Viga cierre	4,59			4,59	1,00	4,59
M37	Viga cierre	1,24			1,24	1,00	1,24
	SUB TOTAL						70,61
	VIENEN						1159,25
	PASAN						1229,86


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.9.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3

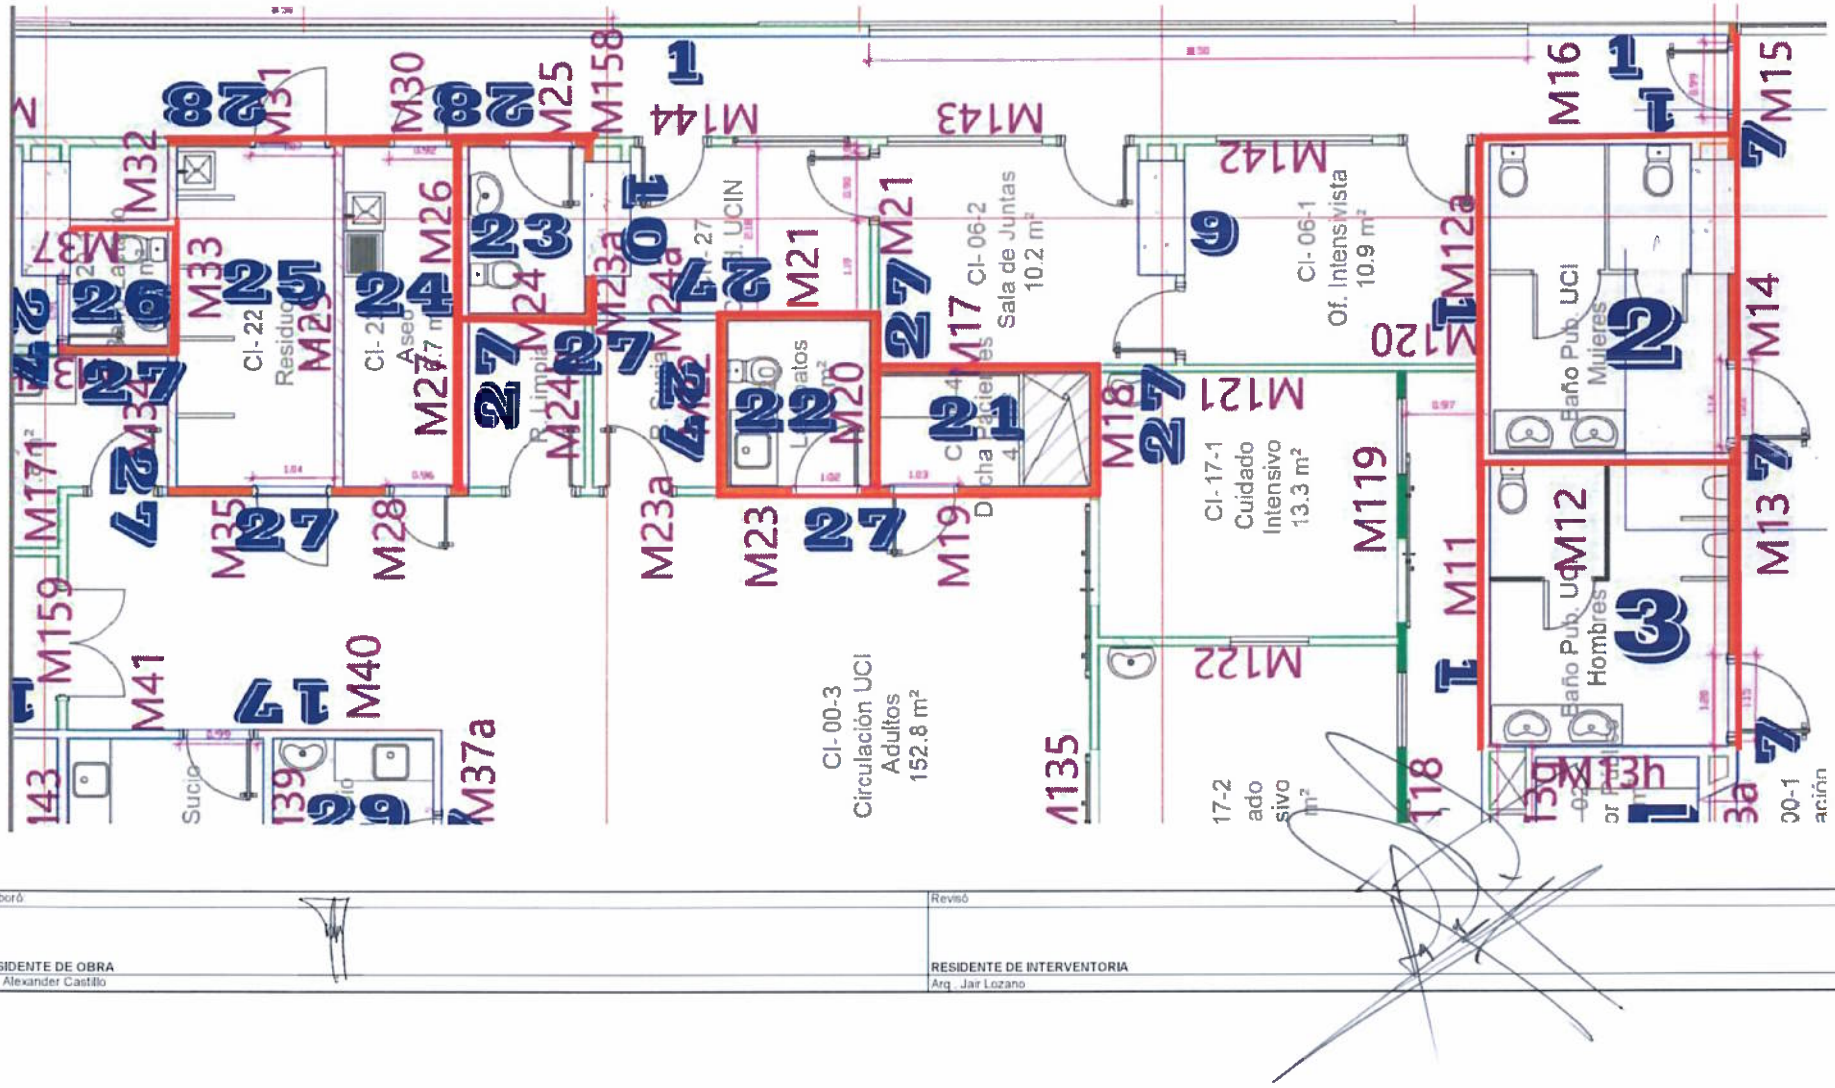

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Versión No. 09		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		Descripción	LARGO	ALTO	Dacuanto viguetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 3								
	M37b	Viga cierre	1,37			1,37	1,00	1,37
	M28-M35	Viga cierre	3,85			3,85	1,00	3,85
	M29	Viga cierre	4,47			4,47	1,00	4,47
	M37a	viga intermedia	2,80			2,80	1,00	2,80
		Viga cierre	5,21			5,21	1,00	5,21
	M40	viga intermedia	2,24			2,24	1,00	2,24
	M40-M41	Viga cierre	4,75			4,75	1,00	4,75
	M39	viga intermedia	2,01			2,01	1,00	2,01
	M43	viga intermedia	2,01			2,01	1,00	2,01
	M38-M42	Viga cierre	4,61			4,61	1,00	4,61
	M58	viga intermedia	2,02			2,02	1,00	2,02
	M50	viga intermedia	2,49			2,49	1,00	2,49
	M58-M50	Viga cierre	5,51			5,51	1,00	5,51
	M59	viga intermedia	5,41			5,41	1,00	5,41
		Viga cierre	5,41			5,41	1,00	5,41
	M60b	viga intermedia	0,66			0,66	1,00	0,66
		Viga cierre	0,66			0,66	1,00	0,66
	M57-M56	viga intermedia	4,29			4,29	1,00	4,29
		Viga cierre	5,28			5,28	1,00	5,28
	M54-M55	viga intermedia	3,69			3,69	1,00	3,69
		Viga cierre	3,69			3,69	1,00	3,69
	M53	viga intermedia	2,18			2,18	1,00	2,18
		Viga cierre	2,18			2,18	1,00	2,18
	M99	viga intermedia	1,51			1,51	1,00	1,51
		Viga cierre	3,50			3,50	1,00	3,50
	M96	Viga cierre	1,83			1,83	1,00	1,83
	M95-M94-M61-M62	Viga cierre	8,29			8,29	1,00	8,29
	M97	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
	M98	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
		SUB TOTAL						95,38
		VIENEN						1229,86
		PASAN						1325,24


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3

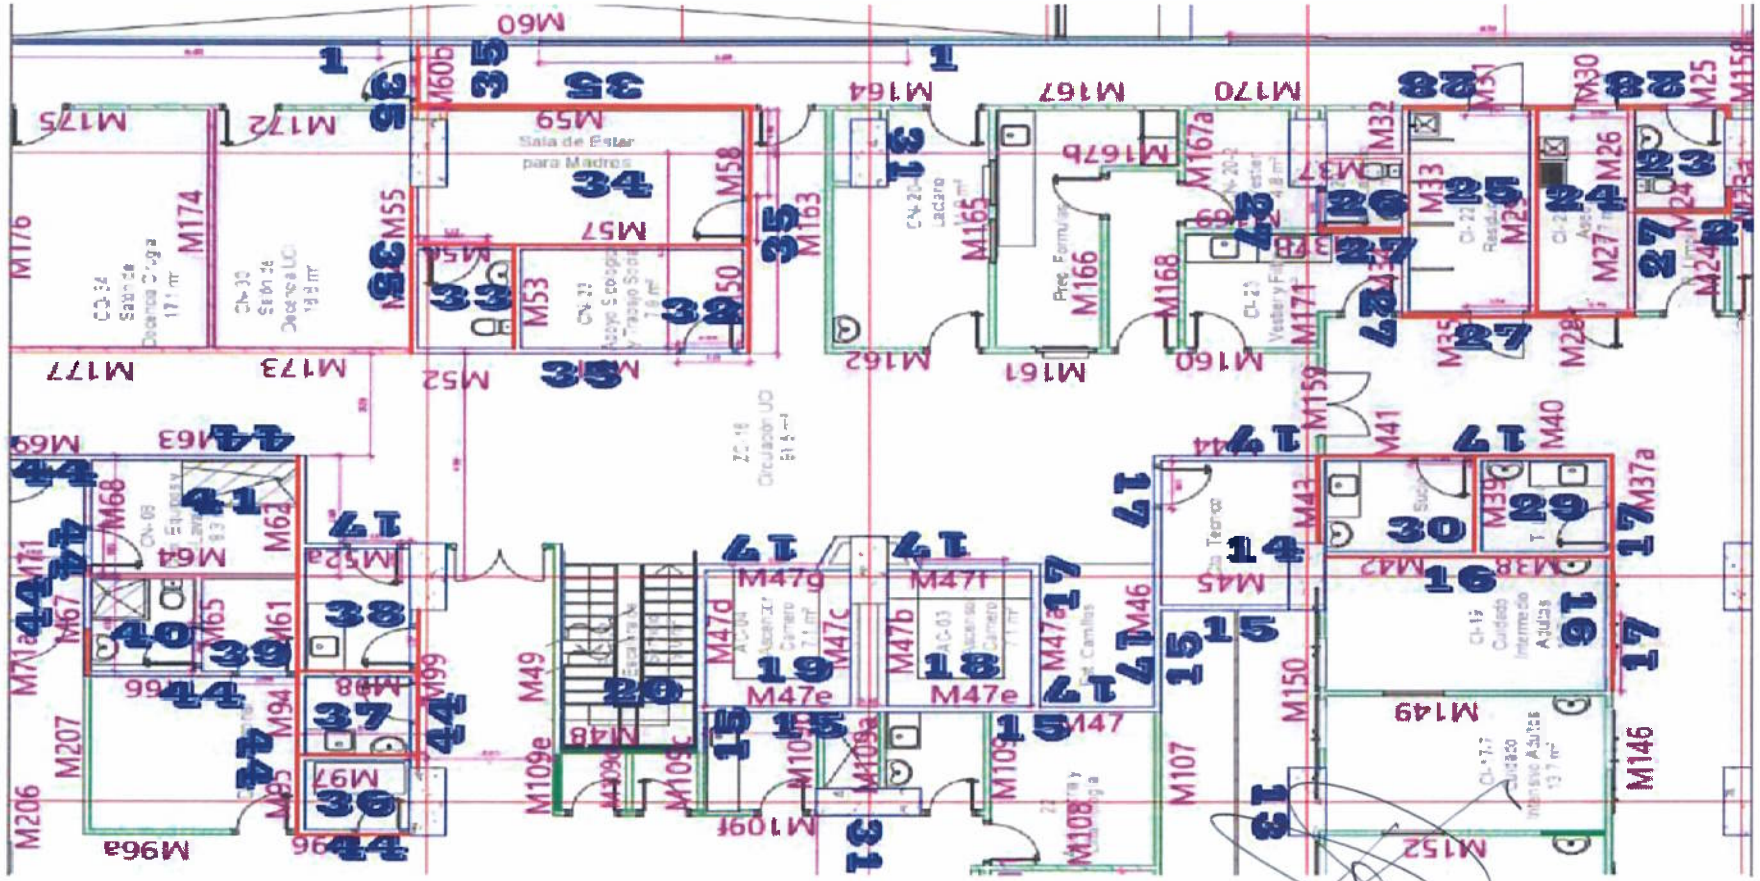

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD POR TIPO DE VIGA	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Descripción	LARGO	ALTO				
PISO 3							
M52a	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
M63-M69-M70	Viga cierre	7,31			7,31	1,00	7,31
M68-M67	Viga cierre	4,80			4,80	1,00	4,80
M66	Viga cierre	3,30			3,30	1,00	3,30
M64	Viga cierre	3,30			3,30	1,00	3,30
M65	Viga cierre	2,06			2,06	1,00	2,06
M71	viga intermedia	2,50			2,50	1,00	2,50
	Viga cierre	2,50			2,50	1,00	2,50
M71-M71a	Viga cierre	5,45			5,45	1,00	5,45
M72	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M75	viga intermedia	0,71			0,71	1,00	0,71
M733-M75	Viga cierre	5,44			5,44	1,00	5,44
M74	Viga cierre	2,37			2,37	1,00	2,37
M96a	Viga cierre	3,81			3,81	1,00	3,81
M97a	Viga cierre	1,65			1,65	1,00	1,65
M98a	Viga cierre	3,81			3,81	1,00	3,81
M95a	Viga cierre	1,16			1,16	1,00	1,16
M7	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
	Viga cierre	4,50			4,50	1,00	4,50
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor camero -AC-04	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor camero -AC-03	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
M47 d - escalera Ec-02	Viga intermedia	4,10			4,10	1,00	4,10
M66	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
	Viga cierre	4,50			4,50	1,00	4,50
NOTA ACLARATORIA: CONTRATISTA E INTERVENTORIA ACUERDAN QUE EL COBRO DE LA VIDA INTERMEDIA DE LOS ASCENSORES SEA DE 1,5 RESPECTO DE VIGA INTERMEDIA ITEM 7,8,2 , Ya que este elemento tiene una seccion de 0,15m x 0,30m							
SUB TOTAL							230,63
VIENEN							1325,24
PASAN							1555,87


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3

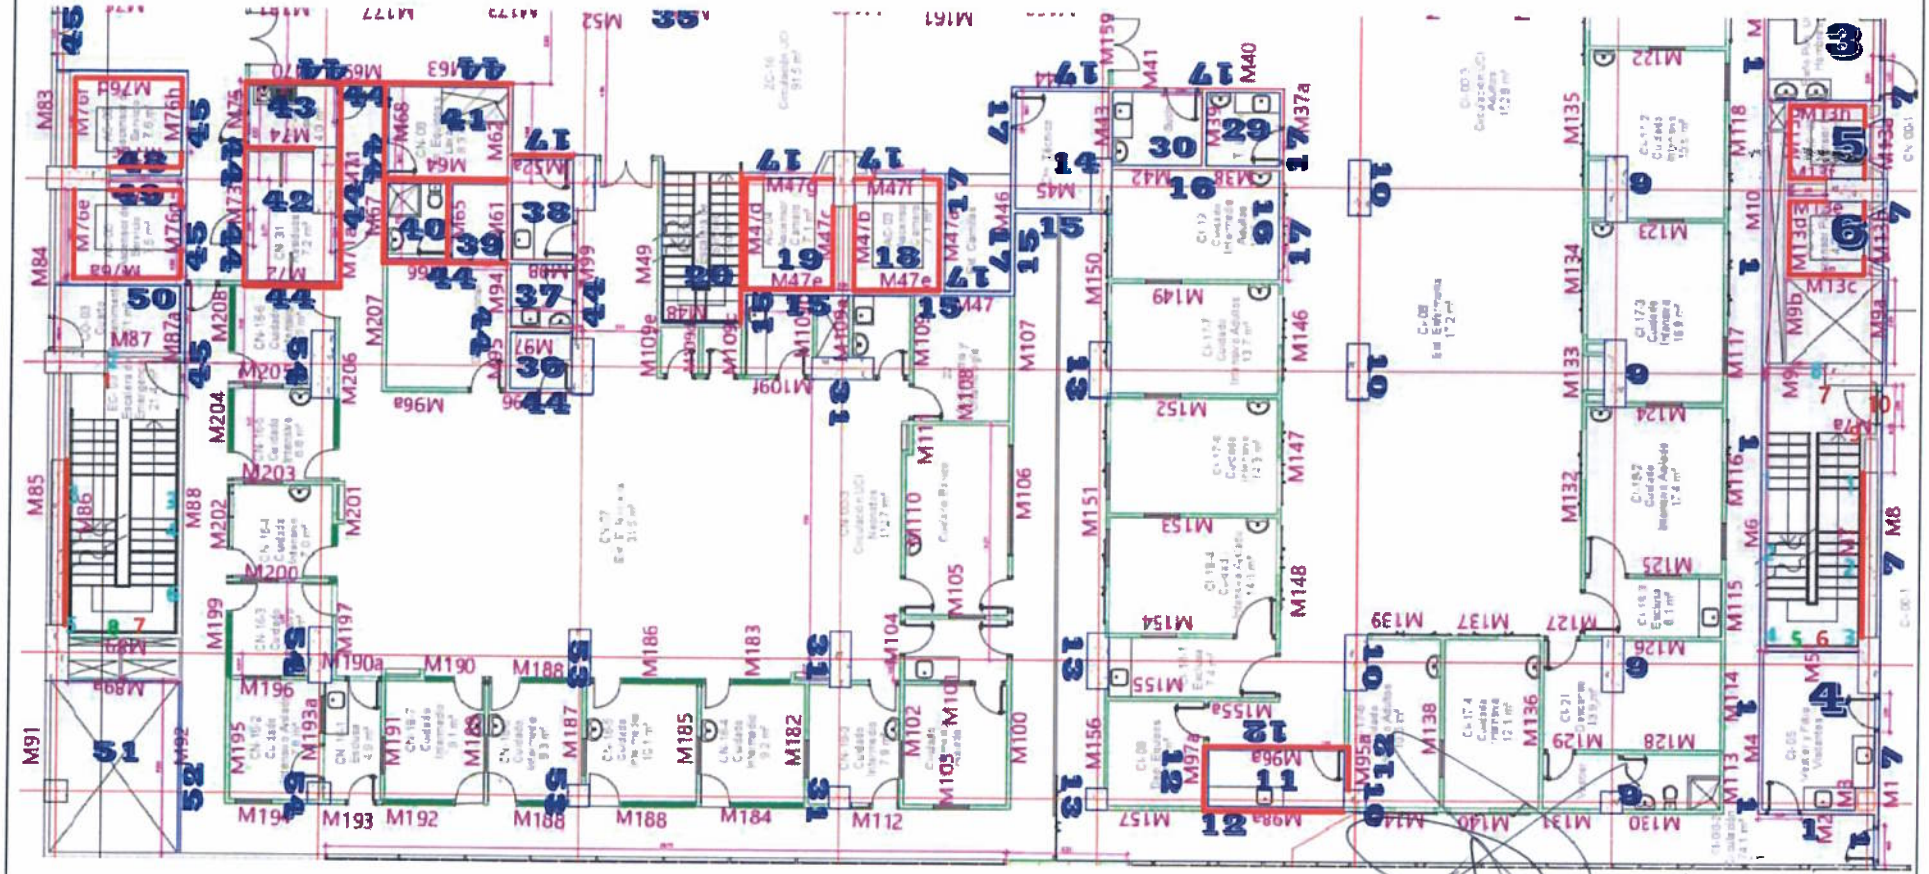

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3							
M4	viga intermedia	4,41			4,41	1,00	4,41
	Viga cierre	4,41			4,41	1,00	4,41
M2	viga intermedia	3,10			3,10	1,00	3,10
	Viga cierre				0,00	1,00	0,00
M3	viga intermedia	1,19			1,19	1,00	1,19
	Viga cierre	1,19			1,19	1,00	1,19
M1	viga intermedia	2,69			2,69	1,00	2,69
	Viga cierre	4,67			4,67	1,00	4,67
M93d-M91c-M91d-M91e-M91f	viga intermedia	48,13			48,13	1,00	48,13
				SUB TOTAL			69,79
				VIENEN			1555,87
				PASAN			1625,66

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 4 Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3

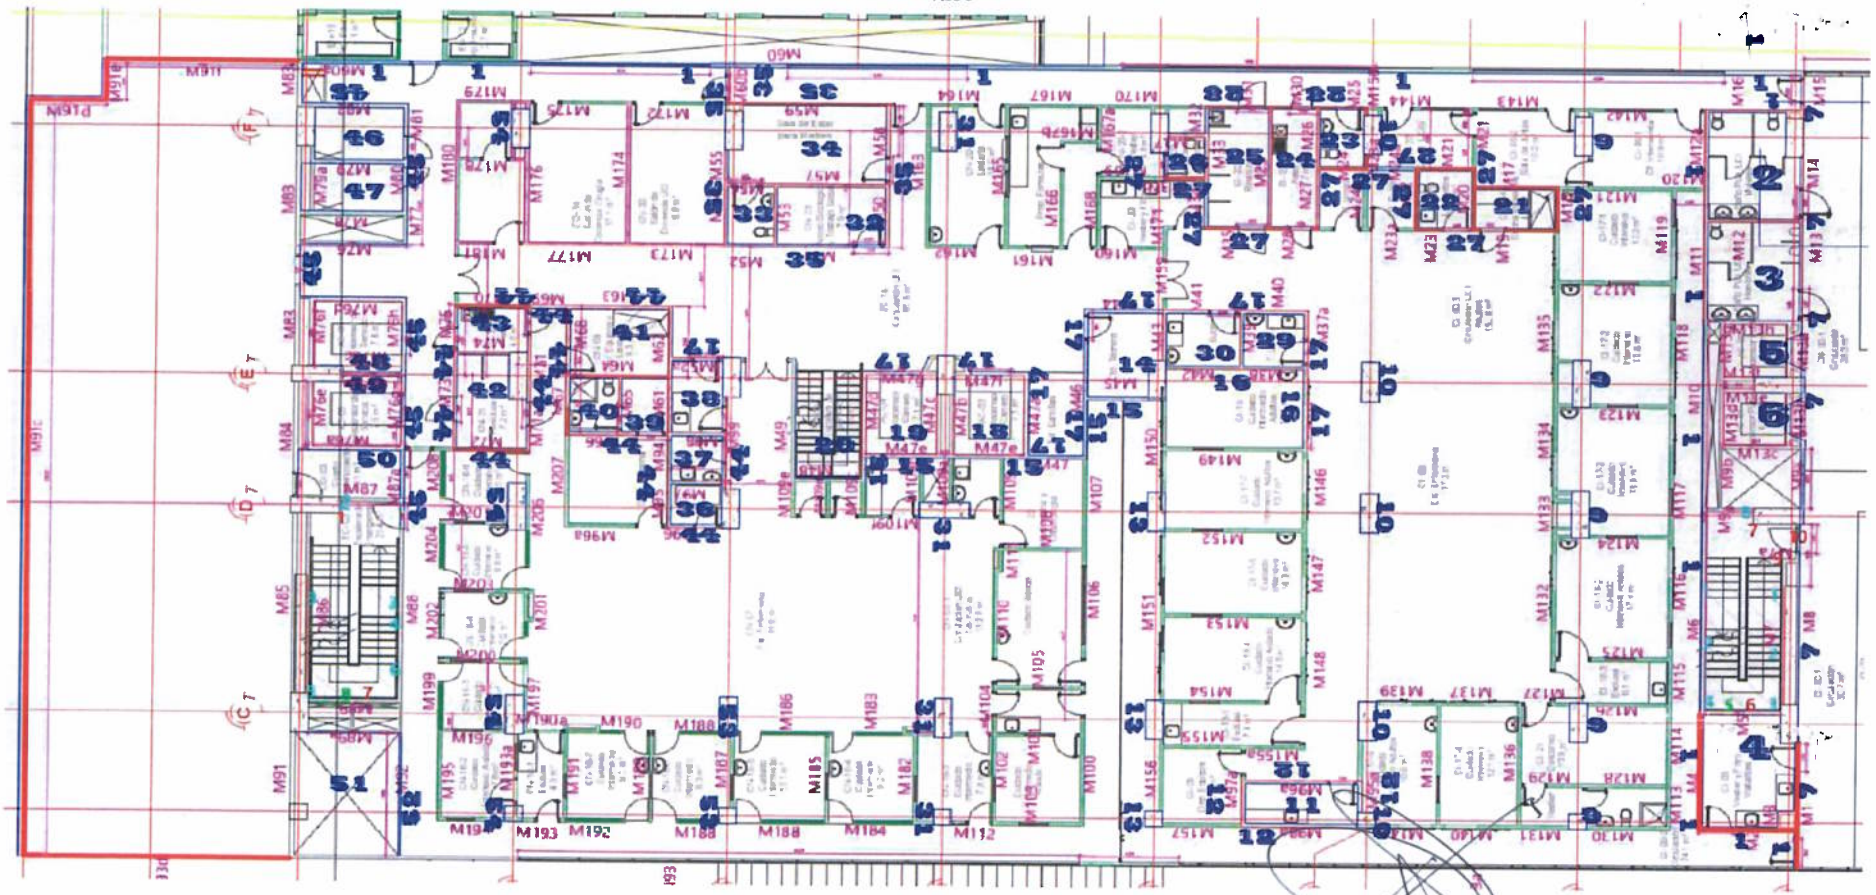

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº: 20	FECHA : JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM Nº: 7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM: Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi		(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	Descripción	DIMENSIONES LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M111	viga intermedia	2,44			2,44	1,00	2,44
	Viga cierre	2,44			2,44	1,00	2,44
M112	viga intermedia	2,18			2,18	1,00	2,18
	Viga cierre	2,18			2,18	1,00	2,18
M109	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M110-M104-M103-M97-M96	viga intermedia	12,28			12,28	1,00	12,28
M61	viga intermedia	0,52			0,52	1,00	0,52
M85a	viga intermedia	3,26			3,26	1,00	3,26
M110-M104-M103-M97-M96-M68-M67-M61-M55-M54-M8	Viga cierre	43,66			43,66	1,00	43,66
M105	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M107-M108	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M102	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M106	viga intermedia	2,66			2,66	1,00	2,66
	Viga cierre	2,66			2,66	1,00	2,66
M100-M101	viga intermedia	4,38			4,38	1,00	4,38
	Viga cierre	4,38			4,38	1,00	4,38
M98	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M95	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M99	viga intermedia	2,66			2,66	1,00	2,66
	Viga cierre	2,66			2,66	1,00	2,66
M69	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
	SUB TOTAL						117,68
	VIENEN						1625,66
	PASAN						1743,34

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

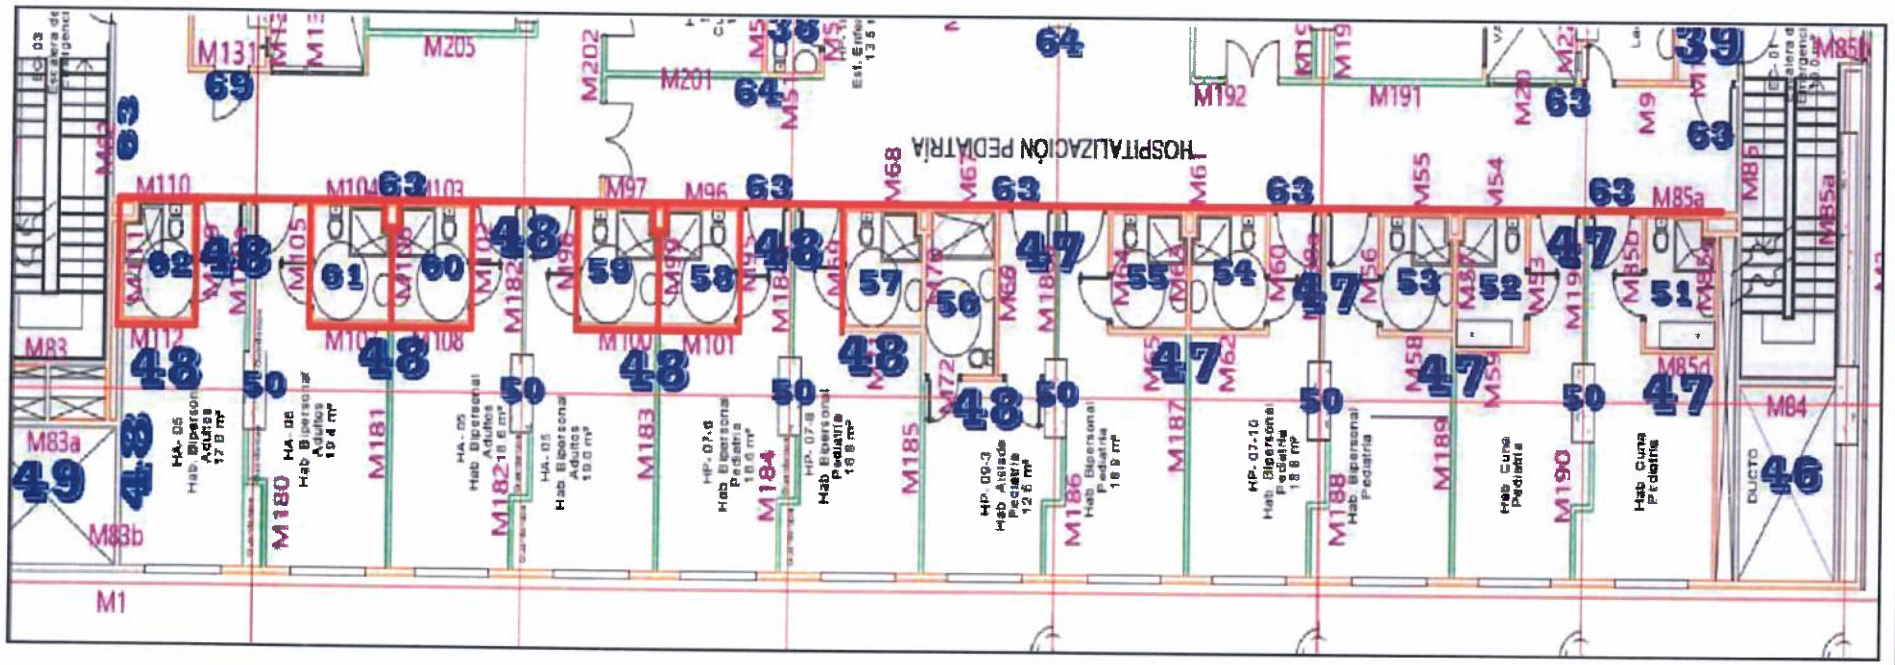

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
PISO 4							
M71	Viga cierre	2,02			2,02	1,00	2,02
M70	Viga cierre	3,69			3,69	1,00	3,69
M72	viga intermedia	1,00			1,00	1,00	1,00
	Viga cierre	3,21			3,21	1,00	3,21
M66	viga intermedia	3,14			3,14	1,00	3,14
	Viga cierre	3,14			3,14	1,00	3,14
M64	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M65-M62	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M63	viga intermedia	2,66			2,66	1,00	2,66
	Viga cierre	2,66			2,66	1,00	2,66
M99	viga intermedia	2,66			2,66	1,00	2,66
	Viga cierre	2,66			2,66	1,00	2,66
M60	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M56	viga intermedia	1,32			1,32	1,00	1,32
	Viga cierre	2,33			2,33	1,00	2,33
M58-M59	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M57	viga intermedia	2,94			2,94	1,00	2,94
	Viga cierre	2,94			2,94	1,00	2,94
M53	Viga cierre	2,50			2,50	1,00	2,50
M85d	Viga cierre	2,53			2,53	1,00	2,53
	Viga cierre	2,53			2,53	1,00	2,53
M85b	viga intermedia	1,50			1,50	1,00	1,50
	Viga cierre	2,50			2,50	1,00	2,50
M85c	viga intermedia	3,29			3,29	1,00	3,29
	Viga cierre	3,29			3,29	1,00	3,29
M143-M114-M124-M125-M150-M153-M158-M161-M166-M167-M173	viga intermedia	43,01			43,01	1,00	43,01
	Descuento puertas	1,20			1,20	-12,00	-14,40
	Viga cierre	43,01			43,01	1,00	43,01
				SUB TOTAL			139,53
				VIENEN			1743,34
				PASAN			1882,87


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

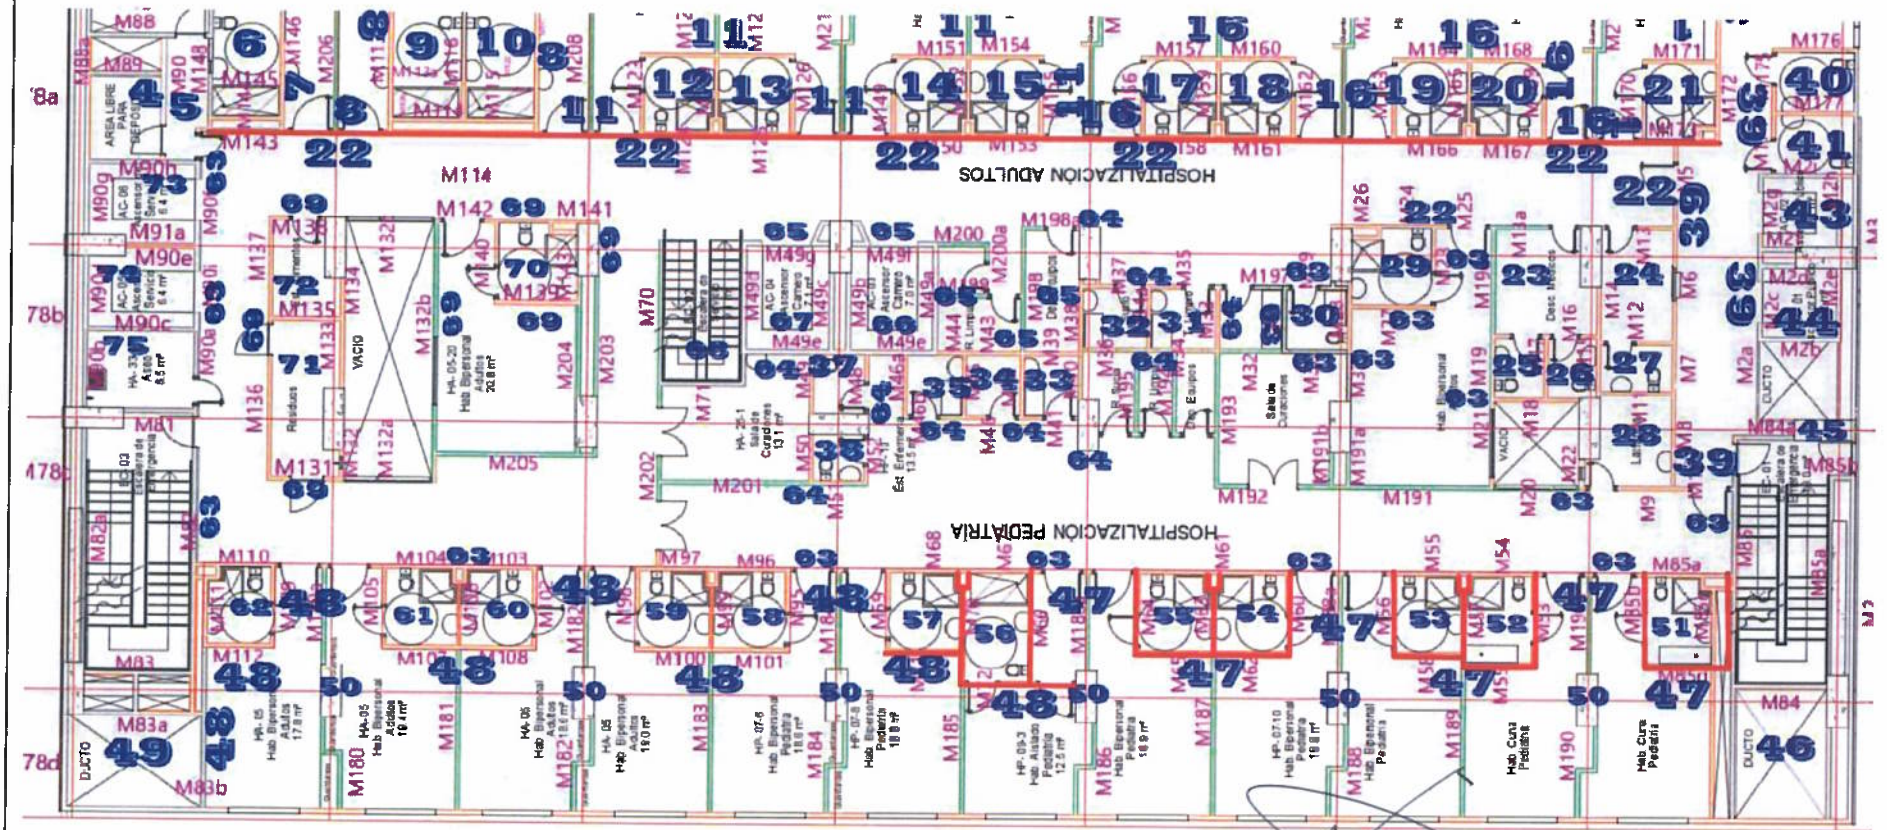

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M148	viga intermedia	3,68			3,68	1,00	3,68
	Viga cierre	3,68			3,68	1,00	3,68
M144	viga intermedia	1,13			1,13	1,00	1,13
	Viga cierre	1,13			1,13	1,00	1,13
M145	viga intermedia	0,60			0,60	1,00	0,60
	Viga cierre	0,60			0,60	1,00	0,60
M146	viga intermedia	2,54			2,54	1,00	2,54
	Viga cierre	2,54			2,54	1,00	2,54
M147	viga intermedia	0,85			0,85	1,00	0,85
	Viga cierre	1,90			1,90	1,00	1,90
M113	viga intermedia	2,54			2,54	1,00	2,54
	Viga cierre	2,54			2,54	1,00	2,54
M113a	viga intermedia	1,13			1,13	1,00	1,13
	Viga cierre	1,13			1,13	1,00	1,13
M113b	viga intermedia	0,60			0,60	1,00	0,60
	Viga cierre	0,60			0,60	1,00	0,60
M116	viga intermedia	3,46			3,46	1,00	3,46
	Viga cierre	3,46			3,46	1,00	3,46
M117	viga intermedia	2,54			2,54	1,00	2,54
	Viga cierre	2,54			2,54	1,00	2,54
M122	viga intermedia	1,13			1,13	1,00	1,13
	Viga cierre	1,13			1,13	1,00	1,13
M119	viga intermedia	0,60			0,60	1,00	0,60
	Viga cierre	0,60			0,60	1,00	0,60
M120-M121	viga intermedia	2,00			2,00	1,00	2,00
	Viga cierre	4,00			4,00	1,00	4,00
M127-M128	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
	SUB TOTAL						57,39
	VIENEN						1882,87
	PASAN						1940,26

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7,8,2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

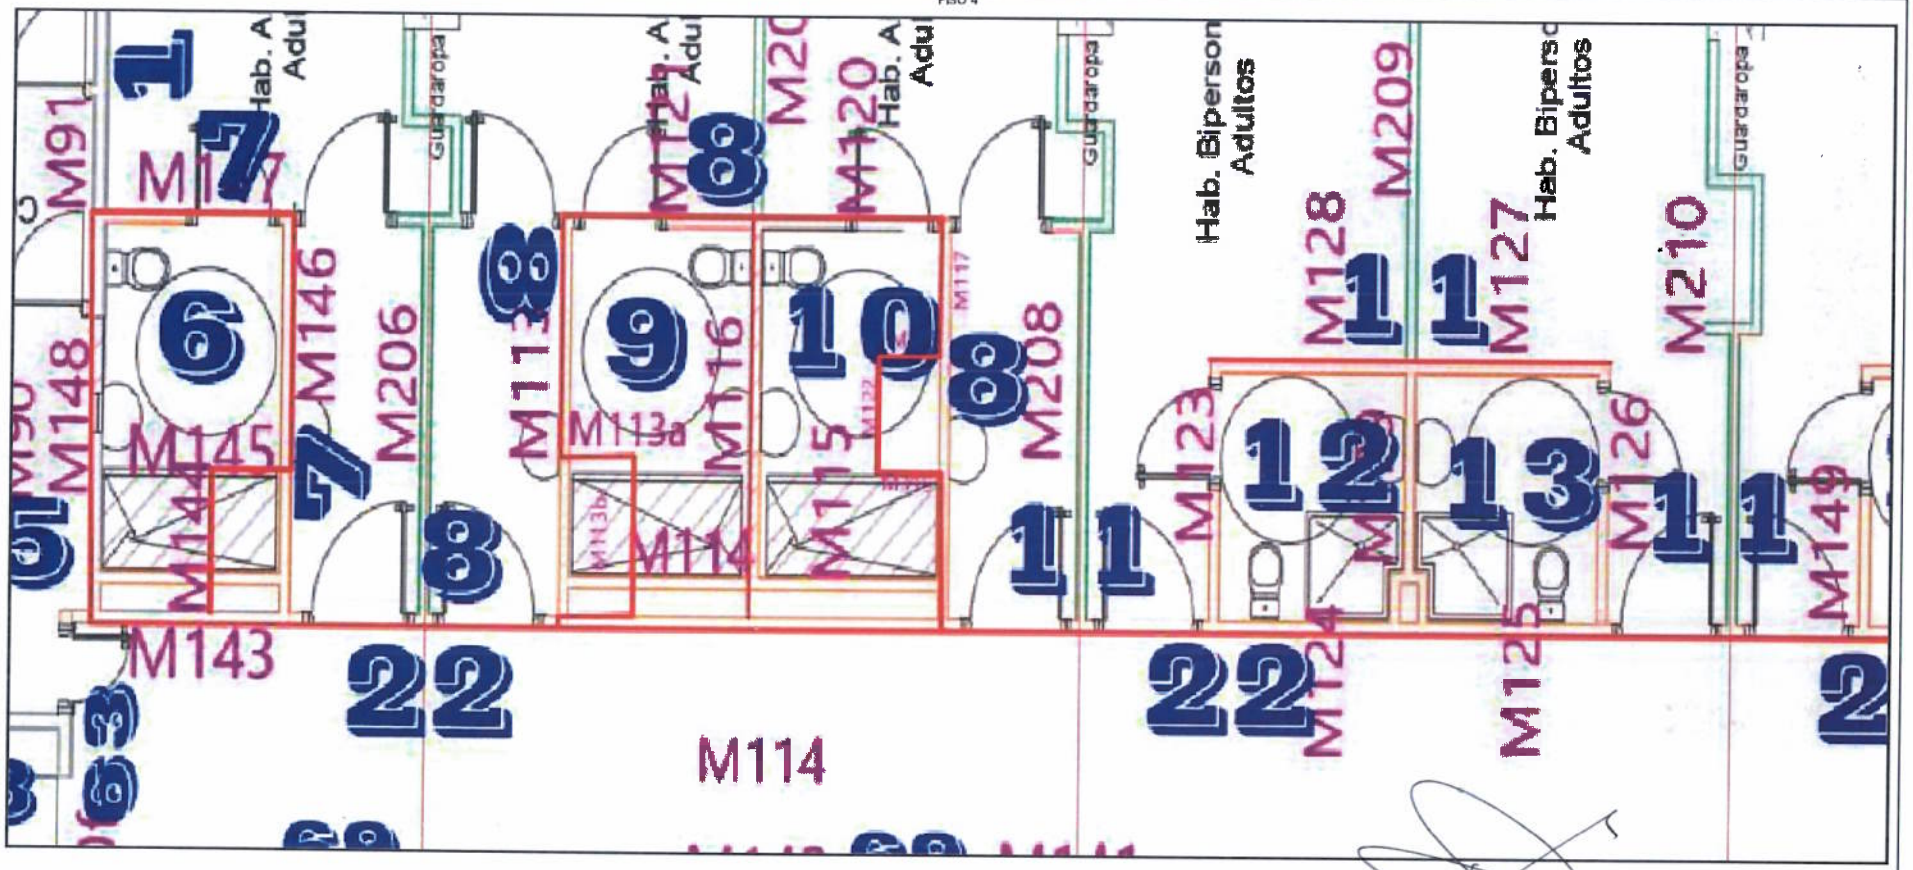

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi		(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M129	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M123	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M126	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M149	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M155	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M152	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M151-M154	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M156	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M162	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M157-M160	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M159	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M164-M168	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M163	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M169	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M165	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
	SUB TOTAL						78,42
	VIENEN						1940,26
	PASAN						2018,68

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

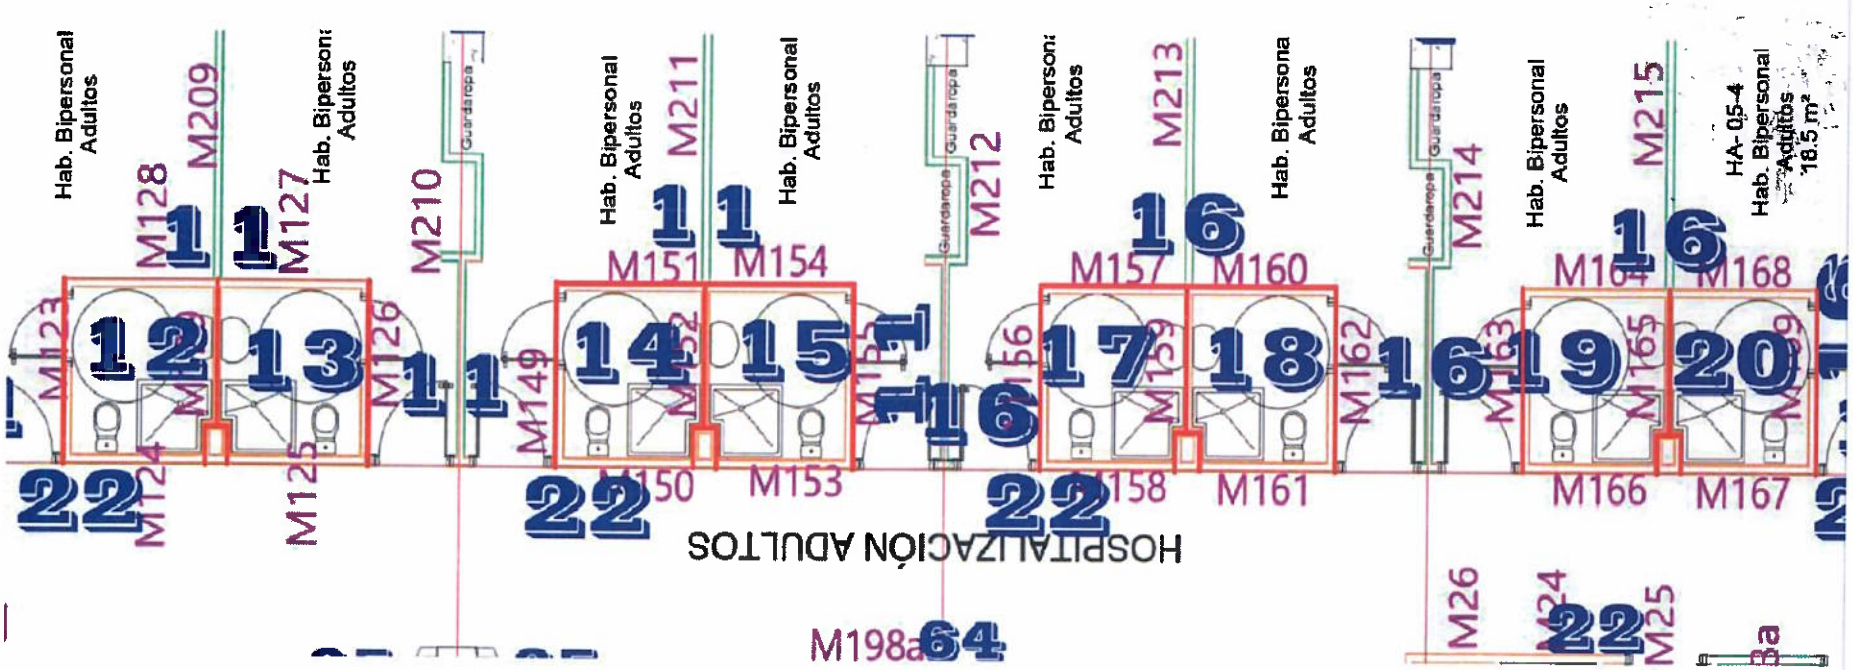


Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

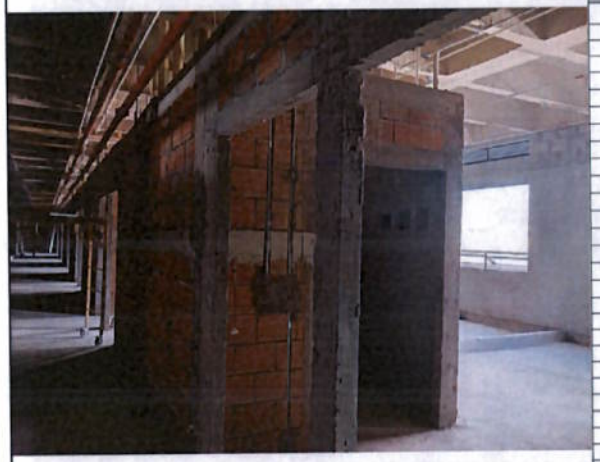

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M164-M168	viga intermedia	4,37			4,37	1,00	4,37
	Viga cierre	4,37			4,37	1,00	4,37
M170	viga intermedia	2,65			2,65	1,00	2,65
	Viga cierre	2,65			2,65	1,00	2,65
M171	viga intermedia	2,03			2,03	1,00	2,03
	Viga cierre	2,03			2,03	1,00	2,03
M172	viga intermedia	6,93			6,93	1,00	6,93
	Viga cierre	6,93			6,93	1,00	6,93
M176	viga intermedia	2,20			2,20	1,00	2,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M177	viga intermedia	2,20			2,20	1,00	2,20
	Viga cierre	2,20			2,20	1,00	2,20
M85a	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
M82a	viga intermedia	4,50			4,50	1,00	4,50
M49d	viga intermedia	4,10			4,10	1,00	4,10
M5	viga intermedia	1,20			1,20	1,00	1,20
M5-M6-M7-M8	Viga cierre	9,97			9,97	1,00	9,97
M13	viga intermedia	1,17			1,17	1,00	1,17
	Viga cierre	2,07			2,07	1,00	2,07
M12	Viga cierre	2,07			2,07	1,00	2,07
M11	Viga cierre	2,07			2,07	1,00	2,07
M14-M15	Viga cierre	3,20			3,20	1,00	3,20
M17	viga intermedia	1,73			1,73	1,00	1,73
	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
M16	viga intermedia	1,17			1,17	1,00	1,17
	Viga cierre	2,95			2,95	1,00	2,95
M18	Viga cierre	2,47			2,47	1,00	2,47
	SUB TOTAL						85,66
	VIENEN						2018,68
	PASAN						2104,34


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

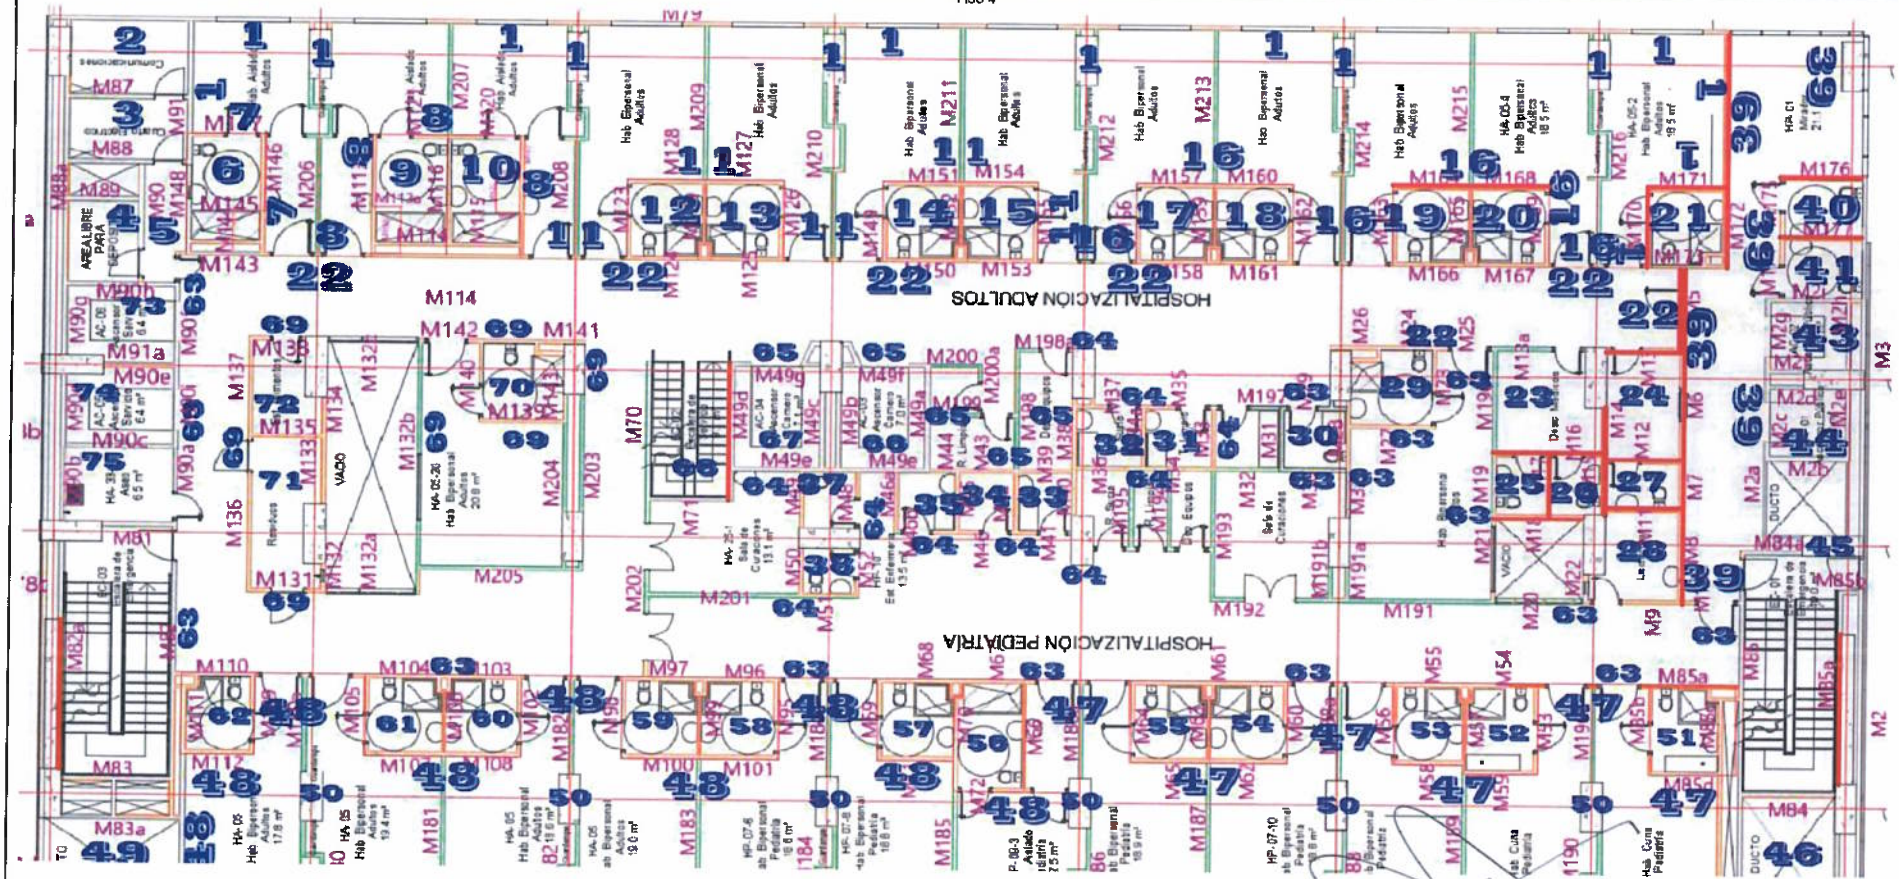

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No. 09		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M46a	Viga cierre	1,75			1,75	1,00	1,75
	viga intermedia	1,75			1,75	1,00	1,75
M48	viga intermedia	0,70			0,70	1,00	0,70
	Viga cierre	1,70			1,70	1,00	1,70
M49	viga intermedia	1,70			1,70	1,00	1,70
	Viga cierre	1,70			1,70	1,00	1,70
M50	viga intermedia	1,48			1,48	1,00	1,48
	Viga cierre	1,48			1,48	1,00	1,48
M51	viga intermedia	1,54			1,54	1,00	1,54
	Viga cierre	1,54			1,54	1,00	1,54
M52	viga intermedia	0,52			0,52	1,00	0,52
	Viga cierre	1,37			1,37	1,00	1,37
M141-M142	viga intermedia	2,75			2,75	1,00	2,75
	Viga cierre	3,95			3,95	1,00	3,95
M140	viga intermedia	1,14			1,14	1,00	1,14
	Viga cierre	2,24			2,24	1,00	2,24
M139	viga intermedia	2,23			2,23	1,00	2,23
	Viga cierre	2,23			2,23	1,00	2,23
M143	viga intermedia	0,85			0,85	1,00	0,85
	Viga cierre	0,85			0,85	1,00	0,85
M136-M137	viga intermedia	6,68			6,68	1,00	6,68
	Viga cierre	7,68			7,68	1,00	7,68
M138	viga intermedia	0,44			0,44	1,00	0,44
	Viga cierre	1,44			1,44	1,00	1,44
M135	viga intermedia	1,90			1,90	1,00	1,90
	Viga cierre	1,90			1,90	1,00	1,90
M131	viga intermedia	0,92			0,92	1,00	0,92
	Viga cierre	1,92			1,92	1,00	1,92
	SUB TOTAL						56,35
	VIENEN						2104,34
	PASAN						2160,69


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

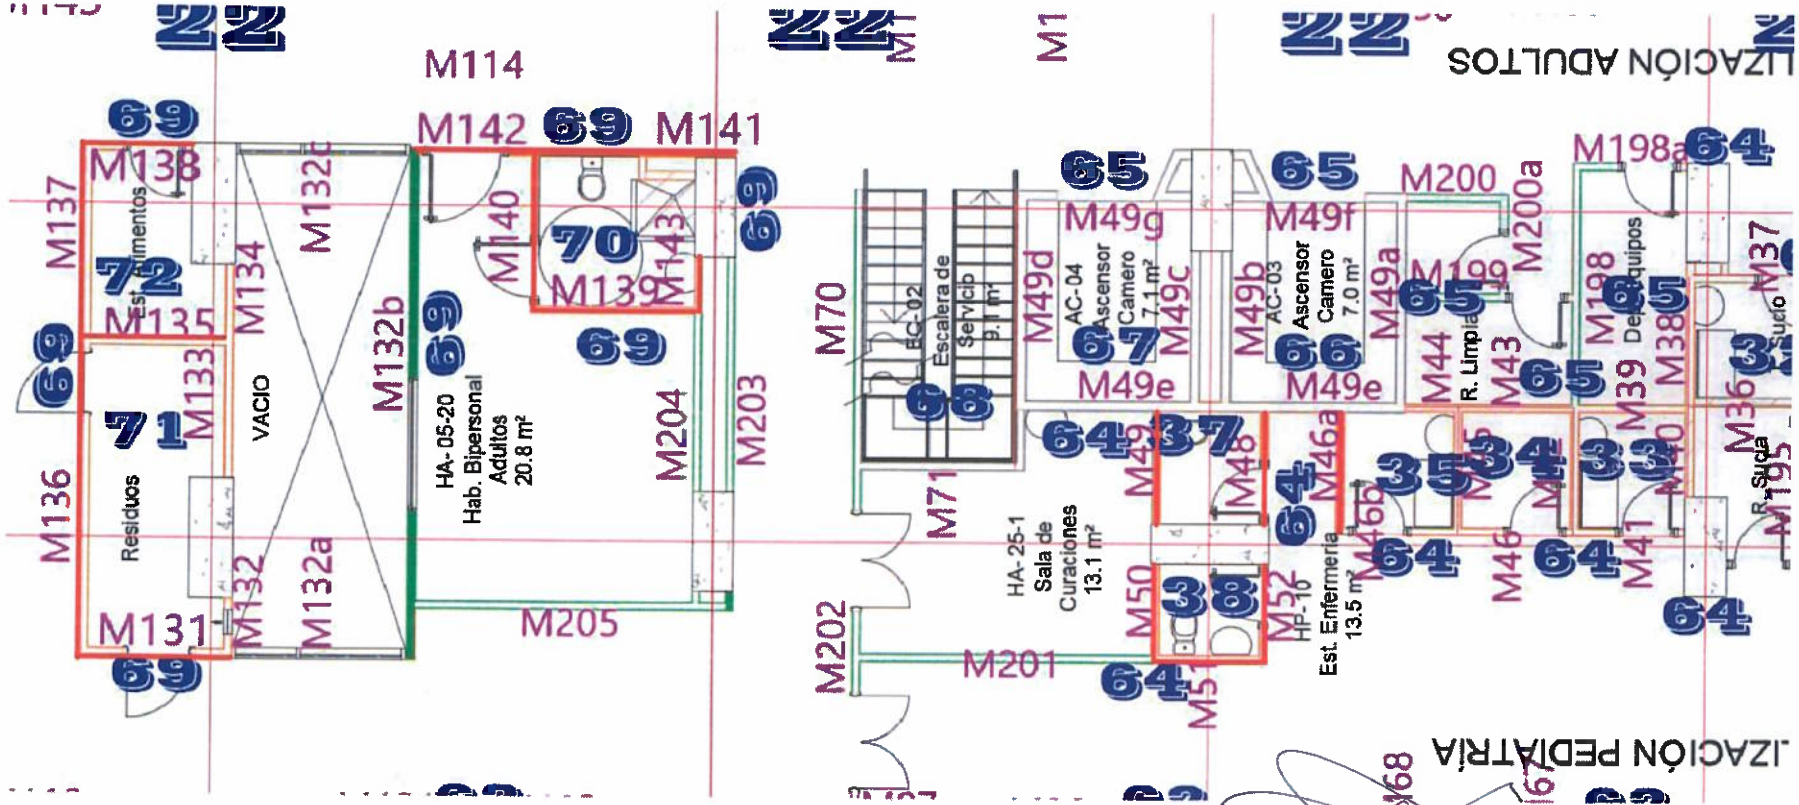

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-36			
Versión No. 00		Página 1 de 4	
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	CANTIDAD POR TIPO DE VIGA	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M132	viga intermedia	0,40			0,40	1,00	0,40
	Viga cierre	0,77			0,77	1,00	0,77
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor de servicio - AC -05	viga intermedia	8,84		1,50	8,84	2,00	26,52
Ascensor camero -AC-04	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor camero -AC-03	Viga intermedia	7,20		1,50	7,20	3,00	32,40
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6,07		1,50	6,07	2,00	18,21
M3a	Viga intermedia	30,43			30,43	1,00	30,43

NOTA ACLARATORIA: CONTRATISTA E INTERVENTORIA ACUERDAN QUE EL COBRO DE LA VIDA INTERMEDIA DE LOS ASCENSORES SEA DE 1,5 RESPECTO DE VIGA INTERMEDIA ITEM 7,8,2 , Ya que este elemento tiene una seccion de 0,15m x 0,30m

SUB TOTAL	185,86
VIENEN	2160,69
PASAN	2346,55


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

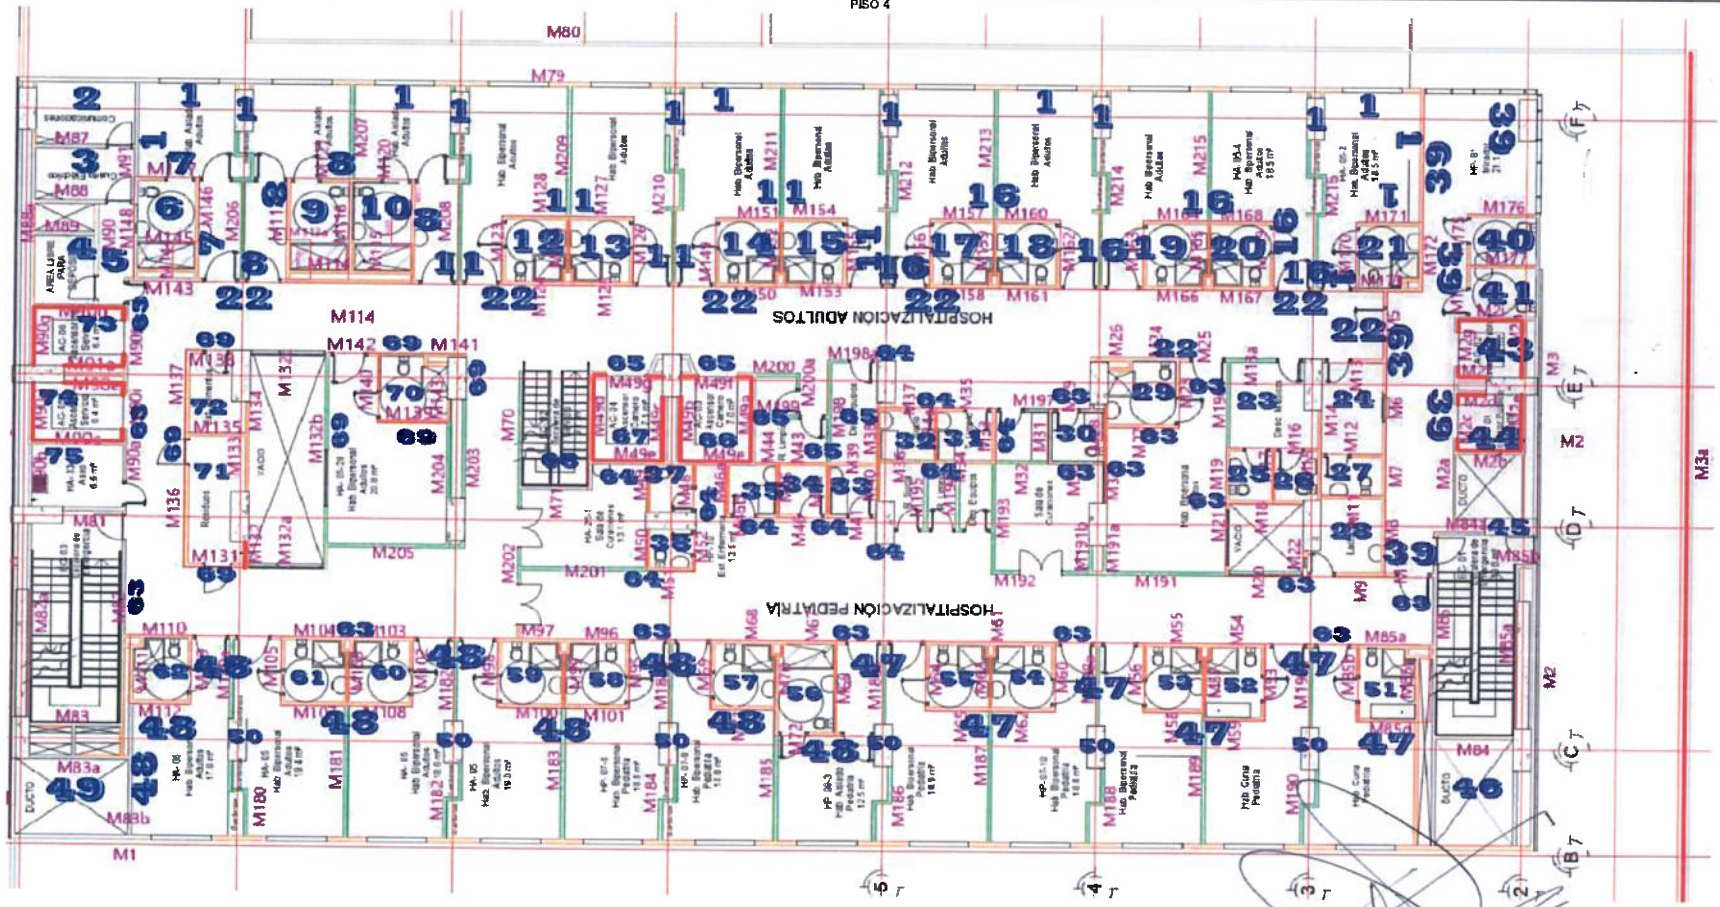

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			
Versión No. 09		Página 1 de 4	
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°: 20	FECHA: JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°: 7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM: Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi		(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M21	viga intermedia	0,70			0,70	1,00	0,70
M19-M21	Viga cierre	4,55			4,55	1,00	4,55
M10	viga intermedia	0,44			0,44	1,00	0,44
M20-M9-M10	Viga cierre	4,77			4,77	1,00	4,77
M22	viga intermedia	0,76			0,76	1,00	0,76
	Viga cierre	0,76			0,76	1,00	0,76
M13-M25-M24-M26	Viga cierre	9,82			9,82	1,00	9,82
M23	Viga cierre	2,25			2,25	1,00	2,25
M27	Viga cierre	2,35			2,35	1,00	2,35
M28	viga intermedia	1,00			1,00	1,00	1,00
M32-M28	Viga cierre	3,50			3,50	1,00	3,50
M29	viga intermedia	1,05			1,05	1,00	1,05
	Viga cierre	1,85			1,85	1,00	1,85
M31	viga intermedia	1,73			1,73	1,00	1,73
M30	Viga cierre	1,87			1,87	1,00	1,87
M35-M37	viga intermedia	2,11			2,11	1,00	2,11
	Viga cierre	3,87			3,87	1,00	3,87
M33	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
M34-M36	Viga cierre	3,88			3,88	1,00	3,88
M38-M40	Viga cierre	3,50			3,50	1,00	3,50
M34a	Viga cierre	1,73			1,73	1,00	1,73
M44-M43	viga intermedia	2,41			2,41	1,00	2,41
	Viga cierre	2,41			2,41	1,00	2,41
M41-M46-M46b	viga intermedia	2,04			2,04	1,00	2,04
	Viga cierre	5,04			5,04	1,00	5,04
M42	Viga cierre	1,75			1,75	1,00	1,75
	viga intermedia	1,75			1,75	1,00	1,75
M45	Viga cierre	1,75			1,75	1,00	1,75
	viga intermedia	1,75			1,75	1,00	1,75
	SUB TOTAL						73,12
	VIENEN						2346,55
	PASAN						2419,67

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 4		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

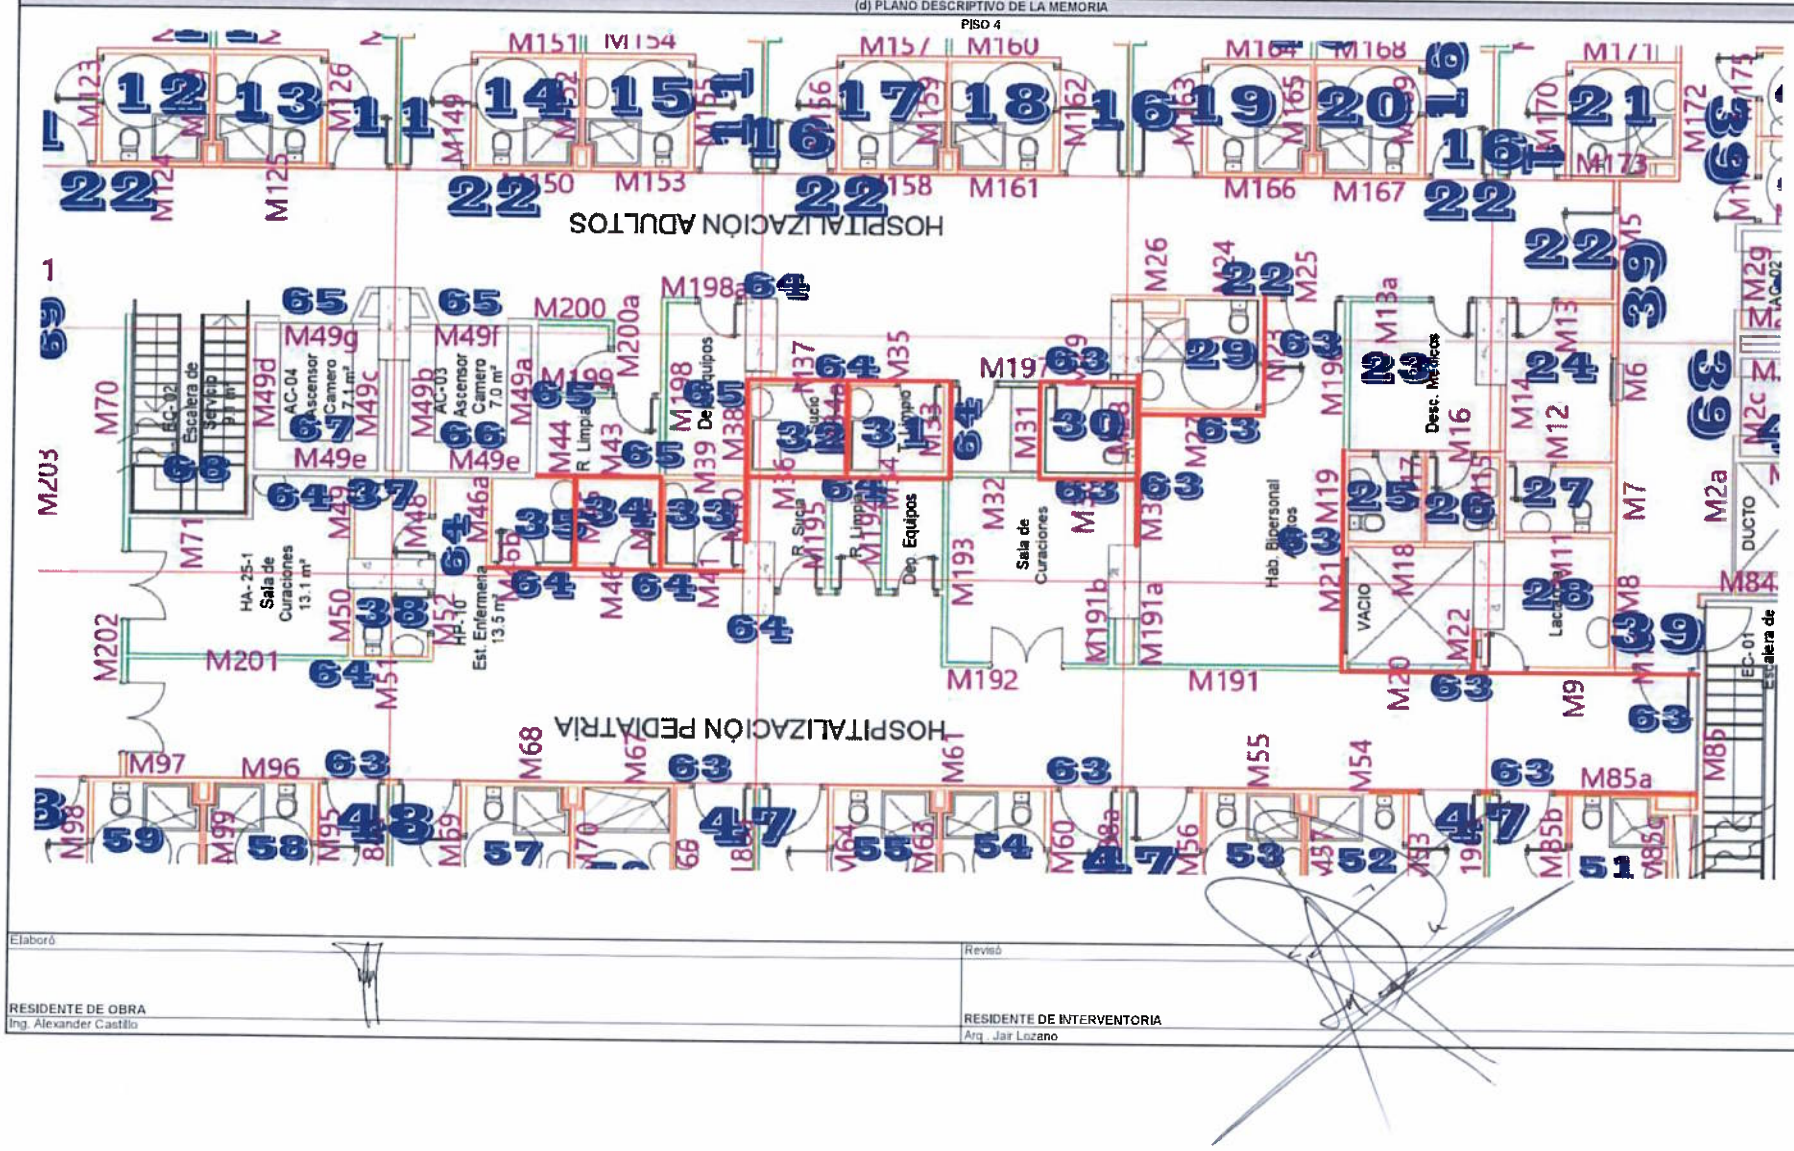


Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 4	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

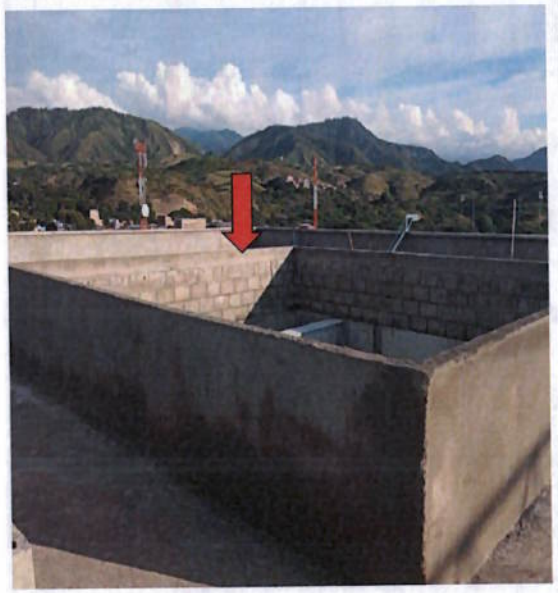

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Descripción	LARGO	ALTO	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
CUBIERTA							
M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8	Viga intermedia	169,20			169,20	1,00	169,20
M9	Viga intermedia	2,85			2,85	1,00	2,85
M10	Viga intermedia	7,46			7,46	1,00	7,46
M11	Viga intermedia	2,85			2,85	1,00	2,85
M12	Viga intermedia	7,46			7,46	1,00	7,46
M13	Viga intermedia	7,00			7,00	1,00	7,00
M14	Viga intermedia	7,46			7,46	1,00	7,46
M15	Viga intermedia	7,00			7,00	1,00	7,00
M16	Viga intermedia	7,46			7,46	1,00	7,46
				SUB TOTAL			218,74
				VIENEN			2419,67
				TOTAL			2638,41

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 4
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CUBIERTA

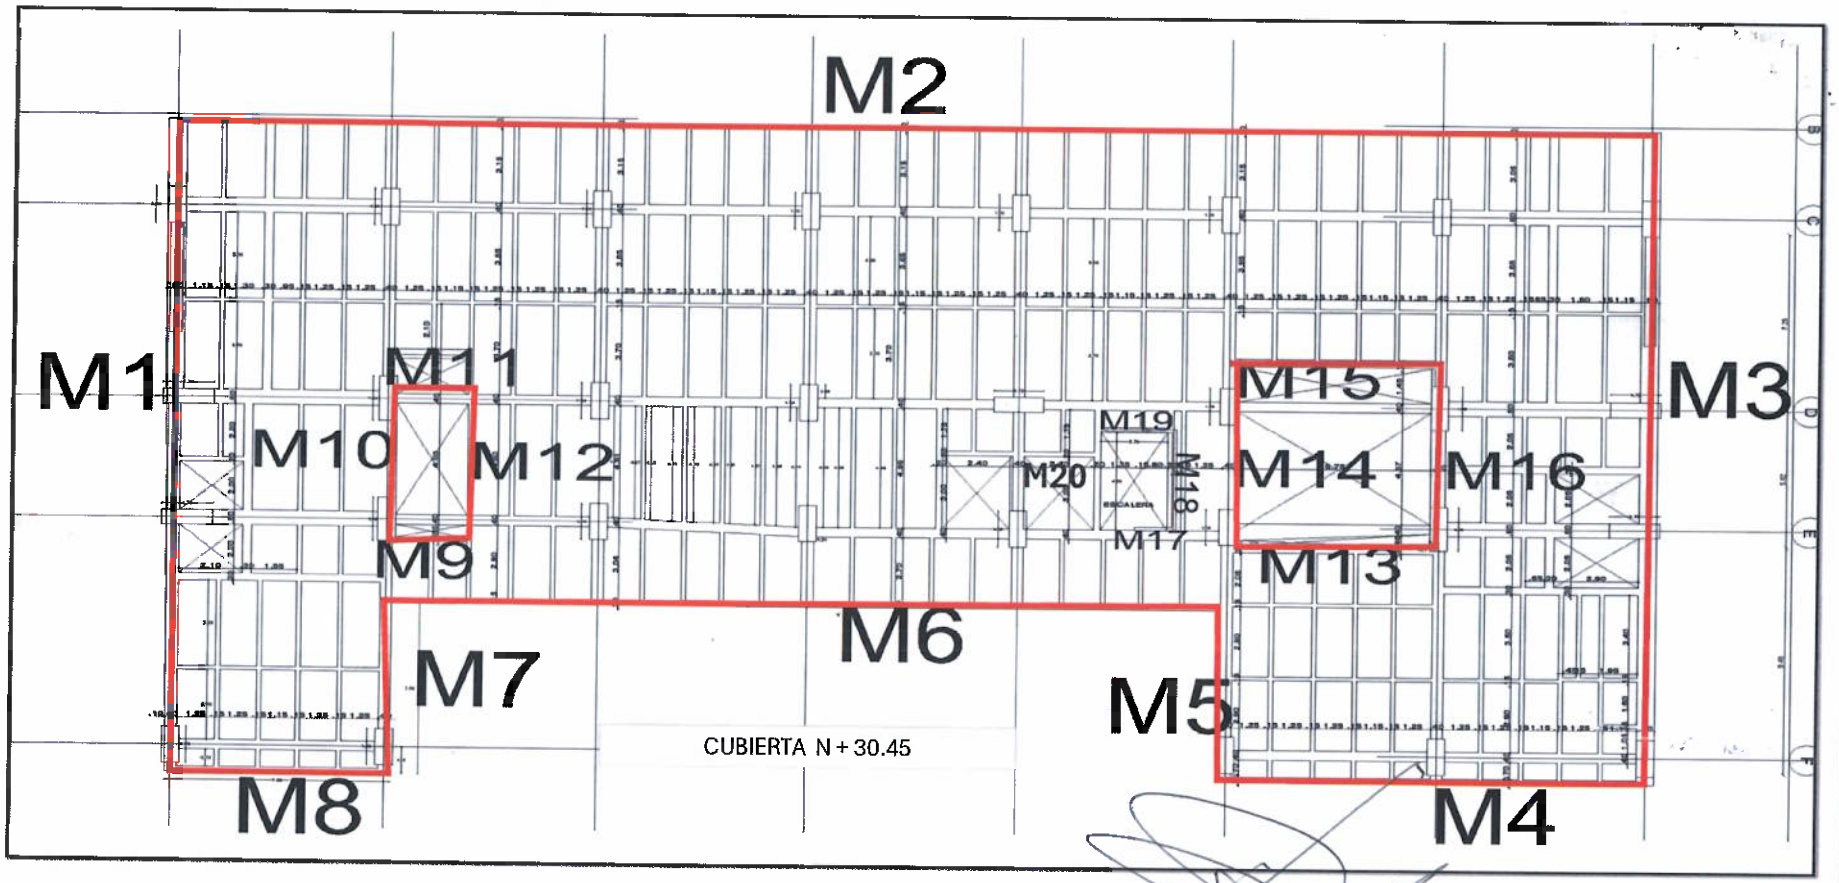


Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	8.1.1	DESCRIPCION ITEM:	Alistado, pendientado cubierta			UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3

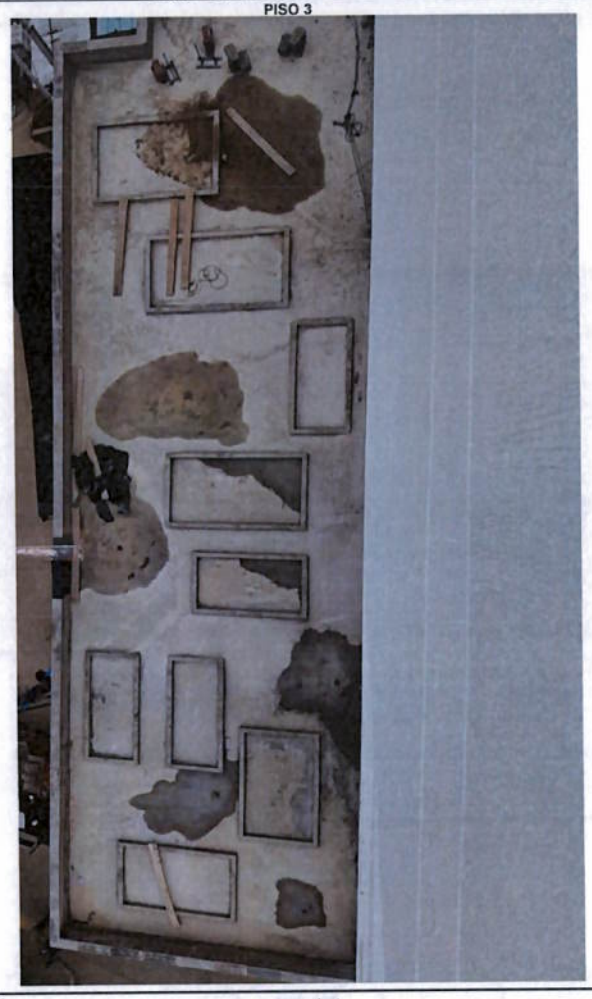

	LOCALIZACION	DIMENSIÓN AREA	DESCUENTO [Puerta - Ventana] LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
	PISO 3						
	CUBIERTA PISO 3	259,92				1,00	259,92
1	Descuento Bordillo	-1,76				1,00	-1,76
2	Descuento Bordillo	-1,77				1,00	-1,77
3	Descuento Bordillo	-1,59				1,00	-1,59
4	Descuento Bordillo	-1,59				1,00	-1,59
5	Descuento Bordillo	-1,62				1,00	-1,62
6	Descuento Bordillo	-1,99				1,00	-1,99
7	Descuento Bordillo	-1,56				1,00	-1,56
8	Descuento Bordillo	-1,99				1,00	-1,99
9	Descuento Bordillo	-1,90				1,00	-1,90
	PASAN						244,14

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	8.1.1	DESCRIPCION ITEM:	Alistado, pendientado cubierta			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

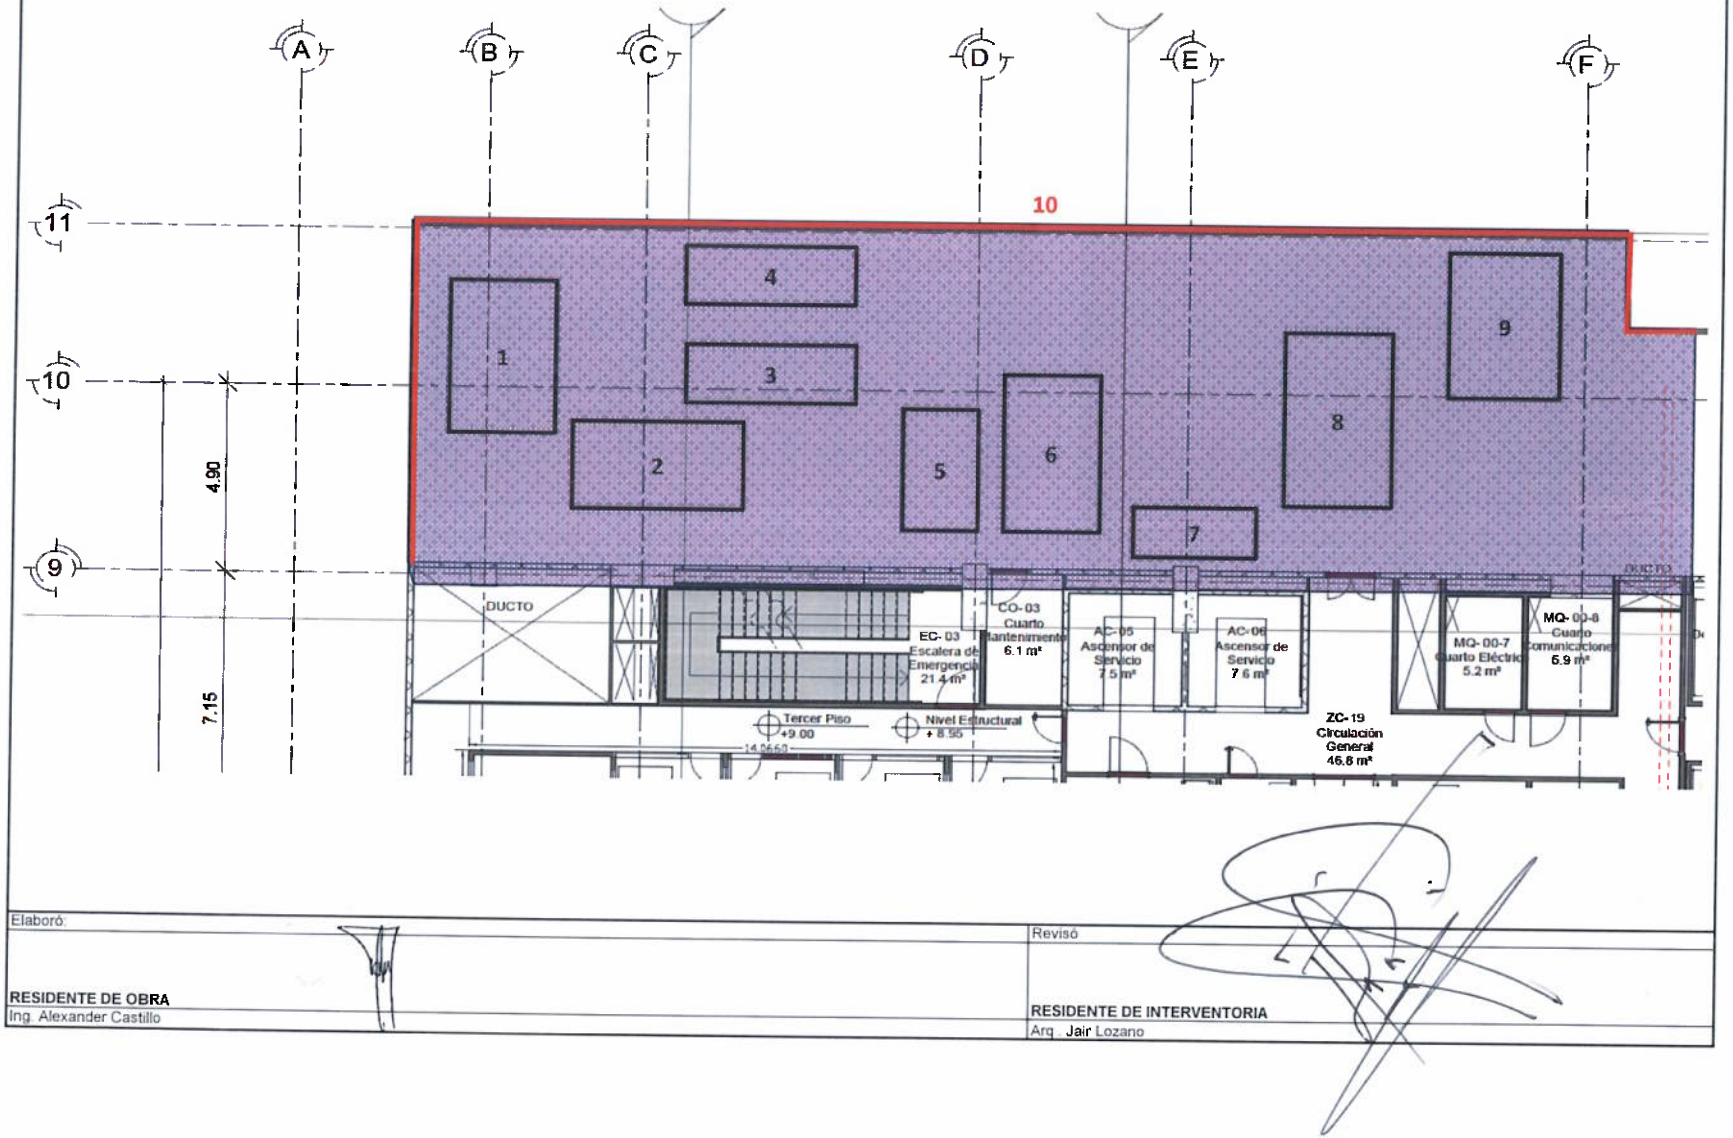

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	8.1.1	DESCRIPCION ITEM:	Alistado, pendientado cubierta			UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CUBIERTA




	LOCALIZACION	DIMENSIÓN	DESCUENTO (Puerta - Ventana)			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		AREA	LARGO	ANCHO	AREA		
	CUBIERTA						
	CUBIERTA	1062,97				1,00	1062,97
1	Descuento Bordillo	-1,56				1,00	-1,56
2	Descuento zona 2	-18,02				1,00	-18,02
3	Descuento Ascensor	-16,00				1,00	-16,00
4	Descuento Ascensor	-18,15				1,00	-18,15
5	Descuento Ascensor	-11,76				1,00	-11,76
	SUBTOTAL PAGINA						997,48
	VIENE						244,14
	TOTAL						1241,62

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	8.1.1	DESCRIPCION ITEM:	Afistado, pendientado cubierta			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

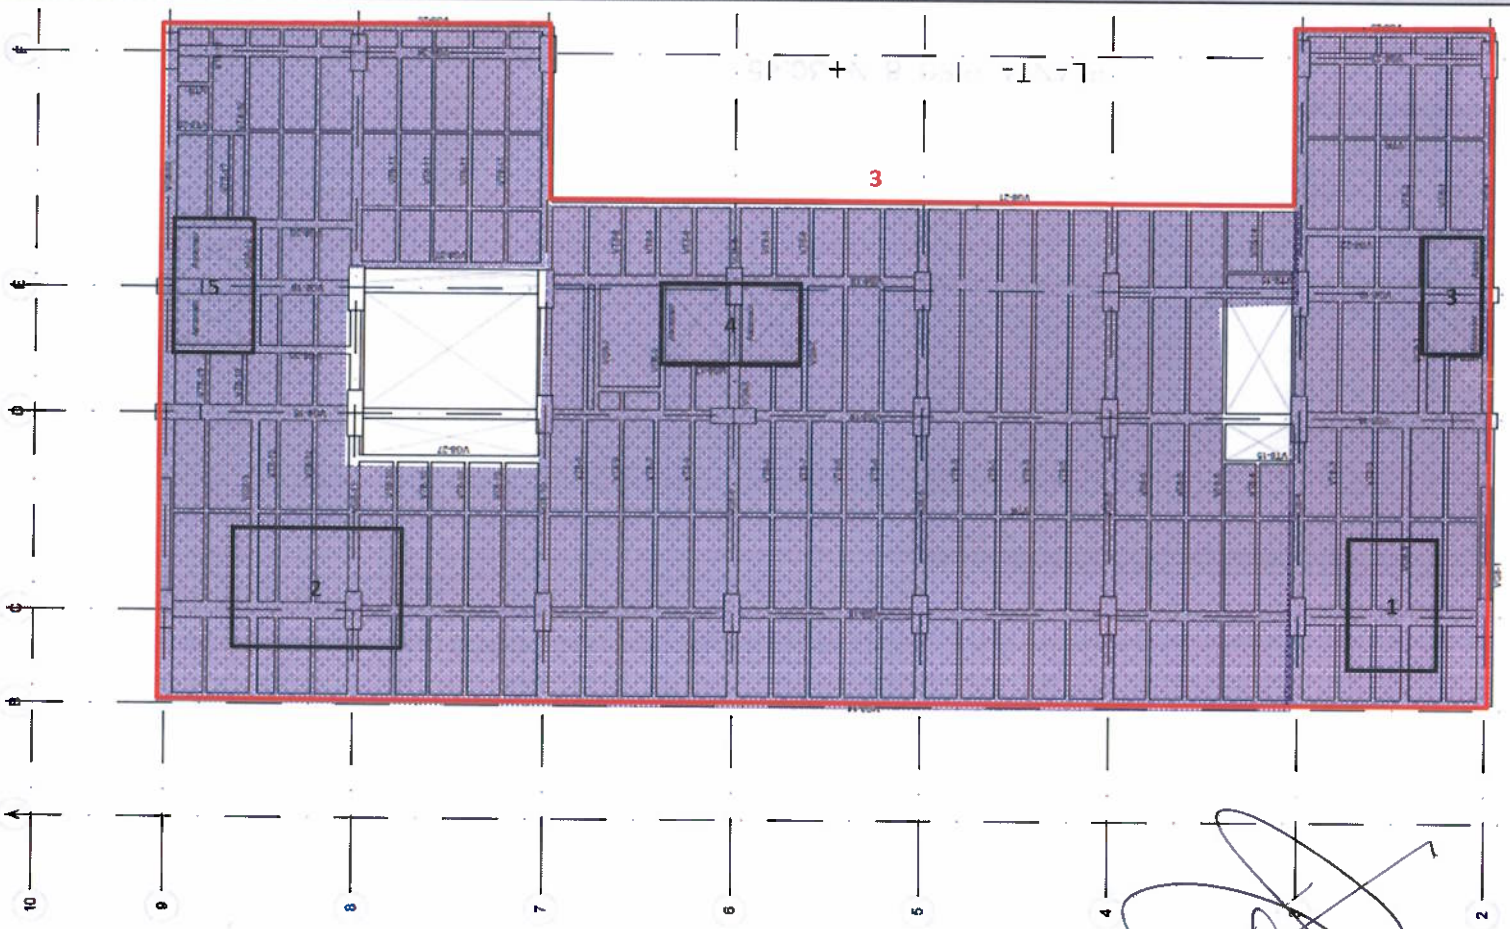

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	8.1.2	DESCRIPCION ITEM:	Media caña en mortero			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CUBIERTA




	LOCALIZACION	DIMENSIÓN		DESCUENTO (Puerta - Ventana)			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LONGITUD	AREA	LARGO	ANCHO	AREA		
	CUBIERTA							
1	CUBIERTA (BORDE)	168,30					1,00	168,30
2	VACIO 1	21,09					1,00	21,09
3	VACIO 2	29,48					1,00	29,48
4	ASCENSOR	11,40					1,00	11,40
5	ASCENSOR	17,60					1,00	17,60
6	ASCENSOR	9,70					1,00	9,70
	TOTAL							257,57

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	8.1.2	DESCRIPCION ITEM:	Media caña en mortero			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

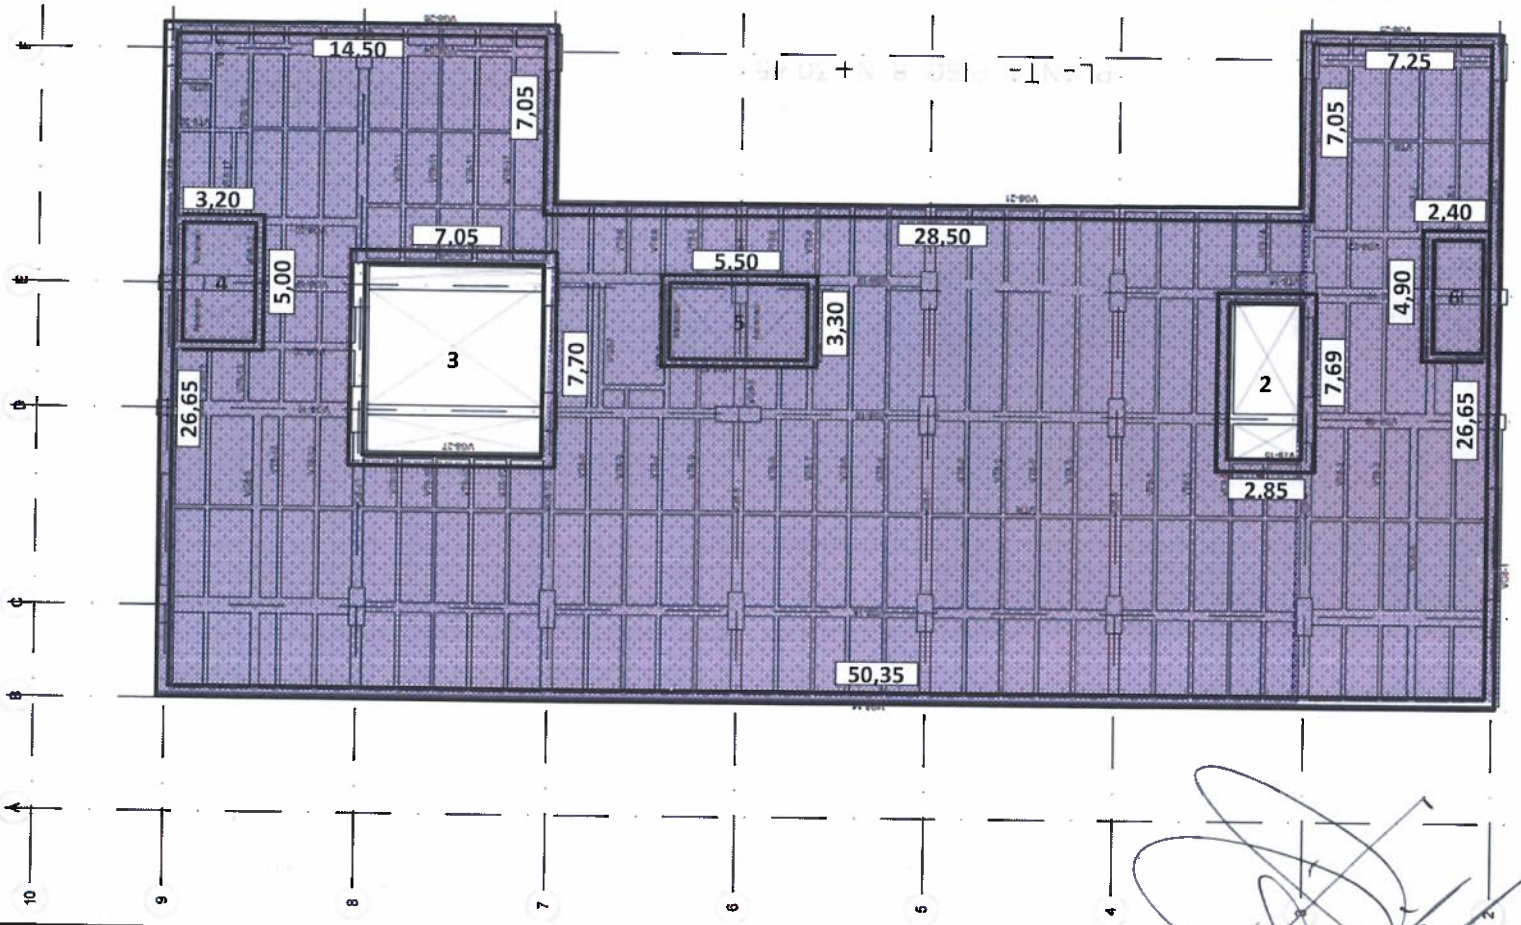

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	ME. IA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	8.3.2	DESCRIPCION ITEM:	Marquesina En Estructura Metálica Con Cubierta De Vidrio A Dos Hojas De 7,70 X 6,70 m			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 7





	LOCALIZACION	DIMENSIÓN		DESCUENTO (Puerta - Ventana)			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LONGITUD	ALTO	LARGO	ANCHO	AREA		
	PISO 7 CUBIERTA							
1	Cubierta						1,65	1,65
	TOTAL							1,65

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	8.3.2	DESCRIPCION ITEM:	Marquesina En Estructura Metálica Con Cubierta De Vidrio A Dos Hojas De 7,70 X 6,70 m			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

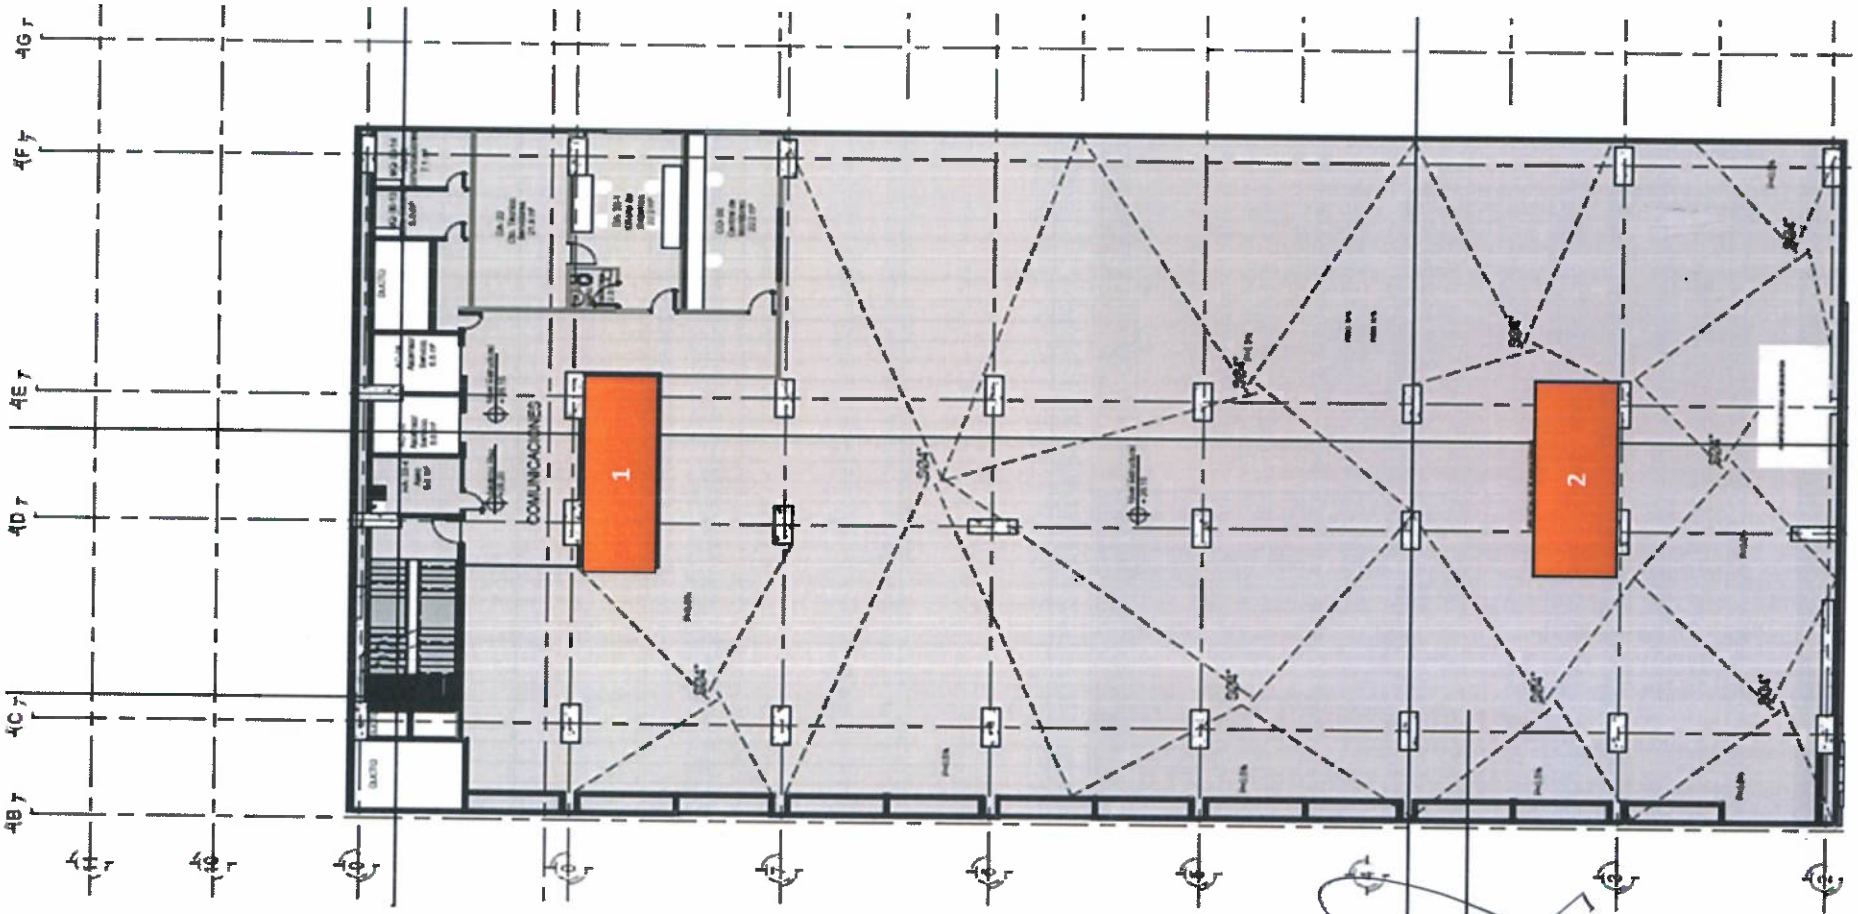

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	NP 11.5.5	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de acabado en baldosa vibroprensada grano de marmol , incluye mortero de pega, destronque , pulido, emboquillado, dilataciones, acidos y ceras.			UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO





	LOCALIZACION	DIMENSIÓN AREA	DESCUENTO (Puerta - Ventana) LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
	SOTANO						
1	Circulación Imag.	91,74				1,00	91,74
2	Sala de espera	115,16				1,00	115,16
3	Circulación general	95,99				1,00	95,99
	SUBTOTAL PAGINA						302,89
	PORCENTAJE EJECUCIÓN (%)						60%
	TOTAL						181,73

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 8		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	NP 11.5.6	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de acabado en baldosa vibroprensada grano de marmol , incluye mortero de pega, destronque , pulido, emboquillado, dilataciones, acidos y ceras.			UND:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

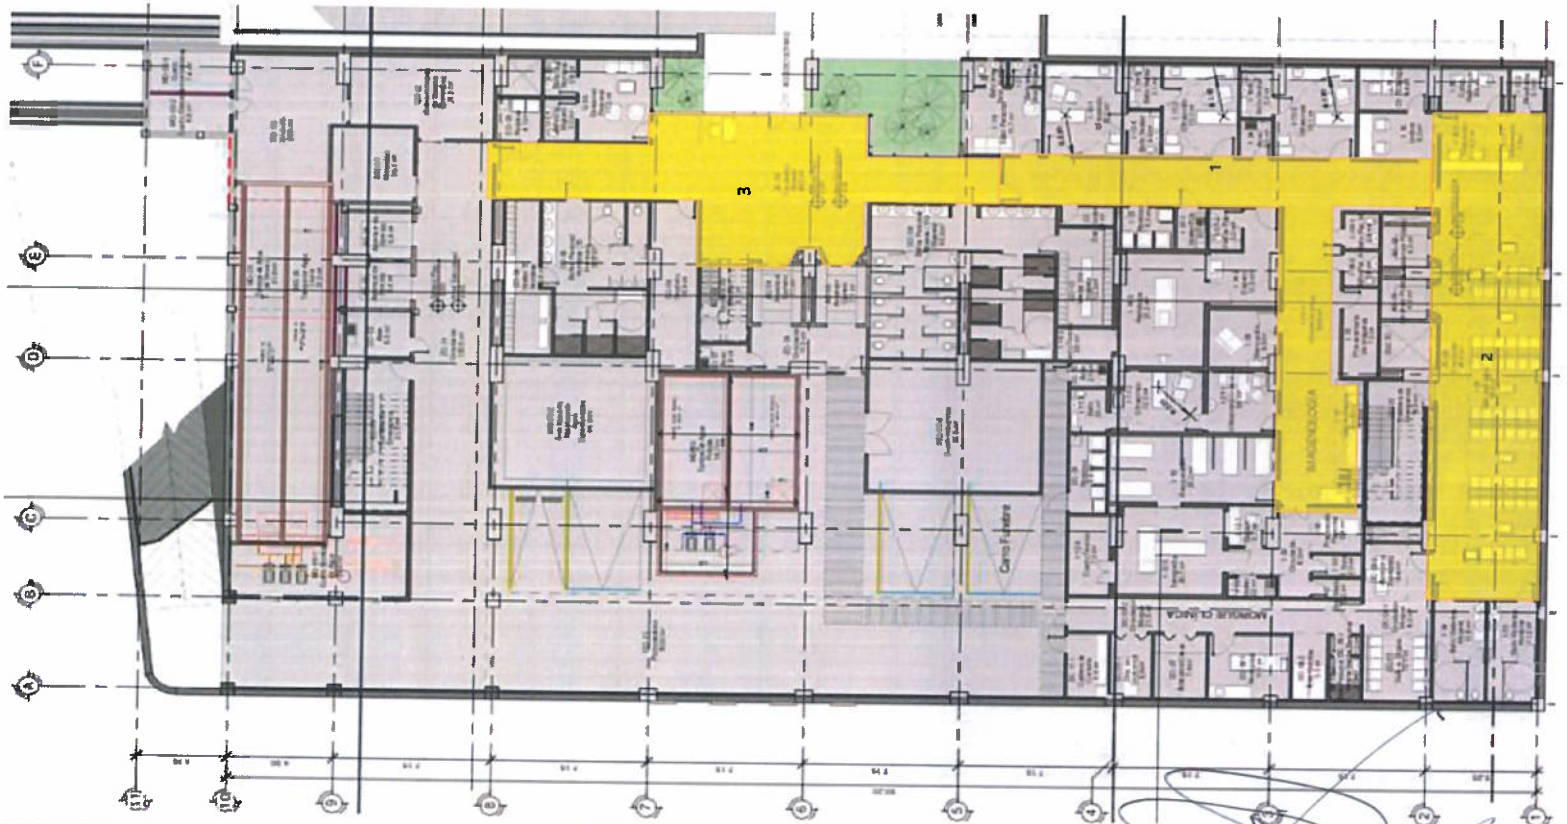

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.2.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC Presión Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
LOTE B						
ACOMETIDA RED CONTRA INCENDIO		25,20				25,20
TOTAL						25,20

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.2.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC Presión Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

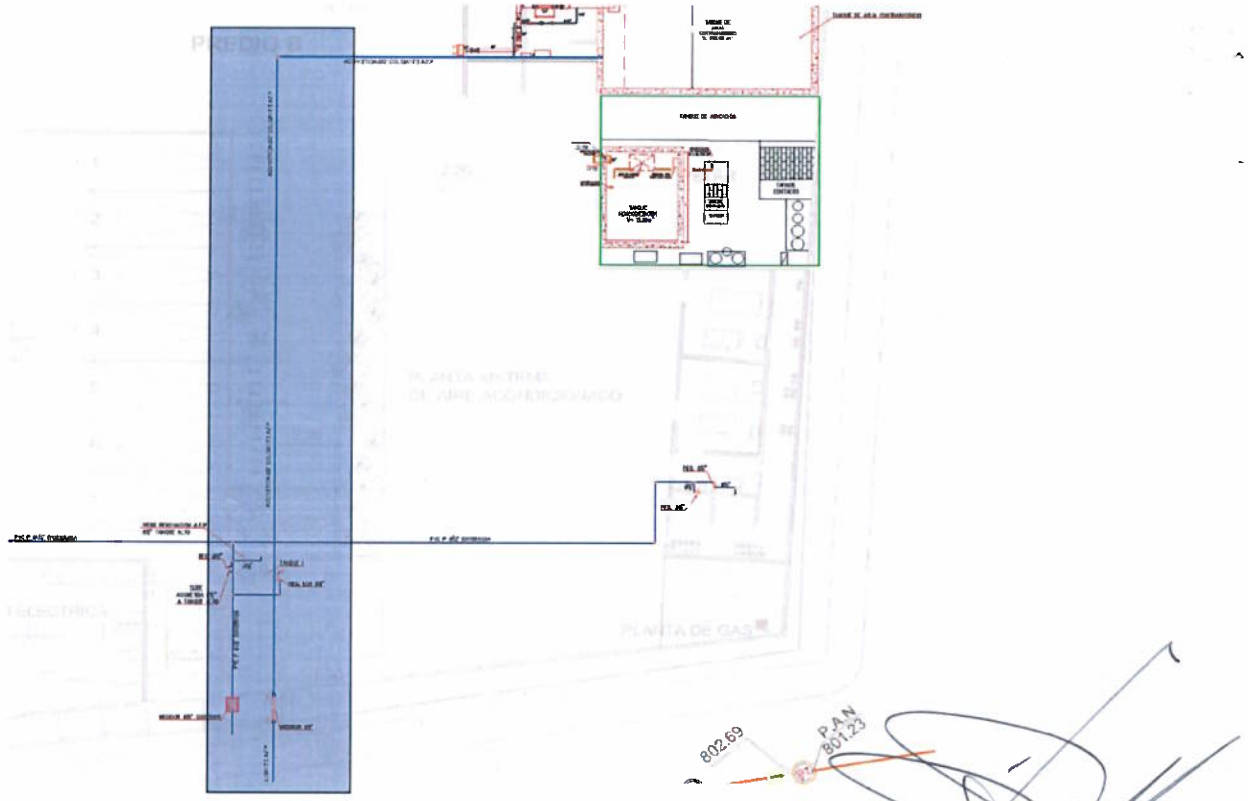

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 DE 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**		**CORTE N°:**	**20**	**FECHA :**	**JUNIO DE 2026**	
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
ITEM N°:	**26.2.15**	**DESCRIPCION ITEM**	Cama arena base soporte tubería			**UND:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
LOTE B						
ACOMETIDA RED CONTRA INCENDIO		25,20				25,20
TOTAL						25,20

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.2.15	DESCRIPCION ITEM	Cama arena base soporte tubería			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

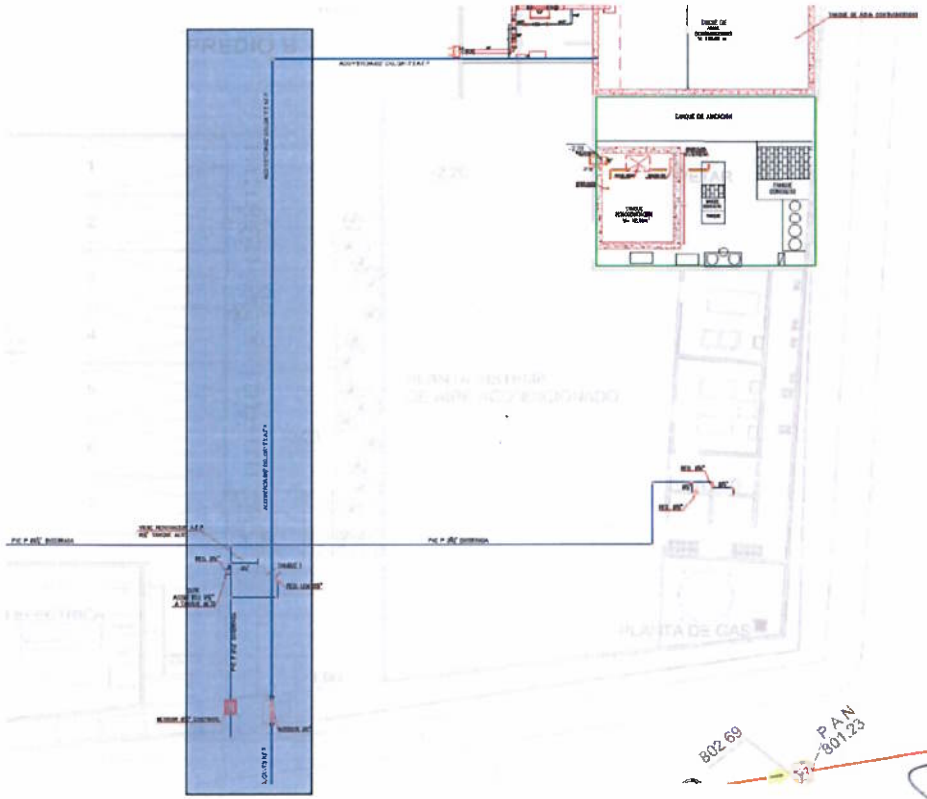

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC Presión Ø4"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
TUBERIA VERTICAL						
SALE BAJO PLACA DEL PRIMER PISO HASTA EL CUARTO PISO ENTRE LOS EJE 8-9 EJE B-C		17,20				17,20
TOTAL						17,20


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC Presión Ø4"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DUCTO ENTRE EL EJE 8-9 Y EJE B-C

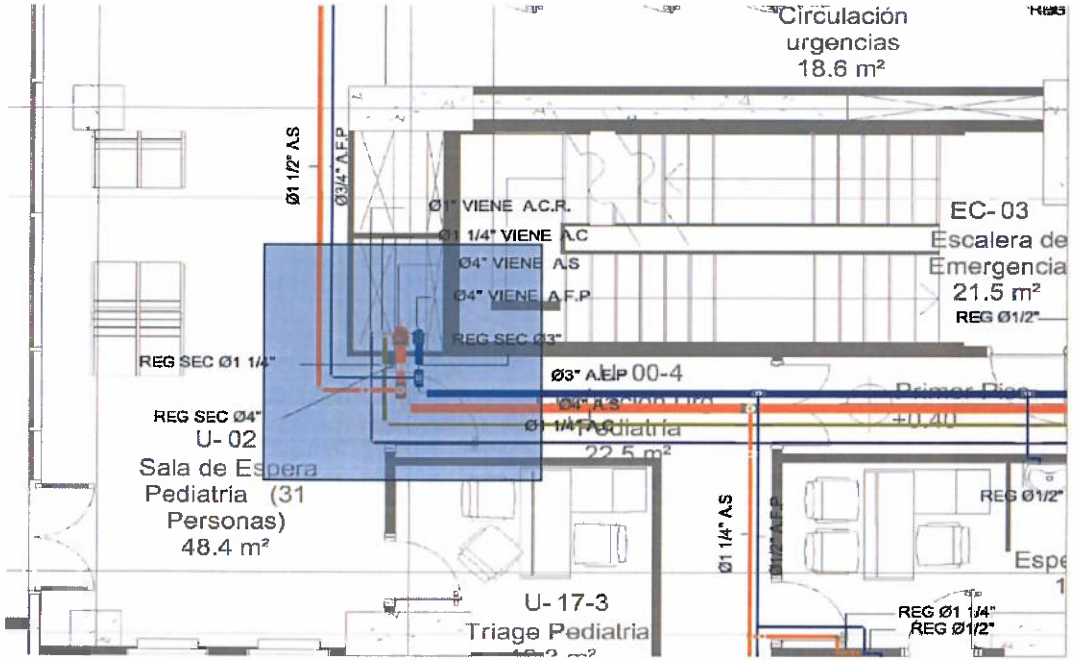

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E		11,76				11,76
ENTRE EL EJE 8-2 Y EJE E		41,00				41,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E		11,76				11,76
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C		41,00				41,00
			TOTAL			105,52


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC presión Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8 Y EJE C-E

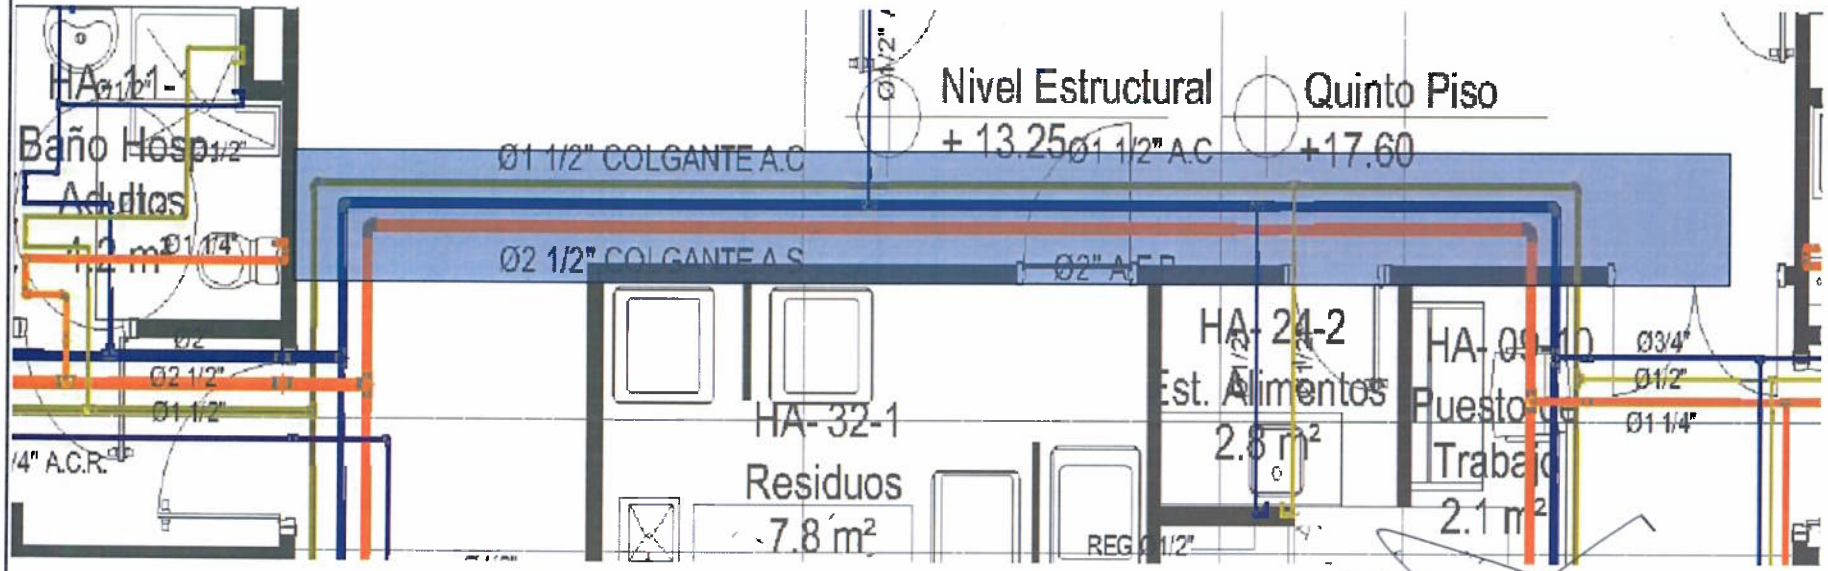


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 Y EJE E

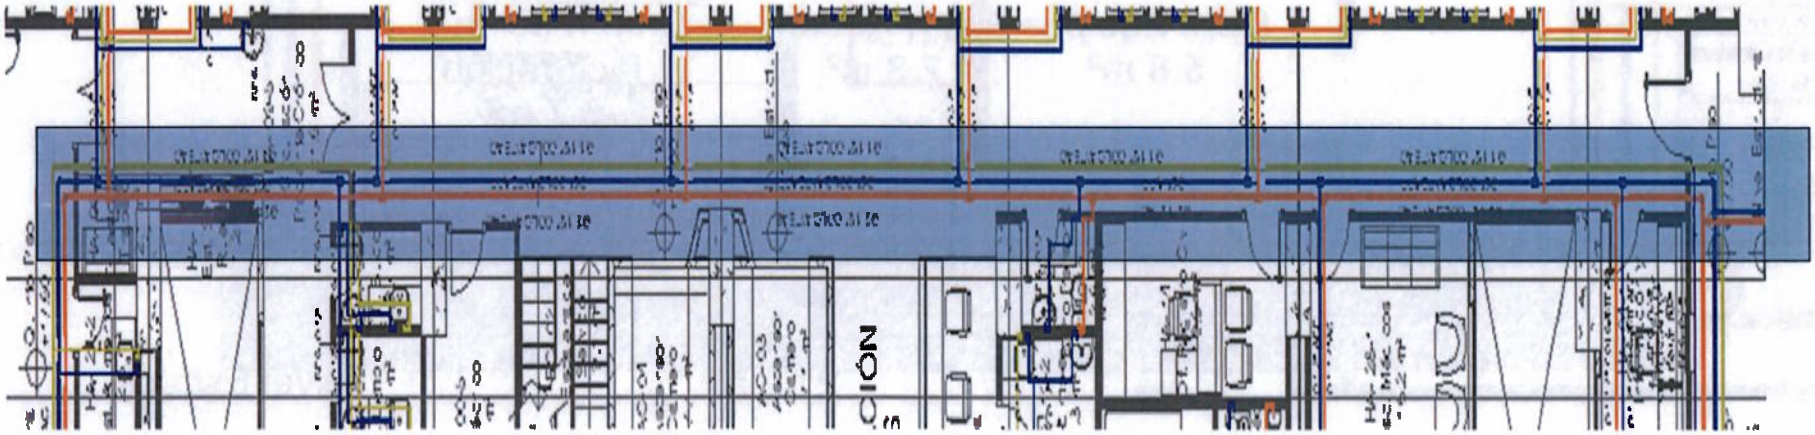

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 Y EJE C-E




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.6.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2-8 Y EJE C

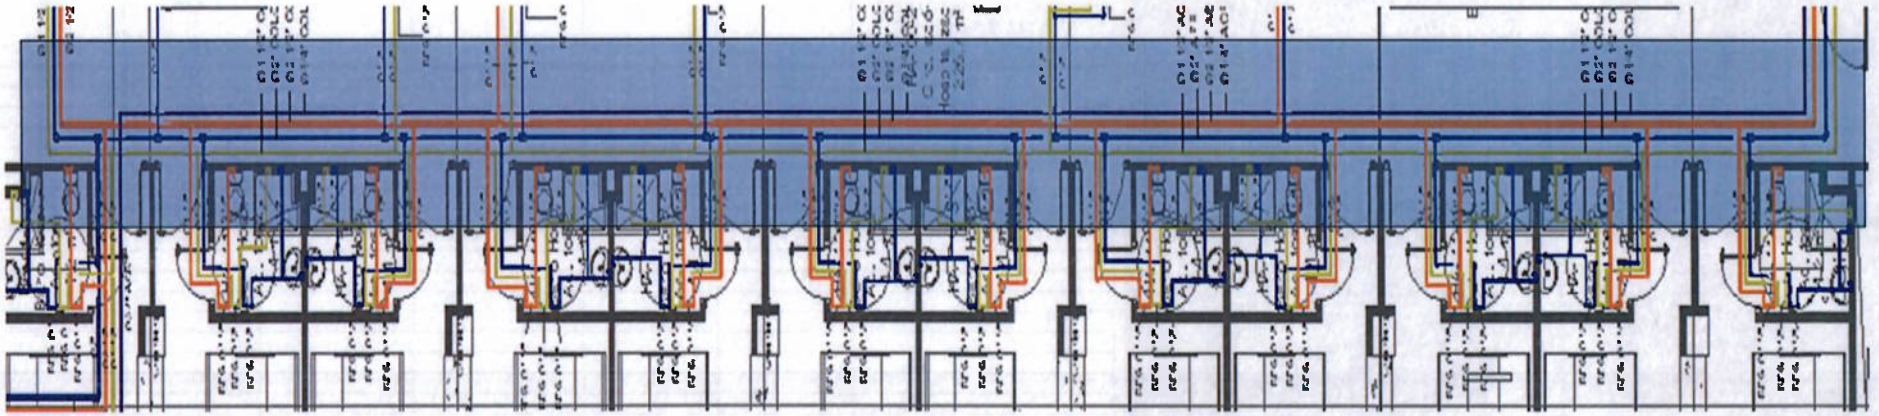

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø4"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
TUBERIA VERTICAL DUCTO						
SALE BAJO PLACA DEL PRIMER PISO HASTA EL CUARTO PISO ENTRE LOS EJE 8-9 EJE B-C					6,00	6,00
TOTAL						6,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø4"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DUCTO ENTRE EL EJE 8-9 EJE B-C

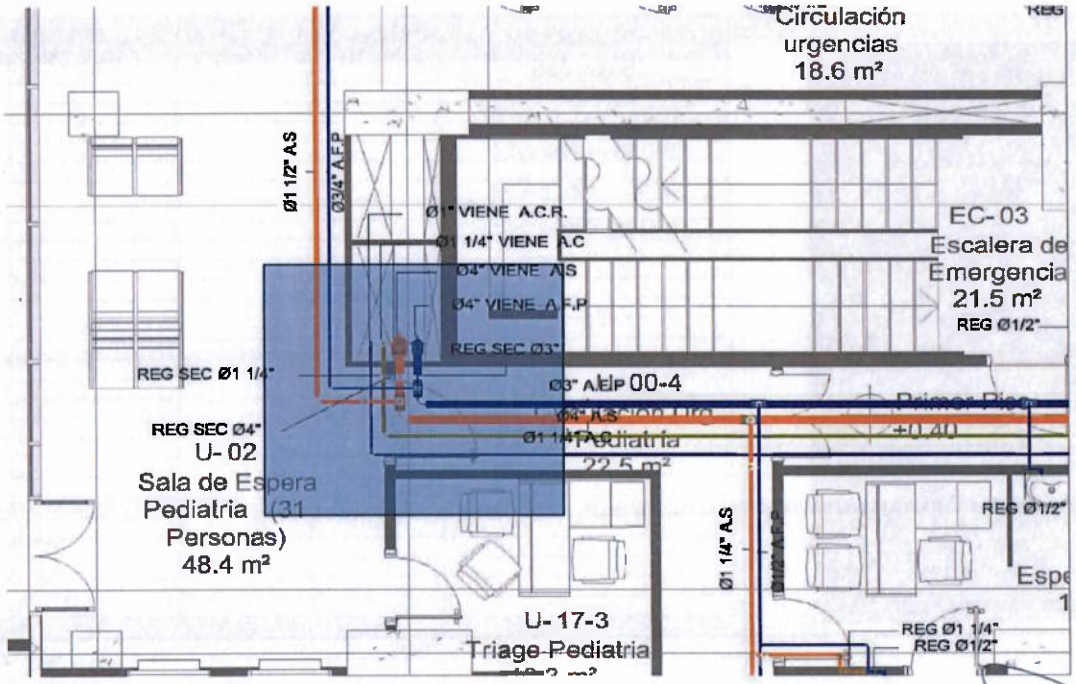


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

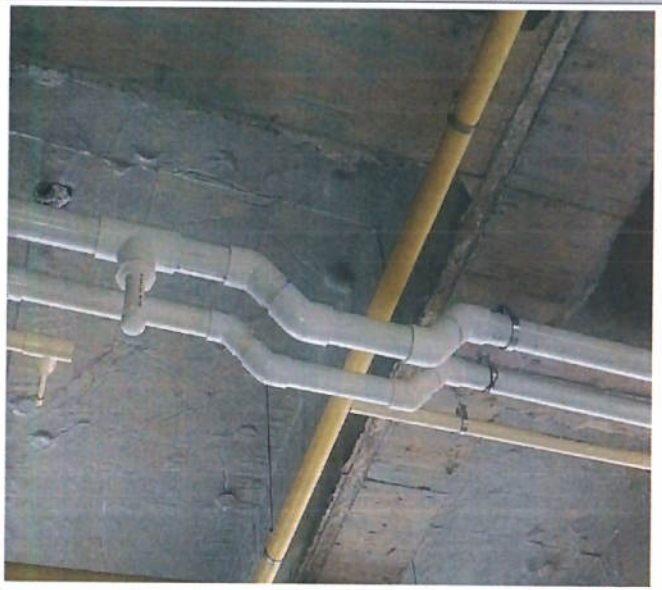

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E					6,00	6,00
ENTRE EL EJE 8-2 EJE E					32,00	32,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E					6,00	0,00
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C					36,00	36,00
			TOTAL			74,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8 Y EJE C-E

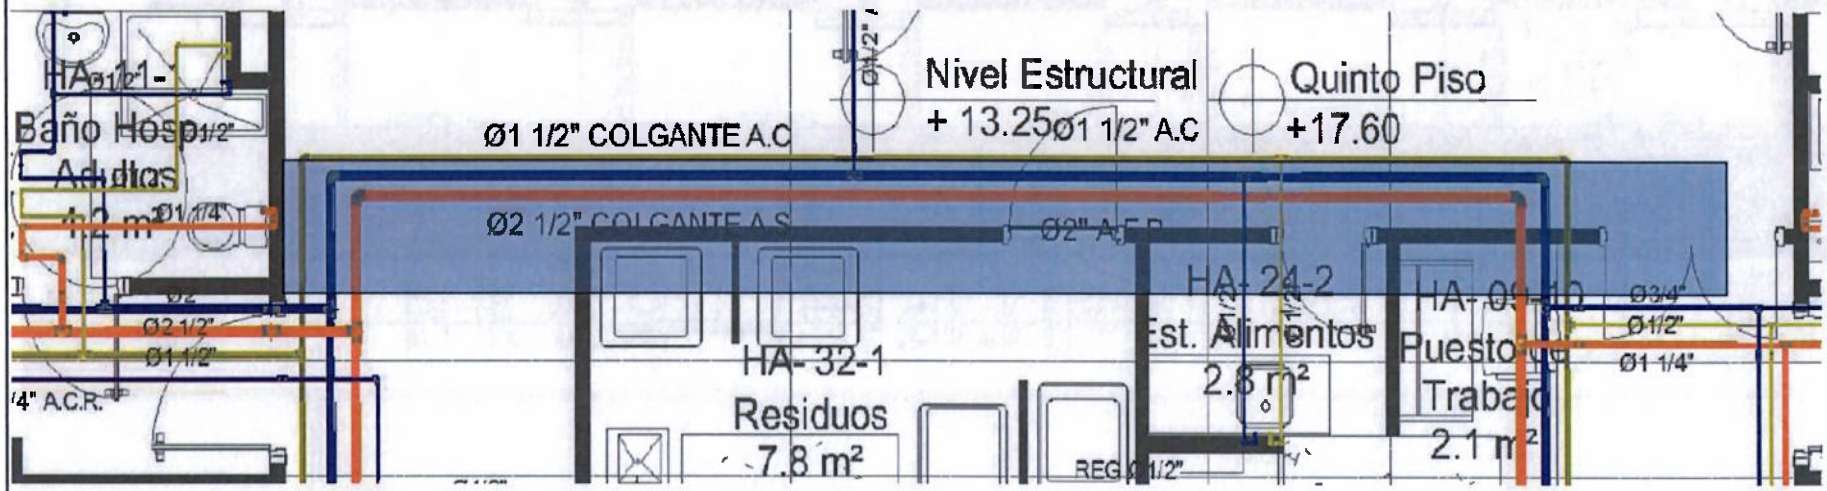


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.6.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 Y EJE E

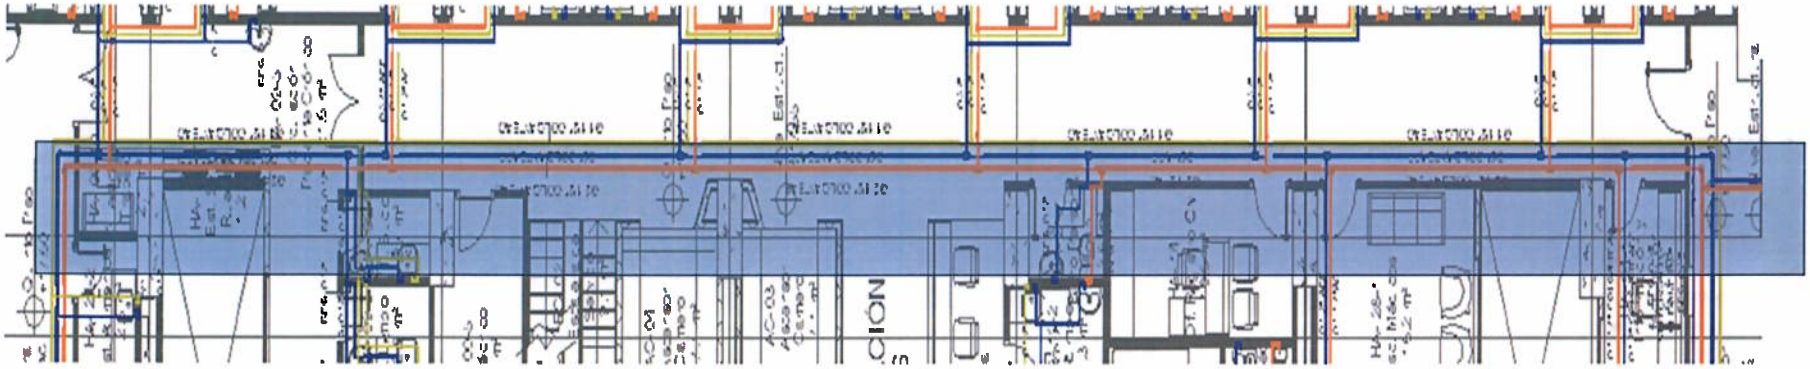


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 Y EJE C-E

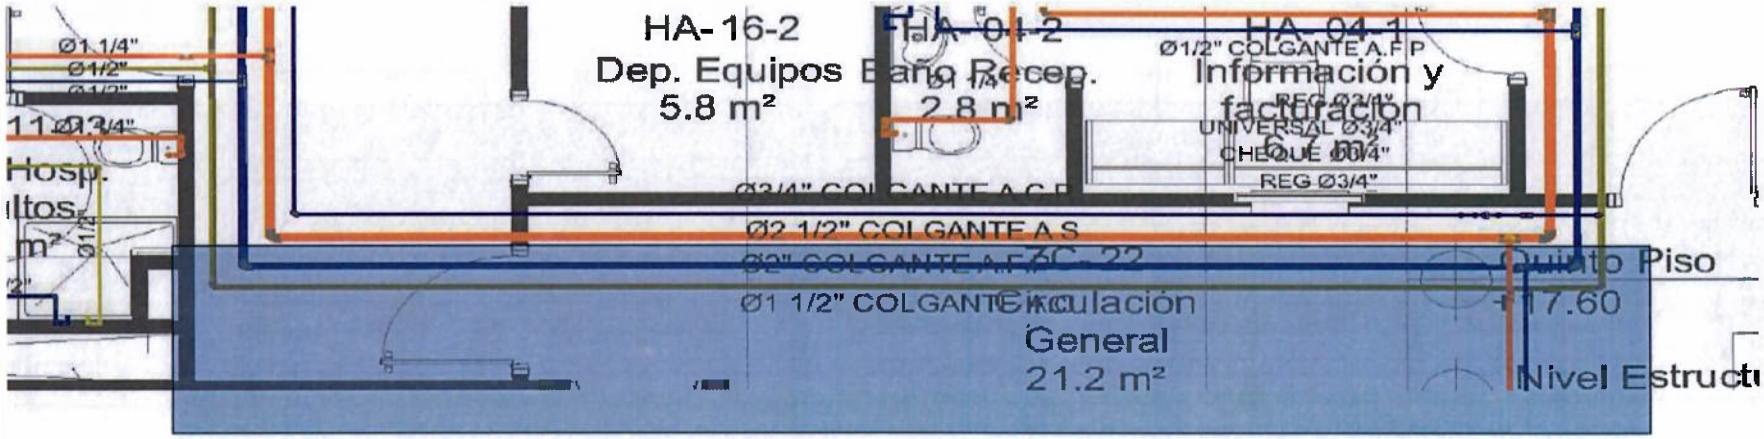


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.13	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2-8 Y EJE C

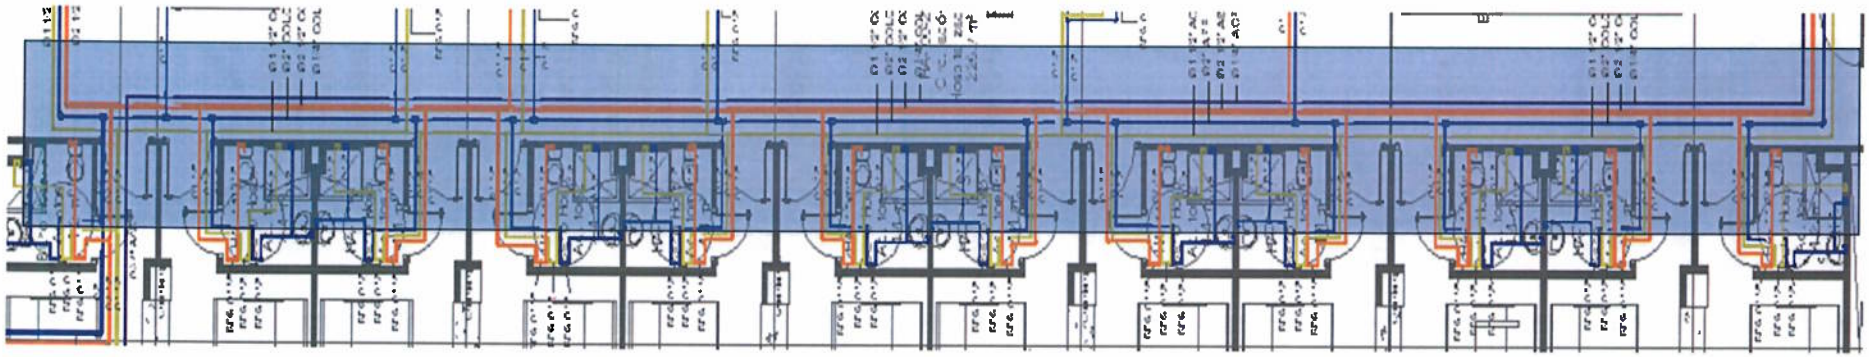

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.6.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E					9,00	9,00
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E					28,00	28,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E					9,00	9,00
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C					28,00	28,00
TOTAL						74,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

TUBERIA AZUL - AGUA CALIENTE

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8 Y EJE C-E

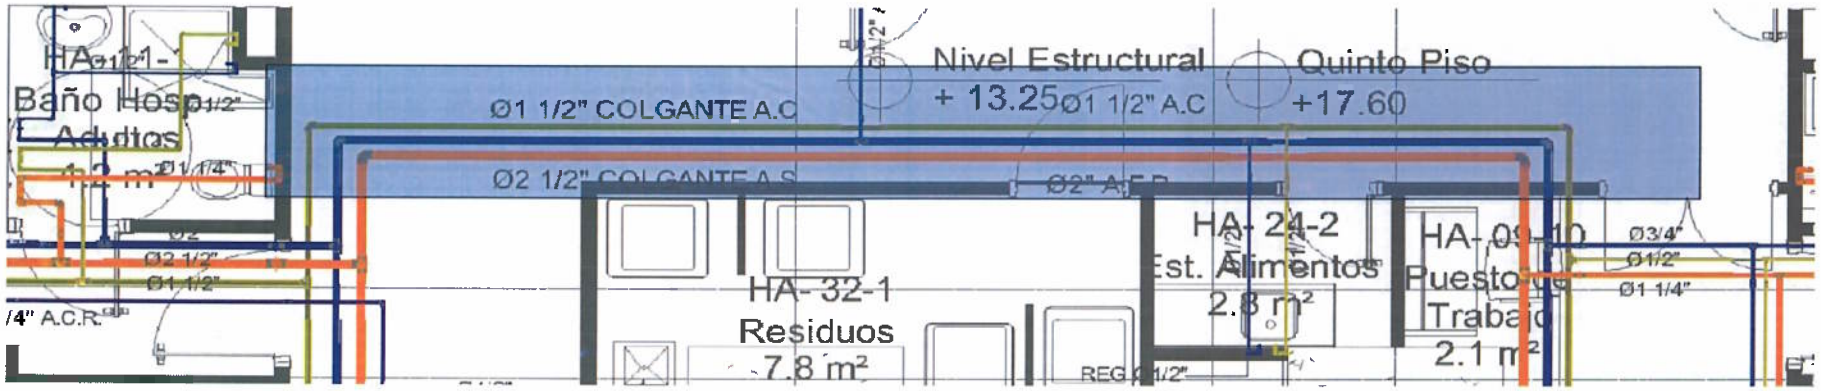


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE DEL CARACOLÍ	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 Y EJE E

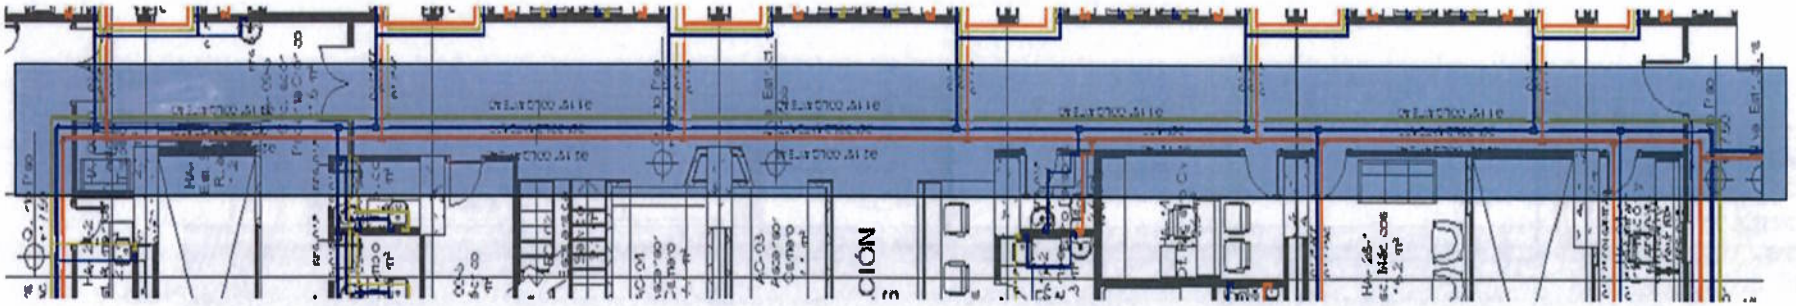

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.6.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.6.30	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2-8 Y EJE C

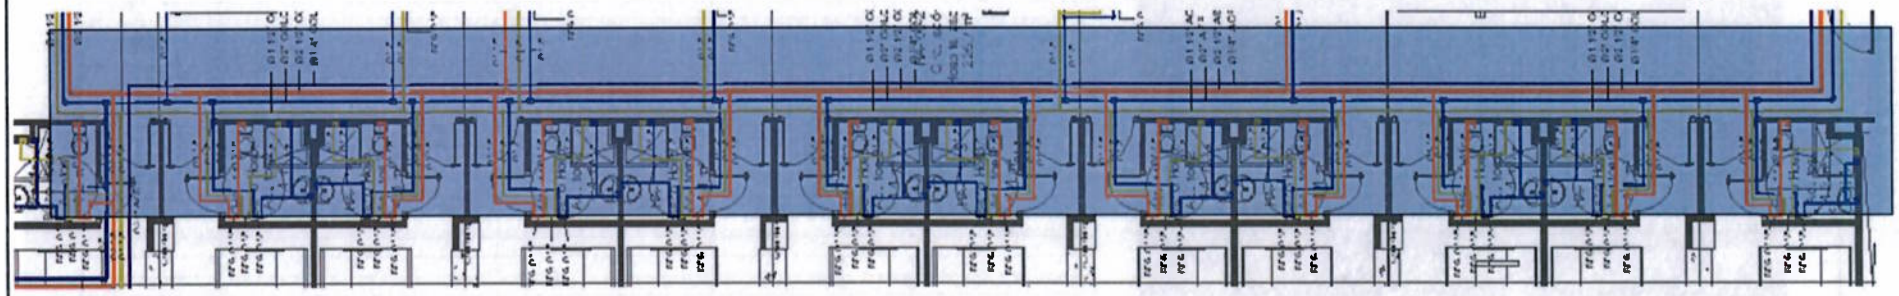

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.7.3	DESCRIPCION ITEM	Tuberia PVC presión Ø2 1/2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E		11,54				11,54
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E		40,00				40,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E		11,54				11,54
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C		40,00				40,00
TOTAL						103,08

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano


SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.7.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2 1/2"			UND:	ML

TUBERIA AZUL - AGUA CALIENTE

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA

ENTRE EL EJE 8 EJE C-E

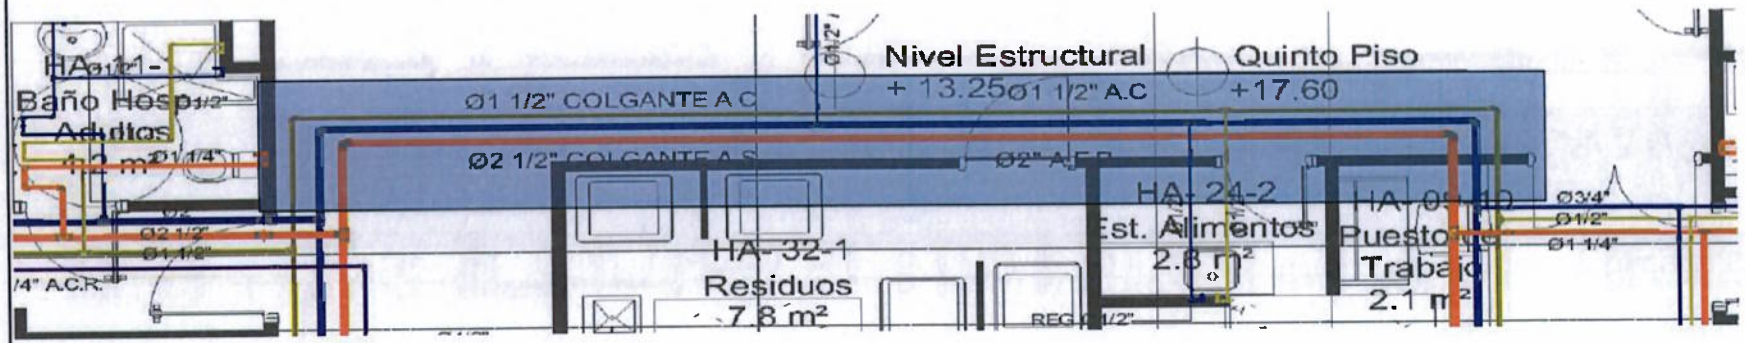


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2 1/2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E

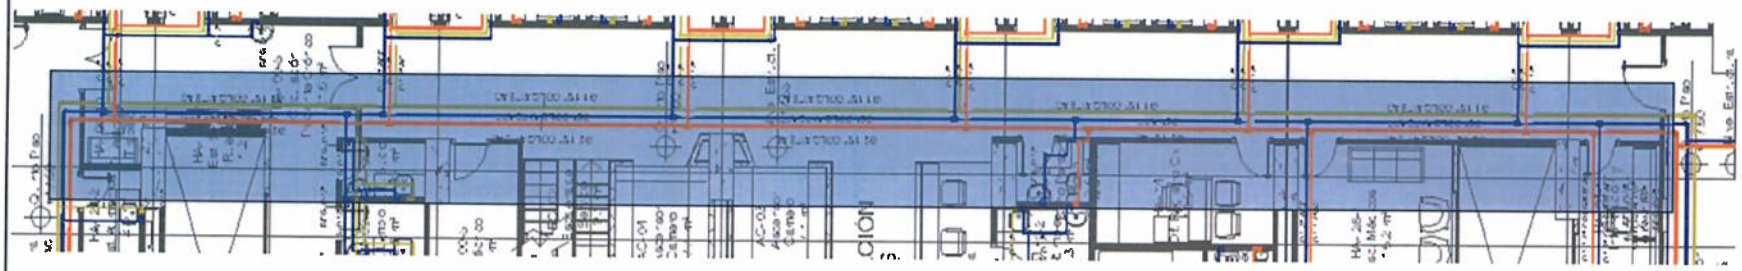

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.7.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería PVC presión Ø2 1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2 1/2"			UND:	UND

TUBERIA AZUL - AGUA CALIENTE

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E

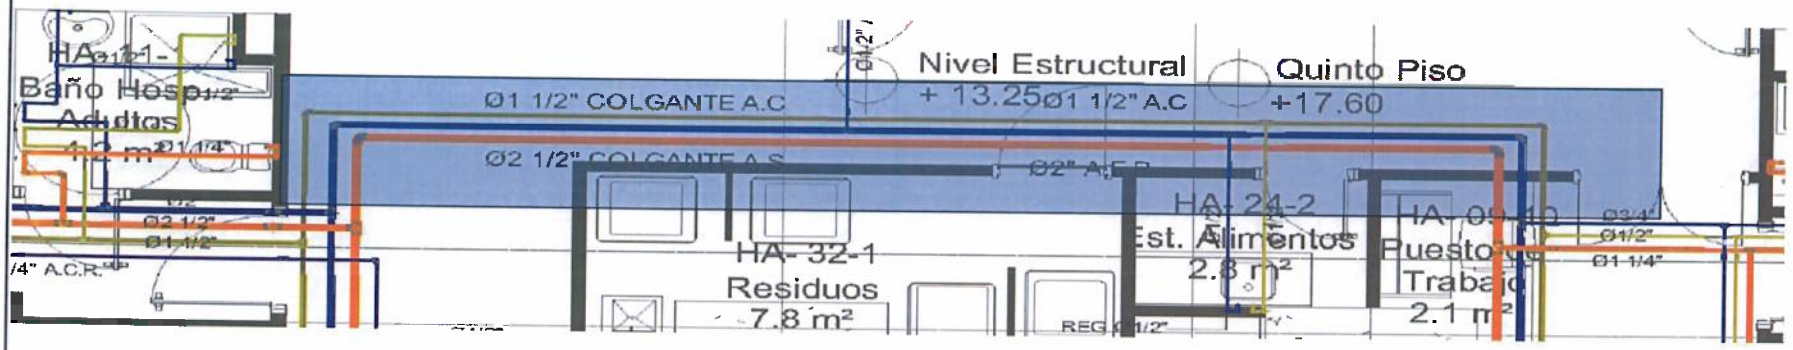


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E

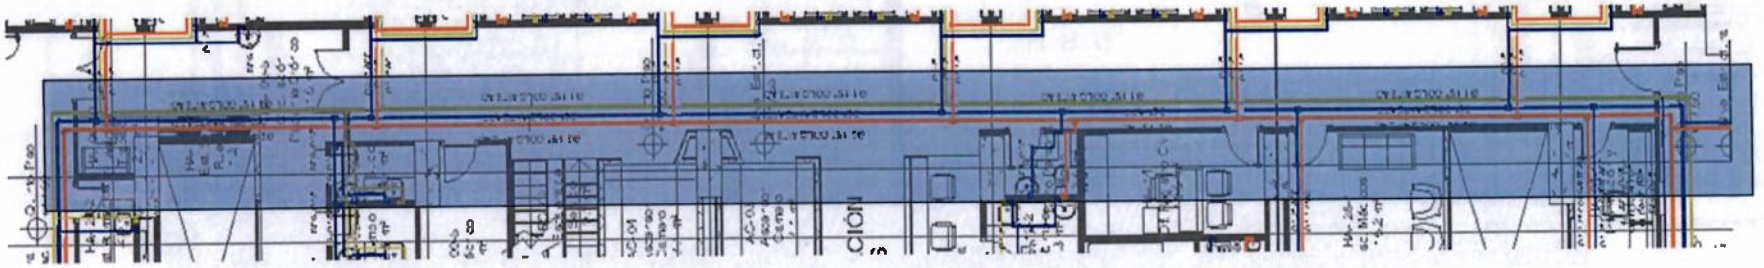


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
ITEM Nº:	26.7.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E

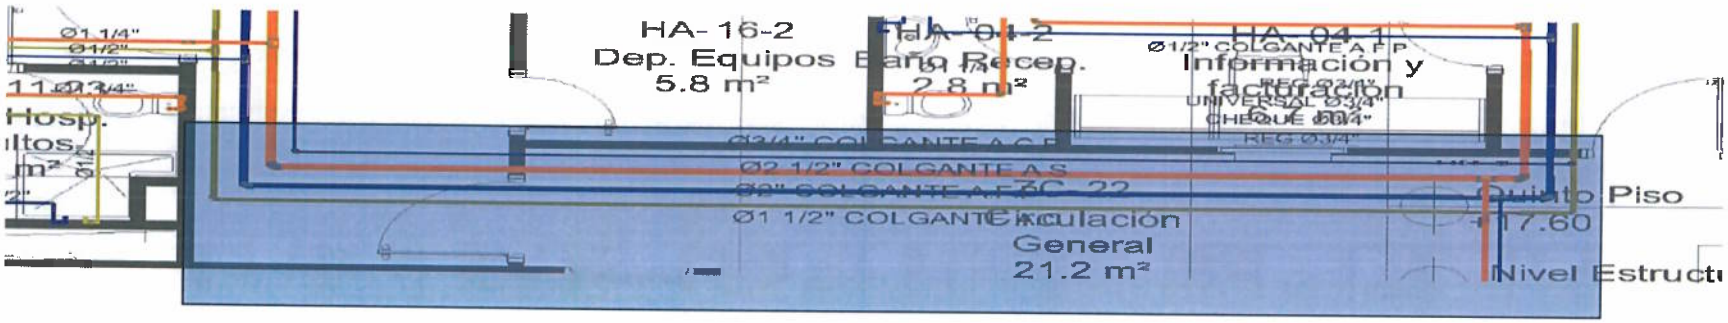


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios presion Ø2 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C

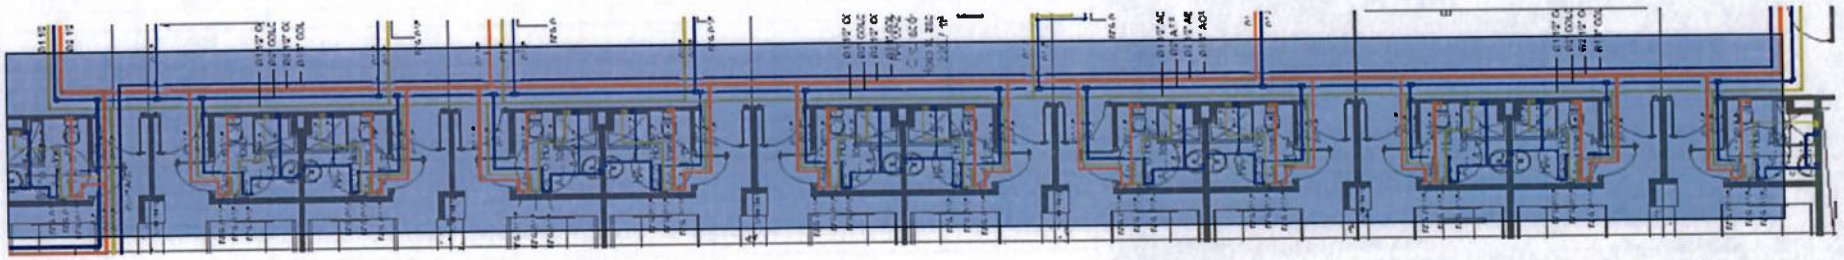

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	26.7.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E					8,00	8,00
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E-F					27,00	27,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E					8,00	8,00
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C-D					27,00	27,00
TOTAL						70,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2 1/2"			UND:	UND

TUBERIA AZUL - AGUA CALIENTE

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8 EJE C-E

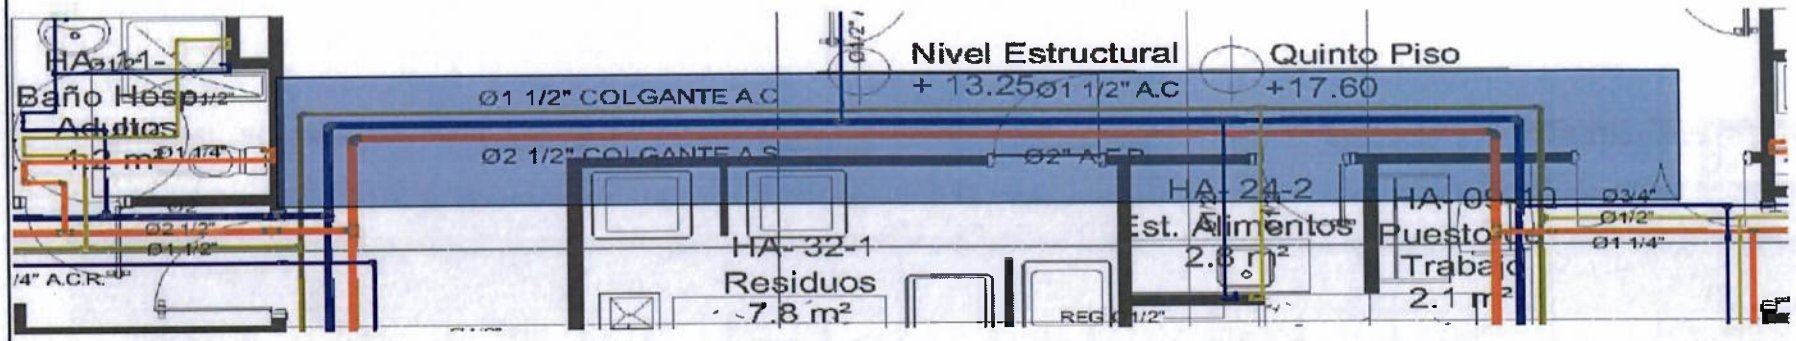


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	26.7.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 8-2 EJE E-F

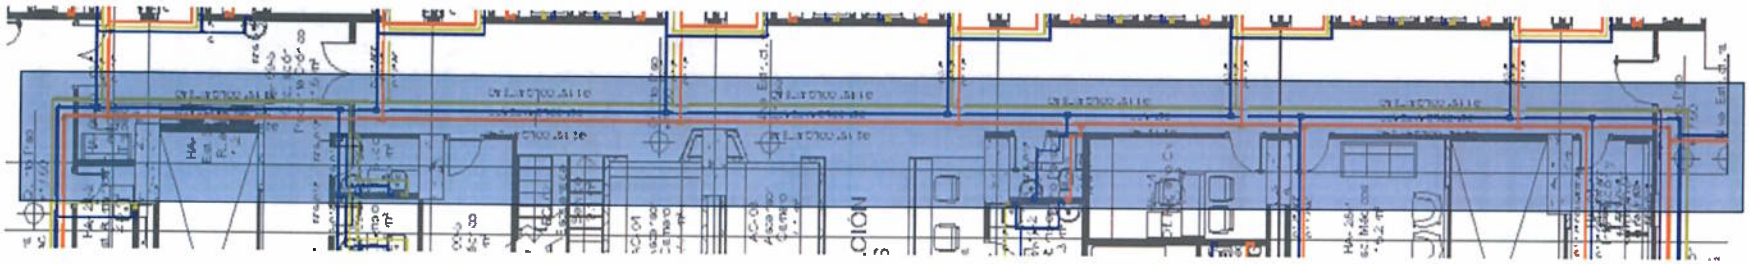

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.7.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø2 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AZUL - AGUA FRIA
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	26.8.5	DESCRIPCION ITEM	Tuberia CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE EL EJE 8 EJE C-E
TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE

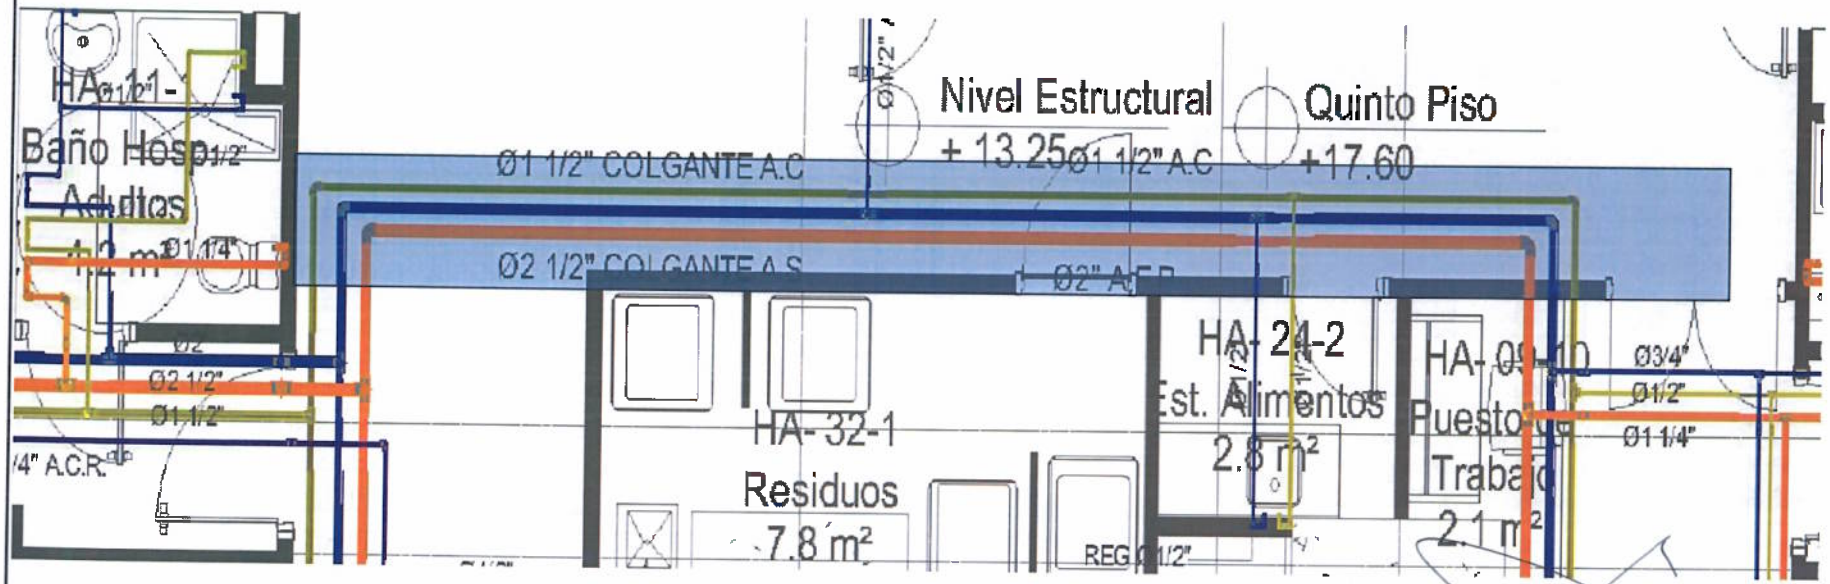


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE EL EJE 8-2 EJE E
TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE

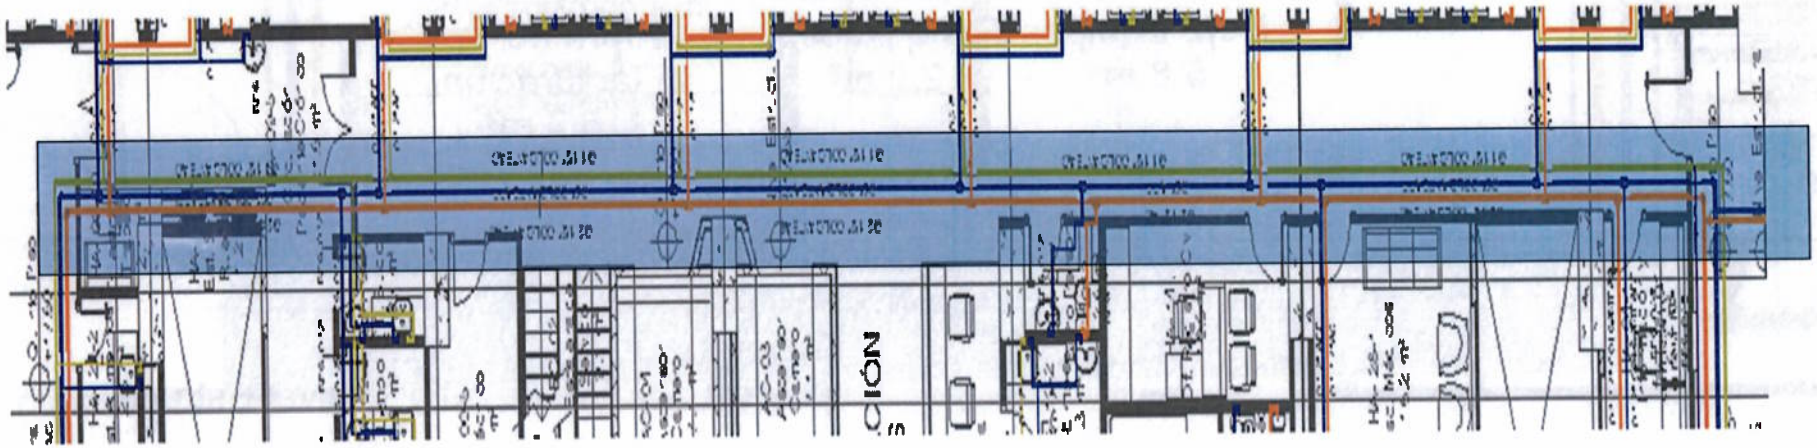


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E

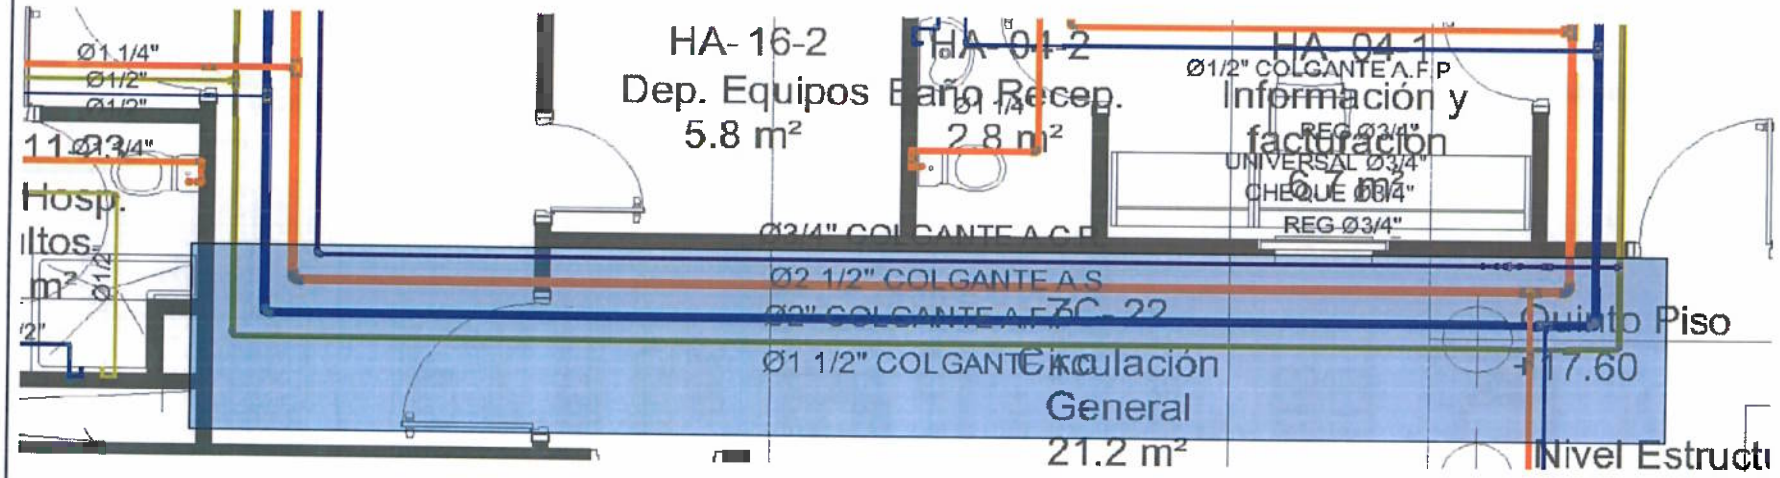


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.5	DESCRIPCION ITEM	Tubería CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C

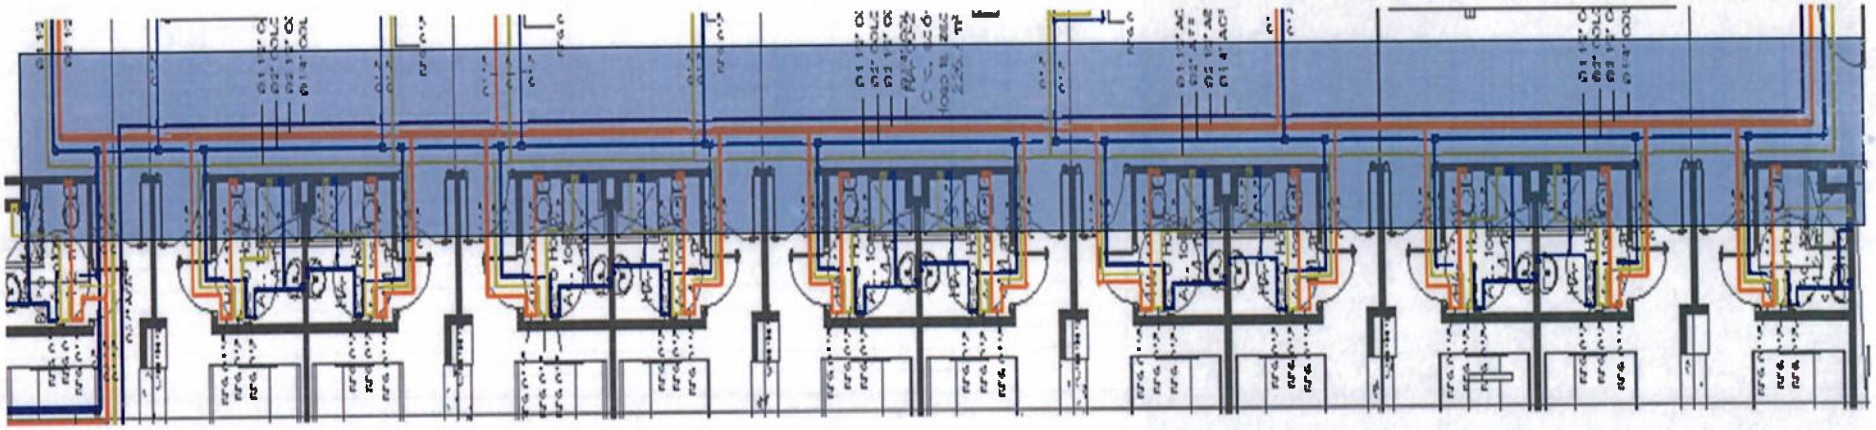

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	26.8.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8-2 EJE E					23,00	23,00
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C					36,00	36,00
TOTAL						59,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE EL EJE 8-2 EJE E
TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE

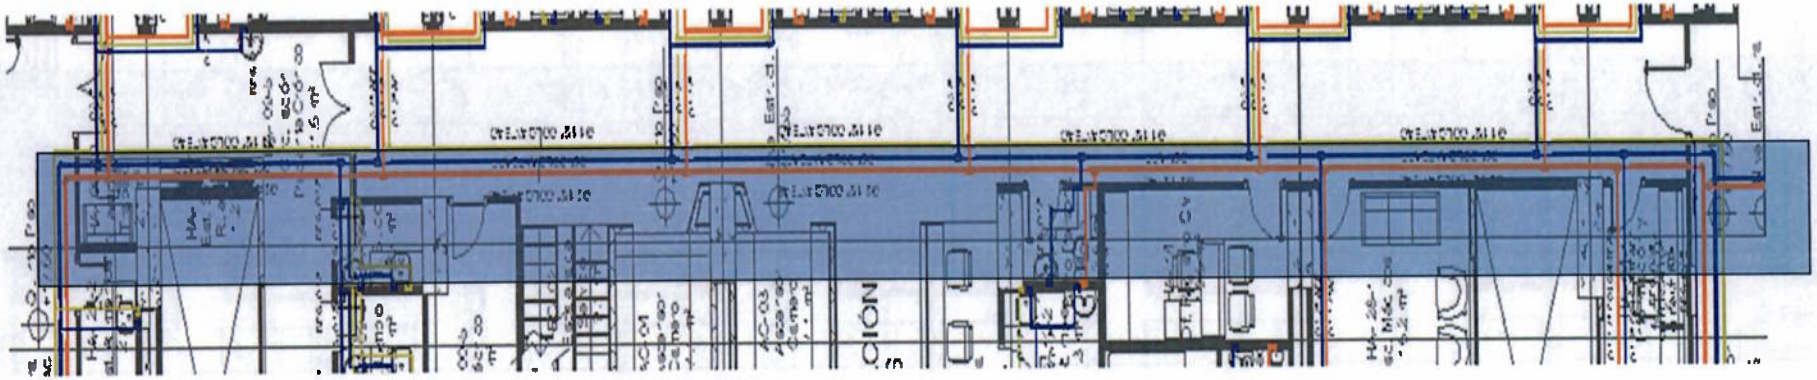


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios CPVC ALTO IMPACTO Ø1 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C

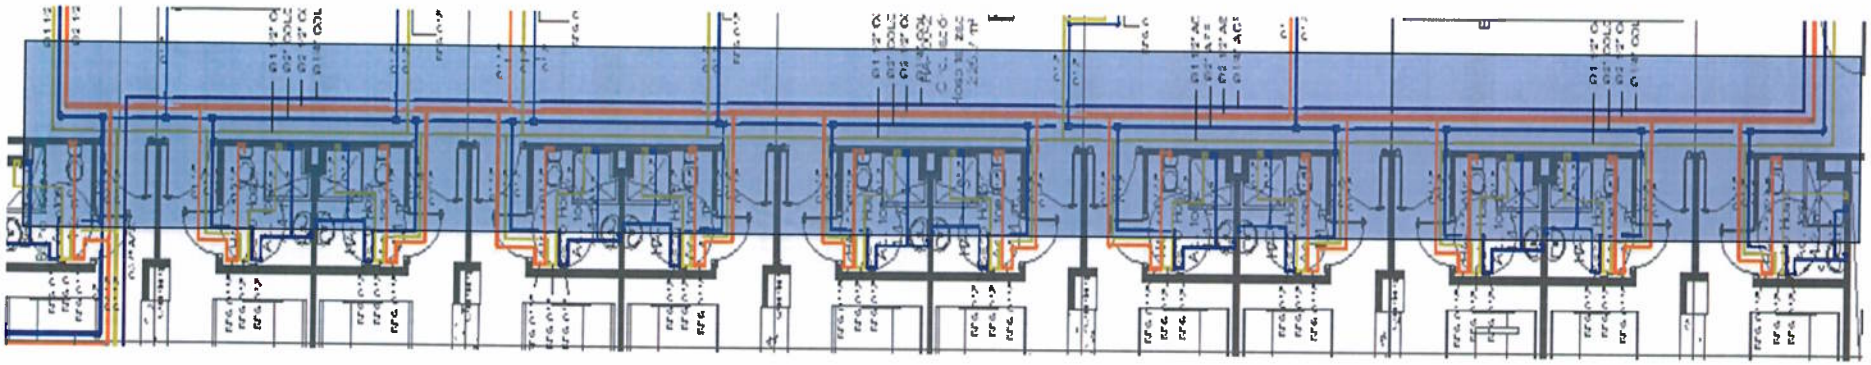


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

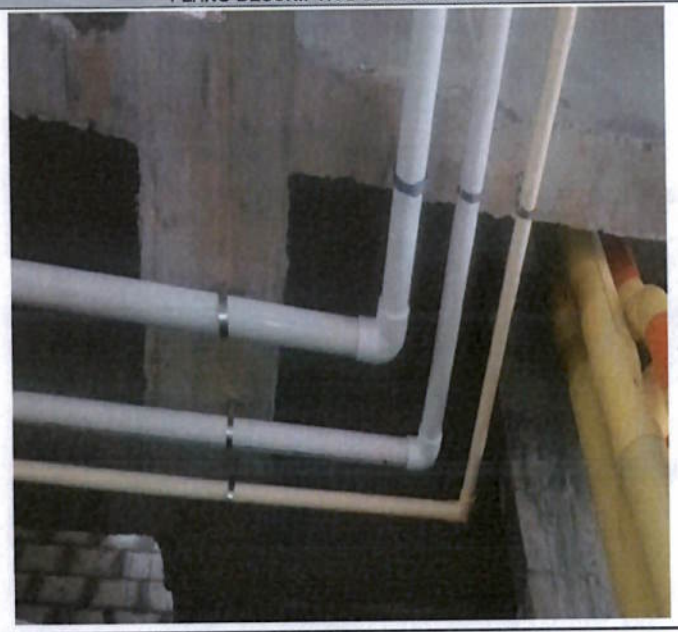

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
QUINTO PISO						
ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E					28,00	28,00
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E					3,00	3,00
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C					12,00	12,00
TOTAL						43,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/2"			UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ENTRE EL EJE 8-2 EJE -E
TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE

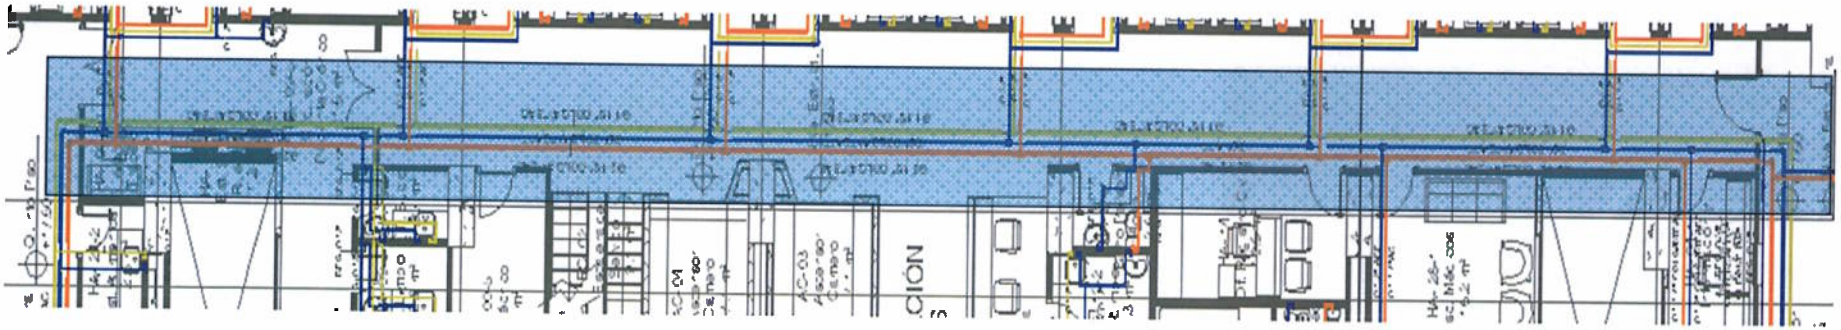


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE
ENTRE EL EJE 2-8 EJE C

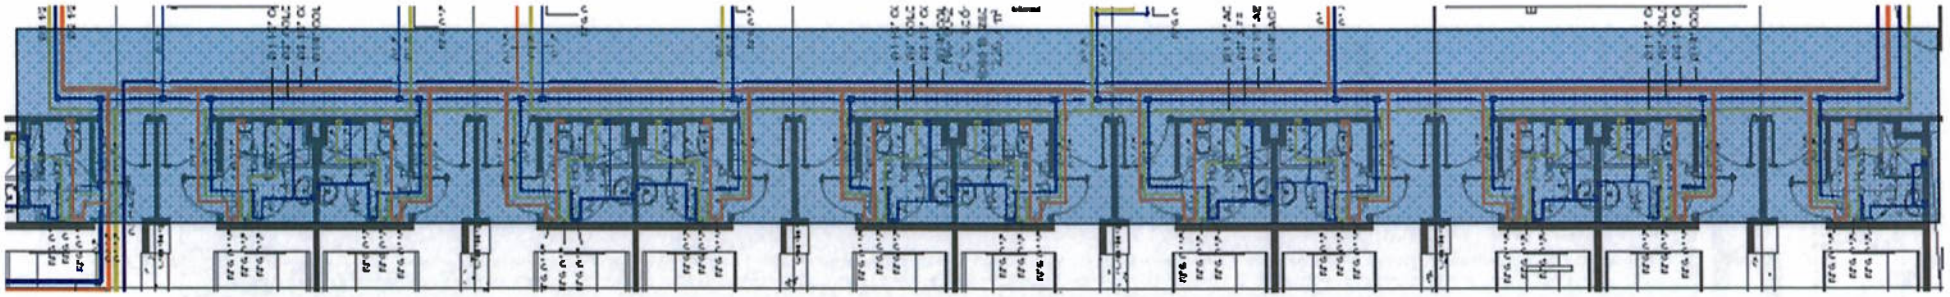

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.8.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/2"			UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TUBERIA AMARILLA - AGUA CALIENTE
ENTRE EL EJE 2 EJE C-E



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería tipo alcantarillado Ø6"			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
LOTE B						
RED ACLATARILLADO EDIFICIO ASISTENCIAL - PETAR		24,00				24,00
TOTAL						24,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería tipo alcantarillado Ø6"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

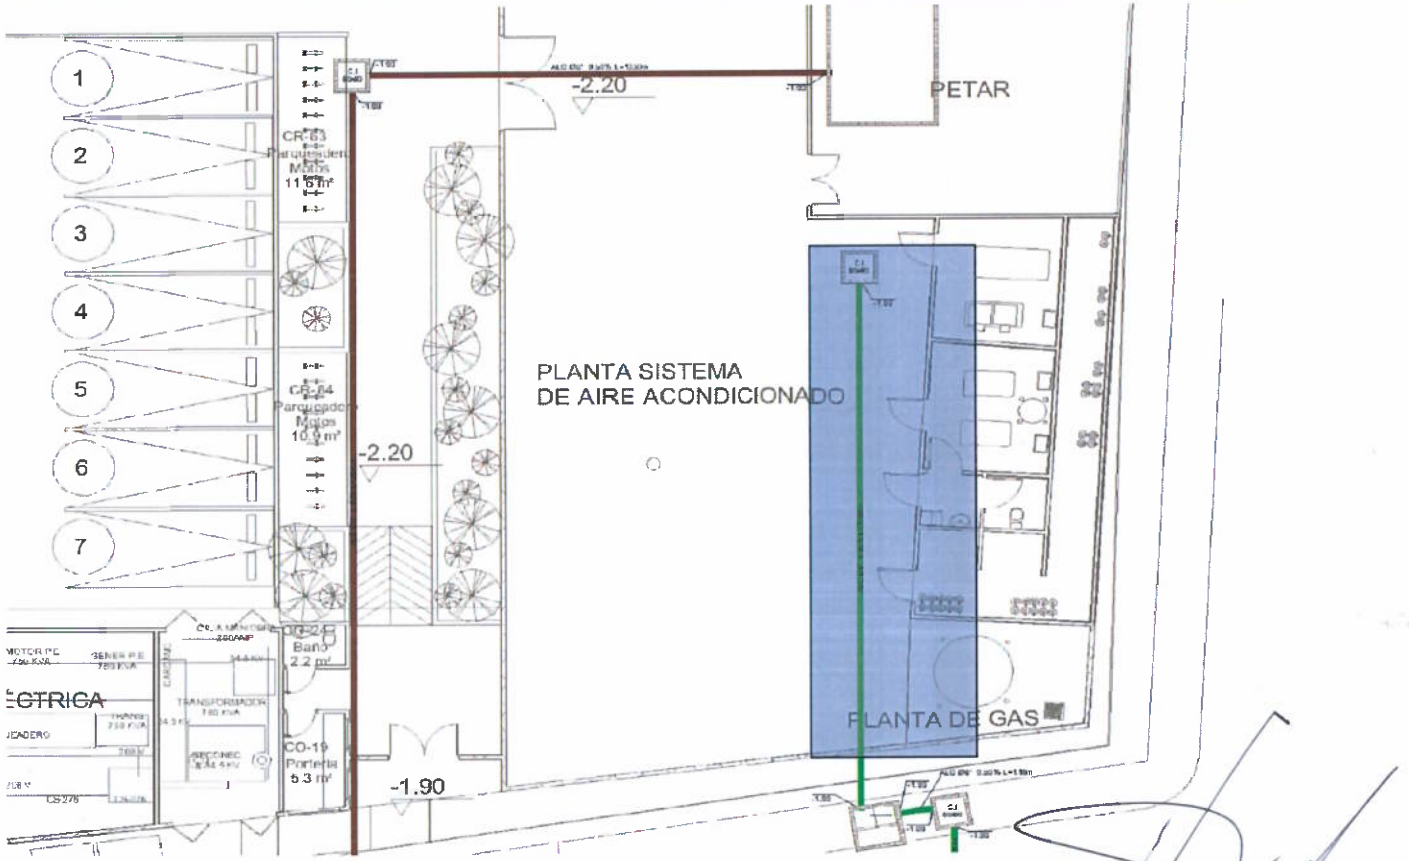

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.15.24	DESCRIPCION ITEM	Cama arena base soporte tubería			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
LOTE B						
RED ACLATARILLADO EDIFICIO ASISTENCIAL - PETAR		24,00				24,00
TOTAL						24,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.1	DESCRIPCION ITEM	Tubería tipo alcantarillado Ø6"			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

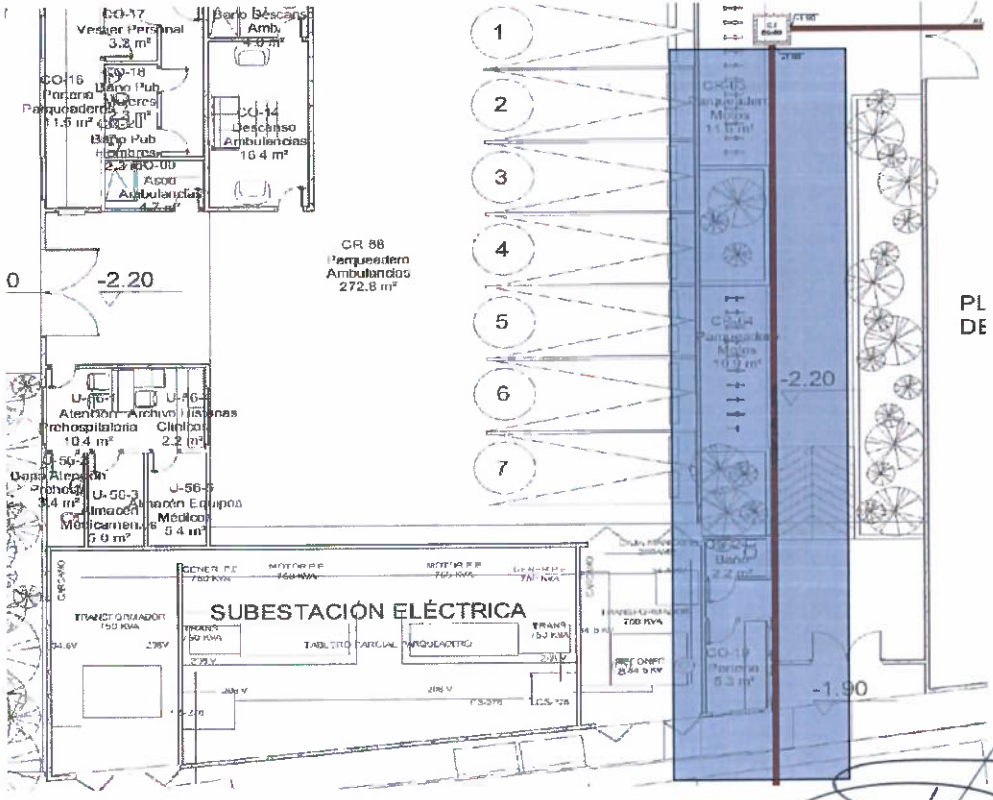

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE LONDOÑO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.21	DESCRIPCION ITEM	Cama arena base soporte tubería			UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
LOTE B						
RED ACLATARILLADO EDIFICIO ASISTENCIAL - PETAR		25,20				25,20
TOTAL						25,20

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	26.16.21	DESCRIPCION ITEM	Cama arena base soporte tubería			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

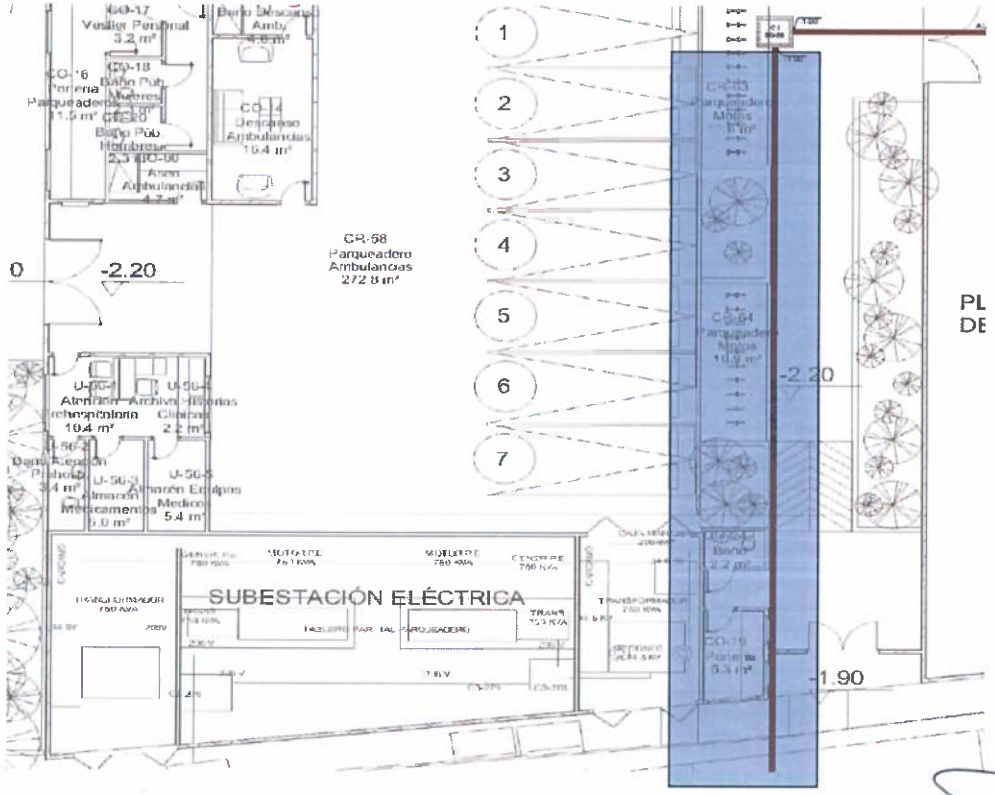

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24
UNIDAD:	M2		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
AIRE EXTERIOR														
EQUIPO VS-01														
DUCTO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		3	24	3,17
CODO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	1	24	0,46
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,75		1	24	0,61
REDUCCION	4	12	8	0,30	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,27
DUCTO	5	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	1,20		3	24	3,66
DUCTO	6	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,35		1	24	0,36
CODO	7	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00		0,20	1	24	0,61
REDUCCION	8	12	10	0,30	0,25	12,00	8,00	0,30	0,20	0,30		1	24	0,32
DUCTO	9	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	1,20		2	24	2,68
DUCTO	10	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,55		1	24	0,56
TAPA	11	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00			1	24	0,06
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		8	24	1,02
UNIONES		12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,25		8	24	1,27
UNIONES		12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,25		4	24	1,12
SUBTOTAL														16,16

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

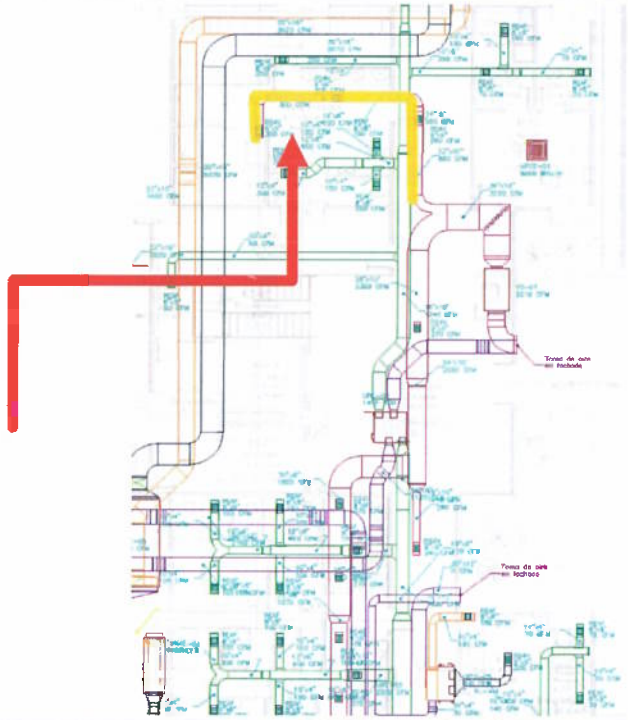

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Version No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº: 20	FECHA: JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM: Cal 24	UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
SOTANO UNO														
TOMA DE AIRE														
EQUIPO URC-01														
DUCTO	1	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,75		3	24	3,20
SEMICODO	2	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00		0,20	2	24	2,00
DUCTO	3	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	1,20		2	24	3,41
UNIONES		18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,25		7	24	2,49
									SUBTOTAL					11,10
									VIENEN					16,16
									PASAN					27,26

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

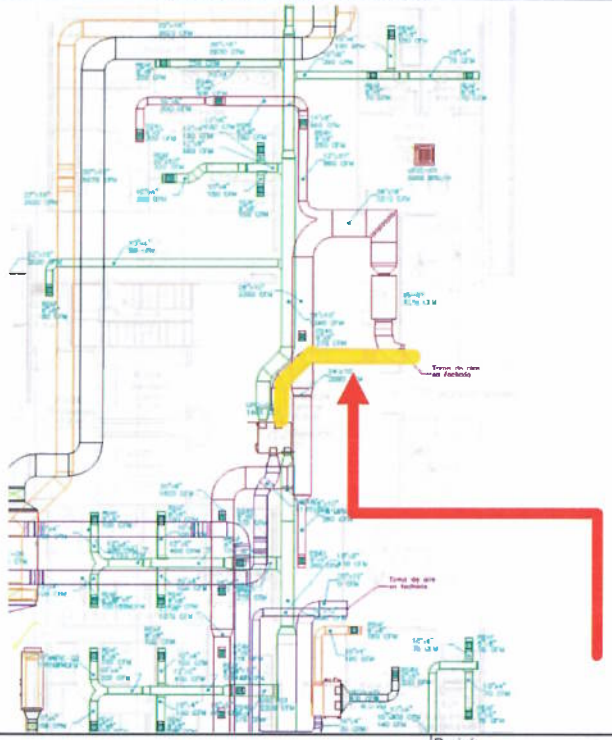

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
TOMA DE AIRE														
EQUIPOS UMAE-04														
DUCTO	1	20	12	0,51	0,30			0,00	0,00	1,30		18	24	38,04
CODO	2	20	12	0,51	0,30			0,00	0,00	0,75		4	24	2,59
DUCTO	3	20	12	0,51	0,30			0,00	0,00	0,72		1	24	1,17
DUCTO	4	20	12	0,51	0,30			0,00	0,00	0,50		4	24	3,25
UNIONES		20	12	0,51	0,30			0,00	0,00	0,50		28	24	22,10
										SUBTOTAL				67,16
										VIENEN				27,26
										PASAN				94,42

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

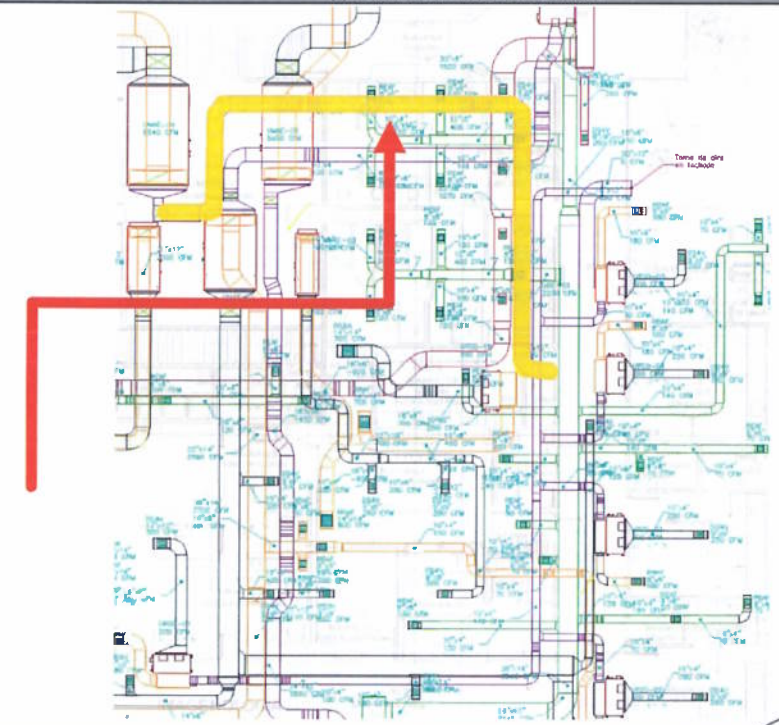

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-03			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
TOMA DE AIRE														
EQUIPOS UMAE-01														
DUCTO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		24	24	22,19
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,30		1	24	0,21
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	5	24	2,04
ZAPATO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		4	24	0,71
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,45		5	24	1,60
REDUCCION	6	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
DUCTO	7	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,20		10	24	9,75
CODO	8	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	1	24	0,46
DUCTO	9	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,45		1	24	0,37
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		35	24	6,22
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		13	24	2,64
													SUBTOTAL	46,43
													VIENEN	94,42
													PASAN	140,85

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

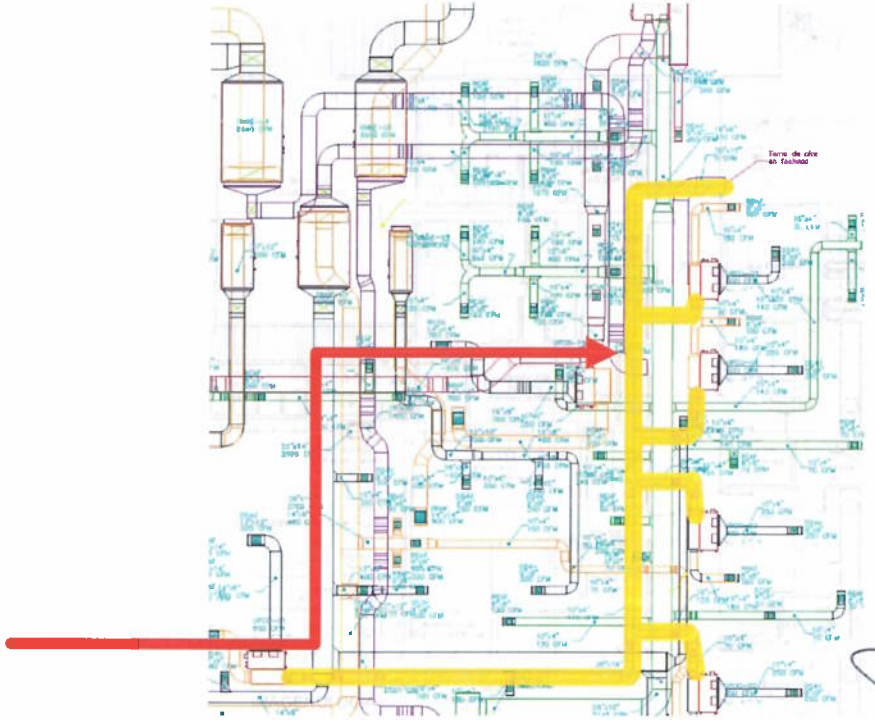

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
TOMA DE AIRE														
EQUIPOS UMAE-01														
DUCTO	1	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,77		2	24	2,03
CODO	2	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,75		2	24	0,95
DUCTO	3	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	1,30		12	24	20,60
DUCTO	4	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,92		1	24	1,22
CODO	5	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,50		2	24	0,95
DUCTO	6	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,22		2	24	0,58
UNIONES		18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,25		18	24	5,94
										SUBTOTAL				32,28
										VIENEN				140,85
										PASAN				173,12

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

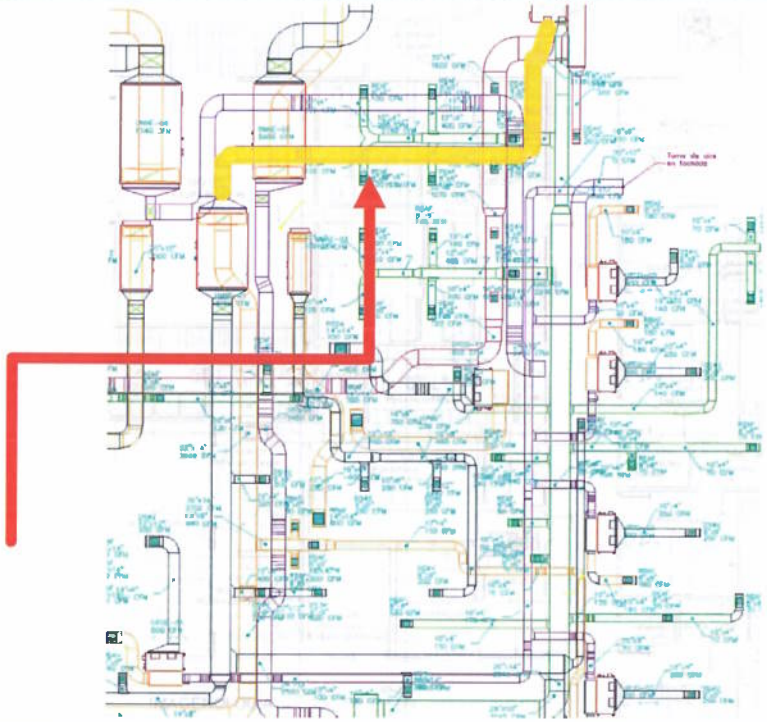

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SOTANO UNO														
RETORNO														
EQUIPOS UMAE-01														
ZAPATO	1	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,00
DUCTO	2	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,64
ZAPATO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,00
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,50		2	24	0,71
TAPA	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
DUCTO	6	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,95		1	24	0,97
REDUCCION	7	14	6	0,36	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,26
DUCTO	8	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		15	24	13,87
DUCTO	9	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,65		4	24	1,85
CODO	10	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,20		4	24	0,57
SEMICODO	11	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	2	24	0,82
DUCTO	12	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,12		1	24	0,09
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		31	24	6,51
UNIONES		14	6	0,36	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,25		3	24	0,65
									SUBTOTAL					28,97
									VIENEN					173,12
									PASAN					202,10

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

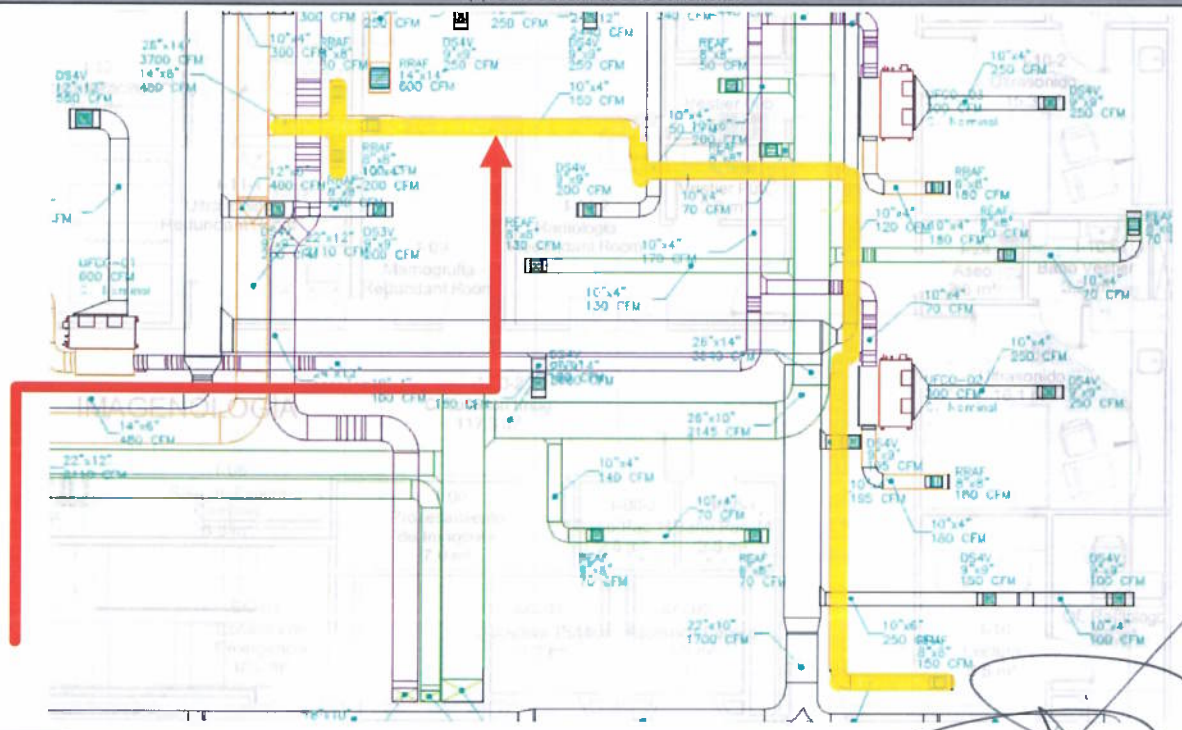

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
AIRE EXTERIOR														
EQUIPOS VS - 03														
DUCTO	1	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	1,30		12	24	22,19
UNIONES		18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,25		12	24	4,27
												SUBTOTAL		26,46
												VIENEN		202,10
												PASAN		228,55

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Version No. 00	
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

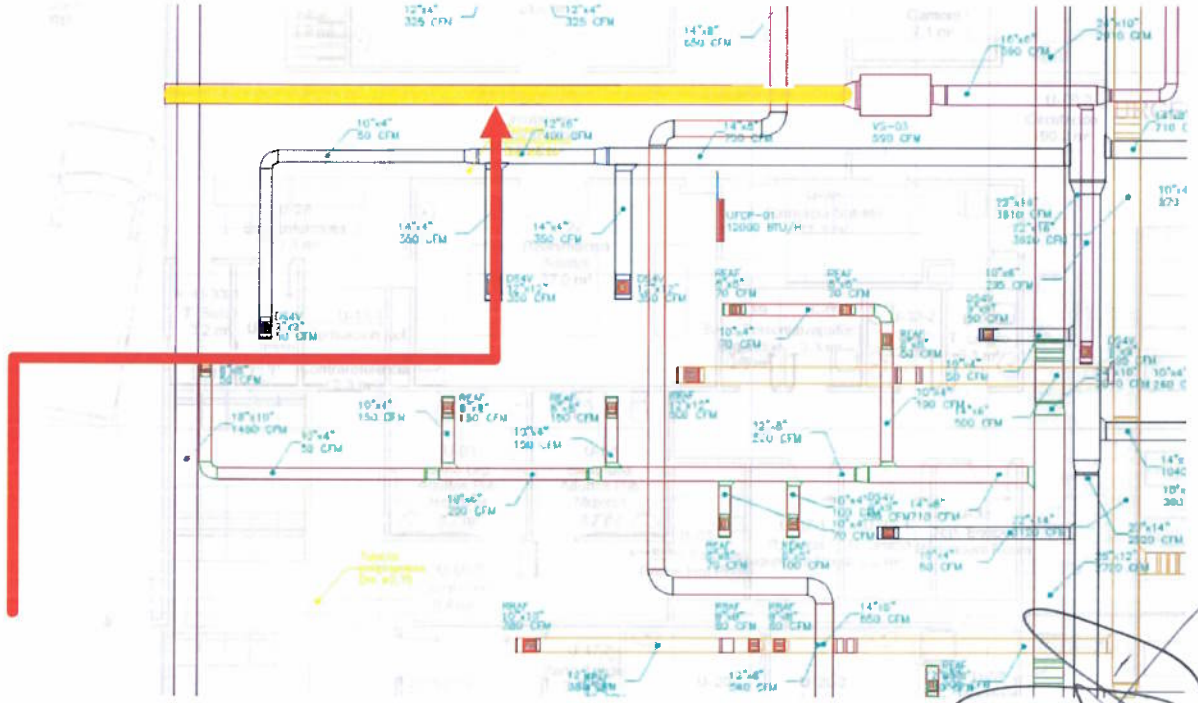

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS URC-04														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			8	24	0,21
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,12		2	24	1,59
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	3	24	1,22
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,20		6	24	5,12
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,58		2	24	0,82
DUCTO	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,87		5	24	3,09
REDUCCION	7	14	8	0,36	0,20	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,27
DUCTO	8	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		7	24	10,17
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,65		1	24	0,73
TAPA	10	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00			1	24	0,07
ZAPATO	11	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,07
ZAPATO	12	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,25
DUCTO	13	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	7,92
DUCTO	14	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,25
DUCTO	15	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,10		2	24	0,14
DUCTO		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		41	24	7,29
DUCTO		14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		6	24	1,52
DUCTO		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		8	24	2,24
									SUBTOTAL					44,00
									VIENEN					228,55
									PASAN					272,55

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-39			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

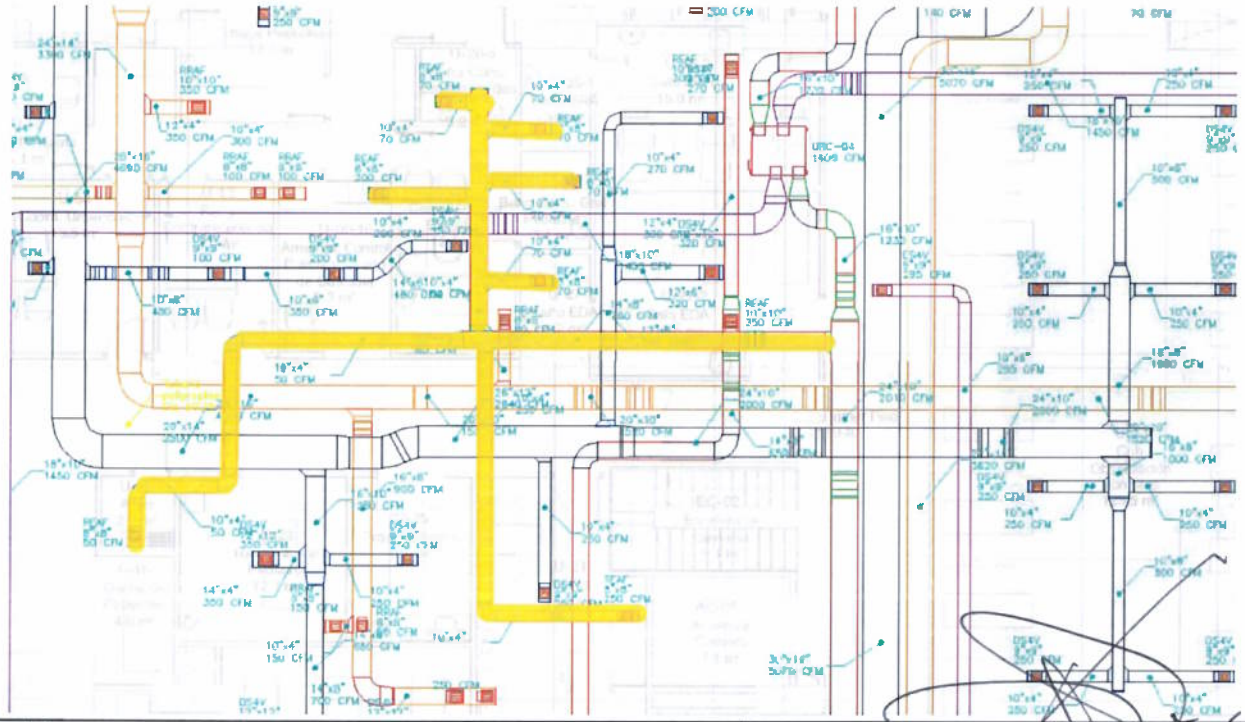

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE - 05														
ZAPATO	1	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,28
DUCTO	2	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		10	24	14,53
DUCTO	3	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,10		1	24	0,11
REDUCCION	4	14	8	0,36	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	5	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,38
ZAPATO	6	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,46
DUCTO	7	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		4	24	0,91
DUCTO	8	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,35		2	24	0,64
TAPA	9	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00			2	24	0,07
REDUCCION	10	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
DUCTO	11	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		7	24	6,47
DUCTO	12	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,35		1	24	0,25
CODO	13	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,41
TAPA	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		9	24	1,60
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,69
UNIONES		14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		8	24	1,83
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		10	24	2,79
										SUBTOTAL				33,99
										VIENEN				272,55
										PASAN				306,54

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-33			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

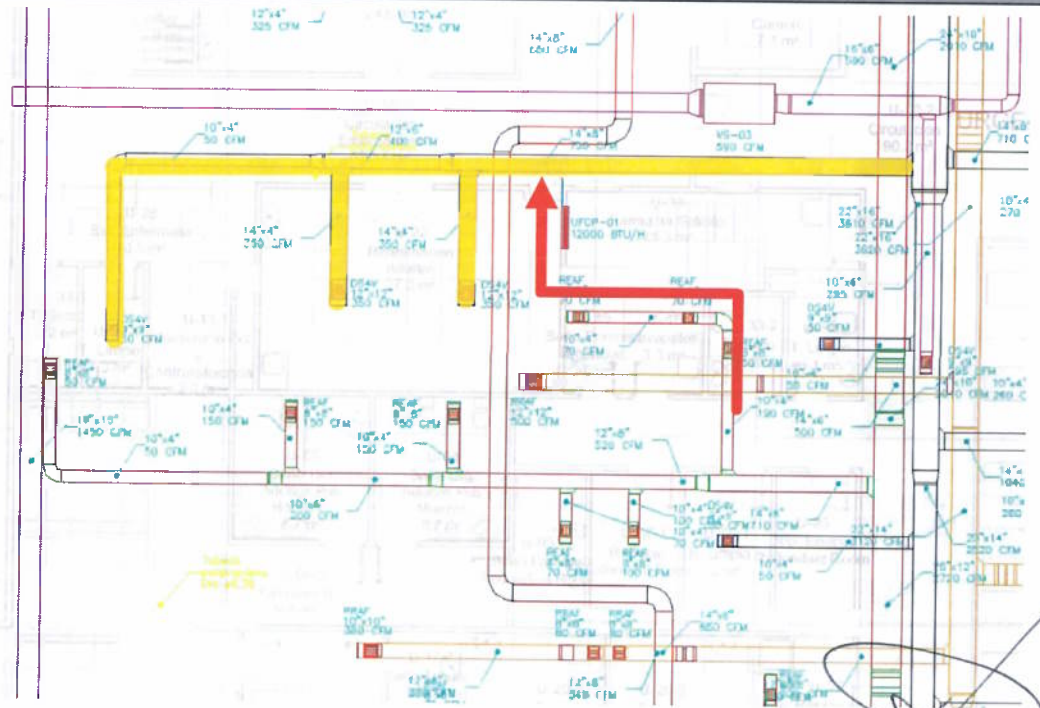

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	060 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°: 20	FECHA: JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM N°:	28.3.1.1	DESCRIPCION ITEM: Cal 24	UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
PRIMER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS URC - 04														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			4	24	0,10
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		14	24	12,94
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,00		4	24	2,84
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	2	24	0,82
REDUCCION	4A	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
ZAPATO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		4	24	0,71
DUCTO	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,20		2	24	0,28
DUCTO	7	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	4,23
DUCTO	8	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,72		1	24	0,59
REDUCCION	9	12	8	0,30	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,27
DUCTO	10	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	1,20		4	24	4,88
DUCTO	11	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,60		1	24	0,61
REDUCCIOM	12	12	8	0,30	0,20	14,00	8,00	0,36	0,20	0,30		1	24	0,00
DUCTO	13	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		3	24	4,36
DUCTO	14	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,96		1	24	1,07
ZAPATO	15	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,28
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		26	24	4,62
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
UNIONES		12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,25		6	24	1,52
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		4	24	1,12
								SUBTOTAL						42,29
								VIENEN						306,54
								PASAN						348,84

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

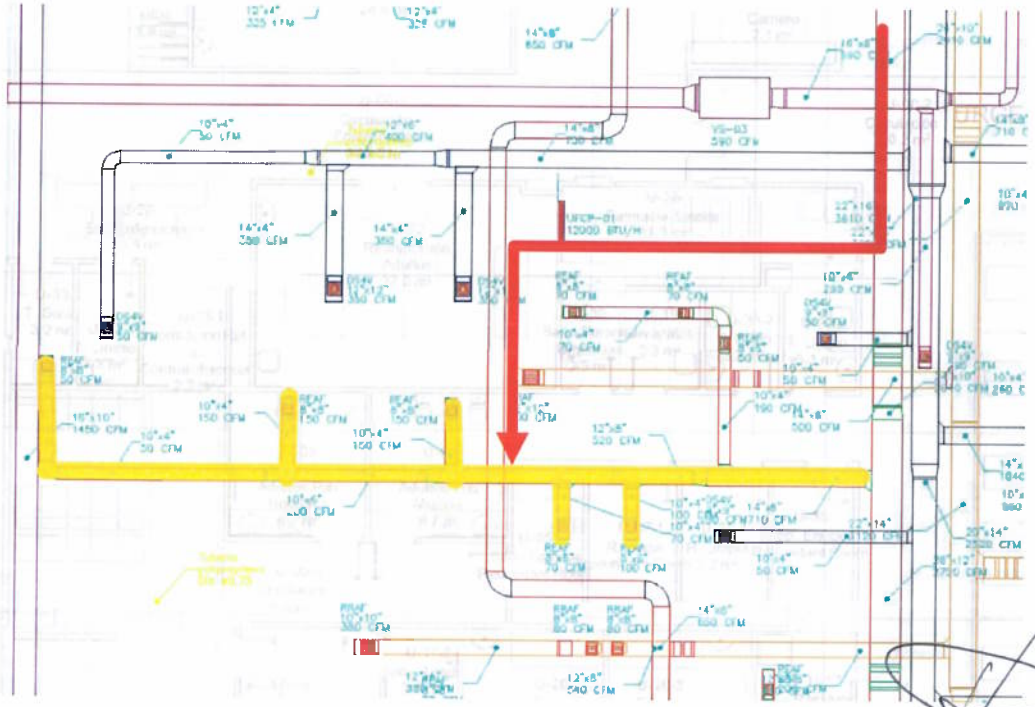

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS VE-09														
TAPA	1	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
DUCTO	3	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,36		1	24	0,29
REDUCCION	4	14	8	0,36	0,20	12,00	4,00	0,30	0,10	0,30		1	24	0,29
DUCTO	5	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		34	24	49,40
DUCTO	6	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,50		4	24	2,24
CODO	7	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00		0,20	6	24	4,24
DUCTO	8	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,22
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,80		3	24	2,68
UNIONES		12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,22
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		46	24	12,85
										SUBTOTAL				79,80
										VIENEN				348,84
										PASAN				428,64

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30		Página 1 de 2	
				Version No. 00			
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

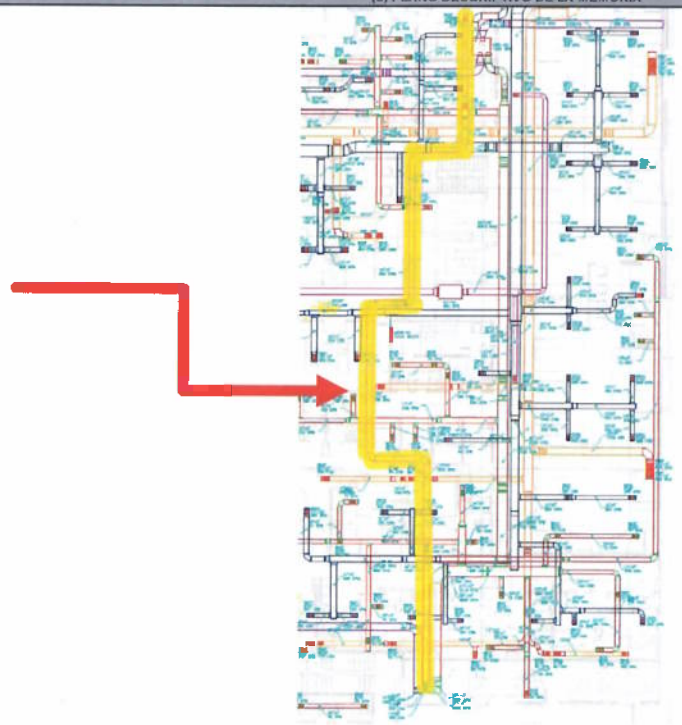

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-05														
TAPA	1	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
DUCTO	3	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,36		1	24	0,29
REDUCCION	4	14	8	0,36	0,20	12,00	4,00	0,30	0,10	0,30		1	24	0,29
DUCTO	5	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		34	24	49,40
DUCTO	6	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,50		4	24	2,24
CODO	7	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00		0,20	6	24	4,24
DUCTO	8	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,22
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,70		2	24	1,56
UNIONES		12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,22
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		46	24	12,85
										SUBTOTAL				78,68
										VIENEN				428,64
										PASAN				507,32

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

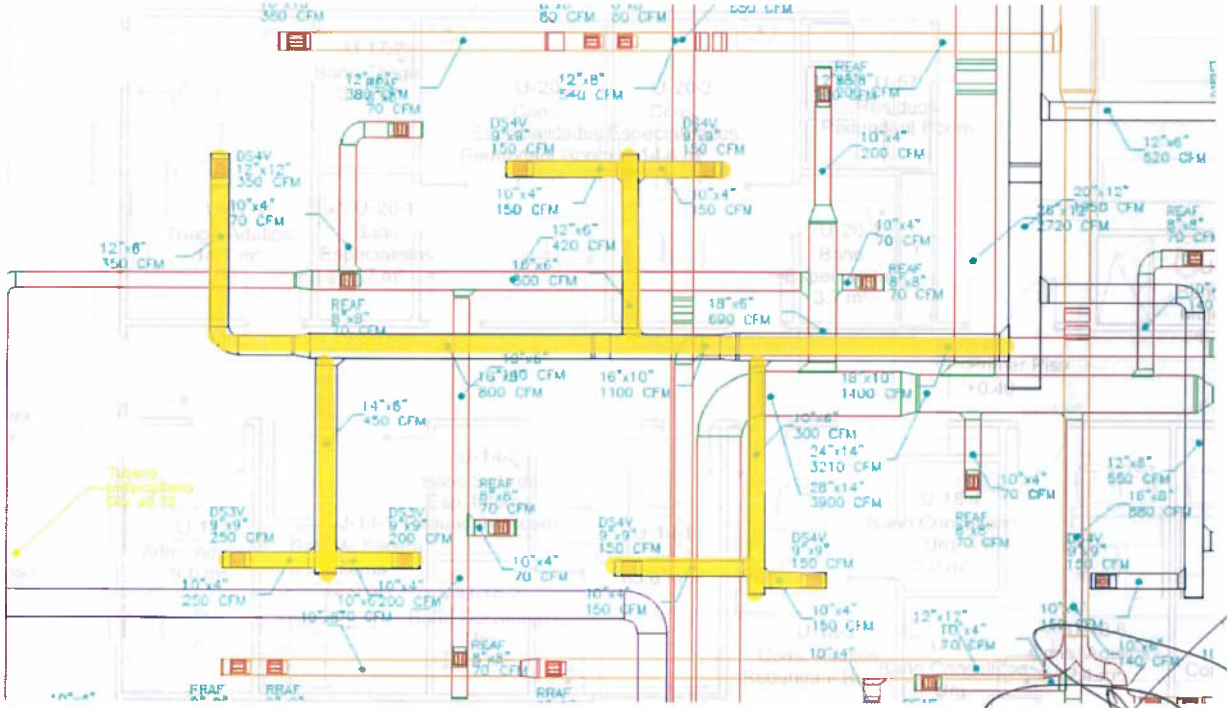

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS VE-10														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
REDUCCION	3	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,20		2	24	1,71
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,20		1	24	0,14
TAPA	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
ZAPATO	7	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	8	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		2	24	1,85
DUCTO	9	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,18		1	24	0,84
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		8	24	2,24
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		5	24	1,02
													SUBTOTAL	14,80
													VIENEN	507,32
													PASAN	522,12

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023		Página 1 de 2	
CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

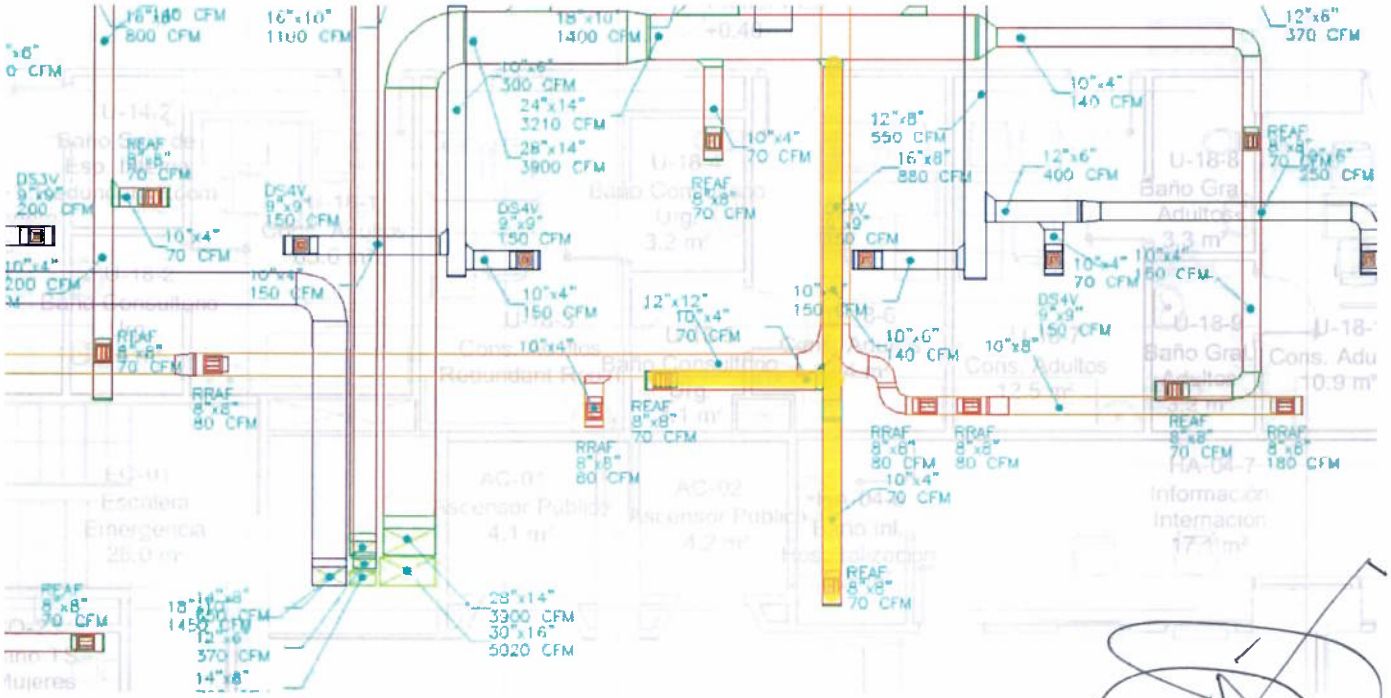

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-33			Página 1 de 2
Versión No. 00			
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS VE-10														
ZAPATO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		1	24	0,92
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,10		1	24	0,07
TAPA	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
										SUBTOTAL				1,55
										VIENEN				522,12
										PASAN				523,67

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

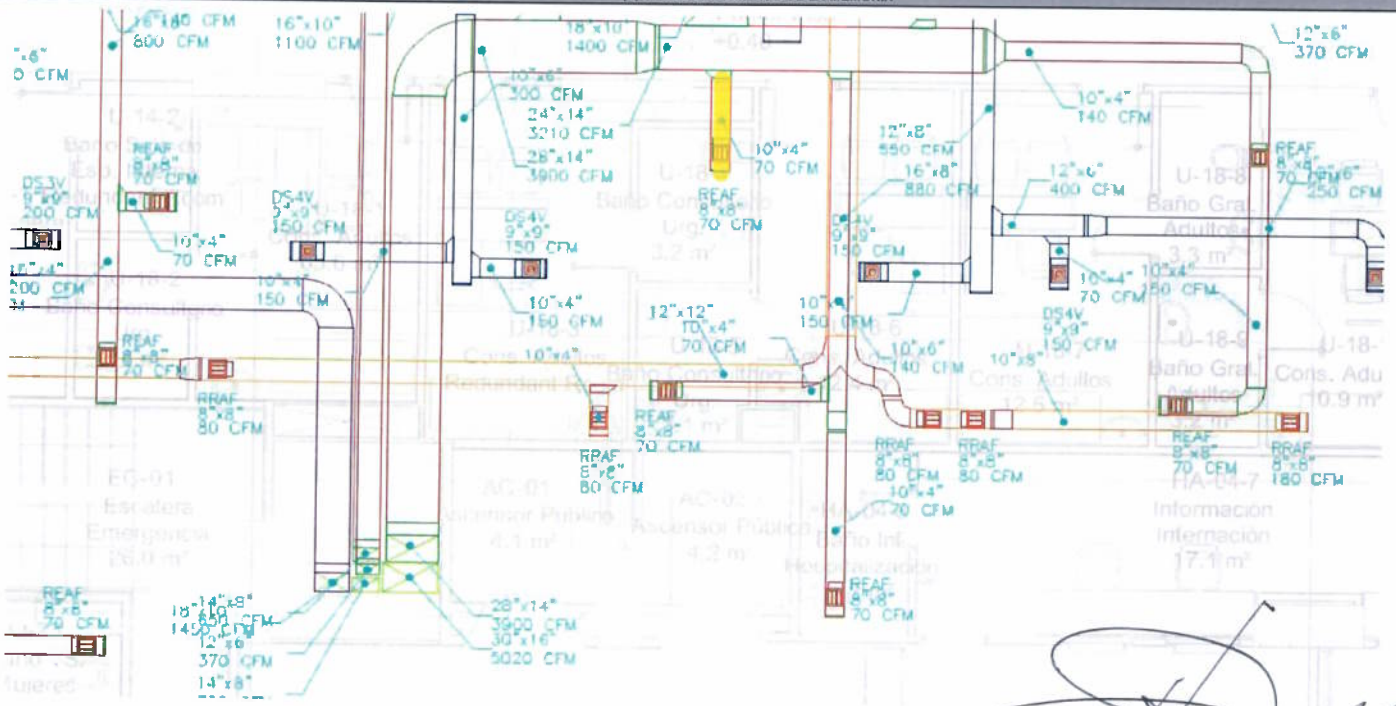

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
TOMA DE AIRE														
EQUIPOS URC-04D														
DUCTO	1	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	1,30		10	24	18,49
DUCTO	2	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,11		1	24	0,16
CODO	3	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,30		1	24	0,51
UNIONES		18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,36
													SUBTOTAL	19,51
													VIENEN	523,67
													PASAN	543,19

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30		Página 1 de 2	
				Version No. 00			
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

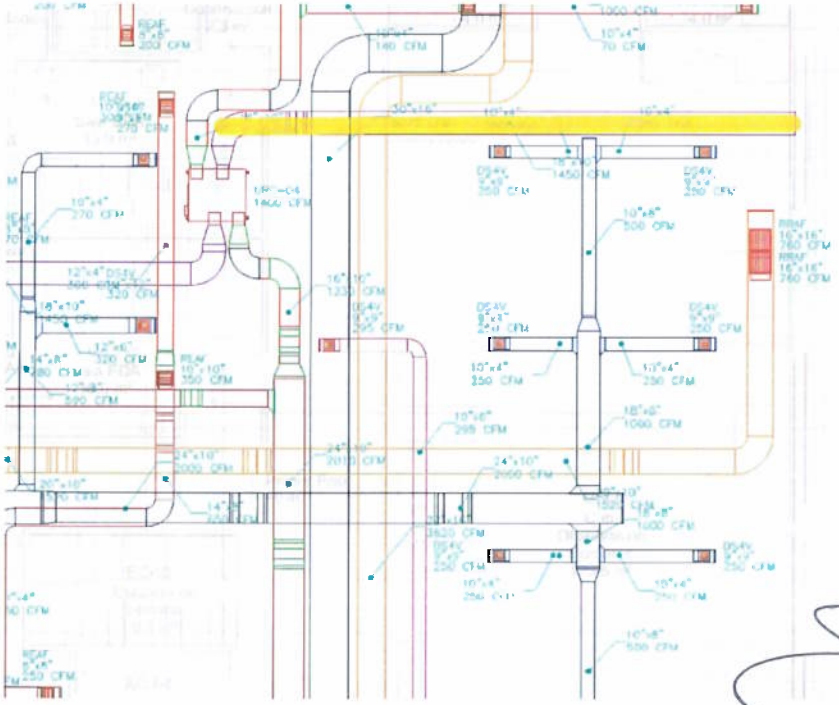

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		9	24	8,32
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,60		1	24	0,43
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,41
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,31		1	24	0,22
ZAPATO	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		11	24	1,96
										SUBTOTAL				11,54
										VIENEN				543,19
										PASAN				554,72

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30		Página 1 de 2	
				Version No. 00			
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

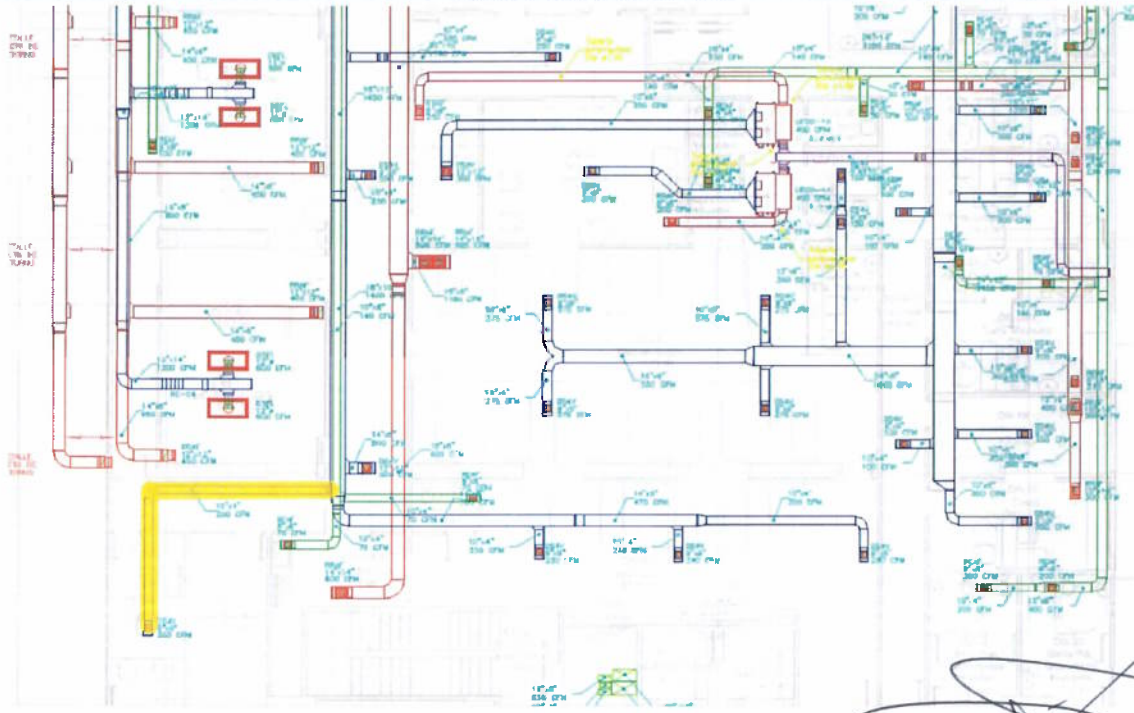

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
TAPA	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
CODO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	2	24	0,92
DUCTO	5	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	5,81
DUCTO	6	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,72		1	24	0,80
REDUCCION	7	24	8	0,61	0,20	16,00	6,00	0,41	0,15	0,30		1	24	0,41
DUCTO	8	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	1,30		4	24	8,45
DUCTO	9	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	0,42		1	24	0,68
ZAPATO	10	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,41
ZAPATO	11	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		2	24	0,41
TAPA	12	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			2	24	0,08
TAPA	13	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,15		1	24	0,82
ZAPATO	15	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,23
DUCTO	16	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	4,75
DUCTO	17	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,28		1	24	0,26
REDUCCION	18	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		12	24	2,44
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		5	24	1,14
UNIONES		16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,25		6	24	1,68
UNIONES		24	8	0,61	0,20	16,00	6,00	0,41	0,15	0,25		6	24	2,06
										SUBTOTAL				39,16
										VIENEN				554,72
										PASAN				593,89

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30		
				Version No. 00		Página 1 de 2
				Fecha:	5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

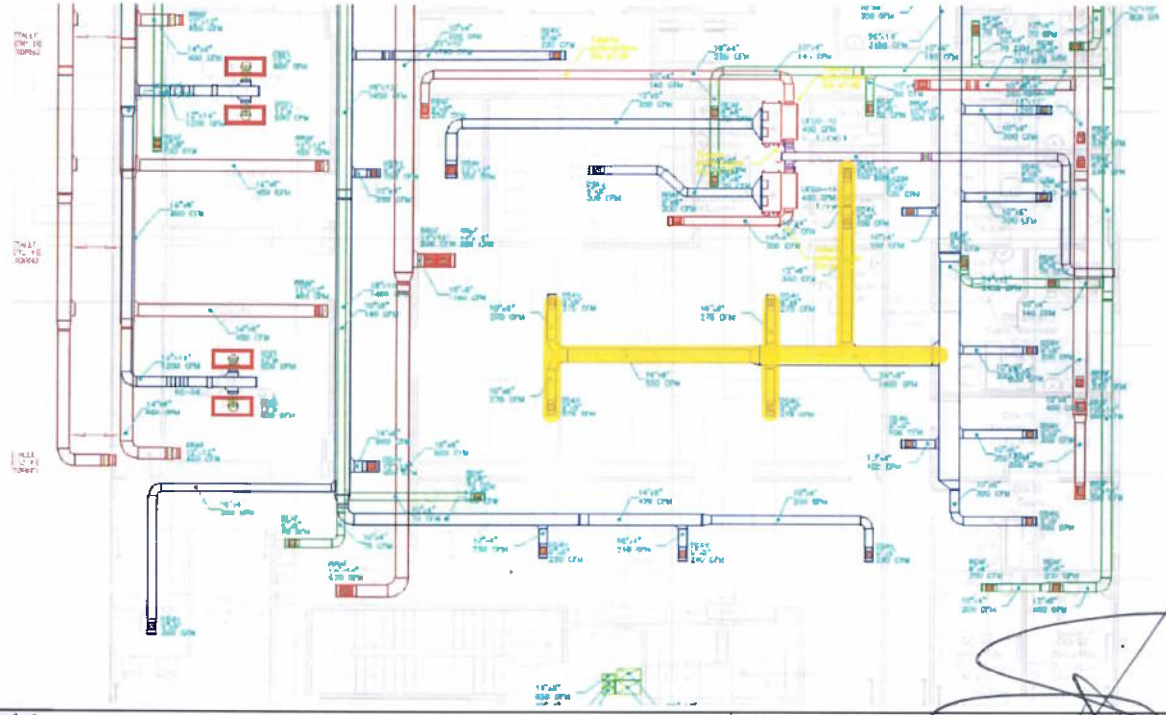


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

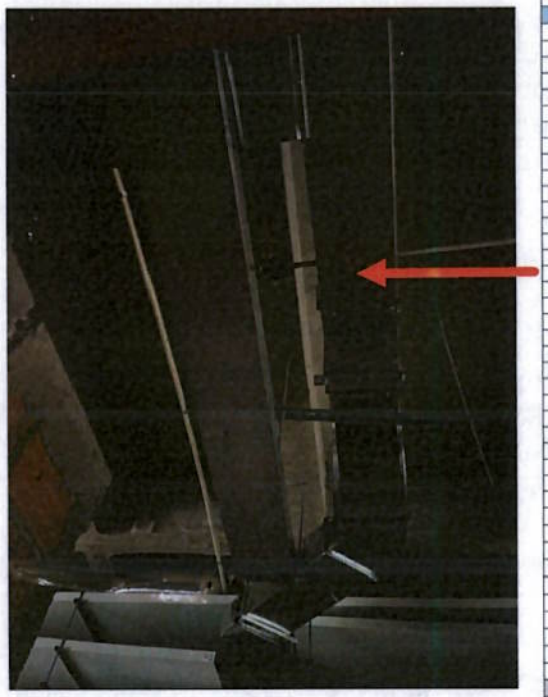

NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UFCO-11														
TAPA	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,85		3	24	2,07
SEMICODO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	2	24	0,92
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		8	24	1,63
										SUBTOTAL				6,77
										VIENEN				593,89
										PASAN				600,66

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

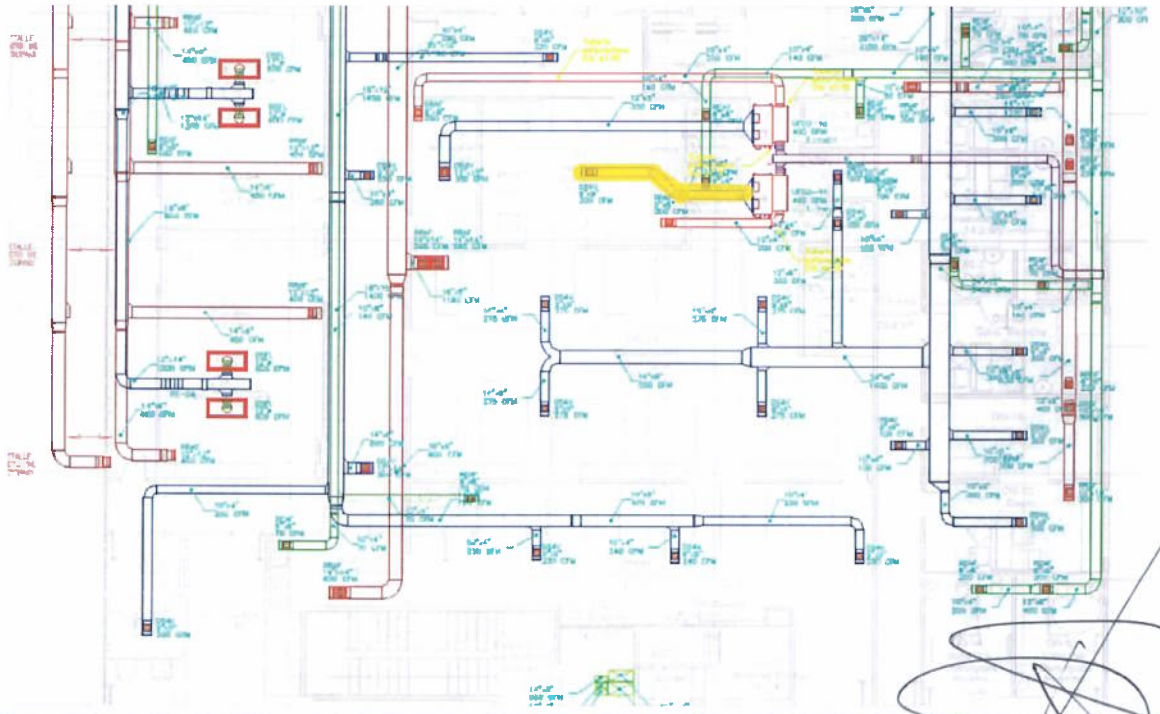

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UFCO-10														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		9	24	8,32
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,15		1	24	0,11
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	2	24	0,92
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,37		1	24	0,92
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		12	24	2,13
												SUBTOTAL		12,43
												VIENEN		600,66
												PASAN		613,09

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

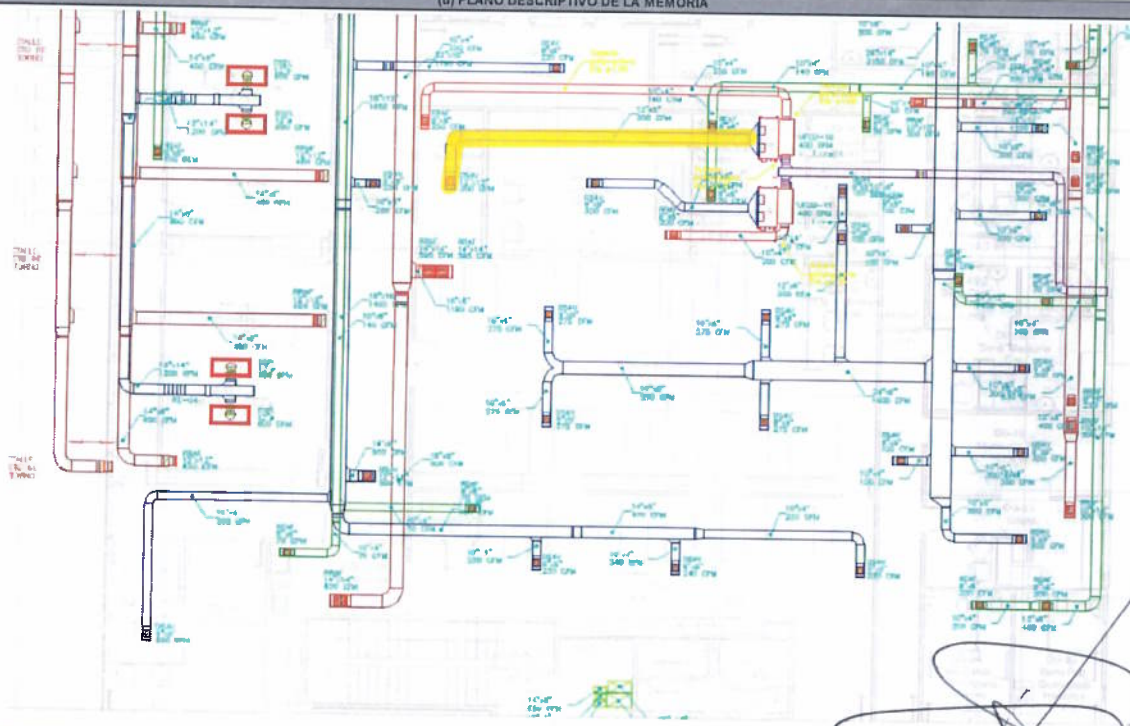

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 09			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,70		1	24	0,57
CODO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	1	24	0,46
DUCTO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,15
DUCTO	5	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,00		1	24	0,92
TAPA	6	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,92
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		5	24	1,02
										SUBTOTAL				5,24
										VIENEN				613,09
										PASAN				618,33

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-33			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

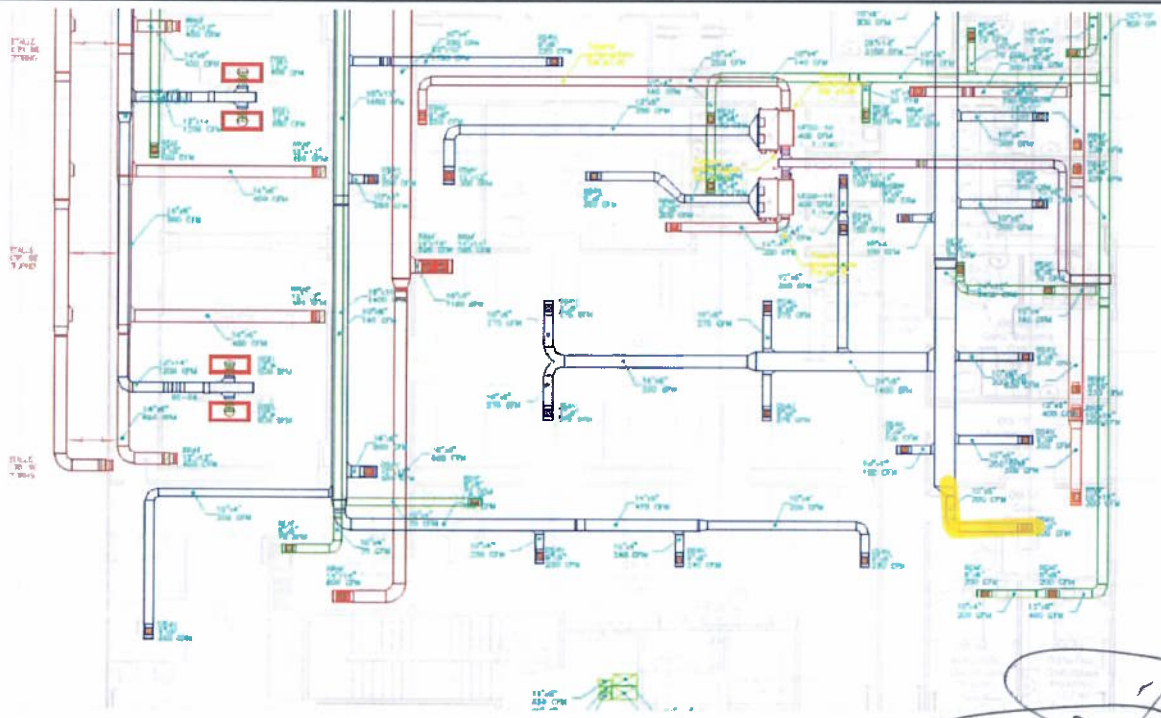

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,10		1	24	0,78
TAPA	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
													SUBTOTAL	1,34
													VIENEN	618,33
													PASAN	619,67

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

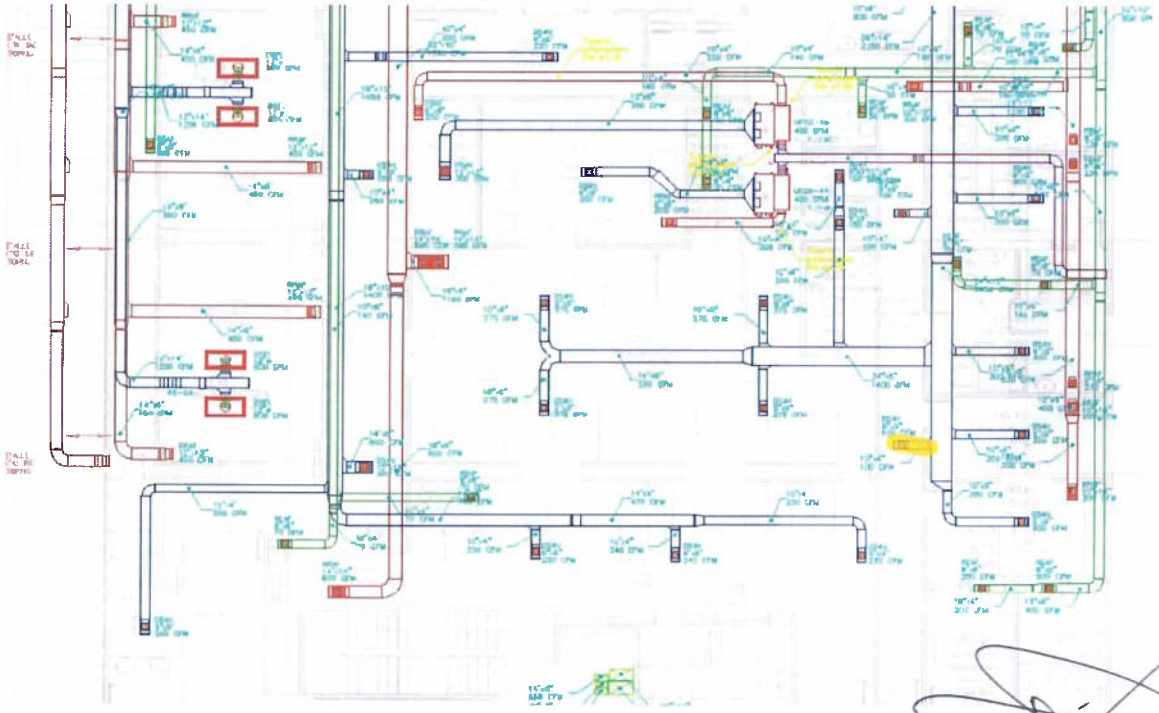

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			
Version No. 09			Página 1 de 2
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,15		1	24	0,93
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
SUBTOTAL														2,84
VIENEN														619,67
PASAN														622,51

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 09			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

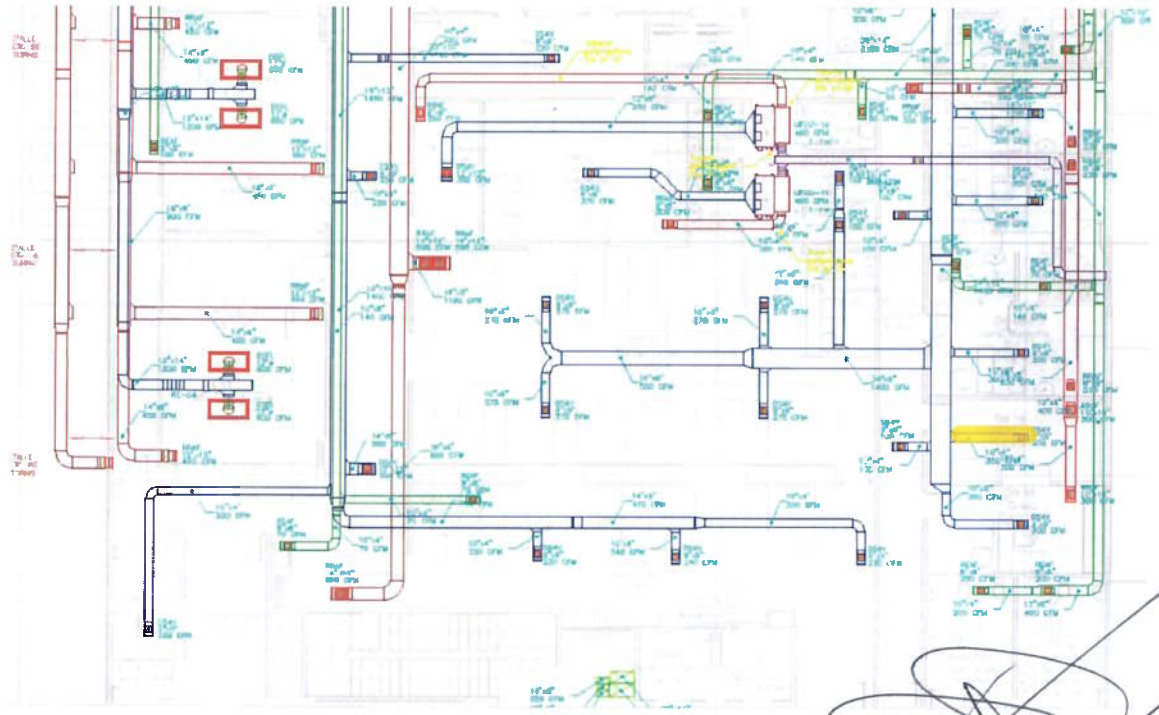

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		

CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,01		1	24	0,82
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
													SUBTOTAL	2,73
													VIENEN	622,51
													PASAN	625,24

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

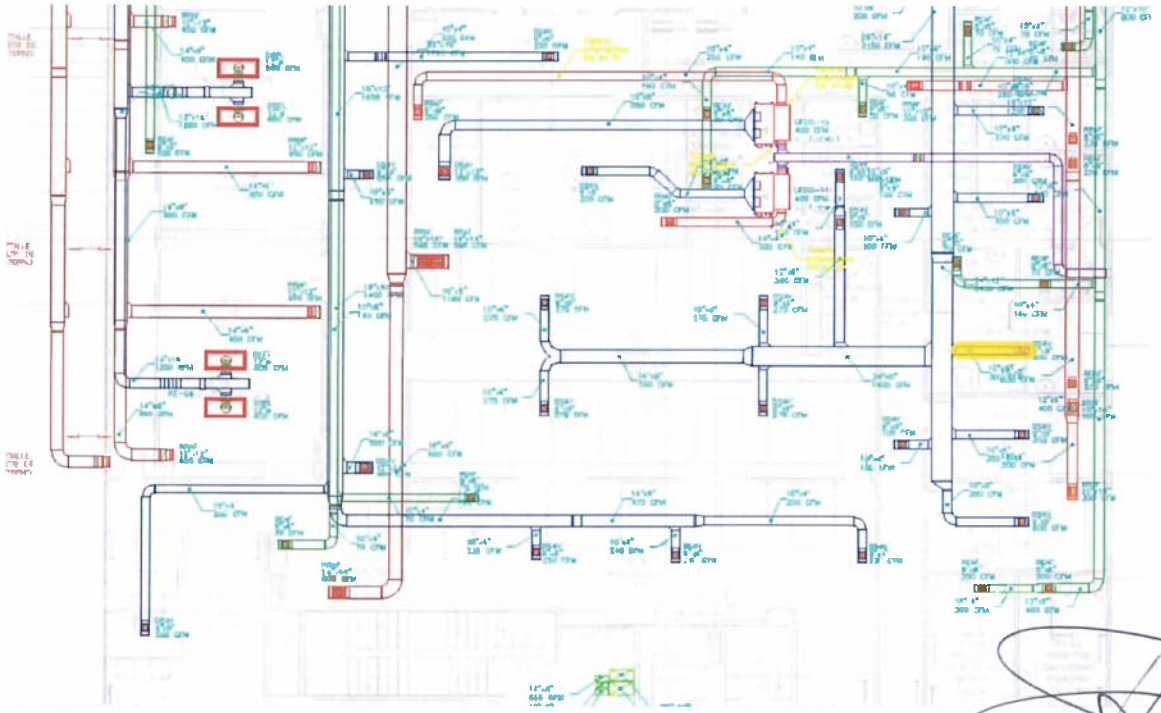

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,21		1	24	0,17
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
										SUBTOTAL				3,34
										VIENEN				625,24
										PASAN				628,58

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: FA-FO-30		Página 1 de 2	
				Version No. 00			
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

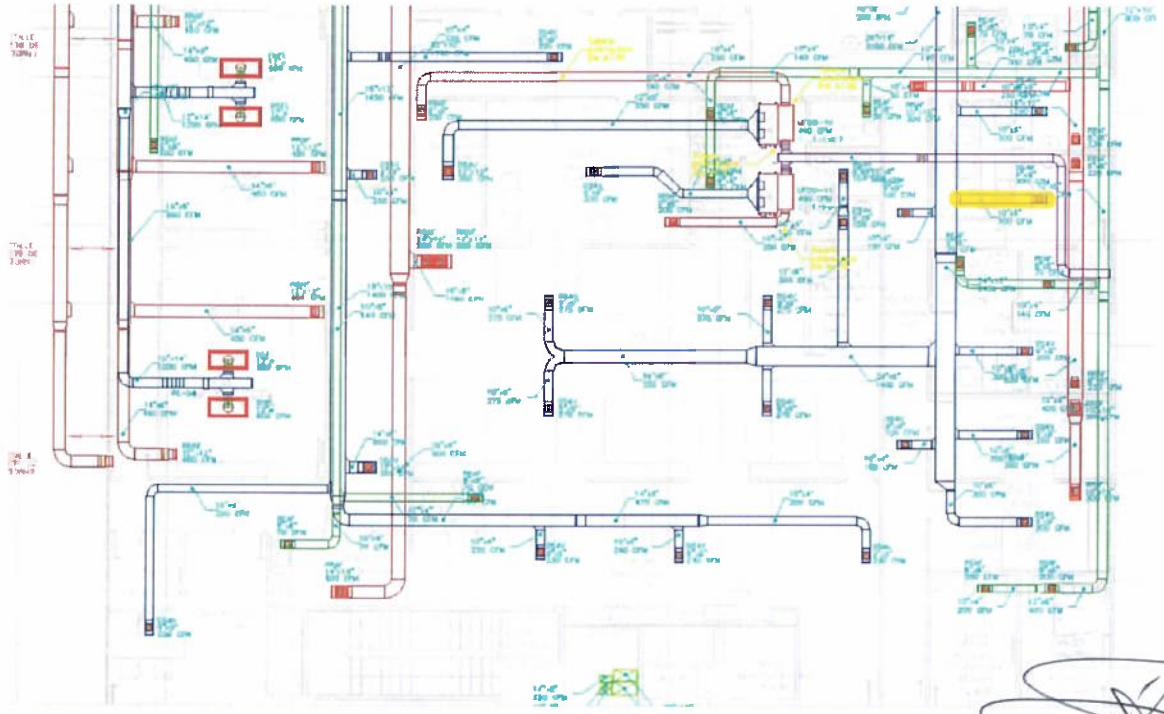

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,21		1	24	0,17
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
													SUBTOTAL	3,34
													VIENEN	628,58
													PASAN	631,92

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE CONVOCATORIA	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha:	5	4	Página 1 de 2 2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

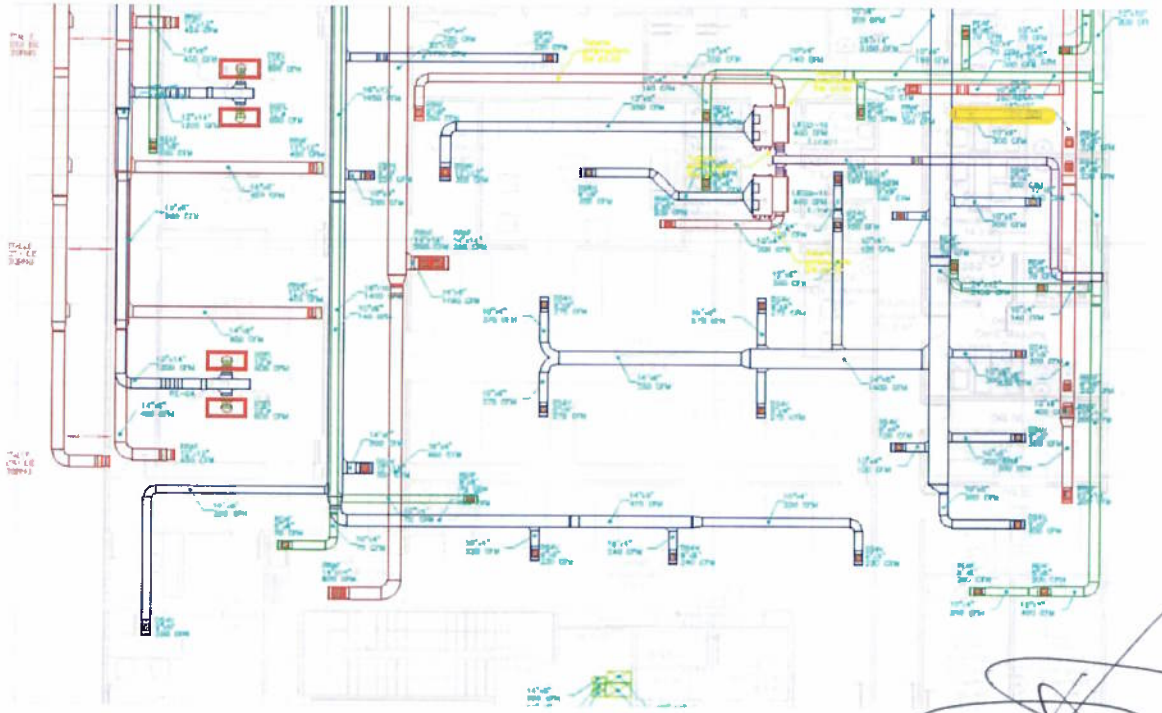

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha.	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,15		1	24	0,82
TAPA	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
									SUBTOTAL					1,38
									VIENEN					631,92
									PASAN					633,29

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 06 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

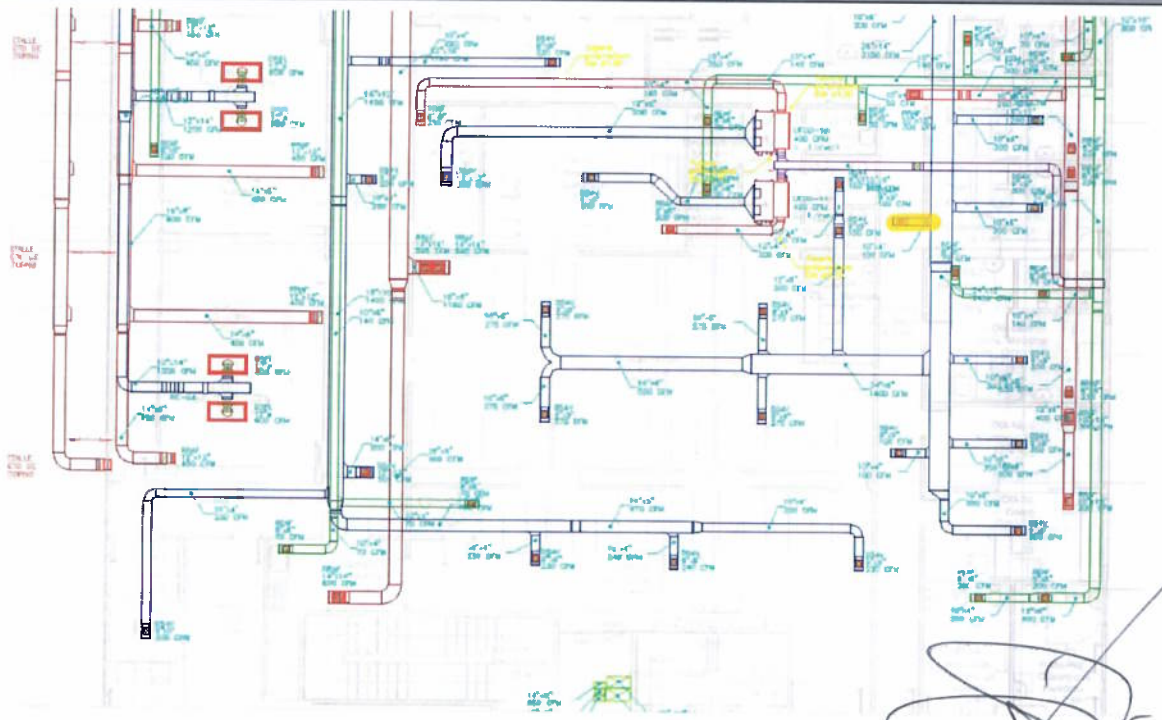


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

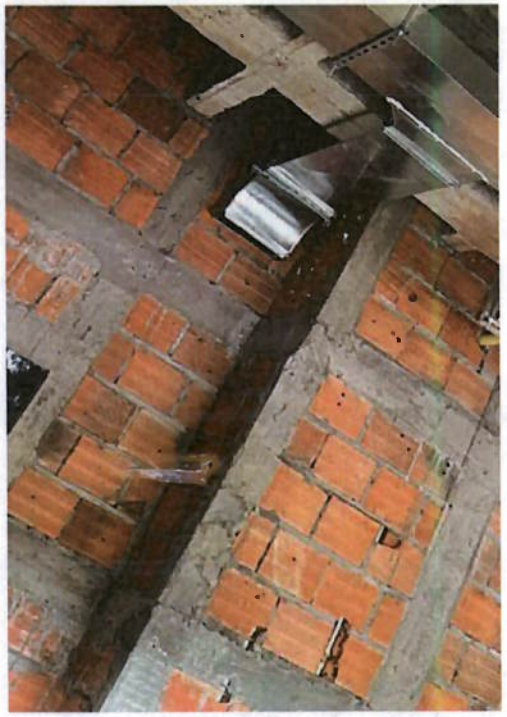

NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,22		1	24	0,18
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
										SUBTOTAL				2,09
										VIENEN				633,29
										PASAN				635,38

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-33			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

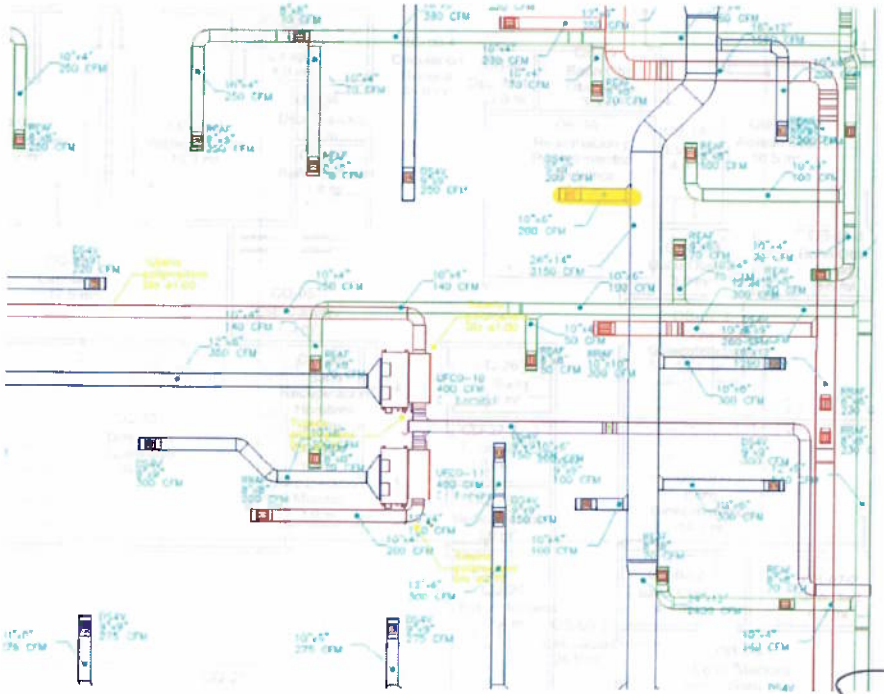

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	060 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
RETORNO														
EQUIPOS UFCO-11														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		3	24	2,77
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,94		1	24	0,67
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,41
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		4	24	0,71
										SUBTOTAL				4,59
										VIENEN				635,38
										PASAN				639,97

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

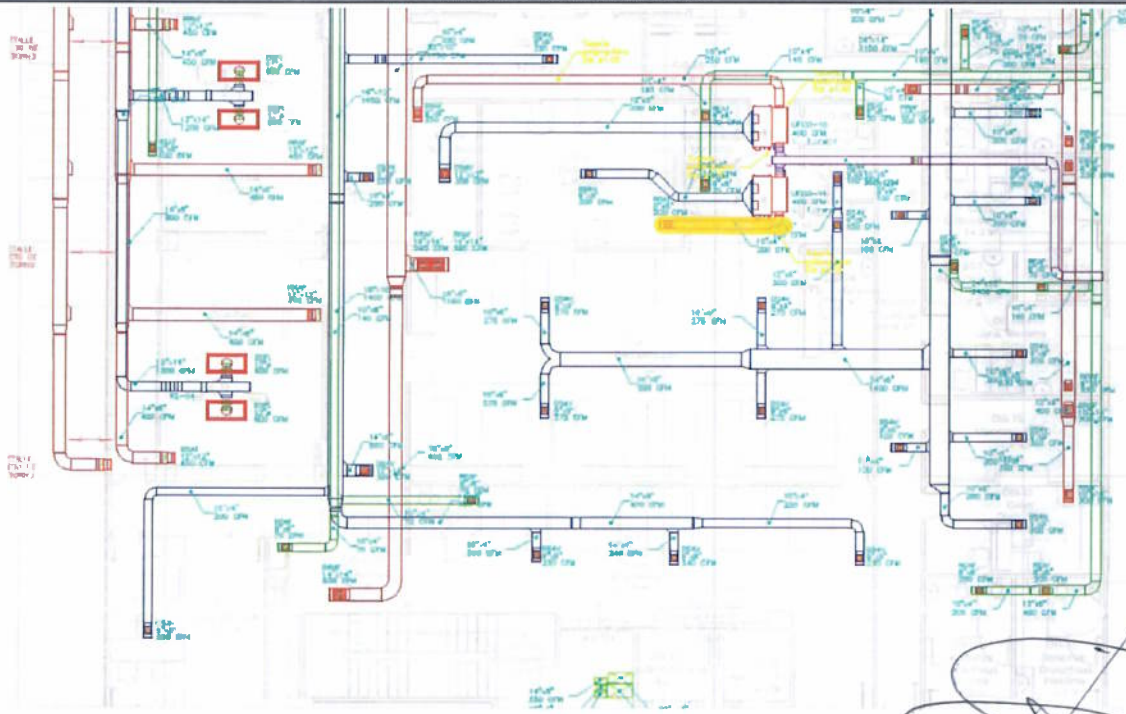

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
RETORNO														
EQUIPOS UFCO-10														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,04		2	24	1,48
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	2	24	0,82
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		9	24	8,32
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,37		1	24	0,26
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		14	24	2,49
												SUBTOTAL		13,39
												VIENEN		639,97
												PASAN		653,36

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

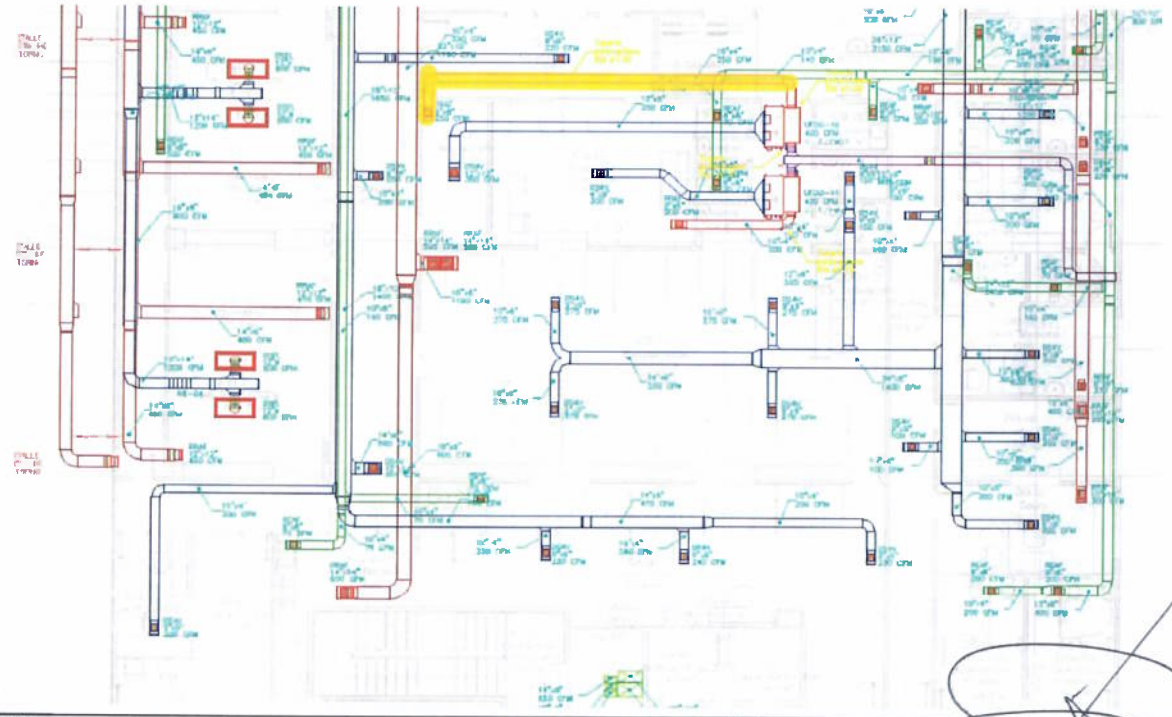

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-12														
DUCTO	1	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	1,30		9	24	14,26
CODO	2	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00		0,20	1	24	0,67
DUCTO	3	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	0,95		1	24	1,16
REDUCCION	4	14	16	0,36	0,41	10,00	14,00	0,25	0,36	0,30		1	24	0,41
DUCTO	5	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	1,30		9	24	17,83
DUCTO	6	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	0,80		1	24	1,22
TAPA	7	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00			1	24	0,14
ZAPATO	8	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	9	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		3	24	2,77
TAPA	10	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	0,25		10	24	3,05
UNIONES		14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	0,25		12	24	4,57
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		3	24	0,53
								SUBTOTAL						46,83
								VIENEN						653,36
								PASAN						700,19

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE TRANSICIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06			Página 1 de 2
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

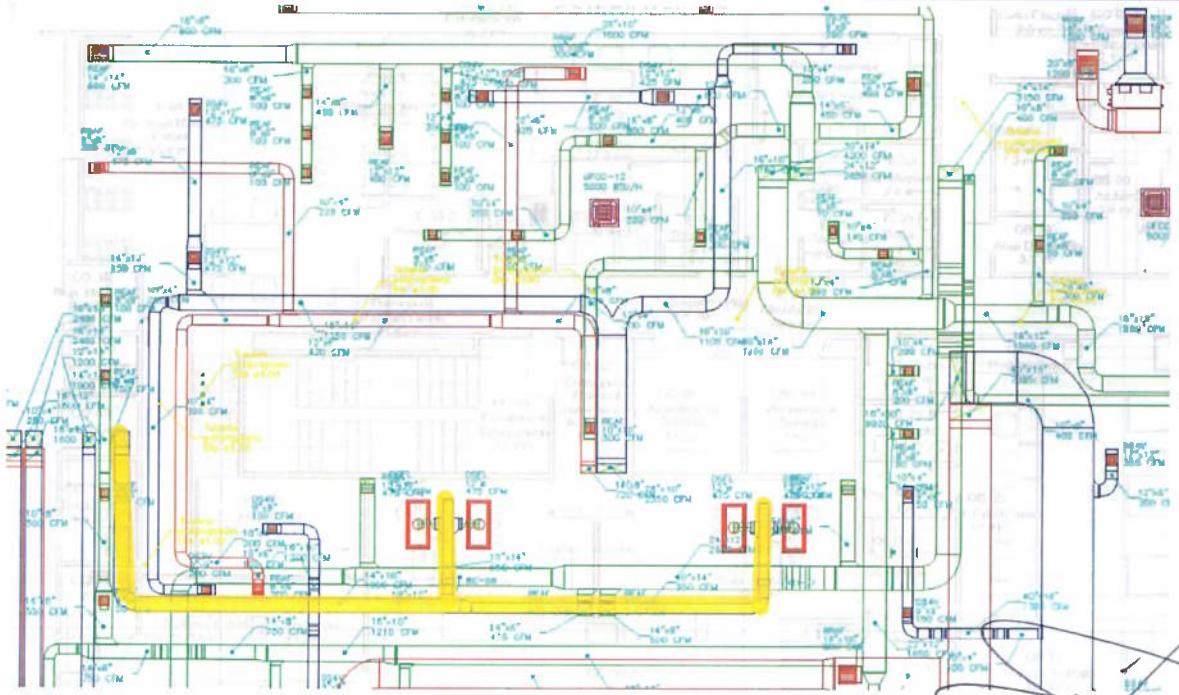

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-14														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		10	24	9,25
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	3	24	1,22
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,71		2	24	1,01
REDUCCION	5	16	10	0,41	0,25	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,30
DUCTO	6	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		15	24	25,76
DUCTO	7	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,35		3	24	1,39
CODO	8	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00		0,30	3	24	3,42
REDUCCION	9	16	10	0,41	0,25	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,30
ZAPATO	10	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,30
DUCTO	10A	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	1,30		3	24	4,75
DUCTO	11	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,24
REDUCCION	12	16	8	0,41	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15			1	24	0,00
DUCTO	13	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		3	24	3,57
DUCTO	14	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,60		1	24	0,55
TAPA	15	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
ZAPATO	16	14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,30
DUCTO	17	14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	1,15		1	24	1,40
REDUCCION	18	14	10	0,36	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,32
DUCTO	19	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,00		1	24	0,91
DUCTO	20	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	1,30		2	22	5,02
DUCTO	21	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	0,70		1	22	1,35
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		17	24	3,02
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		10	24	2,29
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		18	24	5,94
UNIONES		16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		3	24	0,91
UNIONES		14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	0,25		2	24	0,61
									SUBTOTAL					74,26
									VIENEN					700,19
									PASAN					774,45

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

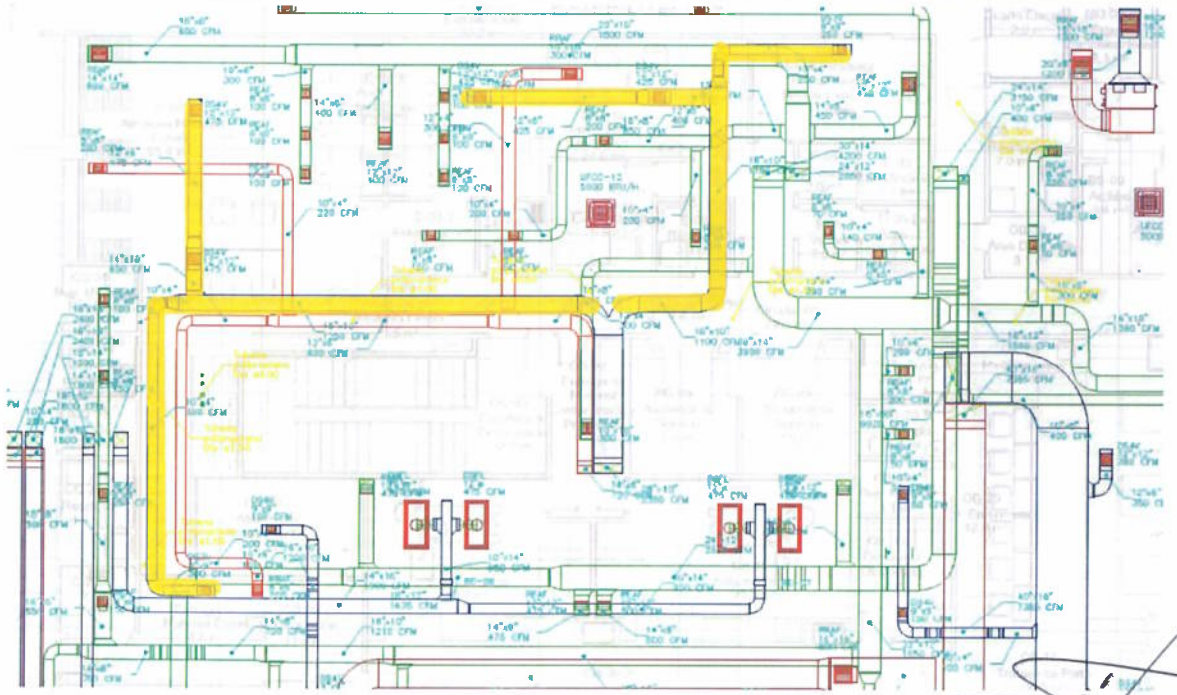

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Version No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
SEGUNDO PISO														
RETORNO														
EQUIPOS UMAE-14														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,55		1	24	0,39
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	4	24	1,63
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		14	24	12,94
DUCTO	4A	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,05		2	24	1,49
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,20		1	24	0,14
DUCTO	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,80		2	24	1,14
REDUCCION	7	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
DUCTO	8	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	7,13
DUCTO	9	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,40		1	24	0,37
REDUCCION	10	14	8	0,36	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	11	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		4	24	5,81
DUCTO	12	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,75		2	24	1,68
CODO	13	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00		0,30	1	24	0,94
ZAPATO	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
ZAPATO	15	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	16	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	1,30		5	24	5,28
DUCTO	17	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,80		1	24	0,65
CODO	18	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00		0,30	1	24	0,67
DUCTO	19	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,30		1	24	0,24
TAPA	20	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		23	24	4,09
UNIONES	8	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		6	24	1,37
UNIONES	11	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		7	24	1,96
UNIONES	16	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,25		9	24	1,83
										0,25				
SUBTOTAL														50,77
VIENEN														774,45
PASAN														825,23

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Version No. 00			Página 1 de 2
				Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

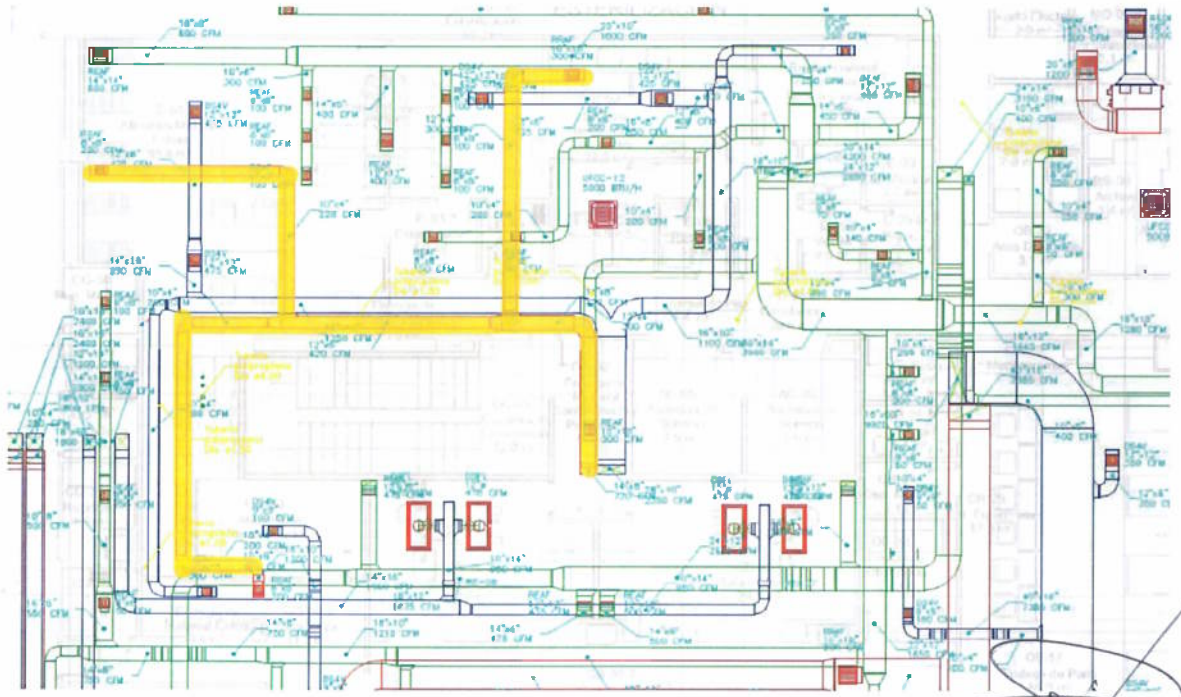

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-33			
Versión No. 00			Página 1 de 2
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS VE-08														
DUCTO	5	16	12	0,41	0,30			0,00	0,00	1,30		1	24	1,85
DUCTO	6	16	12	0,41	0,30			0,00	0,00	1,07		1	24	1,52
REDUCCION	7	16	12	0,41	0,30	16,00	10,00	0,41	0,25	0,30		1	24	0,41
DUCTO	8	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,30		1	24	0,40
CODO	9	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00		0,30	1	24	1,14
DUCTO	10	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,05		2	24	2,77
DUCTO	11	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		22	24	37,77
DUCTO	12	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,75		1	24	0,99
REDUCCION	13	16	10	0,41	0,25	12,00	10,00	0,30	0,25	0,30		1	24	0,37
DUCTO	14	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	1,30		4	24	5,81
DUCTO	15	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,85		1	24	0,95
REDUCCION	16	12	10	0,30	0,25	12,00	8,00	0,30	0,20	0,30		1	24	0,32
DUCTO	17	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	1,30		5	24	6,60
DUCTO	18	12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,20
REDUCCION	19	12	8	0,30	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,29
DUCTO	20	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,20		8	24	8,78
DUCTO	21	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,10		1	24	0,09
CODO	22	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00		0,30	2	24	1,49
REDUCCION	23	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
DUCTO	24	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		13	24	12,02
DUCTO	25	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,55		3	24	1,17
TAPA	26	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			4	24	0,10
REDUCCION	27	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
ZAPATO	28	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	29	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
ZAPATO	30	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
UNIONES		16	12	0,41	0,30			0,00	0,00	0,25		5	24	1,78
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		26	24	8,59
UNIONES		12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,25		6	24	1,68
UNIONES		12	8	0,30	0,20			0,00	0,00	0,25		7	24	1,78
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		13	24	2,97
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		18	24	3,20
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		8	24	1,63
								SUBTOTAL						113,87
								VIENEN						825,23
								PASAN						939,09

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

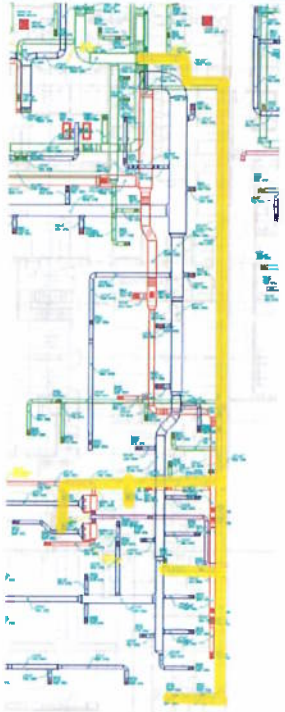


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
SAN VICENTE CONSORCIO		Versión No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24
		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

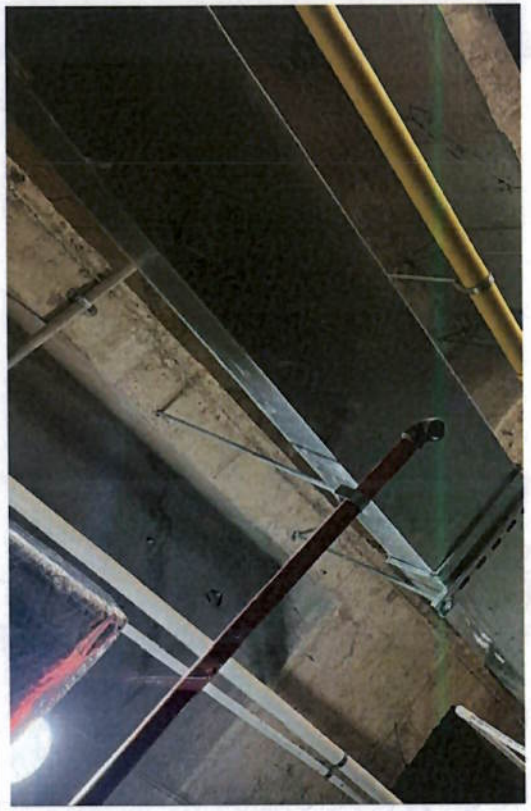

NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
TERCER PISO														
EXTRACCION														
EQUIPO URC-12														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			17	24	0,44
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		29	24	26,81
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,40		9	24	2,56
DUCTO	3A	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,60		1	24	0,43
ZAPATO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		12	24	2,13
DUCTO	5	26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	1,30		1	24	2,38
DUCTO	6	26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	0,65		1	24	1,19
REDUCCION	7	26	10	0,66	0,25	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,38
DUCTO	8	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,95		6	24	4,05
DUCTO	8A	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,10		4	24	3,13
CODO	9	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	7	24	2,86
ZAPATO	10	26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,46
DUCTO	11	26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	1,30		7	24	16,64
DUCTO	12	26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	0,70		1	24	1,28
REDUCCION	13	26	10	0,66	0,25	16,00	10,00	0,41	0,25	0,30		1	24	0,47
CODO	14	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00		0,10	2	24	1,28
DUCTO	15	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,30		1	24	0,40
DUCTO	16	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		8	24	13,74
DUCTO	17	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,40		1	24	0,53
REDUCCION	18	16	10	0,41	0,25	16,00	8,00	0,41	0,20	0,30		1	24	0,38
DUCTO	19	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	1,20		12	24	17,56
DUCTO	20	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,24
REDUCCION	21	16	8	0,41	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	22	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		5	24	5,28
DUCTO	23	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,26		2	24	0,42
CODO	24	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	1	24	0,46
REDUCCION	24A	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
ZAPATO	25	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,25
DUCTO	26	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	7,92
DUCTO	27	14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,70		1	24	0,71
REDUCCION	28	14	6	0,36	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,26
ZAPATO	29	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
ZAPATO	30	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,33
DUCTO	31	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	1,30		1	24	1,72
DUCTO	32	18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,36		1	24	0,48
REDUCCION	33	18	8	0,46	0,20	14,00	8,00	0,36	0,20	0,30		1	24	0,37
CODO	34	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,31
DUCTO	35	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		6	24	8,72
DUCTO	36	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,40		1	24	0,45
REDUCCION	37	14	8	0,36	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,29
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		83	24	14,76
UNIONES		26	10	0,66	0,25			0,00	0,00	0,25		12	24	5,49
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		27	24	8,92
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		10	24	2,03
UNIONES		14	6	0,36	0,15			0,00	0,00	0,25		8	24	2,03
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		8	24	2,24
UNIONES		18	8	0,46	0,20			0,00	0,00	0,25		4	24	1,32
SUBTOTAL														164,82
VIENEN														939,09
PASAN														1103,91

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

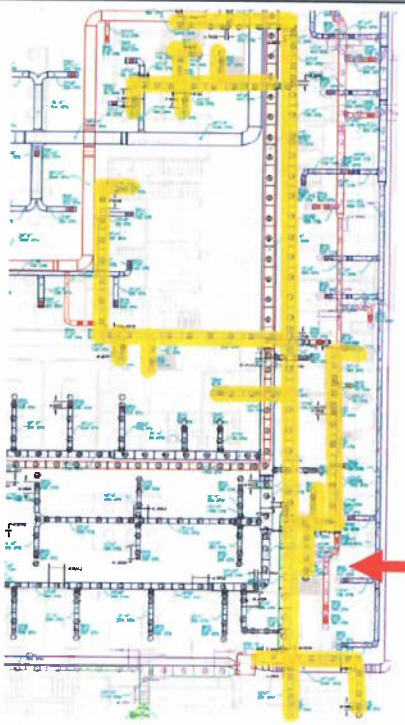


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

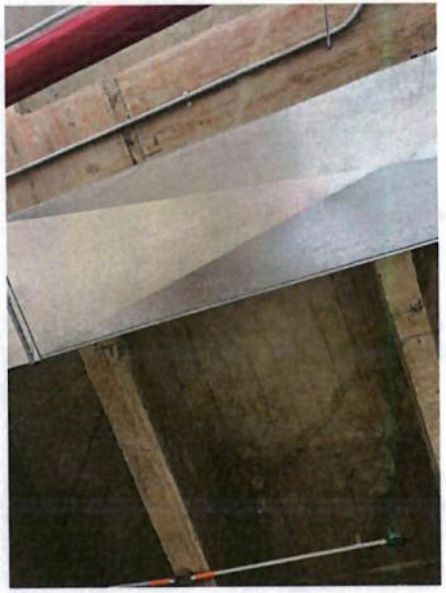

NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
TERCER PISO														
RETORNO														
EQUIPO UMAE-17														
TAPA	1	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00			1	24	0,06
DUCTO	2	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	1,30		23	24	33,42
DUCTO	3	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,60		4	24	2,68
CODO	4	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00		0,10	2	24	1,09
DUCTO	5	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,10		1	24	0,11
CODO	6	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00		0,30	2	24	1,96
REDUCCION	7	24	10	0,61	0,25	16,00	6,00	0,41	0,15	0,30		1	24	0,43
DUCTO	8	24	10	0,61	0,25			0,00	0,00	1,30		31	24	69,61
DUCTO	9	24	10	0,61	0,25			0,00	0,00	0,90		2	24	3,11
CODO	10	24	10	0,61	0,25			0,00	0,00		0,40	2	24	4,17
ZAPATO	11	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	12	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		2	24	1,85
DUCTO	13	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,40		1	24	0,28
TAPA	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,25		31	24	8,66
UNIONES		24	10	0,61	0,25			0,00	0,00	0,25		34	24	14,68
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		5	24	0,89
													SUBTOTAL	143,20
													VIENEN	1103,91
													PASAN	1247,11

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36 Version No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

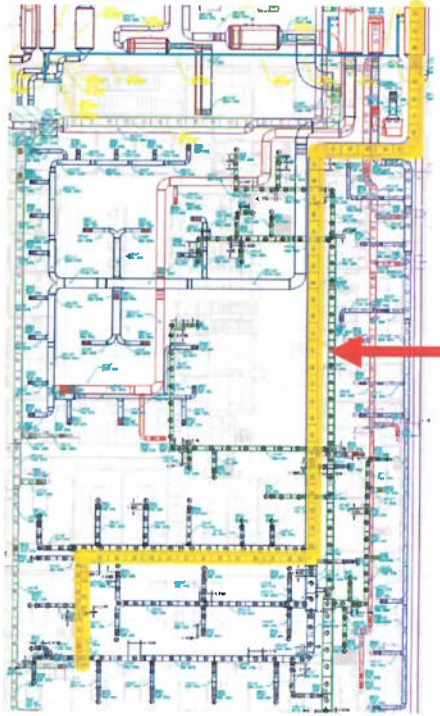

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00			Página 1 de 2	
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM Nº:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
TERCER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPO UMAE-17														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			16	24	0,41
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		28	24	25,89
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,40		14	24	3,98
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	3	24	1,22
REDUCCION	5	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
DUCTO	6	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		8	24	8,45
DUCTO	7	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,80		7	24	4,55
REDUCCION	8	14	8	0,36	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,29
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		2	24	2,91
DUCTO	10	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,90		1	24	1,01
REDUCCION	11	16	8	0,41	0,20	14,00	8,00	0,36	0,20	0,30		1	24	0,35
DUCTO	12	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	1,30		8	24	12,68
DUCTO	13	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,91		1	24	1,11
REDUCCION	14	16	10	0,46	0,25	16,00	8,00	0,41	0,20	0,30		1	24	0,40
DUCTO	15	16	10	0,46	0,25			0,00	0,00	1,30		4	24	7,40
DUCTO	16	16	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,20		2	24	0,57
CODO	17	16	10	0,46	0,25			0,00	0,00		0,30	1	24	1,28
ZAPATO	26	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,07
ZAPATO	27	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,33
DUCTO	28	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		7	24	12,02
DUCTO	29	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,10		2	24	0,26
REDUCCION	30	16	10	0,41	0,25	12,00	10,00	0,30	0,25	0,30		1	24	0,37
DUCTO	31	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	1,30		4	24	5,81
DUCTO	32	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,85		1	24	0,95
REDUCCION	33	12	10	0,30	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	34	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		5	24	5,94
DUCTO	35	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,20		1	24	0,18
CODO	36	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00		0,30	2	24	1,49
TAPA	37	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			6	24	0,23
ZAPATO	38	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
ZAPATO	39	20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,38
DUCTO	40	20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	1,30		7	24	13,87
REDUCCION	41	20	10	0,51	0,25	16,00	10,00	0,41	0,25	0,30		1	24	0,43
REDUCCION	42	16	10	0,41	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,34
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		66	24	11,73
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		23	24	4,67
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		4	24	1,12
UNIONES		16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		8	24	2,44
UNIONES		16	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,25		8	24	2,84
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		11	24	3,63
UNIONES		12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,25		6	24	1,68
UNIONES		20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	0,25		9	24	3,43
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,20		7	24	1,26
UNIONES		28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,25		4	22	2,03
UNIONES		32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	0,25		41	22	23,03
									SUBTOTAL					174,79
									VIENEN					1247,11
									PASAN					1421,90

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30					
		Version No. 00				Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023		

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

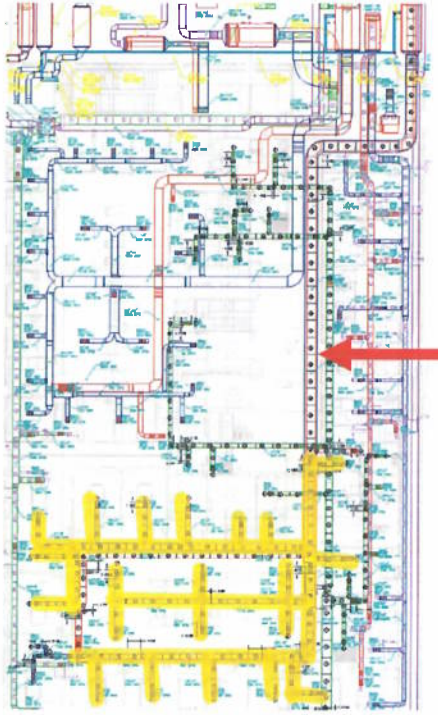

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2025	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-14														
DUCTO	20	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	1,20		2	22	4,63
DUCTO	21	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	0,70		1	22	1,35
UNIONES		28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	0,25		4	22	1,93
SUBTOTAL														7,91

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

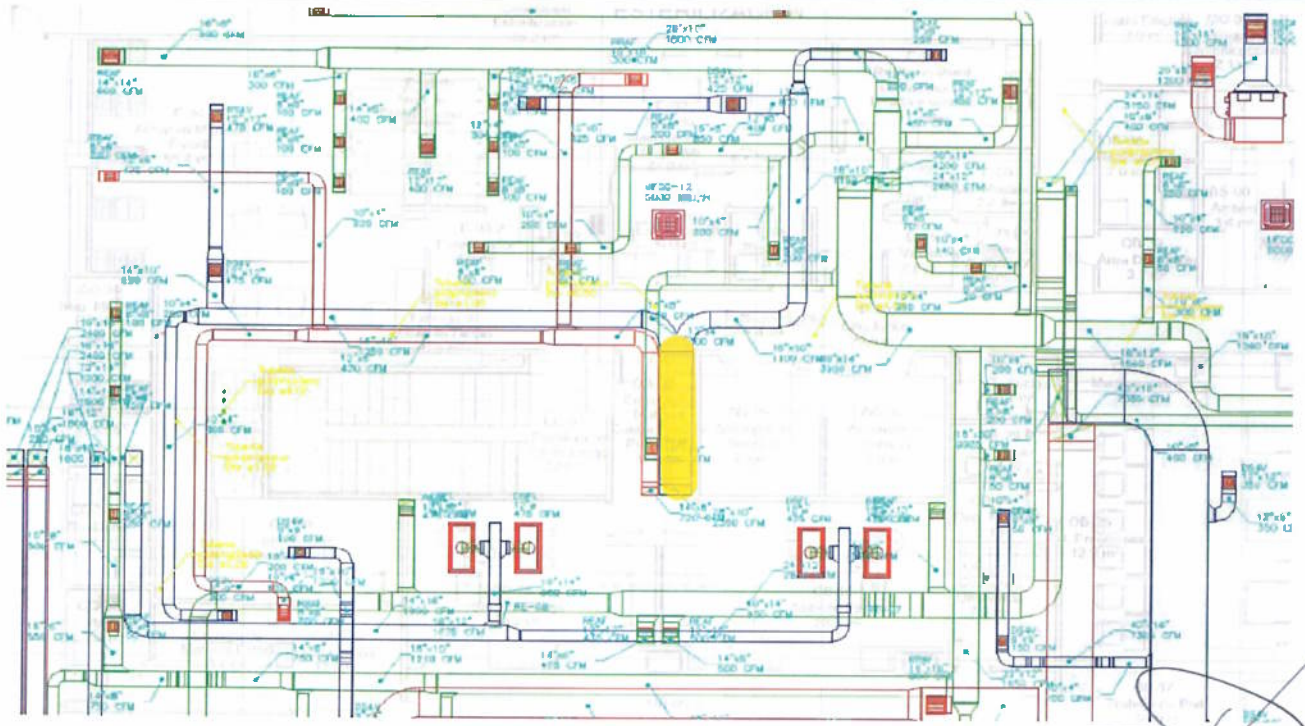

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**	Código: PA-FO-30		
		Version No. 00		Página 1 de 2
		Fecha	5 4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE N°:** 20	**FECHA** JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM N°:	29.3.1.2	**DESCRIPCION ITEM**	Cal 22 — **UNIDAD:** M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
EXTRACCION														
EQUIPOS VE-18														
DUCTO	1	30	14	0,76	0,36			0,00	0,00	1,20		4	22	10,73
CODO	2	30	14	0,76	0,36			0,00	0,00		0,30	1	22	2,49
DUCTO	3	30	14	0,76	0,36			0,00	0,00	1,05		1	22	2,35
REDUCCION	4	30	14	0,76	0,36	16,00	12,00	0,41	0,30	0,30		1	22	0,55
UNIONES		30	14	0,76	0,36			0,00	0,00	0,25		7	22	3,91
													SUBTOTAL	20,02
													VIENEN	7,91
													PASAN	27,94

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

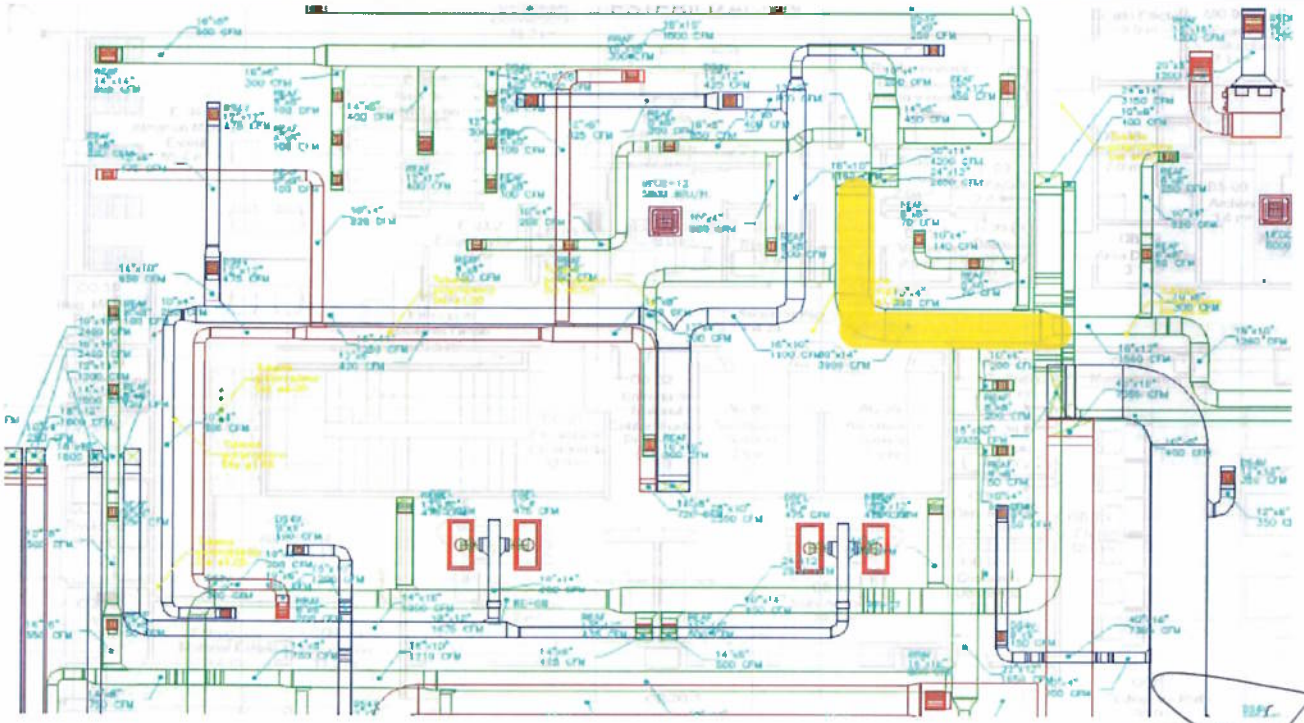

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
TERCER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPO UMAE-17														
REDUCCION	18	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,30		1	22	0,30
DUCTO	19	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	1,30		2	22	5,28
DUCTO	20	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,45		1	22	0,91
REDUCCION	21	32	14	0,81	0,36	28,00	12,00	0,71	0,30	0,30		1	22	0,66
DUCTO	22	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	1,30		31	22	94,17
DUCTO	23	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	1,05		1	22	2,45
CODO	24	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00		0,40	2	22	6,26
DUCTO	25	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	0,45		1	22	1,05
UNIONES		28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,25		4	22	2,03
UNIONES		32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	0,25		36	22	21,03
									162 1/9					
SUBTOTAL														134,16
VIENEN														27,94
PASAN														162,10

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

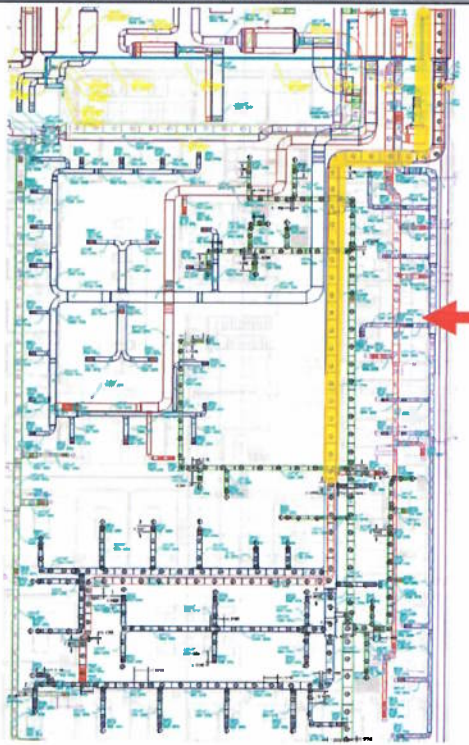

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE - 05														
ZAPATO	1	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,28
DUCTO	2	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		10	24	14,53
DUCTO	3	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,10		1	24	0,11
REDUCCION	4	14	8	0,36	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	5	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,38
ZAPATO	6	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,46
DUCTO	7	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		4	24	0,91
DUCTO	8	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,35		2	24	0,64
TAPA	9	14	4	0,36	0,10			0,00	0,00			2	24	0,07
REDUCCION	10	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
DUCTO	11	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		7	24	6,47
DUCTO	12	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,35		1	24	0,25
CODO	13	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,41
TAPA	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		9	24	1,60
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,69
UNIONES		14	4	0,36	0,10			0,00	0,00	0,25		8	24	1,83
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		10	24	2,79
SUBTOTAL														33,99

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

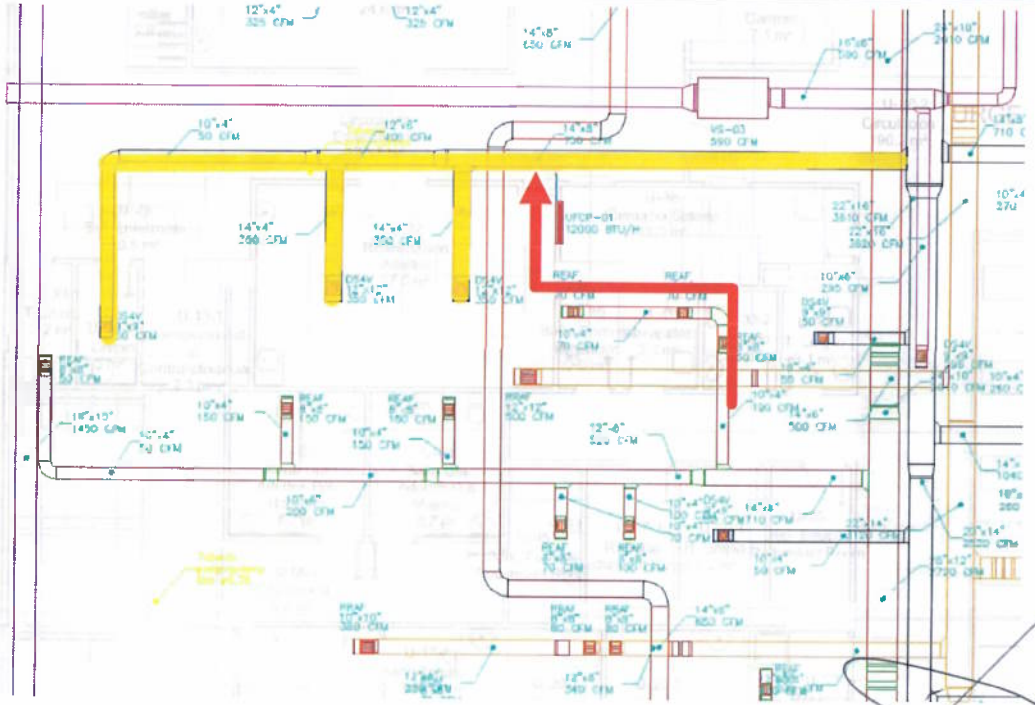

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Versión No. 00	
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
PRIMER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-05														
TAPA	1	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
DUCTO	3	12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,36		1	24	0,29
REDUCCION	4	14	8	0,36	0,20	12,00	4,00	0,30	0,10	0,30		1	24	0,29
DUCTO	5	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		34	24	49,40
DUCTO	6	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,50		4	24	2,24
CODO	7	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00		0,20	6	24	4,24
DUCTO	8	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,22
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,70		2	24	1,56
UNIONES		12	4	0,30	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,22
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		46	24	12,85
												SUBTOTAL		78,68
												VIENEN		33,99
												PASAN		112,68

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

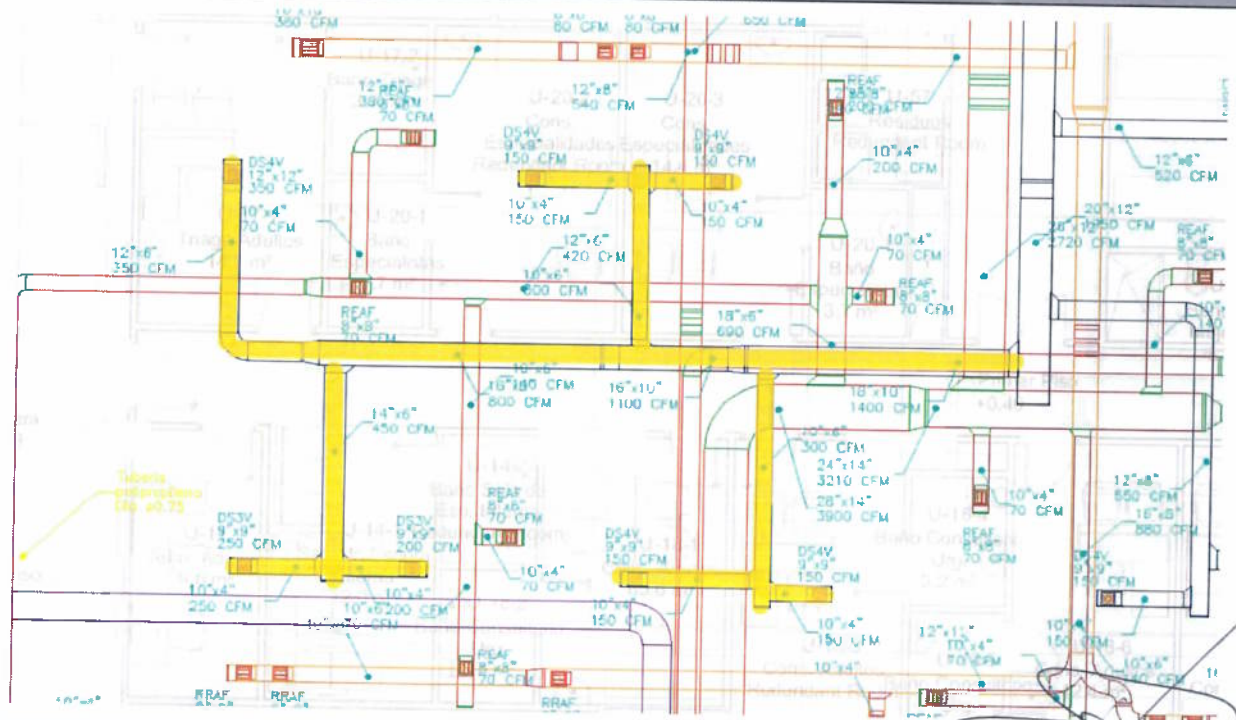


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2	
		Versión No. 00		
		Fecha:	5 / 4 / 2023	

CONTRATO Nº:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	28.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

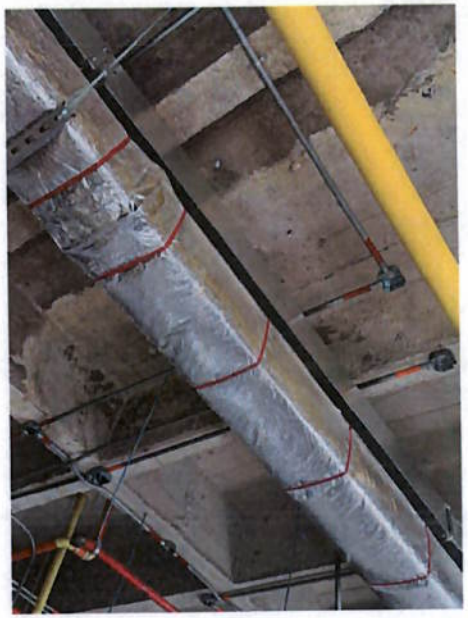

NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		9	24	8,32
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,60		1	24	0,43
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,41
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,31		1	24	0,22
ZAPATO	6	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		11	24	1,96
SUBTOTAL														11,54
VIENEN														112,68
PASAN														124,21

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

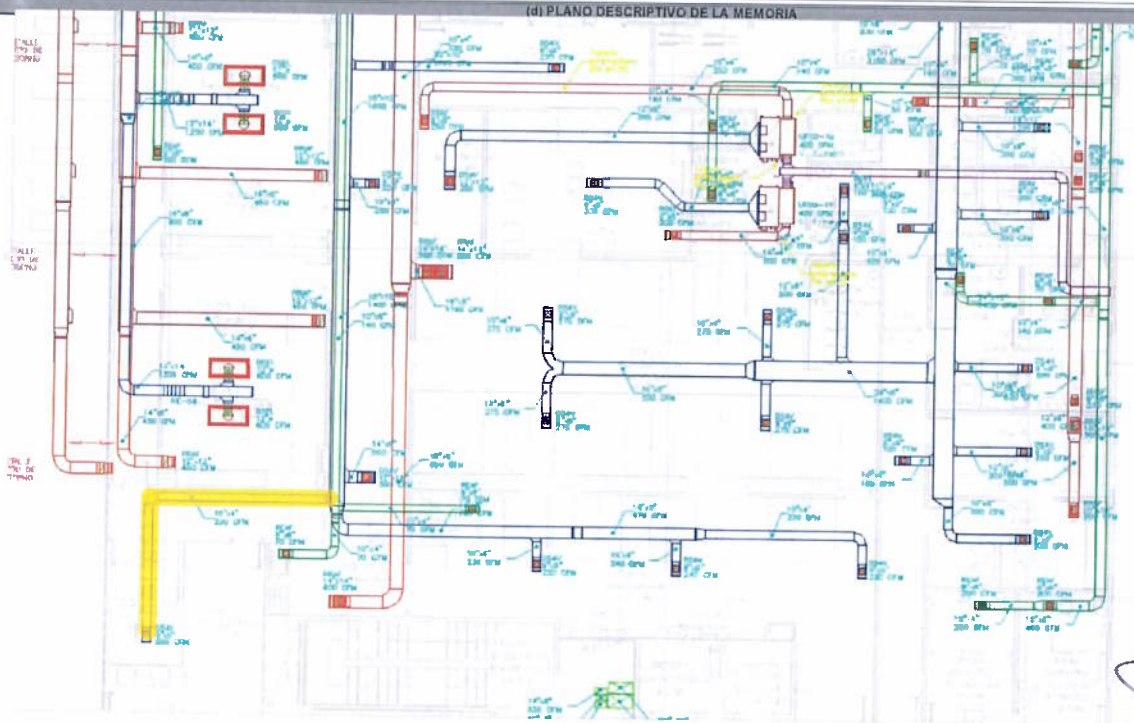

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
TAPA	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		6	24	6,34
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
CODO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	2	24	0,92
DUCTO	5	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	5,81
DUCTO	6	16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,72		1	24	0,80
REDUCCION	7	24	8	0,61	0,20	16,00	6,00	0,41	0,15	0,30		1	24	0,41
DUCTO	8	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	1,30		4	24	8,45
DUCTO	9	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	0,42		1	24	0,68
ZAPATO	10	24	8	0,61	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,41
ZAPATO	11	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		2	24	0,41
TAPA	12	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			2	24	0,08
TAPA	13	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	14	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,15		1	24	0,82
ZAPATO	15	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,23
DUCTO	16	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	4,75
DUCTO	17	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,28		1	24	0,26
REDUCCION	18	12	6	0,30	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,24
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		12	24	2,44
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		5	24	1,14
UNIONES		16	6	0,41	0,15			0,00	0,00	0,25		6	24	1,68
UNIONES		24	8	0,61	0,20	16,00	6,00	0,41	0,15	0,25		6	24	2,06
										SUBTOTAL				39,16
										VIENEN				124,21
										PASAN				163,38

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

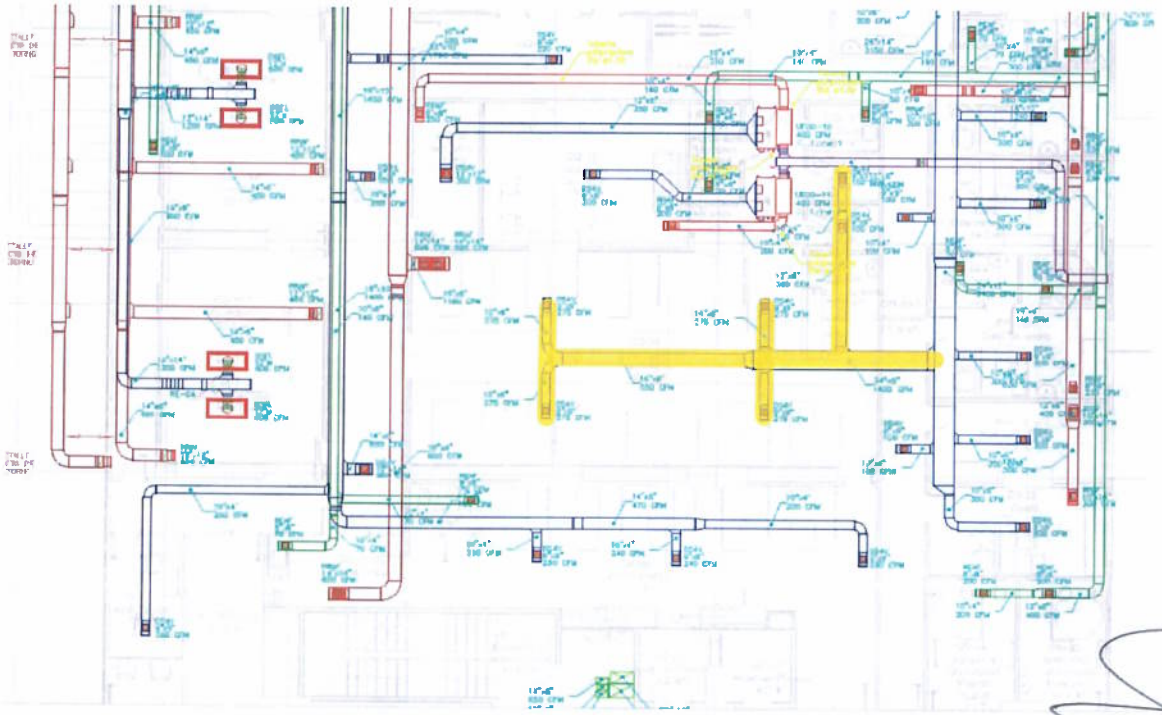

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Version No. 00	
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UFCO-11														
TAPA	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,85		3	24	2,07
SEMICODO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	2	24	0,92
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		8	24	1,63
SUBTOTAL														6,77
VIENEN														163,38
PASAN														170,15

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

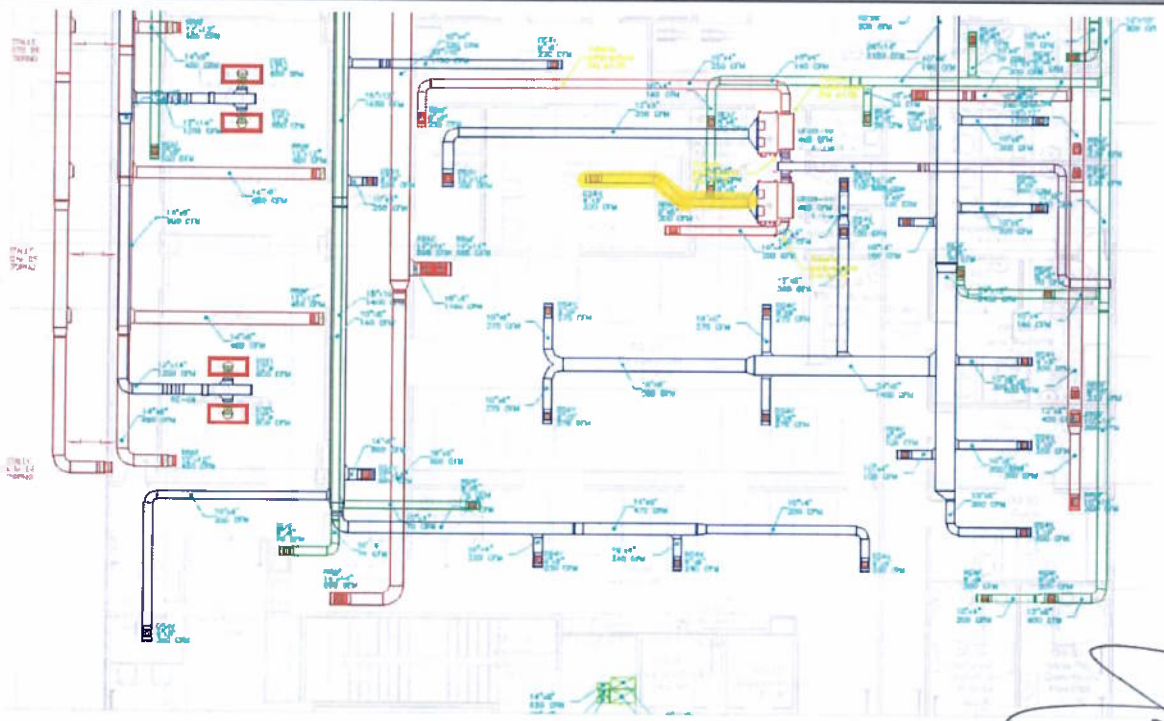


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	060 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	JUNIO DE 2025
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap
UNIDAD:	M2		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

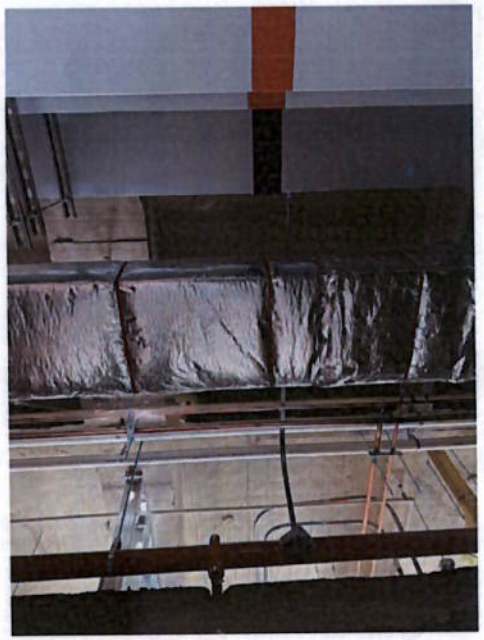

NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UFCO-10														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		9	24	8,32
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,15		1	24	0,11
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	1	24	0,92
DUCTO	5	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,37		1	24	0,92
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		12	24	2,13
									SUBTOTAL					12,43
									VIENEN					170,15
									PASAN					182,57

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

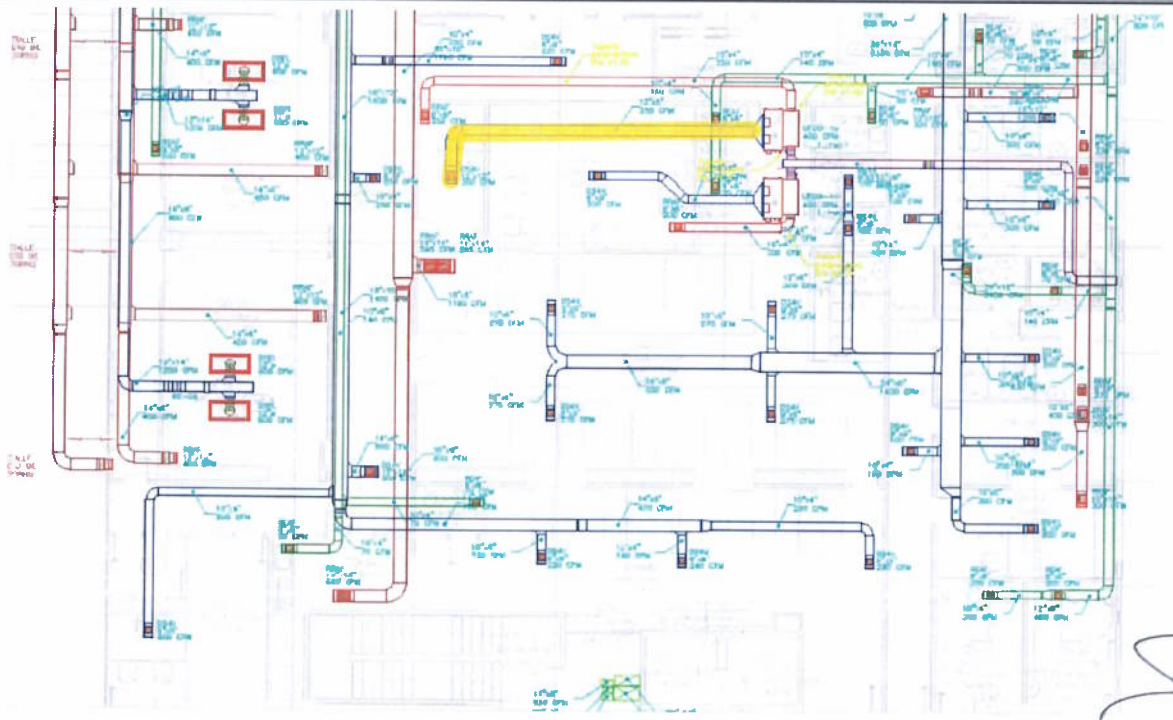

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Version No. 00	
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,70		1	24	0,57
CODO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00		0,20	1	24	0,46
DUCTO	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,15
DUCTO	5	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,00		1	24	0,92
DUCTO	6	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,92
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		5	24	1,02
										SUBTOTAL				5,24
										VIENEN				182,57
										PASAN				187,81

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

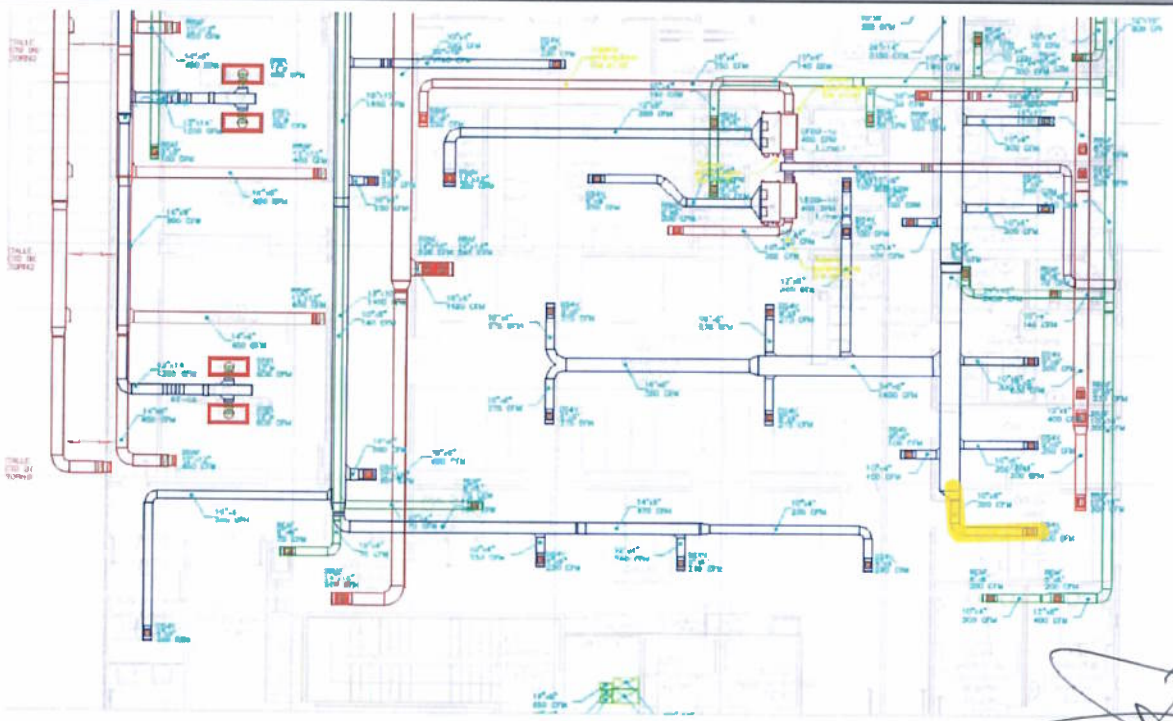

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-35	Página 1 de 2
		Versión No. 00	
		Fecha: 5 4 2023	

CONTRATO N°:	099 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°: 20	FECHA: JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM: ATE 3 Duct Wrap	UNIDAD: M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,10		1	24	0,78
TAPA	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
													SUBTOTAL	1,34
													VIENEN	187,81
													PASAN	189,16

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 90			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

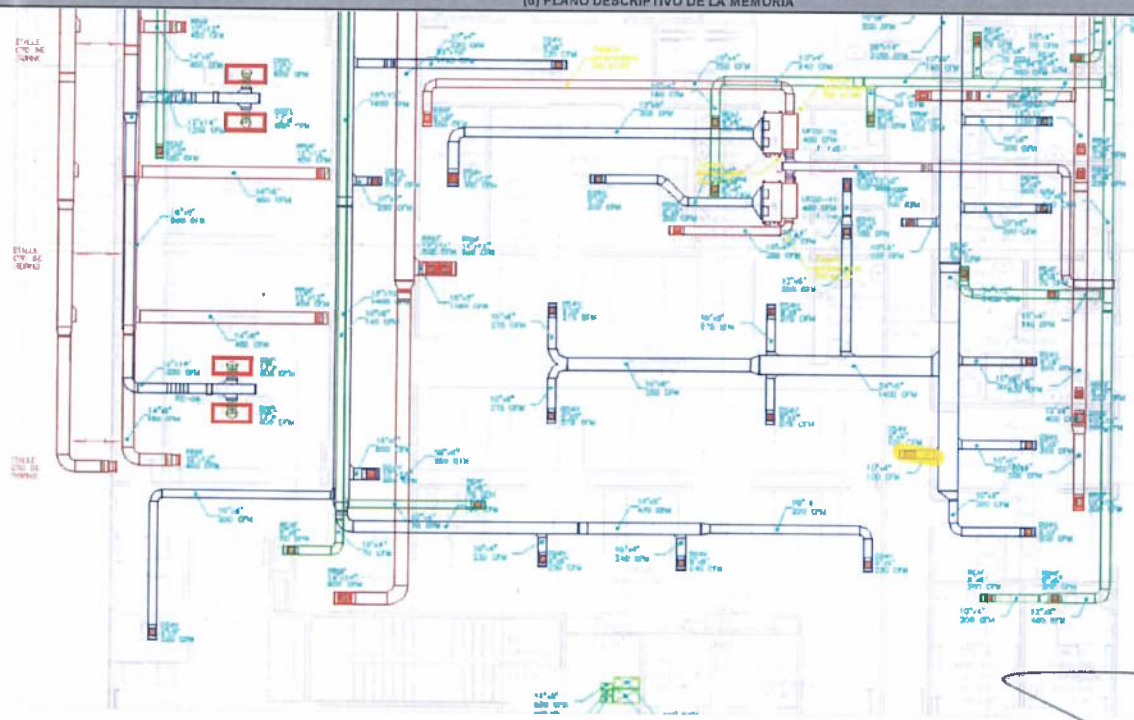

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,15		1	24	0,93
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
SUBTOTAL														2,84
VIENEN														189,16
PASAN														192,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

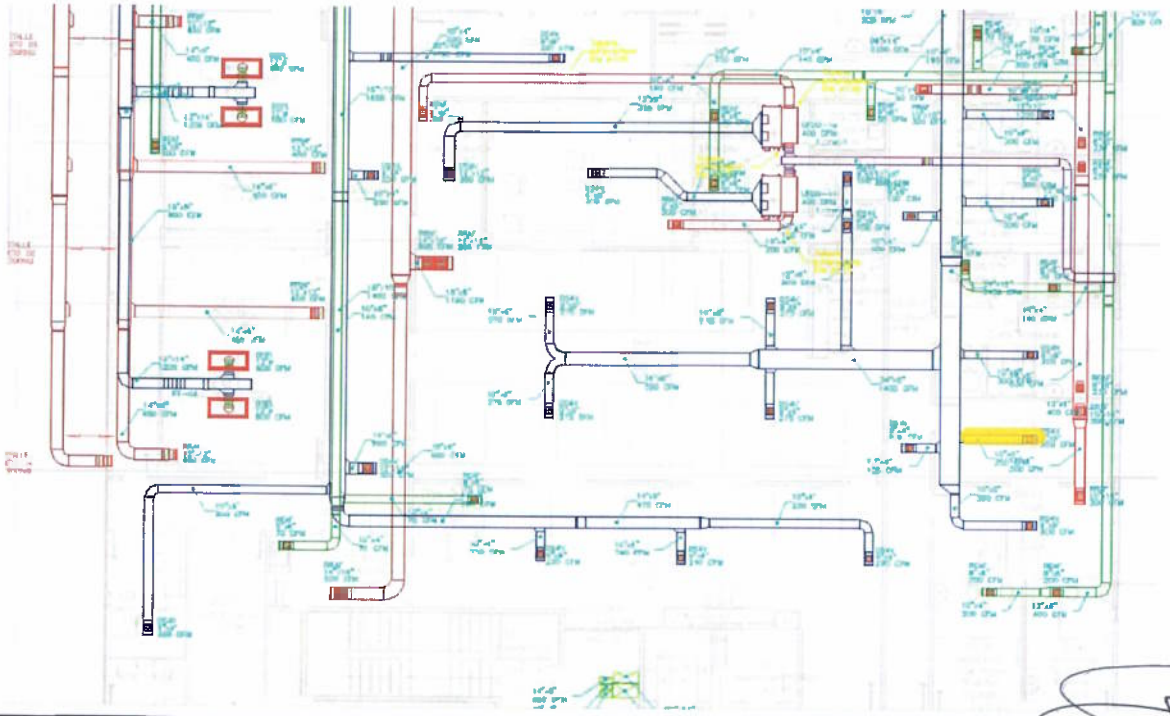

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,01		1	24	0,82
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
SUBTOTAL														2,73
VIENEN														192,00
PASAN														194,73

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

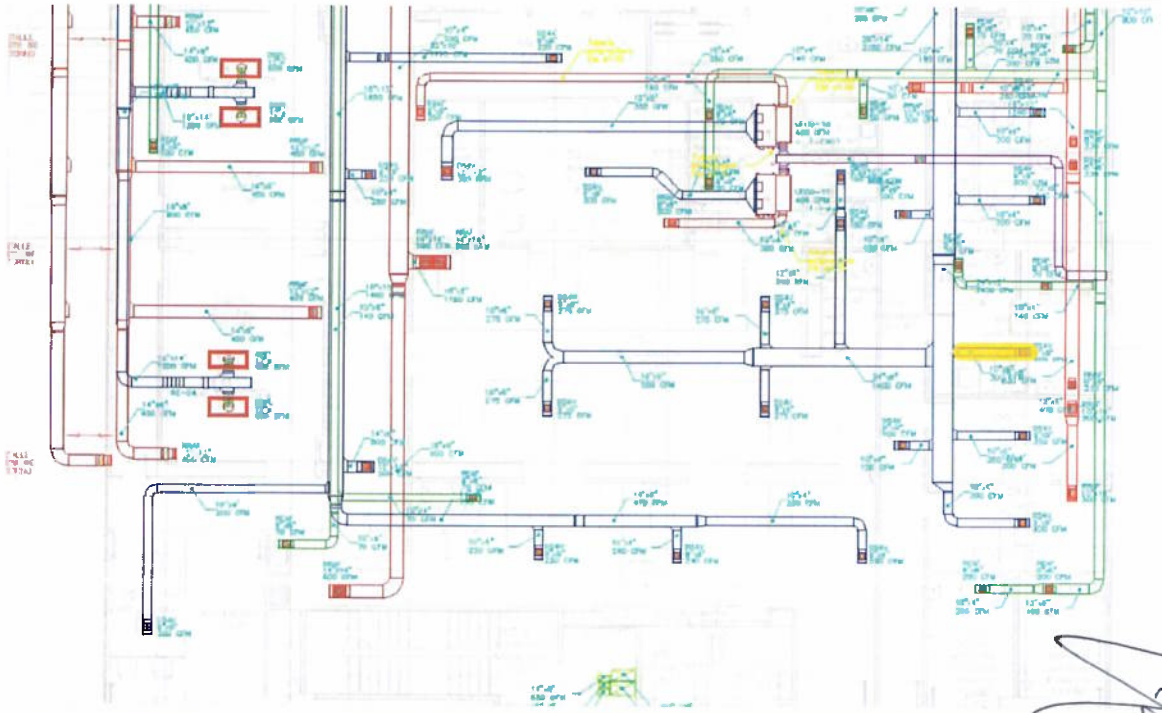

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	20
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap
UNIDAD:	M2		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,21		1	24	0,17
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
										SUBTOTAL				3,34
										VIENEN				194,73
										PASAN				198,07

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

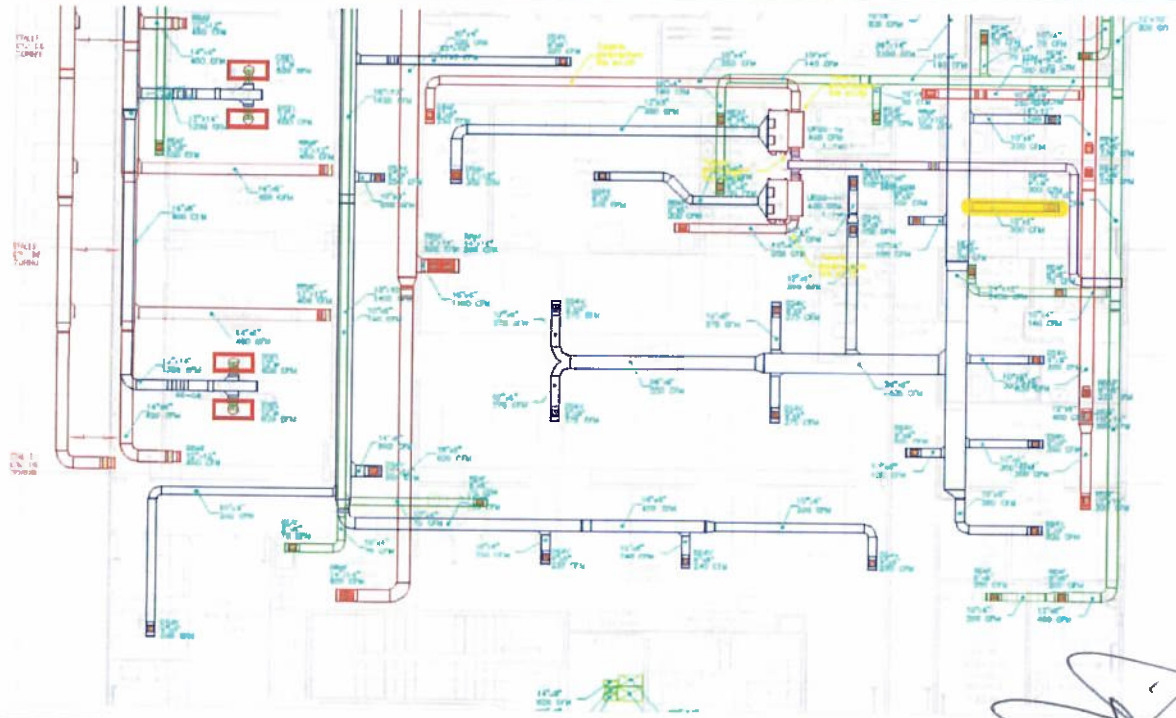

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-33	Página 1 de 2	
		Versión No. 00		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		2	24	2,11
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,21		1	24	0,17
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		4	24	0,81
SUBTOTAL														3,34
VIENEN														198,07
PASAN														201,41

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-38 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

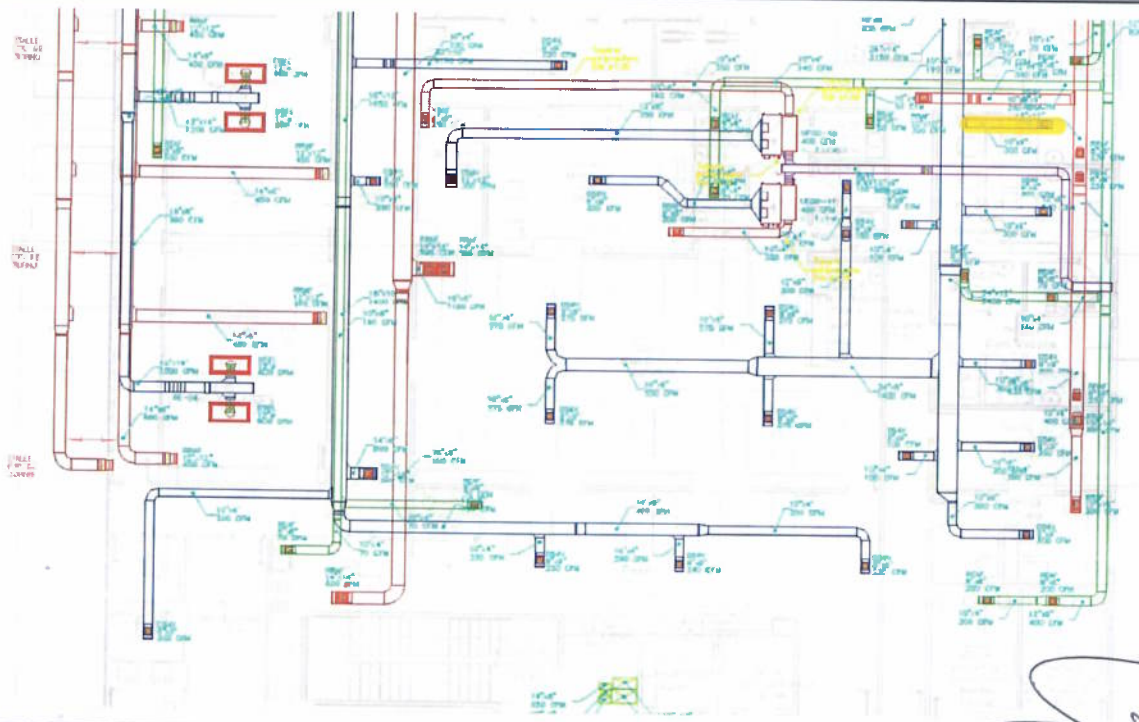

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Version No. 00	
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	060 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,15		1	24	0,82
TAPA	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		2	24	0,36
													SUBTOTAL	1,38
													VIENEN	201,41
													PASAN	202,78

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

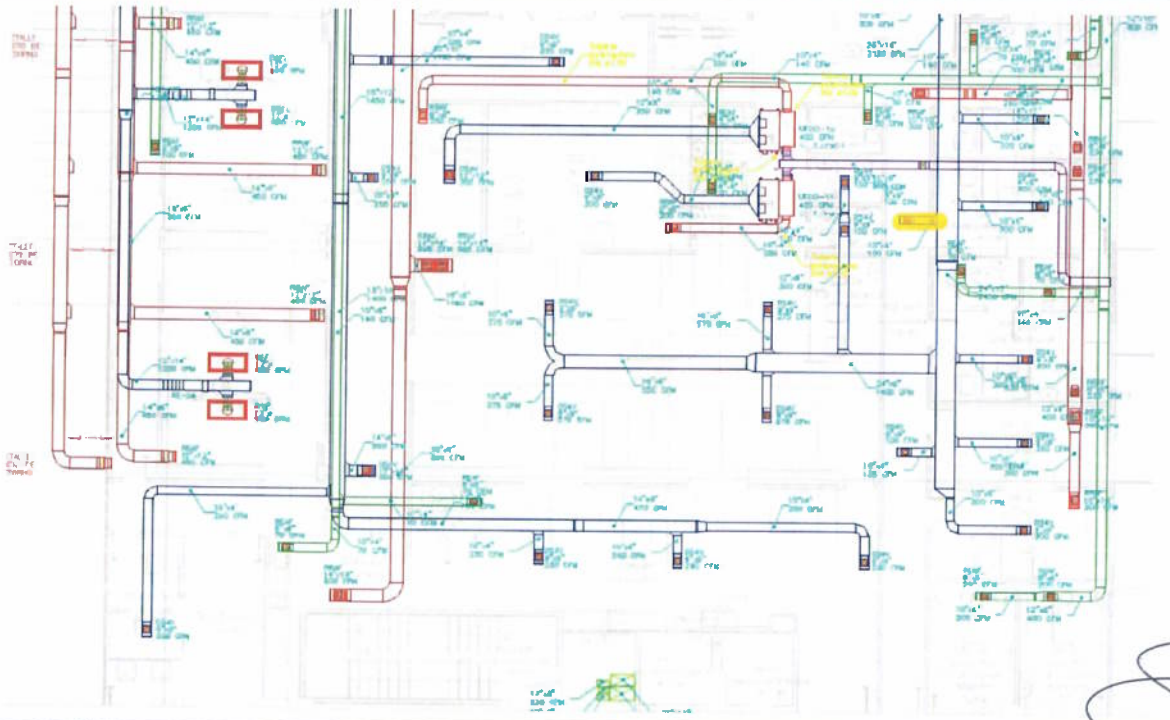

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			Página 1 de 2
Version No. 00			
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-13														
ZAPATO	1	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
DUCTO	2	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		1	24	1,06
DUCTO	3	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,22		1	24	0,18
TAPA	4	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			1	24	0,04
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		3	24	0,61
										SUBTOTAL				2,09
										VIENEN				202,78
										PASAN				204,87

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

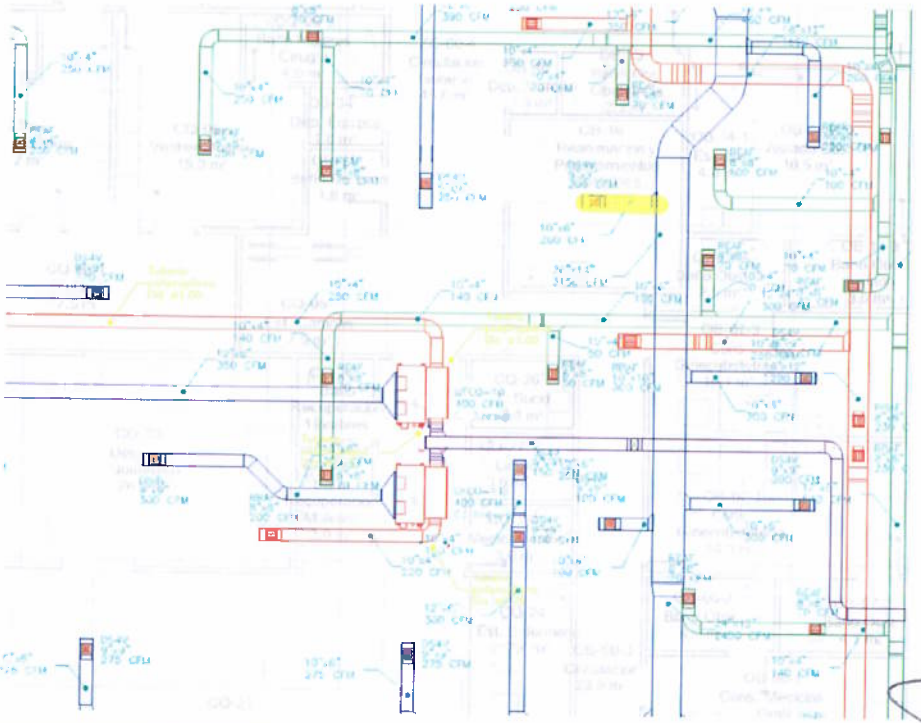

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			Página 1 de 2
		Version No. 00			
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Area M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-12														
DUCTO	1	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	1,30		9	24	14,26
CODO	2	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00		0,20	1	24	0,67
DUCTO	3	10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	0,95		1	24	1,16
REDUCCION	4	14	16	0,36	0,41	10,00	14,00	0,25	0,36	0,30		1	24	0,41
DUCTO	5	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	1,30		9	24	17,83
DUCTO	6	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	0,80		1	24	1,22
TAPA	7	14	16	0,36	0,41			0,00	0,00			1	24	0,14
ZAPATO	8	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		1	24	0,18
DUCTO	9	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		3	24	2,77
TAPA	10	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			1	24	0,03
UNIONES		10	14	0,25	0,36			0,00	0,00	0,25		10	24	3,05
UNIONES		14	16	0,36	0,41			0,00	0,00	0,25		12	24	4,57
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		3	24	0,53
									SUBTOTAL					46,83
									VIENEN					204,87
									PASAN					251,70

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No: 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

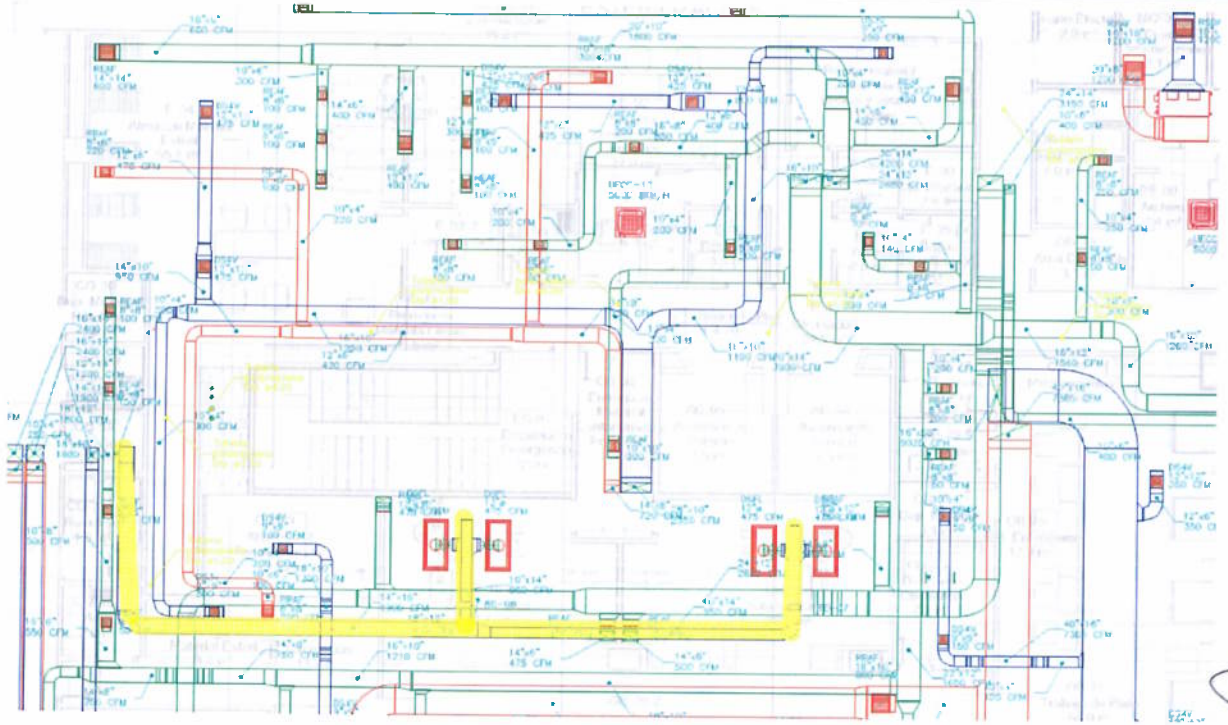

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 2
		Version No. 00	
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



NOTA: VER PLANO DWG

Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
SEGUNDO PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPOS UMAE-14														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		10	24	9,25
CODO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	3	24	1,22
DUCTO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,71		2	24	1,01
REDUCCION	5	16	10	0,41	0,25	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,30
DUCTO	6	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		15	24	25,76
DUCTO	7	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,35		3	24	1,39
CODO	8	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00		0,30	3	24	3,42
REDUCCION	9	16	10	0,41	0,25	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,30
ZAPATO	10	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		1	24	0,30
DUCTO	10A	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	1,30		3	24	4,75
DUCTO	11	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,20		1	24	0,24
REDUCCION	12	16	8	0,41	0,20	12,00	6,00	0,30	0,15			1	24	0,00
DUCTO	13	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		3	24	3,57
DUCTO	14	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,60		1	24	0,55
TAPA	15	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			2	24	0,05
ZAPATO	16	14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,30
DUCTO	17	14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	1,15		1	24	1,40
REDUCCION	18	14	10	0,36	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,32
DUCTO	19	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,00		1	24	0,91
DUCTO	20	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	1,30		2	22	5,02
DUCTO	21	28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	0,70		1	22	1,35
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		17	24	3,02
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,25		10	24	2,29
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		18	24	5,94
UNIONES		16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		3	24	0,91
UNIONES		14	10	0,36	0,25			0,00	0,00	0,25		2	24	0,61
UNIONES		28	10	0,71	0,25			0,00	0,00	0,25		4	22	1,93
										SUBTOTAL				76,19
										VIENEN				251,70
										PASAN				327,89

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Version No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 2

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

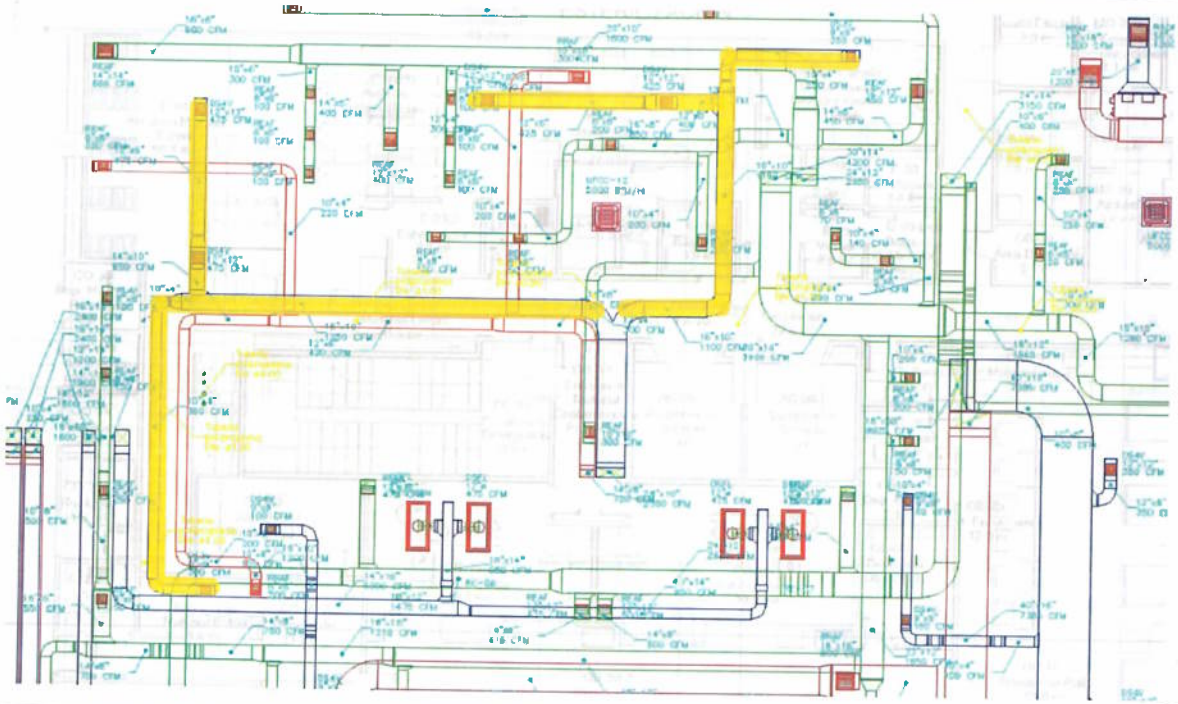


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	030 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM Nº:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

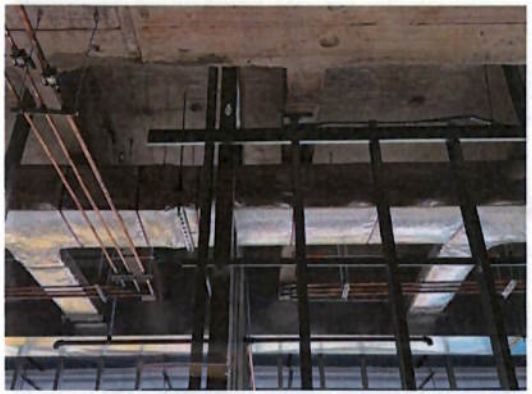

NOTA: VER PLANO DWG


Pieza	No	Dimensiones								Long (m)	Radio m	Cant	Cal	Área M2
		Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)	Ancho (in)	Alto (in)	Ancho (m)	Alto (m)					
TERCER PISO														
SUMINISTRO														
EQUIPO UMAE-17														
TAPA	1	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00			16	24	0,41
DUCTO	2	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	1,30		28	24	25,89
DUCTO	3	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,40		14	24	3,98
CODO	4	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00		0,20	3	24	1,22
REDUCCION	5	10	6	0,25	0,15	10,00	4,00	0,25	0,10	0,30		1	24	0,23
DUCTO	6	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	1,30		8	24	8,45
DUCTO	7	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,80		7	24	4,55
REDUCCION	8	14	8	0,36	0,20	10,00	6,00	0,25	0,15	0,30		1	24	0,29
DUCTO	9	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	1,30		2	24	2,91
DUCTO	10	14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,90		1	24	1,01
REDUCCION	11	16	8	0,41	0,20	14,00	8,00	0,36	0,20	0,30		1	24	0,35
DUCTO	12	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	1,30		8	24	12,68
DUCTO	13	16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,91		1	24	1,11
REDUCCION	14	18	10	0,46	0,25	16,00	8,00	0,41	0,20	0,30		1	24	0,40
DUCTO	15	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	1,30		4	24	7,40
DUCTO	16	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,20		2	24	0,57
CODO	17	18	10	0,46	0,25			0,00	0,00		0,30	1	24	1,28
REDUCCION	18	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,30		1	22	0,30
DUCTO	19	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	1,30		2	22	5,28
DUCTO	20	28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,45		1	22	0,91
REDUCCION	21	32	14	0,81	0,36	28,00	12,00	0,71	0,30	0,30		1	22	0,66
DUCTO	22	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	1,30		31	22	94,17
DUCTO	23	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	1,05		1	22	2,45
CODO	24	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00		0,40	2	22	6,26
DUCTO	25	32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	0,45		1	22	1,05
ZAPATO	26	10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		6	24	1,07
ZAPATO	27	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,33
DUCTO	28	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	1,30		7	24	12,02
DUCTO	29	16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,10		2	24	0,26
REDUCCION	30	16	10	0,41	0,25	12,00	10,00	0,30	0,25	0,30		1	24	0,37
DUCTO	31	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	1,30		5	24	7,26
DUCTO	32	12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,85		1	24	0,95
REDUCCION	33	12	10	0,30	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,30
DUCTO	34	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	1,30		4	24	4,75
DUCTO	35	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,20		1	24	0,18
CODO	36	12	6	0,30	0,15			0,00	0,00		0,30	2	24	1,49
TAPA	37	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00			6	24	0,23
ZAPATO	38	10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		1	24	0,20
ZAPATO	39	20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	0,25		1	24	0,38
DUCTO	40	20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	1,30		7	24	13,87
REDUCCION	41	20	10	0,51	0,25	16,00	10,00	0,41	0,25	0,30		1	24	0,43
REDUCCION	42	16	10	0,41	0,25	12,00	6,00	0,30	0,15	0,30		1	24	0,34
UNIONES		10	4	0,25	0,10			0,00	0,00	0,25		66	24	11,73
UNIONES		10	6	0,25	0,15			0,00	0,00	0,25		23	24	4,67
UNIONES		14	8	0,36	0,20			0,00	0,00	0,25		4	24	1,12
UNIONES		16	8	0,41	0,20			0,00	0,00	0,25		8	24	2,44
UNIONES		18	10	0,46	0,25			0,00	0,00	0,25		8	24	2,84
UNIONES		16	10	0,41	0,25			0,00	0,00	0,25		11	24	3,63
UNIONES		12	10	0,30	0,25			0,00	0,00	0,25		6	24	1,68
UNIONES		20	10	0,51	0,25			0,00	0,00	0,25		9	24	3,43
UNIONES		12	6	0,30	0,15			0,00	0,00	0,20		7	24	1,28
UNIONES		28	12	0,71	0,30			0,00	0,00	0,25		4	22	2,03
UNIONES		32	14	0,81	0,36			0,00	0,00	0,25		41	22	23,03
												SUBTOTAL		286,15
												VIENEN		327,89
												PASAN		614,04

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No: 00			Página 1 de 2
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	29.3.2.1	DESCRIPCION ITEM	ATE 3 Duct Wrap			UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

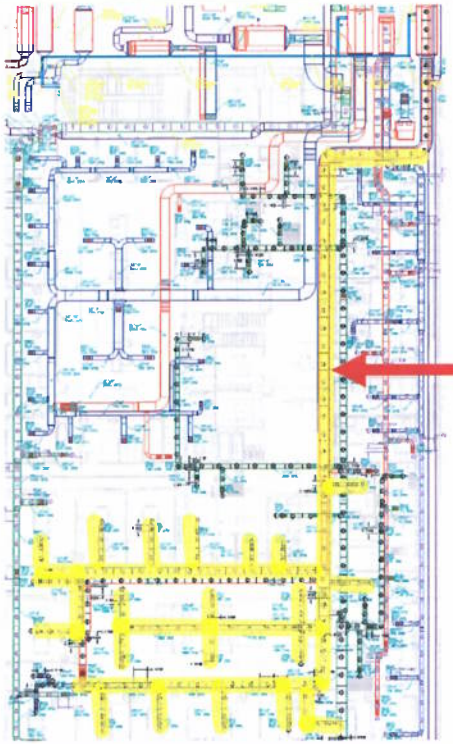


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	EAF-01 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR , R410A, Trifasico, 220 / 3 / 60 Incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

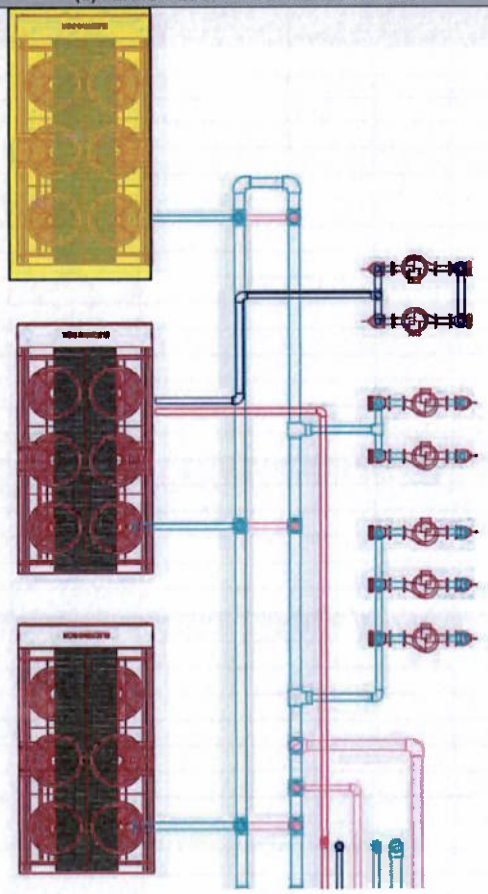


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
SOTANO						
EAF-01					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.1.2	(b) DESCRIPCION ITEM	EAF-02 Unidad de enfriamiento de agua polivalente, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2 Bombas Incorporadas seccion agua helada, Capacidad 100 TR , R410A, Trifasico, 220 / 3 / 60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

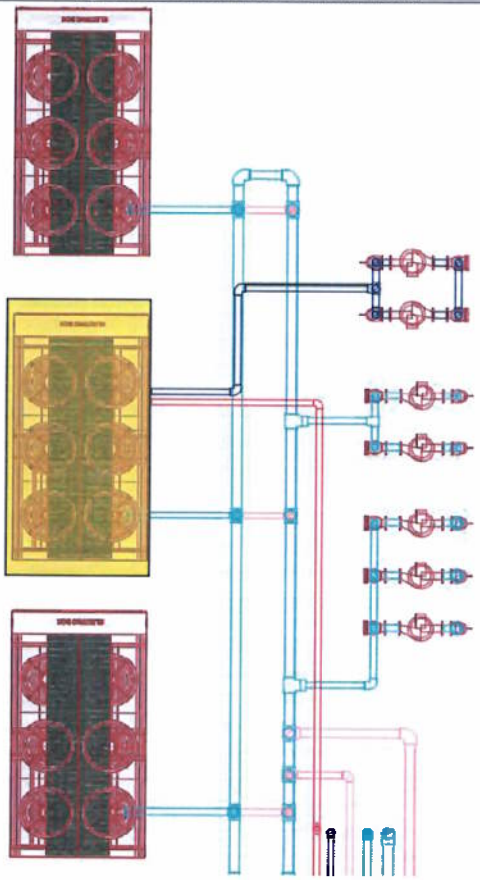

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
SOTANO						
EAF-02					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	80.5.6.1	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-01 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de agua caliente, Blower tipo Plenum Fan, 4070 CFM @ 1 Inwg, Trifasica 220/3/60. Incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

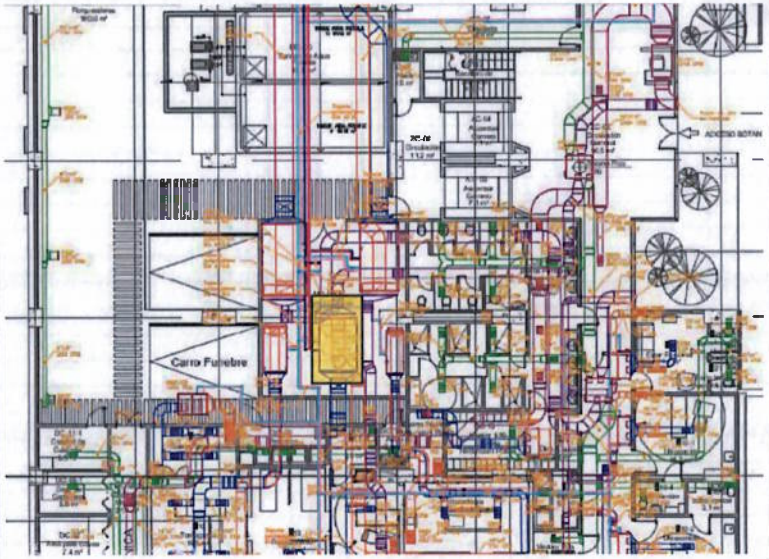

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-01					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-02 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros 65% y 95%, 2145 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

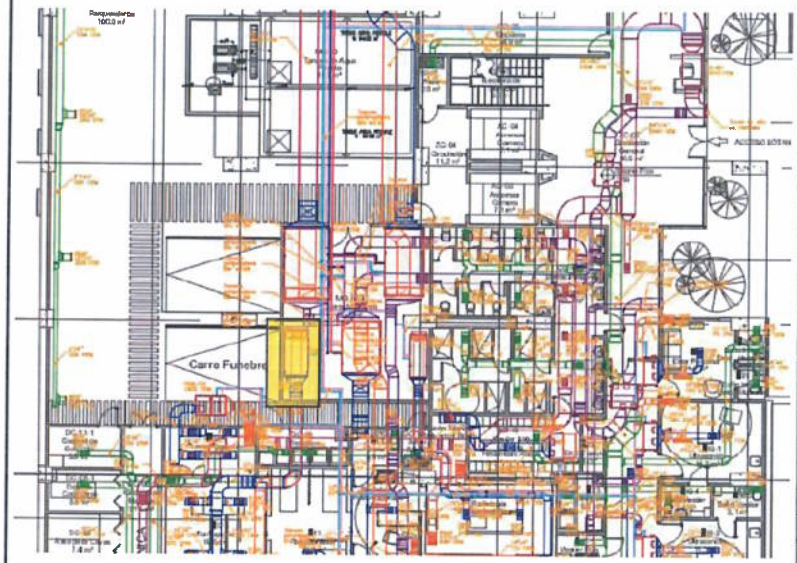


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-02					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.3	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-03 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 770 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

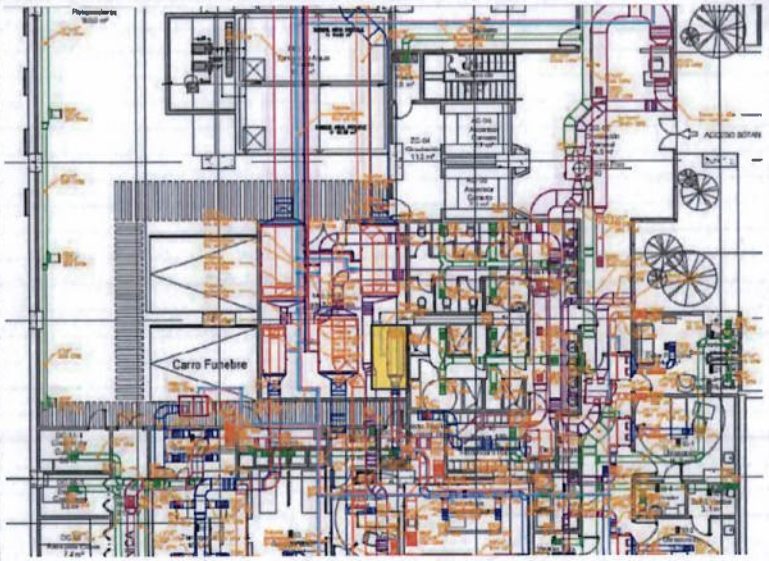(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
SOTANO	EDIFICIO ASISTENCIAL						
	UMAE-03					1,00	1,00
	TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	80.5.6.4	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-04 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 6985 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

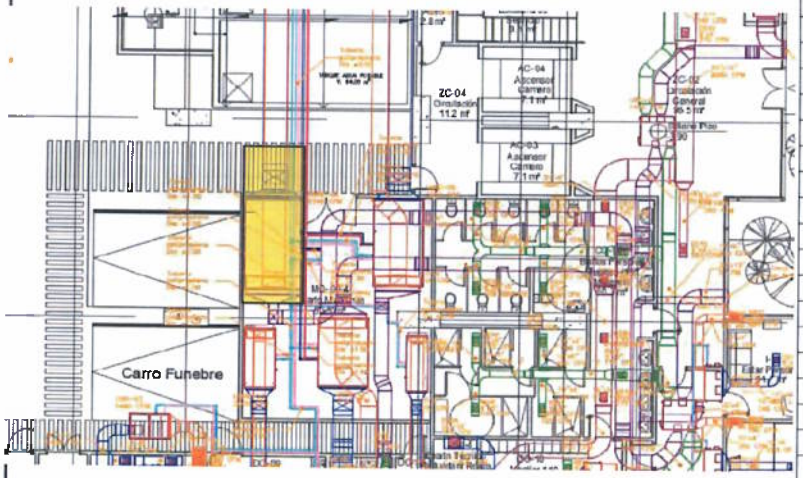


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-04					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.5	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-05 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35% y 85%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, 5600 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. Incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)		(c) UND:		UND

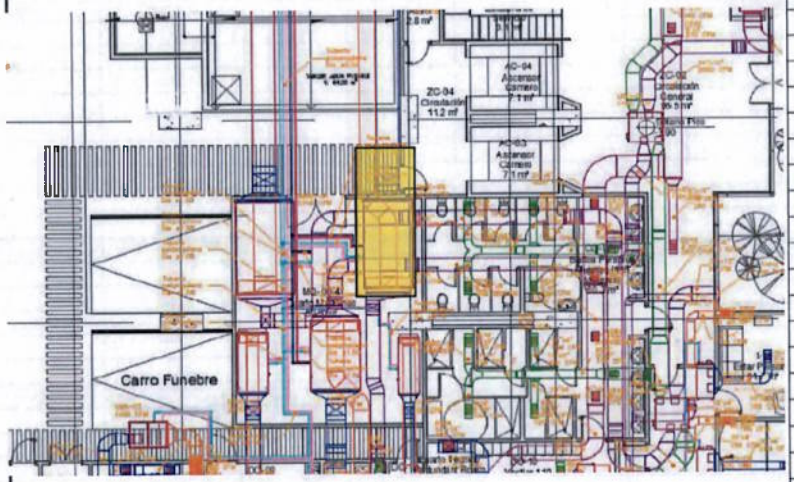(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO		(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
	EDIFICIO ASISTENCIAL						
	UMAE-05					1,00	1,00
					TOTAL		1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	80.5.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-09 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99,97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

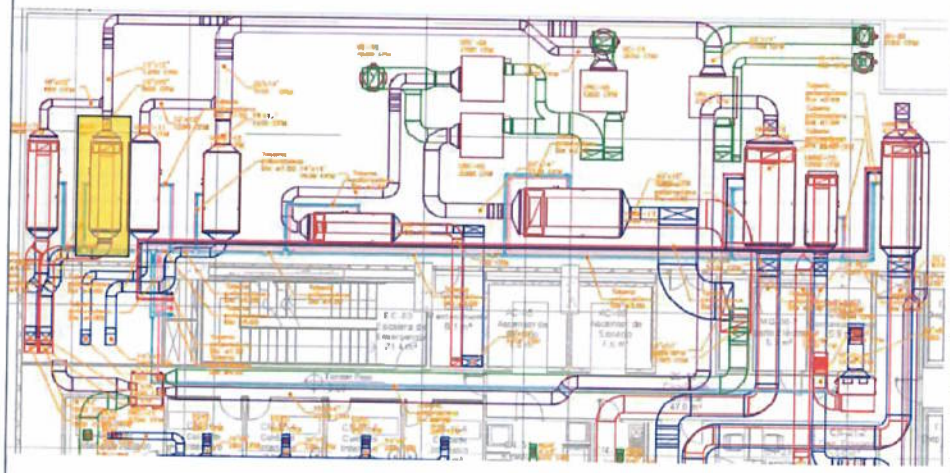

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-09					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.7	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-10 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 3080 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

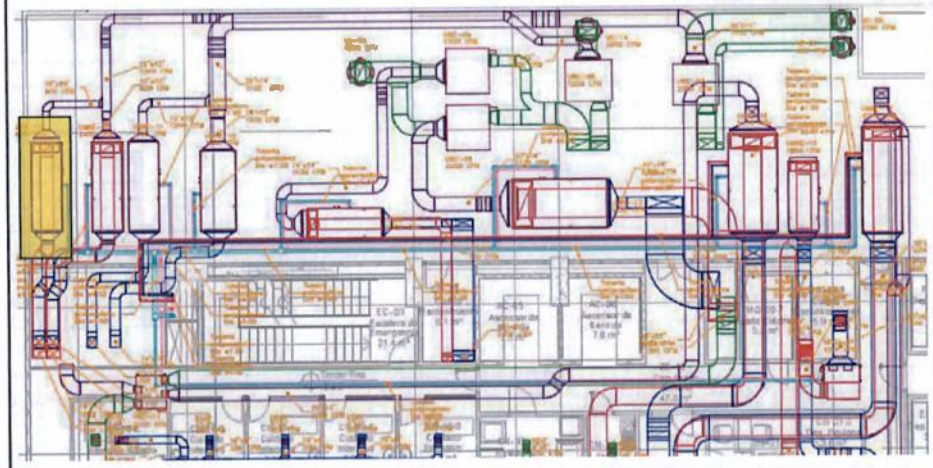

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-10					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	80.5.6.8	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-11 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2300 CFM @ 1.5 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

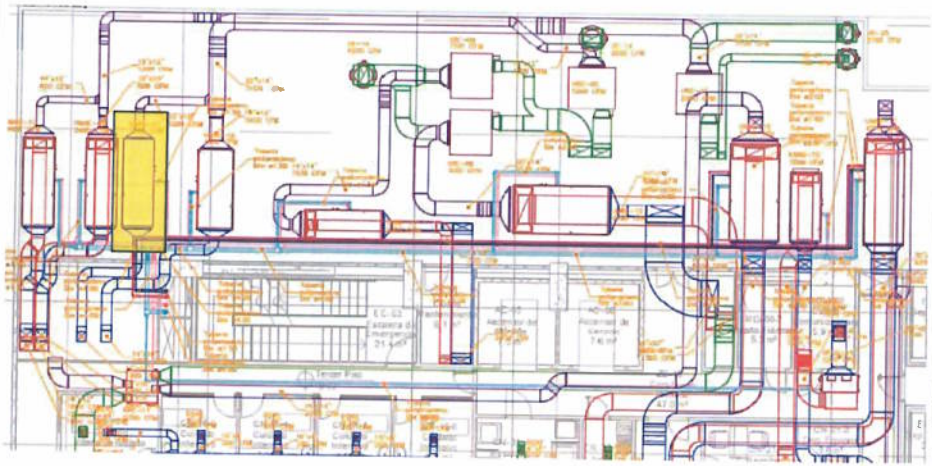

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(I) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-11					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.9	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-12 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 85% y HEPA 99.97, 2100 CFM @ 1.5 Inwg, Trifasica 220/3/60. Incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

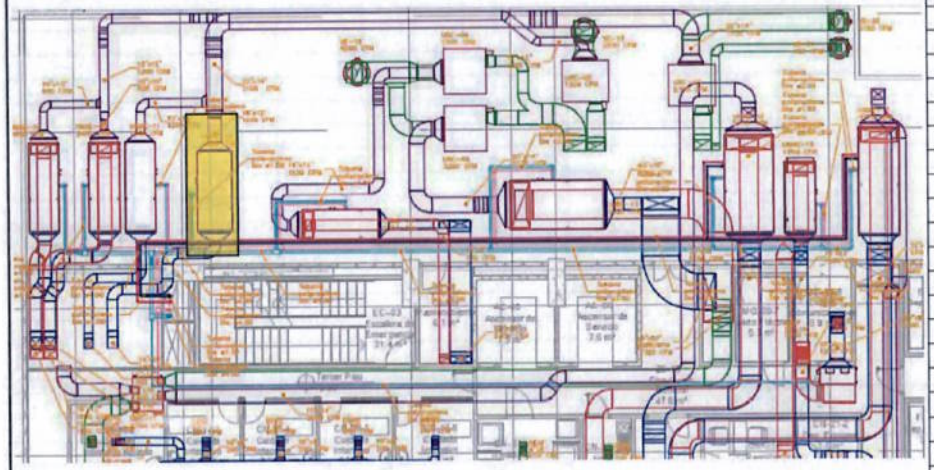(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 4	EDIFICIO ASISTENCIAL						
	UMAE-12					1,00	1,00
					TOTAL		1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	80.5.6.10	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-13 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 11000 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

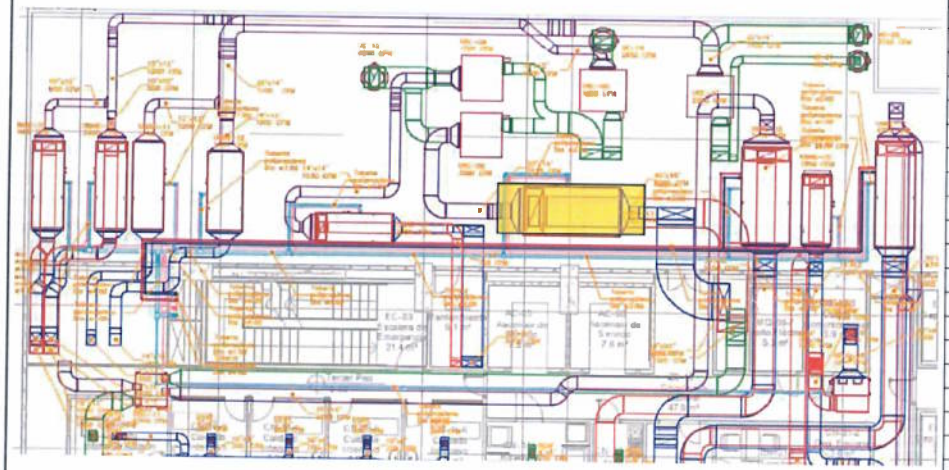

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-13					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.11	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-14 Unidad Manejadora Modular. Para Interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 2365 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

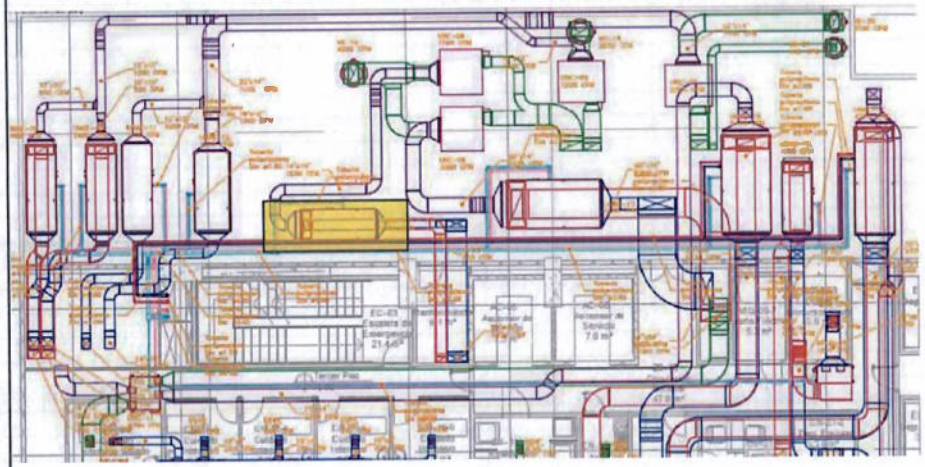

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-14					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	80.5.6.12	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-16 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5665 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

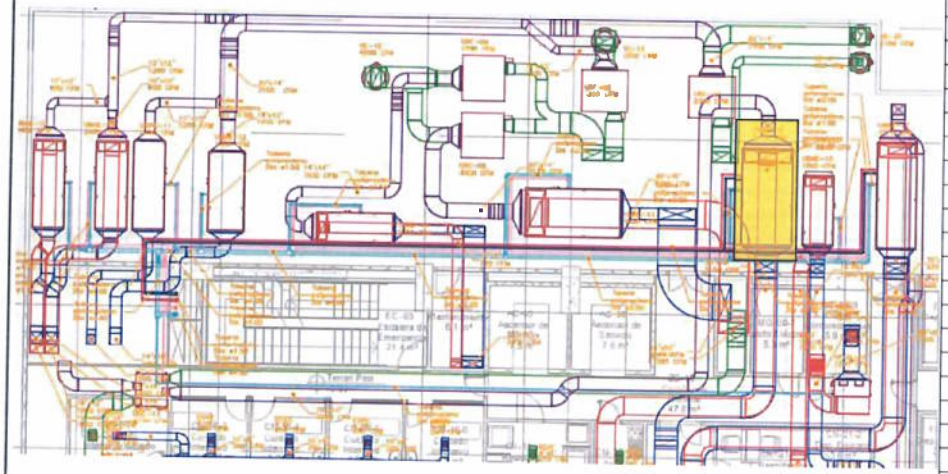

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-16					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.13	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-17 Unidad Manejadora Modular. Para Interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Serpentin de calefaccion, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 5555 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. Incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

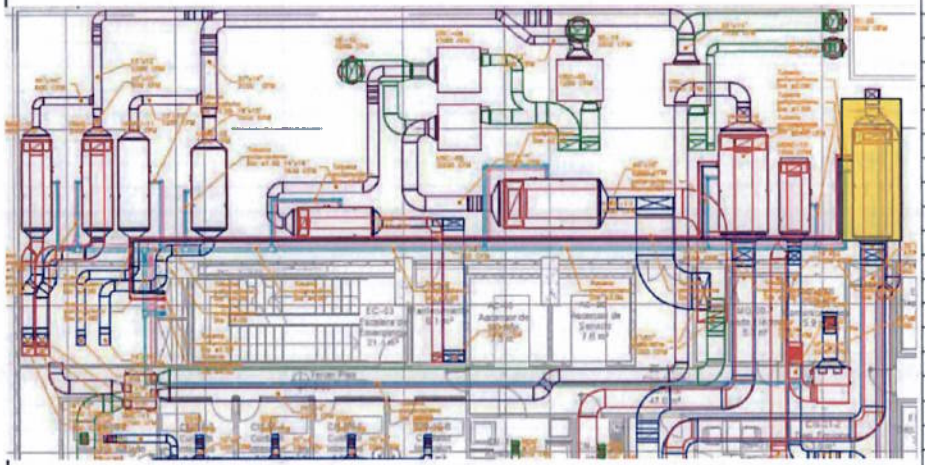

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-17					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.6.14	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-18 Unidad Manejadora Modular. Para interiores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, Filtros finales 65% y 95%, 1925 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 4

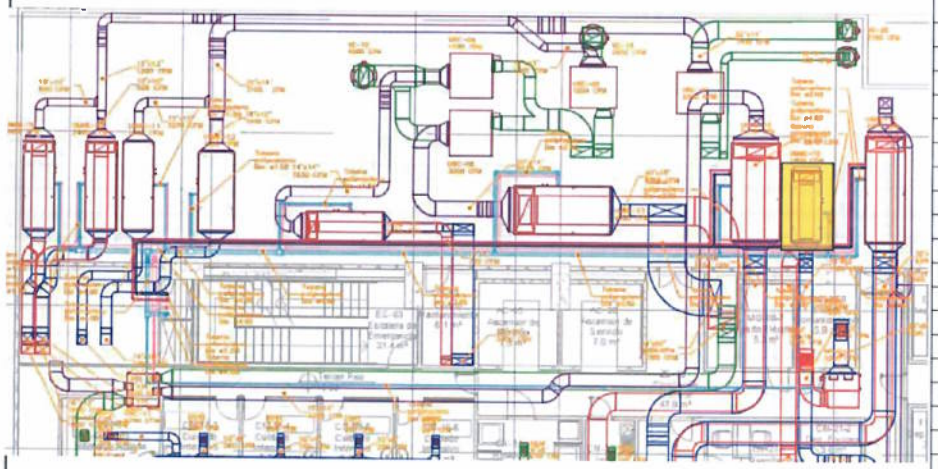

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-18					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	80.5.6.15	(b) DESCRIPCION ITEM	UMAE-20 Unidad Manejadora Modular. Para Exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de agua helada, Blower tipo Plenum Fan, 8195 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. Incluye: (Filtros, Bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CUBIERTA

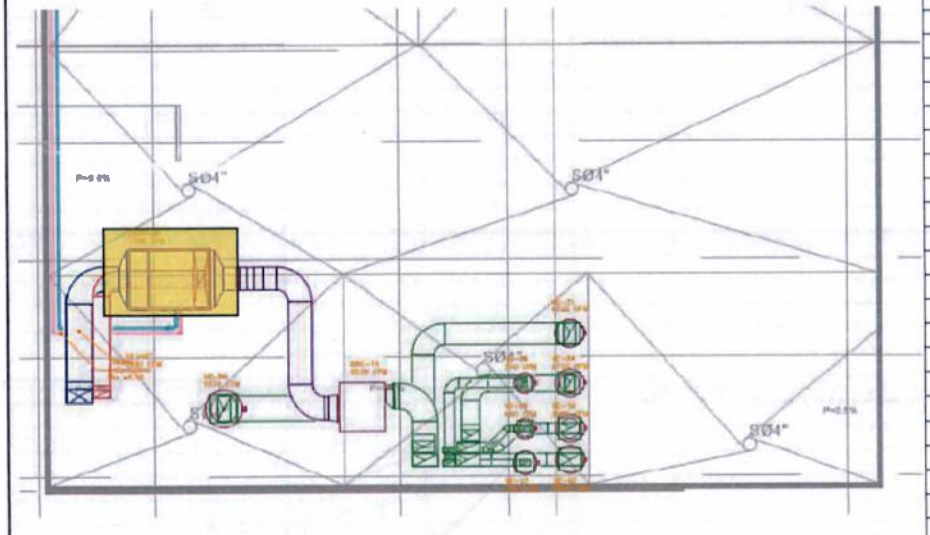

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMAE-20					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.7.1	(b) DESCRIPCION ITEM	UMA-02 Unidad Manejadora Serpentin Agua Hefada Horizontal. 4 TR Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

CUBIERTA

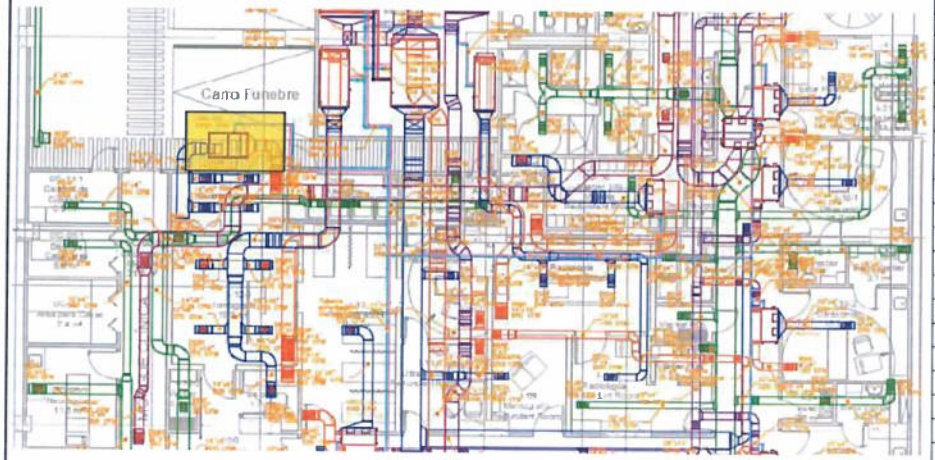


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UMA-02					1,00	1,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCP-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Pared, Agua Helada, Capacidad Nominal 12000 Btu/hr, Incluye: (Base soporte, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1

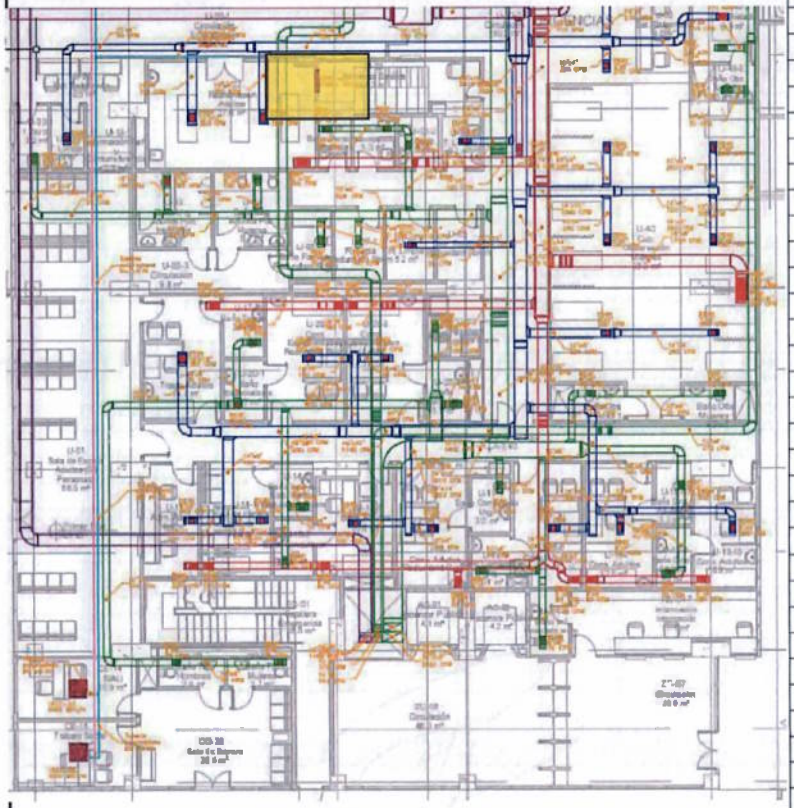


(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCP-01					1,00	1,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	80.5.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

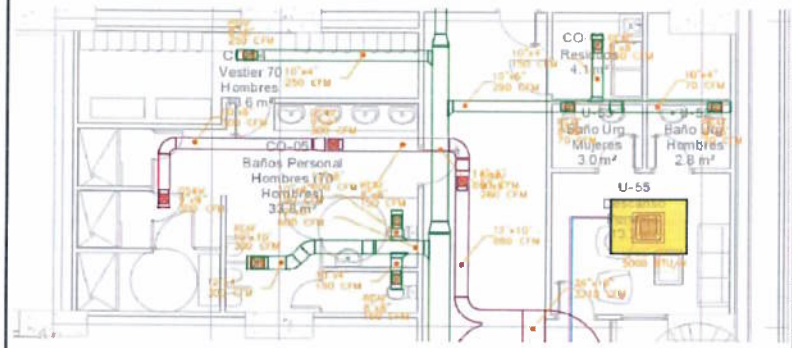

PISO 1



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCC-01					1,00	1,00
UFCC-02					1,00	1,00
UFCC-03					1,00	1,00
UFCC-12					1,00	1,00
UFCC-13					1,00	1,00
UFCC-14					1,00	1,00
TOTAL						6,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA..	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCC-01,02,03,12,13,14 Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette, Agua Helada, Capacidad Nominal 5000 Btu/hr, incluye: (Soporteria a la placa, Control Remoto, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

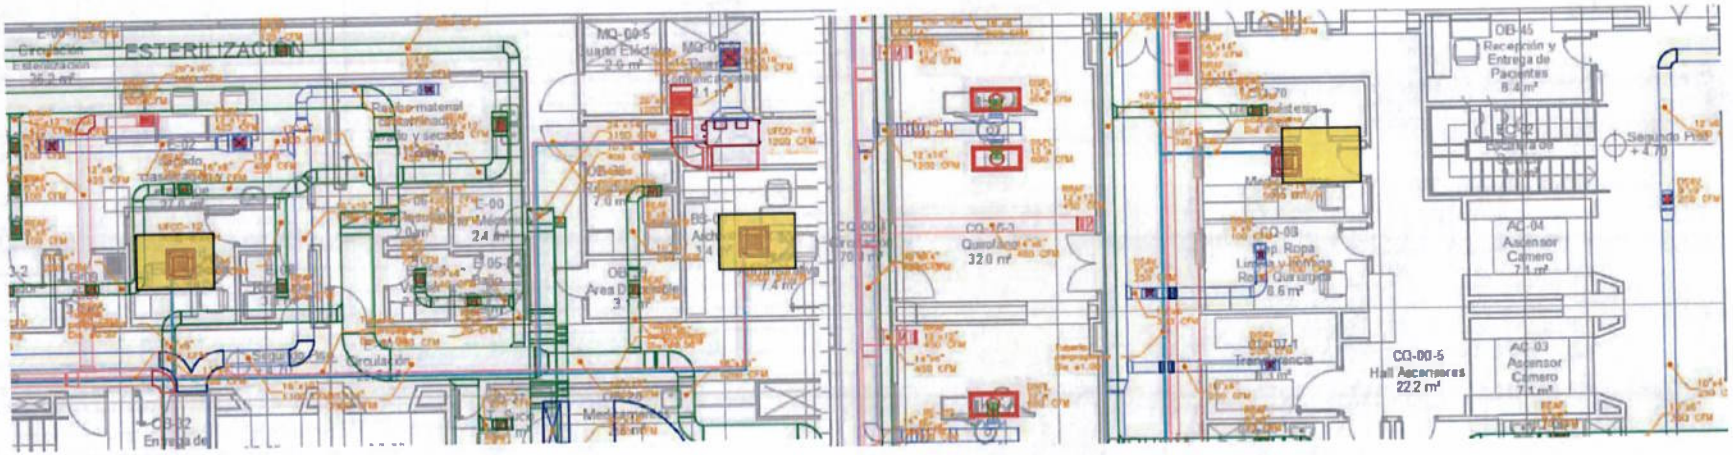


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	80.5.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

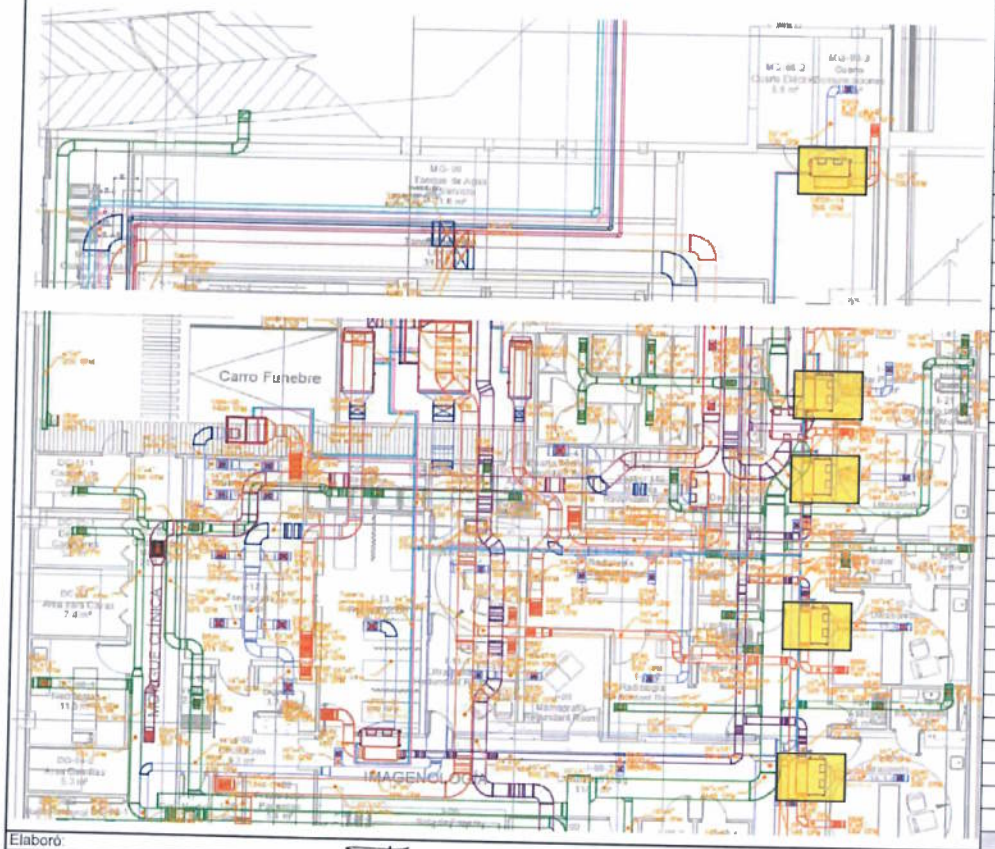

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCO-02					1,00	1,00
UFCO-03					1,00	1,00
UFCO-04					1,00	1,00
UFCO-05					1,00	1,00
UFCO-14					1,00	1,00
UFCO-17					1,00	1,00
UFCO-23					1,00	1,00
UFCO-24					1,00	1,00
UFCO-25					1,00	1,00
UFCO-26					1,00	1,00
TOTAL						10,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023


CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	80.5.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-02,03,04,05,14,17,26,23,24,25 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 300 CFM, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


PISO 1

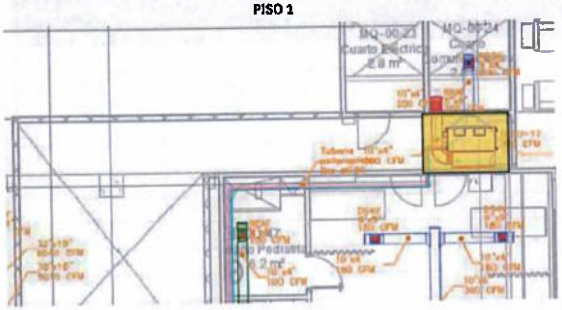


PISO 4

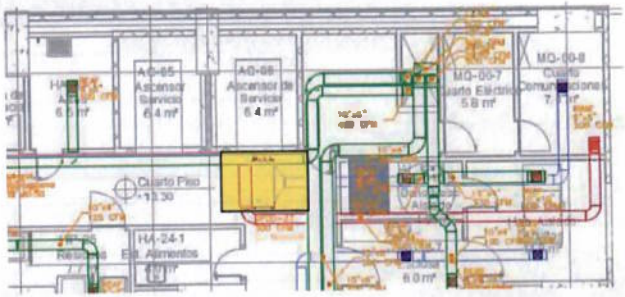


PISO 5

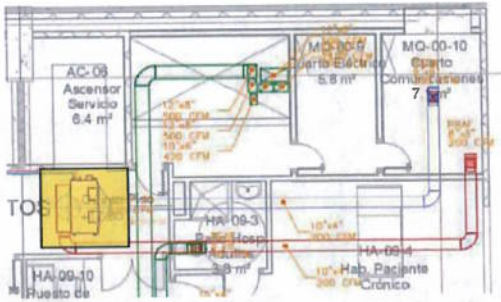

PISO 6

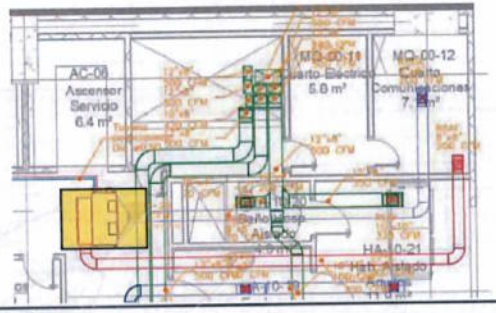

PISO 4

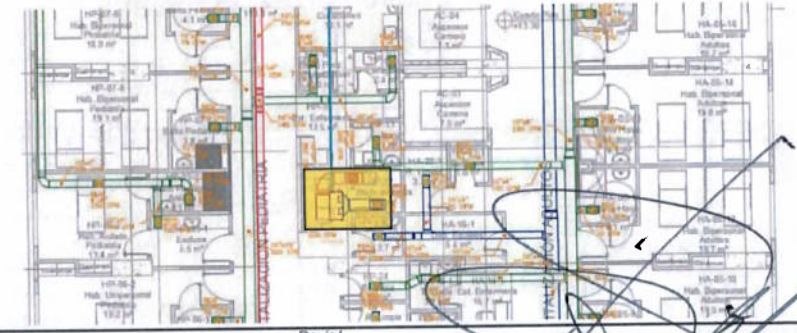


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA:	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	80.5.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-10,11 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 400 CFM, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

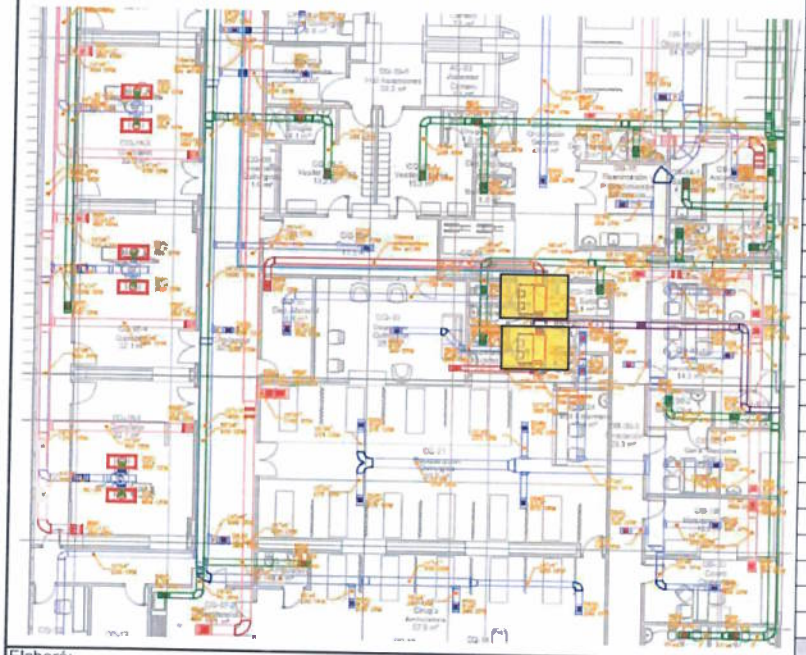

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCO-10					1,00	1,00
UFCO-11					1,00	1,00
TOTAL						2,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	80.5.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-01 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 600 CFM, Incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)		(c) UND:		UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

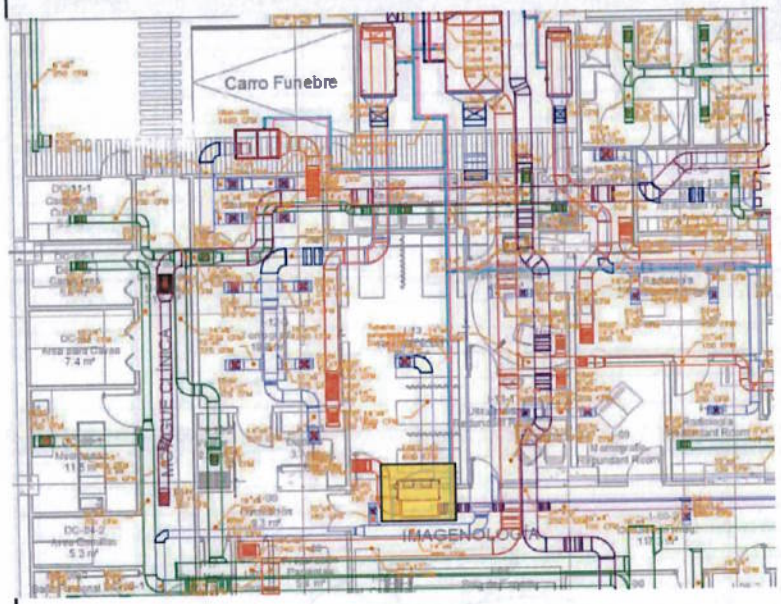

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCO-01					1,00	1,00
TOTAL						1,00


Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
(a) ITEM N°:	80.5.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-15 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 800 CFM, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO

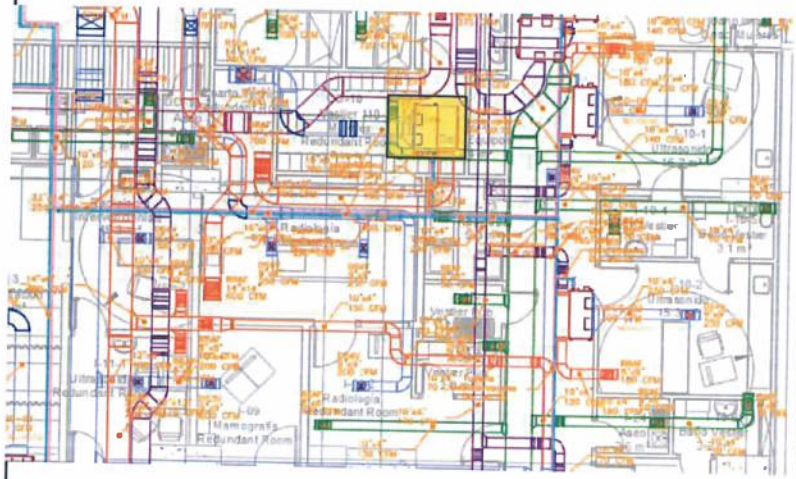

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCO-15					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023


CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	80.5.8.7	(b) DESCRIPCION ITEM	UFCO-19,21 Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta, Agua Helada, Capacidad Nominal 1200 CFM, incluye: (Soporteria a la placa, Termostato Alambrico, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas)			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 2

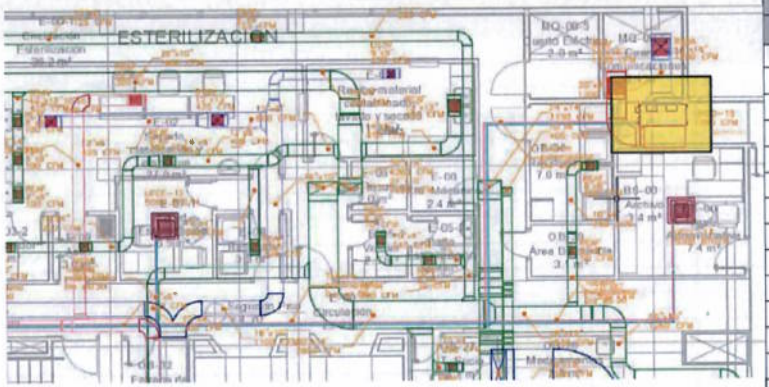

PISO 3

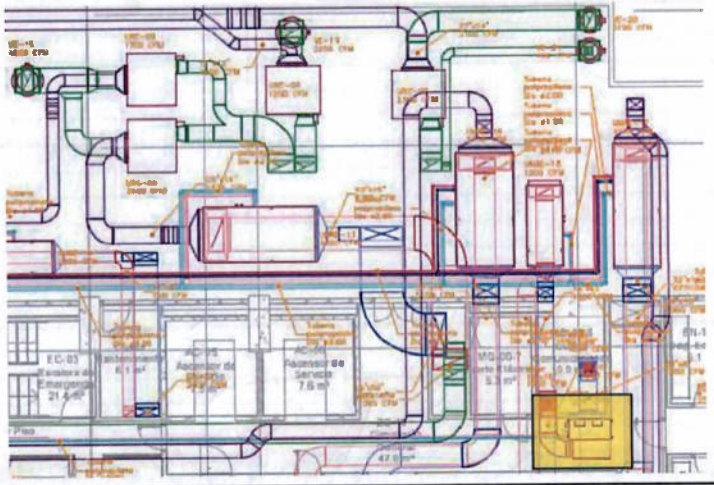

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
EDIFICIO ASISTENCIAL						
UFCO-17					1,00	1,00
UFCO-21					1,00	1,00
TOTAL						2,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	20	FECHA :	JUNIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	81.4.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	EAF-03 Unidad de enfriamiento de agua, condensada por aire, compresores tipo Scroll, 2 Bombas Incorporadas, Capacidad 100 TR , R410A, Trifasico, 220 / 3 / 60 incluye: (Bases Antivibratorias, Suministro, Instalacion, Izada, Pruebas)		(c) UND:	UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

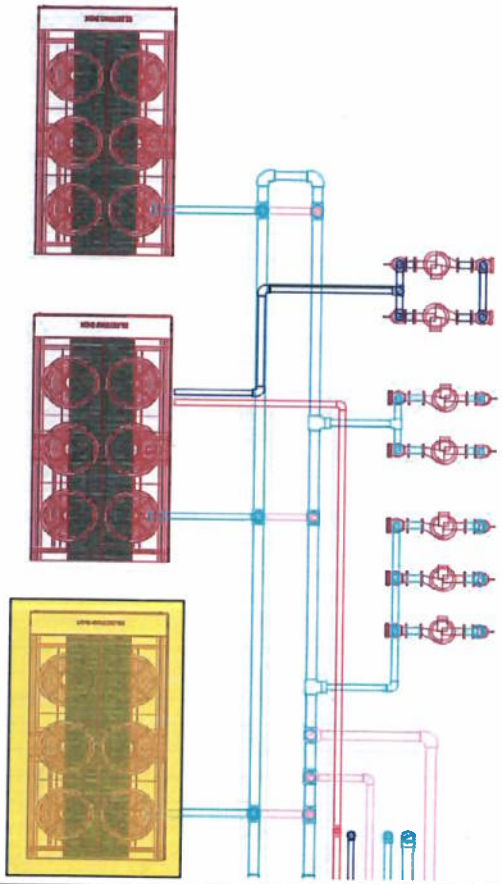

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
EDIFICIO ASISTENCIAL						
EAF-03					1,00	1,00
TOTAL						1,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE
CONSORCIO

ENTRADA DE ALMACÉN

Responsable: Jefe de Unidad Operativa

Revisión No 6

05062016

Página No. de

Consecutivo No 1

OBRA:	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	CALLE 7 SUR # 14-69, GARZON HUILA
PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA No.
C.C. O NIT:	
DIRECCIÓN:	
TELEFONO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	EAF-01 REF:FCL/40HQ	1	1		
	EAF-02 REF:FCL/40HQ	1	1		
	EAF-03 REF:FCL/40HQ	1	1		
	UMAE-01 Modelo #CLCA010-2015	1	1		
	UMAE-02 Modelo #CLCA004-1510	1	1		
	UMAE-03 Modelo #CLCA003-1010	1	1		
	UMAE-04 Modelo #CLCA014-3015	1	1		
	UMAE-05 Modelo #CLCA012-2515	1	1		
	UMAE-09 Modelo #CLCA008-2510	1	1		
	UMAE-10 Modelo #CLCA008-2510	1	1		
	UMAE-11 Modelo #CLCA004-1510	1	1		
	UMAE-12 Modelo #CLCA004-1510	1	1		
	UMAE-13 Modelo #CLCA025-3025	1	1		
	UMAE-14 Modelo #CLCA006-2010	1	1		
	UMAE-16 Modelo #CLCA012-2515	1	1		
	UMAE-17 Modelo #CLCA012-2515	1	1		
	UMAE-18 Modelo #CLCA004-1510	1	1		
	UMAE-20 Modelo #CLCA016-2520	1	1		
	UMA-02 Modelo #CLCA004-1510	1	1		
	UFCO-02-05-1 Modelo HFHC04R3052A5BB02C	1	10		
	UFCO-10-11-1 Modelo HFCF06R3052A5BB02C	1	2		
	UFCO-01 Modelo HFCF08R3052A5BB02C	1	1		
	UFCO-15 Modelo HFCF10R3052A5BB02C	1	1		
	UFCO-19-21-1 Modelo HFCF14R3052A5BB02C	1	2		

MATERIALES [ ] EQUIPOS [X]

OBSERVACIONES GENERALES Y CRITERIO DE ACEPTACION

JUSTIFICACIÓN

Elaboró:	Fabio Ochoa
Fecha:	14/07/2026
Revisó y Aprobó:	
Fecha:	

TRANE

Remisión

NÚMERO DE REMISIÓN

1315402278

09-JUL-2026 14:57

ALMACÉN ORIGEN
Diagonal 22
No 53-43 - Barrio el Bosque
CARTAGENA
CO
Teléfono 1
Fax 1

VENDIDO POR
Trane de Colombia S A
Avenida Carrera 45
No 106-27 Torre 2 Piso 18 Edificio paralelo 108
BOGOTA
COLOMBIA

Fecha de embarque 09-07-2026
Número de Orden 81386130
Vendedor Bogota SO TCS CO
Transportista.
Términos de embarque DDP
Tipo de vehículo LTL

FACTURADO A
CONSORCIO SAN VICENTE
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2
VIA PALERMO
NEIVA 410001 -
HUILA
CO
IVA

NÚMERO DE CLIENTE
4423155

EMBARCADO A
CONSORCIO SAN VICENTE
CR 4 2 85 ZN INDUSTRIAL KM 3 2 VIA PALERMO
CONSORCIO SAN VICENTE
NEIVA 410001
HUILA
CO
IVA 901785549-8

Instrucciones de Embarque:

Modelo	Descripcion	Cantidad	Numero de Serie	Proyecto / #PO	Tarea
CLCA003*63808636	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421001	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA004*63808628	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421002	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA004*63808632	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060413001	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA004*63808634	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421003	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA004*63808646	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421004	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA004*63808648	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421005	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA006*63808622	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060421006	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA008*63808642	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420001	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades	1			
CLCA008*63808644	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420002	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades.	1			

Datos de Transporte		Datos del Cliente	
Recibo de Conformidad y Percibo la Integridad Física de los equipos Nombre Fecha Emb Hora Salida	Sello	Firma Nombre	Fecha Recibido

Scanned with CamScanner

TRANE

Remisión

NÚMERO DE REMISIÓN:
1315402278

Instrucciones de Embarque:					
Modelo	Descripción	Cantidad	Número de Serie	Proyecto / #PO	Tarea
CLCA010*63808618	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420003.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA012*63808624	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420004.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA012*63808626	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420005.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA012*63808640	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420006.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA014*63808638	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420007.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA016*63808630	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420008.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
CLCA025*63808620	CLIMATE CHANGER ADVANCED	1	50220060420009.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
HFCF04R3052A5BB02C	FAN COIL UNIT	10	51829360424001., 51829360424002., 51829360424003., 51829360424004., 51829360424005., 51829360424006., 51829360424007., 51829360424008., 51829360424009., 51829360424010.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	10			
HFCF06R3052A5BB02C	FAN COIL UNIT	2	51829460424001., 51829460424002.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	2			
HFCF08R3052A5BB02C	FAN COIL UNIT	1	51829560424001.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
HFCF10R3052A5BB02C	FAN COIL UNIT	1	51829760424001.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	1			
HFCF14R3052A5BB02C	FAN COIL UNIT	2	51829960424001., 51829960424002.	CO-5738-10681	010
	Total de Unidades:	2			

Unidades Totales: 32

Datos de Transporte:	Datos del Cliente:		
Recibo de Conformidad y Percibo la Integridad Física de los equipos Nombre: Fecha Emb: Hora Salida:	Sello:	Firma: Nombre:	Fecha Recibido:

Scanned with CamScanner

ORIGINAL
Red foil indicates ORIGINAL

Expeditors International Ocean

Expeditors®
BILL OF LADING

SHIPPER (Name and Full Address) TRANE AIR CONDITIONING SYSTEMS (CHINA) CO LTD NO.88 EAST SUZHOU ROAD, TAICANG JIANGSU CHINA	SHIPPER'S I.D. BOX
BOOKING NUMBER ONEYSHAGE6300400	B/L NUMBER 6396039473
EXPORT REFERENCES SHPR REF: 75Y822,CFR.	
CONSIGNEE (Name and Full Address/Non-Negotiable Unless Consigned to Order) TRANE DE COLOMBIA S.A NIT 8300223191 ENTREGA DIRECTO AV CRA 45 # 108-27 TORRE 3 PISO 17 BOGOTA COLOMBIA MARIA CARDENAS /3214200868	FORWARDING AGENT REFERENCES BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH SHANGHAI 200335
	POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS
NOTIFY PARTY /INTERMEDIATE CONSIGNEE (Name and Full Address) TRANE DE COLOMBIA S.A NIT 8300223191 ENTREGA DIRECTO AV CRA 45 # 108-27 TORRE 3 PISO 17 BOGOTA COLOMBIA MARIA CARDENAS /3214200868	ALSO NOTIFY(Name and Full Address) / DOMESTIC ROUTING/ EXPORT INSTRUCTIONS/ PIER TERMINAL/ONWARD ROUTING FROM POINT OF DESTINATION. FOR RELEASE OF CARGO PLEASE CONTACT:
INITIAL CARRIAGE	PLACE OF RECEIPT TAICANG, CHINA
EXPORT CARRIER (Vessel, voyage) MSC VIRGO , FA618A	PORT OF LOADING SHANGHAI
PORT OF DISCHARGE BUENAVENTURA	PLACE OF DELIVERY BUENAVENTURA

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

MARKS AND NUMBERS/ CONTAINER NUMBERS	NOS. OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT KGS	MEASUREMENT CBM
75Y822	5PKG	AIR COOLED SCREW CHILLER & AIR COOLED CHILLER (HEAT PUMP)	12766.00 KG	95.370 M3
		****FREIGHT PREPAID**** SHIPPER LOAD & COUNT		
BEAU4619198 CY/CY	Size :40H	3 PKG Seal:CN82605AX	5122.00 KG	38.890 M3
CAIU8932712 CY/CY	Size :40H	2 PKG Seal:CN82715AX	7644.00 KG	56.480 M3
TOTALS:		2 Container(s) LADEN ON BOARD 05/06/26 Page 1 of 1		

Expeditors de Colombia Ltda.
NIT: 830.050.256-3
19 JUN 2026
LIBERAMOS ESTE DOCUMENTO EN CUANTO A FLETES SE REFIERE.

SHIPPER'S DECLARED VALUE: $ _____
IF MERCHANT ENTERS A VALUE, CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY AND THE AD VALOREM RATE WILL BE CHARGED.

BILL OF LADING TO BE RELEASED AT

FREIGHT RATES, CHARGES, WEIGHT AND/OR MEASUREMENT(S) SUBJECT TO CORRECTION	PREPAID	COLLECT
DECLARED VALUE CHARGES		
TOTAL		

The Goods, or the container(s) or package(s) said to contain the cargo herein mentioned, to be carried subject to all the terms and conditions of this Bill of Lading by the vessel named herein or any substitute at the Carrier's option and/or other means of transport, from the place of receipt or the port of loading to the port of discharge or the place of delivery shown herein and there to be delivered unto order or assigns. In accepting this Bill of Lading, Shipper (as defined by Article 1 on the back hereof) agrees to be bound by all stipulations, exceptions, terms, and conditions on the face and back hereof, whether written, typed, stamped, or printed, as fully as if signed by the Shipper, any local custom or privilege to the contrary notwithstanding, and understands that Carrier's liability will be limited as set forth in Article 22, unless Shipper declares an ad valorem valuation in excess of $500 per container per package, or in case of Goods not shipped in packages, per customary freight unit, and pays extra freight as required by the Carrier's published tariff.

IN WITNESS WHEREOF THE CARRIER BY ITS AGENT HAS SIGNED 3 BILLS OF LADING, ALL OF THIS SAME TENOR AND DATE, ONE OF WHICH BEING ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO STAND VOID.

DATED AT PORT OF LOADING SHOWN ABOVE
For EXPEDITORS INTERNATIONAL OCEAN

BY _____ DATE 05/06/26
as the Carrier

An original version of this bill of lading, with certain rights, terms and conditions and exceptions limiting the liability of Carrier, is available at Expeditor's website at www.expeditors.com/terms-conditions. All services provided are subject to these terms and conditions.

OCEAN NETWORK EXPRESS

SECOND ORIGINAL

BILL OF LADING

(NON NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER)

BOOKING NO. SHAGE6300400	BILL OF LADING NO. ONEYSHAGE6300400

SHIPPER/EXPORTER
BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL
CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH
NO.1,LANE
128,, LINGHONG ROAD SHANGHAI 200335
CHINA

EXPORT REFERENCES(for the Merchant's and/or Carrier's reference only. See back clause 8. (4).)

CONSIGNEE
EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA.
CRA 11 # 84A-09 ENT. NORTE OF.401 A
CI DIAN
4347 - NIT: 830.050.256-3 CN>

FORWARDING AGENT-REFERENCES
FMC NO.
BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL
CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH
NO.1,LANE128,, LINGHONG ROAD <

NOTIFY PARTY (It is agreed that no responsibility shall be attached to the Carrier or its Agents for failure to notify)
EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA.
CRA 11 # 84A-09 ENT. NORTE OF.401 A
CI DIAN 4347- NIT: 830.050.256-3
BOGOTA D.C. TEL: 571 NP>

RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Receipt", to be carried subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, as applicable. Delivery of the Goods to the Carrier for Carriage hereunder constitutes acceptance by the Merchant (as defined hereinafter) of all the terms and conditions, whether printed, stamped or otherwise incorporated on this side and on the reverse side of this Bill of lading and the terms and conditions of the Carrier's applicable tariff(s) as if they were all signed by the Merchant, and (b) that any prior regret conditions and/or agreements for or in connection with Carriage of the Goods are superseded by this Bill of Lading. If this is a negotiable (To Order/to) Bill of Lading, one original Bill of Lading, duly endorsed must be surrendered by the Merchant to the Carrier together with any outstanding Freighting in exchange for the Goods or a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System. If this is a non-negotiable (straight) Bill of Lading, or where issued as a Sea Waybill, the Carrier shall deliver the Goods or issue a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System (after payment of outstanding Freight) to the named consignee against the surrender of one original Bill of Lading, or in the case of a Sea Waybill, on production of such reasonable proof of identity as may be required by the Carrier, or in accordance with the national law at the Port of Discharge or Place of Delivery as applicable. IN WITNESS WHEREOF the Carrier or their Agent has signed the number of Bills of Lading stated at the top, all of this tenor and date, and whenever one original Bill of Lading has been surrendered all other Bills of Lading shall be void.

PRE-CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT: SHANGHAI
OCEAN VESSEL VOYAGE NO. FLAG: HSC VIRGO FA618A	PORT OF LOADING: SHANGHAI
PORT OF DISCHARGE: BUENAVENTURA	PLACE OF DELIVERY: BUENAVENTURA

FINAL DESTINATION(for the Merchant's reference only)

TYPE OF MOVEMENT(IF MIXED, USE DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS FIELD): FCL / FCL CY / CY

(CHECK "HM" COLUMN IF HAZARDOUS MATERIAL) PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER BUT NOT ACKNOWLEDGED BY THE CARRIER

CNTR. NOS. W/SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	H M	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	GROSS MEASUREMENT
BEAU4619198 / CN02605AX CAIU8932712 / CN02715AX			3 PACKAGES /FCL / FCL/40HQ/5122.000KGS/38.890M3 2 PACKAGES /FCL / FCL/40HQ/7644.000KGS/56.480M3		
EI REF: SHA9028777 SAME AS INVOICE	5 PACKAGES		5 PACKAGES IN TOTAL 2X40HC CONTAINER(S) SAID TO CONTAIN: AIR COOLED SCREW CHILLER & AIR COOLED CHILLER (HEAT PUMP) HS CODE:8418692090 S/C#HKGN01422A FREIGHT PREPAID RATED ORIGINAL BILL SCAC:EXDO	12766.000KGS	95.370CBM

** TO BE CONTINUED ON ATTACHED LIST **

Declared Cargo Value US $ _____. If Merchant enters a value, Carrier's limitation of liability shall not apply and the ad valorem rate will be charged.

FREIGHT & CHARGES PAYABLE AT / BY: SHANGHAI, SHANGHAI BOGOTA	SERVICE CONTRACT NO. HKGN01422A	DOC FORM NO.	COMMODITY CODE	EXCHANGE RATE

CODE	TARIFF ITEM	FREIGHTED AS	RATE	PREPAID	COLLECT

FLETES LIBERADOS
1 p [illegible] 2026
CIA TRANSPORTADORA S.A.S.
AS AGENTE ONLY

[3] ORIGINAL BILL(S) OF LADING HAVE BEEN SIGNED, WHERE DELIVERED AGAINST ONE, THE OTHER(S) TO BE VOID.

DATE CARGO RECEIVED

DATE LADEN ON BOARD: 06 MAY 2026

PLACE OF BILL(S) ISSUE: BUENAVENTURA

DATED: 06 MAY 2026

The printed terms and conditions on this Bill are available at its website at www.one-line.com

SIGNED BY: COMPANIA TRANSPORTADORA BUENAVENTUR

, as agent for and on behalf of

Ocean Network Express Pte, Ltd.

OCEAN NETWORK EXPRESS

SECOND ORIGINAL

VESSEL VOYAGE: MSC VIRGO FA618A

B/L NO.: ONEYSHAGE6300400

CNTR NOS. /SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	H.M.	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
			CN> BOGOTA D.C. TEL: 571 3130098 COLOMBIA NP> 3130098 COLOMBIA		
			OCEAN FREIGHT PREPAID "DESTINATION CHARGES COLLECT PER LINE TARIFF AND OTHER CHARGES TO BE COLLECTED FROM THE PARTY WHO LAWFULLY DEMANDS DELIVERY OF THE CARGO WITHOUT PREJUDICE TO THE CARRIER'S RIGHTS AGAINST THE MERCHANT (SEE BACK CLAUSE 1) AS SET OUT AT BACK CLAUSE 13(1)" FREIGHT PREPAID SHANGHAI 200335 CHINA		

SIGNED BY: COMPANIA TRANSPORTADORA BUENAVENTUR

as agent for and on behalf of

Ocean Network Express Pte. Ltd.

(ONE) AS CARRIER

SECOND ORIGINAL BILL OF LADING

(NON NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER)

OCEAN NETWORK EXPRESS

SHIPPER/EXPORTER
BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL
CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH
NO.1,LANE
128,, LINGHONG ROAD SHANGHAI 200335
CHINA

BOOKING NO. SHAGE6300400
BILL OF LADING NO. ONEYSHAGE6300400
EXPORT REFERENCES (for the Merchant's and/or Carrier's reference only. See back clause 8. (c).)

CONSIGNEE
EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA.
CRA 11 # 84A-09 ENT. NORTE OF.401 A
CI DIAN
4347 - NIT: 830.050.256-3 CN>

FORWARDING AGENT-REFERENCES
FMC NO.
BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL
CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH
NO.1,LANE128,, LINGHONG ROAD

NOTIFY PARTY (It is agreed that no responsibility shall be attached to the Carrier or its Agents for failure to notify)
EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA.
CRA 11 # 84A-09 ENT. NORTE OF.401 A
CI DIAN 4347- NIT: 830.050.256-3
BOGOTA D.C. TEL: 571 NP>

RECEIVED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Receipt", to be carried subject to all the terms and conditions hereof from the Place of Receipt or Port of Loading to the Port of Discharge or Place of Delivery, as applicable. Delivery of the Goods to the Carrier for Carriage hereunder constitutes acceptance by the Merchant (as defined hereinafter) (i) of all the terms and conditions, whether printed, stamped or otherwise incorporated on this side and on the reverse side of this Bill of Lading and the terms and conditions of the Carrier's applicable tariff(s) as if they were all signed by the Merchant, and (ii) that any prior representations and/or agreements for or in connection with Carriage of the Goods are superseded by this Bill of Lading. If this is a negotiable (To Order/To Bearer) Bill of Lading, one original Bill of Lading duly endorsed must be surrendered by the Merchant to the Carrier (together with any outstanding Freight) in exchange for the Goods or a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System. If this is a non-negotiable (straight) Bill of Lading, or where issued as a Sea Waybill, the Carrier shall deliver the Goods or issue a Delivery Order or the pin codes for any applicable Electronic Release System (after payment of outstanding Freight to the named consignee against the surrender of one original Bill of Lading, or in the case of a Sea Waybill, on production of such reasonable proof of identity as may be required by the Carrier, or in accordance with the national law at the Port of Discharge or Place of Delivery as applicable. IN WITNESS WHEREOF the Carrier or their Agent has signed the number of Bills of Lading stated at the top, all of this tenor and date, and whenever one original Bill of Lading has been surrendered all other Bills of Lading shall be void.

PRE-CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT
	SHANGHAI
OCEAN VESSEL VOYAGE NO. FLAG	**PORT OF LOADING**
MSC VIRGO FA618A	SHANGHAI
PORT OF DISCHARGE	**PLACE OF DELIVERY**
BUENAVENTURA	BUENAVENTURA

FINAL DESTINATION (for the Merchant's reference only)

TYPE OF MOVEMENT (IF MIXED, USE DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS FIELD)
FCL / FCL CY / CY

PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER BUT NOT ACKNOWLEDGED BY THE CARRIER

(CHECK "HM" COLUMN IF HAZARDOUS MATERIAL) CNTR. NOS. /SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	H M	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	GROSS MEASUREMENT
BEAU4619198 / CN82605AX.		/	3 PACKAGES /FCL / FCL/40HQ/5122.000KGS/38.890M3		
CAIU8932712 / CN82715AX		/	2 PACKAGES /FCL / FCL/40HQ/7644.000KGS/56.480M3		
				12766.000KGS	95.370CBM
EI REF: SHA9028777 SAME AS INVOICE	5 PACKAGES		5 PACKAGES IN TOTAL 2X40HC CONTAINER(S) SAID TO CONTAIN: AIR COOLED SCREW CHILLER & AIR COOLED CHILLER (HEAT PUMP) HS CODE:8418692090 S/C#HKGN01422A FREIGHT PREPAID RATED ORIGINAL BILL SCAC:EXDO		

** TO BE CONTINUED ON ATTACHED LIST **

Declared Cargo Value US $ _____ If Merchant enters a value, Carrier's limitation of liability shall not apply and the ad valorem rate will be charged.

FREIGHT & CHARGES PAYABLE AT/BY SHANGHAI, SHANGHAI BOGOTA	SERVICE CONTRACT NO.	DOC FORM NO.	COMMODITY CODE	EXCHANGE RATE
	HKGN01422A			

CODE	TARIFF ITEM	FREIGHTED AS	RATE	PREPAID	COLLECT

FLETES LIBERADOS
1º MAY 2026
CIA TRANSPORTADORA S.A.S.
AS AGENTS ONLY

[3] ORIGINAL BILLS(S) OF LADING HAVE BEEN SIGNED, WHERE DELIVERED AGAINST ONE, THE OTHERS(S) TO BE VOID.

DATE CARGO RECEIVED

DATE LADEN ON BOARD
06 MAY 2026

PLACE OF BILL(S) ISSUE
BUENAVENTURA

DATED
06 MAY 2026

The printed terms and conditions on this Bill are available at its website at www.ons-line.com

SIGNED BY: COMPANIA TRANSPORTADORA BUENAVENTUR, as agent for and on behalf of

Ocean Network Express Pte. Ltd.

OCEAN NETWORK EXPRESS

ORIGINAL
Red foil indicates ORIGINAL

Expeditors International Ocean

Expeditors®
BILL OF LADING

SHIPPER (Name and Full Address) TRANE AIR CONDITIONING SYSTEMS (CHINA) CO LTD NO.88 EAST SUZHOU ROAD, TAICANG JIANGSU CHINA	SHIPPER'S I.D. BOX	BOOKING NUMBER ONEYSHAGE6300400	B/L NUMBER 6396039473
		EXPORT REFERENCES SHPR REF: 75Y822,CFR.	
CONSIGNEE (Name and Full Address/Non-Negotiable Unless Consigned to Order) TRANE DE COLOMBIA S.A NIT 8300223191 ENTREGA DIRECTO AV CRA 45 # 108-27 TORRE 3 PISO 17 BOGOTA COLOMBIA MARIA CARDENAS /3214200868		FORWARDING AGENT REFERENCES BEIJING KANGJIEKONG INTERNATIONAL CARGO AGENT CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH SHANGHAI 200335	
		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS	
NOTIFY PARTY /INTERMEDIATE CONSIGNEE (Name and Full Address) TRANE DE COLOMBIA S.A NIT 8300223191 ENTREGA DIRECTO AV CRA 45 # 108-27 TORRE 3 PISO 17 BOGOTA COLOMBIA MARIA CARDENAS /3214200868		ALSO NOTIFY(Name and Full Address) / DOMESTIC ROUTING/ EXPORT INSTRUCTIONS/ PIER TERMINAL/ONWARD ROUTING FROM POINT OF DESTINATION. FOR RELEASE OF CARGO PLEASE CONTACT:	
INITIAL CARRIAGE	PLACE OF RECEIPT TAICANG, CHINA		
EXPORT CARRIER (Vessel, voyage) MSC VIRGO , FA618A	PORT OF LOADING SHANGHAI		
PORT OF DISCHARGE BUENAVENTURA	PLACE OF DELIVERY BUENAVENTURA		

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

MARKS AND NUMBERS/ CONTAINER NUMBERS	NOS. OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT KGS	MEASUREMENT CBM
75Y822	5PKG	AIR COOLED SCREW CHILLER & AIR COOLED CHILLER (HEAT PUMP)	12766.00 KG	95.370 M3
		****FREIGHT PREPAID**** SHIPPER LOAD & COUNT		
BEAU4619198 CY/CY	Size :40H	3 PKG Seal:CN82605AX	5122.00 KG	38.890 M3
CAIU8932712 CY/CY	Size :40H	2 PKG Seal:CN82715AX	7644.00 KG	56.480 M3
TOTALS:		2 Container(s) LADEN ON BOARD 05/06/26		
		Page 1 of 1		

Expeditors de Colombia Ltda.
NIT: 830.050.256-3
19 JUN 2026
LIBERAMOS ESTE DOCUMENTO EN CUANTO A FLETES SE REFIERE.

SHIPPER'S DECLARED VALUE: $ _____
IF MERCHANT ENTERS A VALUE, CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY AND THE AD VALOREM RATE WILL BE CHARGED.

BILL OF LADING TO BE RELEASED AT		
FREIGHT RATES CHARGES WEIGHT AND/OR MEASUREMENTS SUBJECT TO CORRECTION	PREPAID	COLLECT
DECLARED VALUE CHARGES		
TOTAL		

The Goods, or the container(s) or package(s) said to contain the cargo herein mentioned, to be carried subject to all the terms and conditions of this Bill of Lading by the vessel named herein or any substitute at the Carrier's option and/or other means of transport, from the place of receipt or the port of loading to the port of discharge or the place of delivery shown herein and there to be delivered unto order or assigns, in accepting this Bill of Lading, Shipper (as defined by Article 1 on the back hereof) agrees to be bound by all stipulations, exceptions, terms, and conditions on the face and back hereof, whether written, typed, stamped, or printed, as fully as if signed by the Shipper, any local custom or privilege to the contrary notwithstanding, and understands that Carrier's liability will be limited as set forth in Article 22, unless Shipper declares all valuation in excess of $500 per container, per package, or in case of Goods not shipped in packages, per customary freight unit, and pays extra freight as required by the Carrier's published tariff.

IN WITNESS WHEREOF THE CARRIER BY ITS AGENT HAS SIGNED 3 BILLS OF LADING, ALL OF THIS SAME TENOR AND DATE, ONE OF WHICH BEING ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO STAND VOID.

DATED AT PORT OF LOADING SHOWN ABOVE
For EXPEDITORS INTERNATIONAL OCEAN

BY _____ DATE 05/06/26
as the Carrier

All original versions of this straight, negotiable or shipper's order bill of lading are subject to the terms and conditions of service on the reverse side of this bill of lading. These terms and conditions are also available at www.expeditors.com/terms-conditions. All services provided are subject to these terms and conditions.

REV 2/03

SECOND ORIGINAL

B/L NO.: ONEYSHAGE6300400

VESSEL VOYAGE: MSC VIRGO FA618A

CNTR NOS. / SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS DECLARATION ONLY)	N M	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
			CN> BOGOTA D.C. TEL: 571 3130098 COLOMBIA NP> 3130098 COLOMBIA		
OCEAN FREIGHT PREPAID "DESTINATION CHARGES COLLECT PER LINE TARIFF AND OTHER CHARGES TO BE COLLECTED FROM THE PARTY WHO LAWFULLY DEMANDS DELIVERY OF THE CARGO WITHOUT PREJUDICE TO THE CARRIER'S RIGHTS AGAINST THE MERCHANT (SEE BACK CLAUSE 1) AS SET OUT AT BACK CLAUSE 13(1)" FREIGHT PREPAID SHANGHAI 200335 CHINA					

SIGNED BY: COMPANIA TRANSPORTADORA BUENAVENTUR

as agent For and on behalf of

Ocean Network Express Pte. Ltd.

(ONE) AS CARRIER

SECOND ORIGINAL

B/L NO.: ONEYSHAGE6300400

VESSEL VOYAGE: MSC VIRGO FAG18A

CTR# NOS. W/SEAL NOS. MARKS & NUMBERS	QUANTITY (FOR CUSTOMS CLEARANCE ONLY)	H M	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
			CN> BOGOTA D.C. TEL: 571 3130098 COLOMBIA NP> 3130098 COLOMBIA		
OCEAN FREIGHT PREPAID "DESTINATION CHARGES COLLECT" THE PARTY WHO LAWFULLY DEMANDS CARRIER'S RIGHTS AGAINST THE CLAUSE 13(1)" FREIGHT PREPAID SHANGHAI 200335 CHINA			PER LINE TARIFF AND OTHER CHARGES TO BE COLLECTED FROM DELIVERY OF THE CARGO WITHOUT PREJUDICE TO THE MERCHANT (SEE BACK CLAUSE 1) AS SET OUT AT BACK		

SIGNED BY COMPANIA TRANSPORTADORA BUENAVENTUR

as agent for and on behalf of

Ocean Network Express Pte. Ltd.

(ONE) AS CARRIER

23-04-26 2:28PM
